

15_Planraum_Export.txt

Planraum Nordfeld Architektur

Projekt HM-BA26 / Schule Brückenanger

Export durch Lea Wernicke am 24.09.2026, 16:10 Uhr

02.09.2026 09:30 A-101/B eingestellt, Zweck Koordination

04.09.2026 11:02 A-101/B an Lenz Metallbau versandt

08.09.2026 15:42 T-201/B von Rautenberg eingegangen

11.09.2026 10:18 M-17/0 von Lenz eingegangen, zur Prüfung

12.09.2026 14:05 L-301/D von Behrens eingegangen

14.09.2026 17:20 A-101/C eingestellt, B im Büroarchiv ersetzt

15.09.2026 08:15 A-101/C an Behrens und Rautenberg versandt

16.09.2026 13:12 D-12/B an Bauherrschaft versandt

22.09.2026 14:25 TGA-Mail seitliche Route abgelegt

24.09.2026 14:25 Bauherren-Mail abgelegt

Für A-101/C ist im Export kein Versand an Lenz Metallbau erfasst.

Eine Freigabe zur Ausführung ist für die oben aufgeführten Ausbaupläne nicht eingetragen.

Die Ereignisliste gibt den gespeicherten Planraumstand wieder; mündliche Erklärungen werden hier nicht erfasst.

gez. Lea Wernicke

12_TGA_Antwort.eml

Von	"Tammo Behrens", Fachplaner Lüftung <t.behrens@behrens-tga.example>
An	"Lea Wernicke", Architektin <l.wernicke@nordfeld-architektur.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	HM-BA26 Seitliche Kanalroute F-01

Sehr geehrte Frau Wernicke,

die seitliche Route im Deckenfeld zwischen Achse 2 und 3 ist hinsichtlich des freien Querschnitts mit 600 x 280 mm weiter bearbeitbar. Wir benötigen zwei zusätzliche Bögen und eine zugängliche Revisionsstelle vor dem Abzweig U-03. Die äußere Hülle bleibt mit 680 x 360 mm unverändert. Eine Reduzierung auf 600 x 200 mm frei bestätigen wir nicht.

Unser Blatt L-301/D enthält noch die direkte Route. Die seitliche Variante wird als Revision E erst nach dem Abgleich mit Leuchten und Revisionsöffnungen ausgegeben. Die Befestigung an der Bestandsdecke ist nicht Gegenstand dieser Mail; hierfür benötigen wir den bestätigten Befestigungsgrund und die Lastangaben des gewählten Systems.

Bitte halten Sie den Zugang zur Brandschutzklappe an Wand W-04 frei. Der dafür benötigte Wartungsraum ist im Fachblatt dargestellt. Die vorliegende Aussage betrifft keine brandschutztechnische Freigabe der gesamten Unterdecke und keine Ausführung vor Abschluss der Koordination.

Mit freundlichen Grüßen

Tammo Behrens, Fachplaner Lüftung

Behrens Gebäudetechnik

Am Hainfeld 15 · 31789 Hameln

t.behrens@behrens-tga.example

Anlagen: keine

13_Metallbau_Antwort.eml

Von	"Fenja Lenz", technische Leitung <f.lenz@lenz-metallbau.example>
An	"Lea Wernicke", Architektin <l.wernicke@nordfeld-architektur.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	HM-BA26 M-17 lichte Breite Tür T-01

Sehr geehrte Frau Wernicke,

unser Montageplan M-17/0 vom 11.09.2026 beruht auf dem am 04.09.2026 erhaltenen Grundriss A-101/B. Mit der dargestellten Profilkombination verbleiben aus der Rohbauöffnung 1,36 m rechnerisch 1,16 m lichte Durchgangsbreite. Die 1,20 m aus Ihrer Mail vom 16.09.2026 werden damit nicht erreicht.

Wir können eine schmalere Profilkombination untersuchen. Dazu benötigen wir die abschließend geforderte Funktion des Türfelds und die Anschlussausbildung an die flankierende Wand. Alternativ wäre eine größere Rohbauöffnung zu prüfen. Eine solche Änderung haben wir weder kalkuliert noch technisch freigegeben. Bitte die vorliegende Zeichnung nicht zur Fertigung verwenden.

Der Fertigungsvorlauf von 35 Kalendertagen beginnt mit der bestätigten Montagezeichnung und der Beauftragung. Die Prüfung durch die Objektplanung auf Übereinstimmung mit deren Planung ersetzt nicht unsere Fertigungsplanung. Eine neue Revision wird nach Klärung der Maße erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Fenja Lenz, technische Leitung
Lenz Metallbau GmbH
Gewerbeanger 18 · 31855 Aerzen
f.lenz@lenz-metallbau.example
Anlagen: keine

14_Bauherrenentscheidung.eml

Von	"Janne Vollmer", Geschäftsführerin <j.vollmer@schulbau-brueckenanger.example>
An	"Lea Wernicke", Architektin <l.wernicke@nordfeld-architektur.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	HM-BA26 Flurhöhe und seitliche Route

Sehr geehrte Frau Wernicke,

wir bevorzugen die seitliche Leitungsführung, sofern die Fachplanung deren Funktion bestätigt und die Revisionsöffnungen zugänglich bleiben. Eine Absenkung der Flurdecke unter die vereinbarte lichte Höhe von 2,75 m geben wir nicht frei. Die Ausführung soll weiterhin ruhig und durchgehend wirken; lokale Abkofferungen sind uns vor einer Entscheidung zeichnerisch zu zeigen.

Am Türfeld T-01 halten wir an der nutzbaren Breite 1,20 m fest. Eine Bestellung der derzeitigen Profilkombination ist nicht freigegeben. Bitte unterscheiden Sie in der Planliste unsere gestalterische Präferenz von der noch offenen technischen Bestätigung und vom Versand zur Ausführung.

Der Ausbauplantermin 09.10.2026 bleibt unser Ziel. Für zusätzliche Kosten der seitlichen Route liegt uns noch kein Betrag vor. Wir haben weder einen Nachtrag beauftragt noch eine Kostenneutralität bestätigt. Die Montagezeichnung M-17/0 soll bis zur Überarbeitung nur als vorliegender Unternehmerstand im Archiv bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Janne Vollmer, Geschäftsführerin

Schulbau Brückenanger gGmbH

Brückenanger 12 · 31787 Hameln

j.vollmer@schulbau-brueckenanger.example

Anlagen: keine


09_Planindex.csv

Projekt	Plan	Revision	Datum	Inhalt	Verwendung	Versand	Verfasser
HM-BA26	A-100	G	2026-02-12	Genehmigungsgrundriss	genehmigter Satz	2026-02-27 Bescheid	Lea Wernicke
HM-BA26	A-101	B	2026-09-02	Ausbaugrundriss	ersetzt durch C	2026-09-04 Lenz	Lea Wernicke
HM-BA26	A-101	C	2026-09-14	Flur und Tür T-01	zur Koordination	2026-09-15 Fachplaner	Lea Wernicke
HM-BA26	T-201	B	2026-09-08	Unterzug Achse 3	Fachplan Bestand	2026-09-09 Nordfeld	Iven Rautenberg
HM-BA26	L-301	D	2026-09-12	direkte Kanalroute	zur Koordination	2026-09-12 Nordfeld	Tammo Behrens
HM-BA26	M-17	0	2026-09-11	Flurverglasung T-01	zur Prüfung	2026-09-11 Nordfeld	Fenja Lenz
HM-BA26	D-12	B	2026-09-16	Fensterbrüstung	zur Fachabsimmung	2026-09-16 Bauherr	Lea Wernicke

05_Koordinationsschnitt_K07.png

Schule Brückenanger · Koordinationsschnitt K-07

15.09.2026 · F-01 / Achse 3 · Bezug FFB EG = 0,00 m · zur Koordination

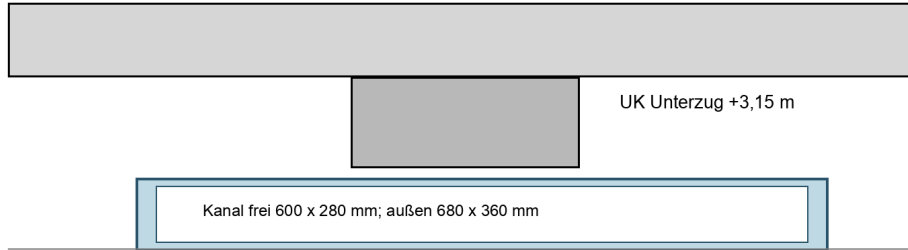

Direkte Route: $3,15 - 0,05 - 0,36 - 0,06 = 2,68$ m

Projektvorgabe lichte Höhe mindestens 2,75 m; Entwurfsdecke +2,80 m

Seitliche Route liegt außerhalb dieses Schnitts und ist in L-301/D noch nicht eingetragen.

50 mm Montageabstand und 60 mm Deckenunterkonstruktion gemäß Koordination 15.09.

Nordfeld Architektur · gez. Lea Wernicke · Darstellung nicht zur Maßentnahme

Bilddatei: 05_Koordinationsschnitt_K07.png

08_Hoehenketten.xlsx

Schule Brückenanger Höhenketten

HM-BA26 · Lea Wernicke · 15.09.2026 · alle Höhen und Dicken in m

Route / Stand	UK Tragwerk	Montage oben	Kanal frei	Dämmung je Seite	Decke unten	Lichte Höhe	Differenz Ziel
Direkt L-301/D	3,150	0,050	0,280	0,040	0,060	2,680	-0,070
Seitlich, Studie	3,600	0,050	0,280	0,040	0,060	3,130	0,380
Altstand L-301/B	3,150	0,050	0,200	0,040	0,060	2,760	0,010

Projektziel lichte Höhe	2,75
Entwurfsdecke UK	2.8

Quellen: T-201/B UK Unterzug 3,15 m, UK Decke 3,60 m; L-301/D Kanal 600 x 280 mm frei.
Dämmt 40 mm je Seite; Montageabstand 50 mm; Deckenunterkonstruktion 60 mm, Koordination 15.09.2026.
Seitliche Route ist eine geometrische Studie. Befestigung, Wartung und Abschottung sind nicht bestätigt.
Altstand zeigt die frühere Kanalhöhe von 200 mm frei; er ist keine bestätigte Alternative zum Fachstand D.

Blaue Zahlen auf hellem Feld sind Eingaben. Positive Resthöhe ist keine technische Freigabe.

gez. Lea Wernicke · Nordfeld Architektur

03_Entwurfsuebergabe.docx

Nordfeld Architektur

Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
l.wernicke@nordfeld-architektur.example

Schulbau Brückenanger gGmbH
Brückenanger 12 · 31787 Hameln

Hameln, 03.03.2026 · Bezug HM-BA26

Übergabe Entwurf und Ausstattungsentscheidungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir übergeben den bestätigten Entwurfsstand des Ostflügels als Grundlage der Ausführungsplanung. Der Flur F-01 verläuft zwischen den Achsen 1 bis 5 und den Unterrichtsräumen U-01 bis U-04. Der Bestand wurde mit einem Achsraster von 6,00 m aufgenommen; der Flur hat 2,40 m lichte Breite.

1 Bestätigte Nutzung

Die vier Unterrichtsräume werden mit jeweils bis zu 25 Lernenden und einer Lehrkraft belegt. Die Gruppenräume G-01 und G-02 werden nicht gleichzeitig mit voller Unterrichtsbelegung zusätzlich genutzt. Die durch die Bauherrschaft bestätigte Gesamtbelegung beträgt höchstens 120 Personen. Die Flurhöhe von mindestens 2,75 m wurde aus dem Nutzungskonzept übernommen; die Entwurfsdecke liegt bei 2,80 m.

2 Materialien und Anschlüsse

Im Flur ist eine demontierbare Unterdecke vorgesehen. Die Fenster erhalten innen eine Holzwerkstoffbank; außen ist eine Metallfensterbank mit seitlichen Abschlüssen vorgesehen. Die Leibungsdämmung wird nach dem bauphysikalischen Detail abgestimmt. Die im Entwurf gezeichneten 30 mm sind ein geometrischer Platzansatz, kein bereits bestätigter Systemnachweis.

Die Flurverglasung V-01 trennt den Eingangsbereich vom Unterrichtsflur. Die lichte Durchgangsbreite am Türfeld T-01 beträgt nach der Nutzungsvorgabe 1,20 m. Die Rohbauöffnung wird in A-101 mit 1,36 m vorgesehen. Das endgültige Profil-/Zargenmaß ist mit dem Montageplan abzugleichen; die Rohbauöffnung ist nicht mit der nutzbaren Breite gleichzusetzen.

3 Noch zu koordinierende Beiträge

Die Lüftungsplanung ist mit dem Unterzug in Achse 3 abzugleichen. Der Tragwerksplan weist die Unterkante auf 3,15 m über Fertigfußboden aus. Im Vorentwurf der TGA war eine Kanalhülle von 0,28 m angesetzt. Eine neue Fachausslegung liegt zum Zeitpunkt dieser Übergabe noch nicht vor. Die spätere Ausführungsplanung soll die vollständige Einbauhülle einschließlich Dämmung, Aufhängung und Deckenunterkonstruktion zeigen.

Die Übergabe ersetzt keine Ausführungsfreigabe. Janne Vollmer hat am 03.03.2026 die beschriebenen Nutzungs- und Materialentscheidungen bestätigt; Fachnachweise und Unternehmensplanung bleiben im weiteren Ablauf zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lea Wernicke, Architektin

Anlagen: keine

10_Koordinationsprotokoll.docx

Nordfeld Architektur

Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
l.wernicke@nordfeld-architektur.example

Schulbau Brückenanger gGmbH
Brückenanger 12 · 31787 Hameln

Hameln, 15.09.2026 · Bezug HM-BA26

Koordinationsbesprechung Ostflügel vom 15.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Teilgenommen haben Lea Wernicke für Nordfeld Architektur, Tammo Behrens für die Lüftungsplanung, Iven Rautenberg für das Tragwerk und Janne Vollmer für die Bauherrschaft. Besprochen wurden die Planstände A-101/C, T-201/B und L-301/D. Die nachfolgenden Angaben geben den Gesprächsstand wieder; sie enthalten keine gemeinsame technische Freigabe.

1 Flur F-01 und Unterzug Achse 3

Die aktuelle TGA benötigt am Hauptkanal einen freien Querschnitt von 600 mm mal 280 mm. Behrens setzt umlaufend 40 mm Dämmung an. Die äußere Kanalhöhe beträgt damit 360 mm. Die im Architekturentwurf übernommene Hülle von 280 mm entspricht nicht mehr diesem Fachstand. Rautenberg bestätigt für den vorhandenen Unterzug eine Unterkante von 3,15 m über Fertigfußboden.

Wernicke zeigt zwei räumliche Wege: Führung unter dem Unterzug oder seitliches Umfahren im Deckenfeld der Achse 2 bis 3. Für die seitliche Route muss Behrens Druckverlust, Wartung und Anschluss an die Klassenräume prüfen. Rautenberg lehnt eine ungeprüfte Durchdringung des Unterzugs ab. Eine neue Trägeröffnung wurde nicht beauftragt.

2 Flurverglasung

Der Montageplan M-17/0 von Lenz Metallbau verwendet A-101/B als Referenz. Im Plan ist für das Türfeld T-01 eine lichte Breite von 1,16 m eingetragen. Die Bauherrschaft hält an 1,20 m fest. Die Rohbauöffnung von 1,36 m wird nicht durch eine reine Beschriftungsänderung größer. Lenz wird die Profilkombination und die tatsächliche Durchgangsbreite erläutern.

3 Termine und Unterlagen

Als interner Antworttermin für die Fachbeiträge wurde der 24.09.2026 vereinbart. Das Ausbaupaket soll am 09.10.2026 an die Vergabevorbereitung gehen. Die Angabe von 35 Kalendertagen Fertigungsverfahren stammt aus der Mail von Lenz vom 10.09.2026 und beginnt erst nach bestätigtem Montageplan. Eine Bestellung oder Ausführungsfreigabe wurde in der Sitzung nicht erklärt.

Korrekturen dieser Niederschrift sind bis zum 21.09.2026 mitzuteilen. Bis zum heutigen Versand liegt keine Bestätigung einer Kanalroute und keine korrigierte Türzeichnung vor. Versand durch Lea Wernicke am 15.09.2026 an die genannten Teilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lea Wernicke, Architektin

Anlagen: keine

01_Planungsauftrag.pdf

Nordfeld Architektur
Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
Hameln, 06.03.2026 · Bezug HM-BA26

Abruf Ausführungsplanung Schulumbau Brückenanger

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Grundlage unseres Planervertrags vom 15.10.2025 rufen wir die Gebäude-Leistungsphase 5 für den Umbau des Ostflügels der Schule Brückenanger ab. Das Gebäude steht im Eigentum der Schulbau Brückenanger gGmbH. Der Auftrag betrifft den eingeschossigen Unterrichtsflügel mit vier Unterrichtsräumen, gemeinsamem Flur und zwei Gruppenräumen. Die Genehmigungsunterlagen vom 12.02.2026 sind Ausgangspunkt der Bearbeitung.

1 Geschuldete Unterlagen

Nordfeld Architektur erstellt die Ausführungsgrundrisse, Schnitte, Tür- und Öffnungslisten sowie die für die Ausführung notwendigen Anschlussdetails. Einzubeziehen sind die Beiträge von Rautenberg Tragwerksbüro, Behrens Gebäudetechnik und Röwe Brandschutzkonzepte. Die Fachplaner sind jeweils unmittelbar durch uns beauftragt. Die Koordination umfasst insbesondere den Flur F-01, den Anschluss der neuen Lüftung und den Austausch der Fenster im Ostflügel.

Erforderliche Montagepläne für die von Nordfeld geplanten baukonstruktiven Einbauten werden auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung geprüft. Die eigenständige Bemessung von TGA-Komponenten, Tragwerk und Befestigungen, soweit fachplanerisch zu führen, wird dadurch nicht übertragen. Die Werkstattplanung der Metallbaufirma muss auf den bezeichneten Ausführungsstand zurückgeführt werden.

2 Planungsziele und Entscheidungsrechte

Im Flur F-01 ist eine durchgehend lichte Höhe von mindestens 2,75 m nach der bestätigten Nutzungsvorgabe einzuhalten. Die abgehangte Decke wird im Entwurf mit Unterkante 2,80 m geführt. Der Flur muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben; Leitungen dürfen die erforderlichen Türdurchgänge nicht einschränken. Diese Werte sind Projektvorgaben und keine Aussage über allgemeine gesetzliche Mindestmaße.

Die Bauherrschaft entscheidet über sichtbare Materialien, Budgetänderungen und Änderungen der Nutzung. Technische Bestätigungen erteilen die jeweils beauftragten Fachplaner in ihrer Zuständigkeit. Eine Entscheidung von Janne Vollmer über eine bevorzugte Leitungsrouten ersetzt keinen Nachweis zur Dimensionierung, Befestigung oder Abschottung. Die öffentlich-rechtliche Bauleiterbestellung erfolgt gesondert vor Beginn der Bauausführung.

3 Termine und Vergütung

Für den Abruf wird ein Honorar von 47.500,00 EUR netto vereinbart. Der koordinierte Ausbauplansatz soll am 09.10.2026 an die Vergabevorbereitung übergeben werden. Für die Fertigung der Flurverglasung ist nach gegenwärtiger Auskunft ein Vorlauf von 35 Kalendertagen nach bestätigtem Montageplan vorgesehen. Der Ausbau soll am 11.01.2027 beginnen; technische Voraussetzungen und Vergabe sind noch nicht abgeschlossen.

4 Revision und Kommunikation

Planänderungen sind mit Anlass, Datum, betroffenem Bauteil und ersetzter Revision zu dokumentieren. Nordfeld darf Koordinationsanfragen stellen, aber keine kostenpflichtigen Unternehmensänderungen in unserem Namen beauftragen. Ein Planversand zur Ausführung bedarf der dokumentierten fachlichen Prüfung und unserer projektbezogenen Freigabe. Die Parteien bestätigen den Abruf in Textform: Janne Vollmer und Lea Wernicke, jeweils am 06.03.2026.

Schulbau Brückenanger gGmbH

Brückenanger 12 · 31787 Hameln

j.vollmer@schulbau-brueckenanger.example

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janne Vollmer, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

02_Genehmigungsbescheid.pdf

Schulbau Brückenanger gGmbH
Brückenanger 12 · 31787 Hameln
Hameln, 27.02.2026 · Bezug HM-BA26

Baugenehmigung HM-BA-2026-073

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Ihren Antrag vom 12.02.2026 wird der Umbau des Ostflügels der Schule Brückenanger auf dem Grundstück Brückenanger 12, Flur 4, Flurstück 72/3, im nachfolgend bestimmten Umfang genehmigt. Gegenstand sind die Umgestaltung der Unterrichtsräume, der Austausch der Fenster und die in den genehmigten Unterlagen dargestellte technische Erneuerung.

1 Maßgebliche Unterlagen

Der genehmigte Gegenstand ergibt sich aus dem Grundriss A-100/G und Schnitt A-210/G, jeweils vom 12.02.2026, der Baubeschreibung vom selben Tag und dem Brandschutzbeitrag BS-02 vom 09.02.2026. Die in der Baubeschreibung zugrunde gelegte Nutzung als Unterrichtsflügel mit maximal 120 gleichzeitig anwesenden Personen ist Bestandteil des Antragsgegenstands. Eine Veranstaltungsnutzung wird nicht genehmigt.

2 Anforderungen an die weitere Bearbeitung

Die im Brandschutzbeitrag bezeichneten Rettungswege und Abschlüsse sind entsprechend den dort beschriebenen Anforderungen herzustellen. Die im Schnitt angegebene Flurhöhe darf durch nachträgliche Leitungsführung nicht ohne vorherige Klärung des geänderten Gegenstands unterschritten werden. Die Genehmigung bestätigt keine noch nicht vorgelegte Montageplanung einzelner Unternehmen.

Bautechnische Nachweise und erforderliche Prüfungen sind durch die verantwortlichen Personen nach den einschlägigen Bestimmungen zu führen. Die Darstellung einer Leitungsöffnung im Architekturgrundriss ersetzt nicht deren statischen Nachweis. Änderungen an tragenden Bauteilen sind nicht Gegenstand einer allgemeinen Freigabe durch diesen Bescheid.

3 Hinweise zum Umfang

Diese Entscheidung umfasst ausschließlich den beschriebenen Umbau. Sie ersetzt keine privatrechtlichen Erklärungen Dritter und keine außerhalb ihres Prüfgegenstands erforderlichen fachlichen Nachweise. Der Beginn der Arbeiten und die verantwortlichen Personen sind nach den maßgeblichen Verfahrensvorgaben anzuzeigen. Der Bescheid ist mit den bezeichneten Unterlagen zusammen aufzubewahren.

Für Rückfragen zum Inhalt verwenden Sie bitte das Aktenzeichen HM-BA-2026-073. Der Bescheid wurde am 27.02.2026 elektronisch an die bevollmächtigte Entwurfsverfasserin übermittelt. Die Kostenentscheidung erfolgt gesondert.

Mit freundlichen Grüßen


gez. Tessa Riemer, im Auftrag

Anlagen: keine

04_Grundriss_A101C.pdf

Schule Brückenanger Ausführungsgrundriss

HM-BA26 · A-101/C · 14.09.2026 · Vermaßte Koordinationsdarstellung

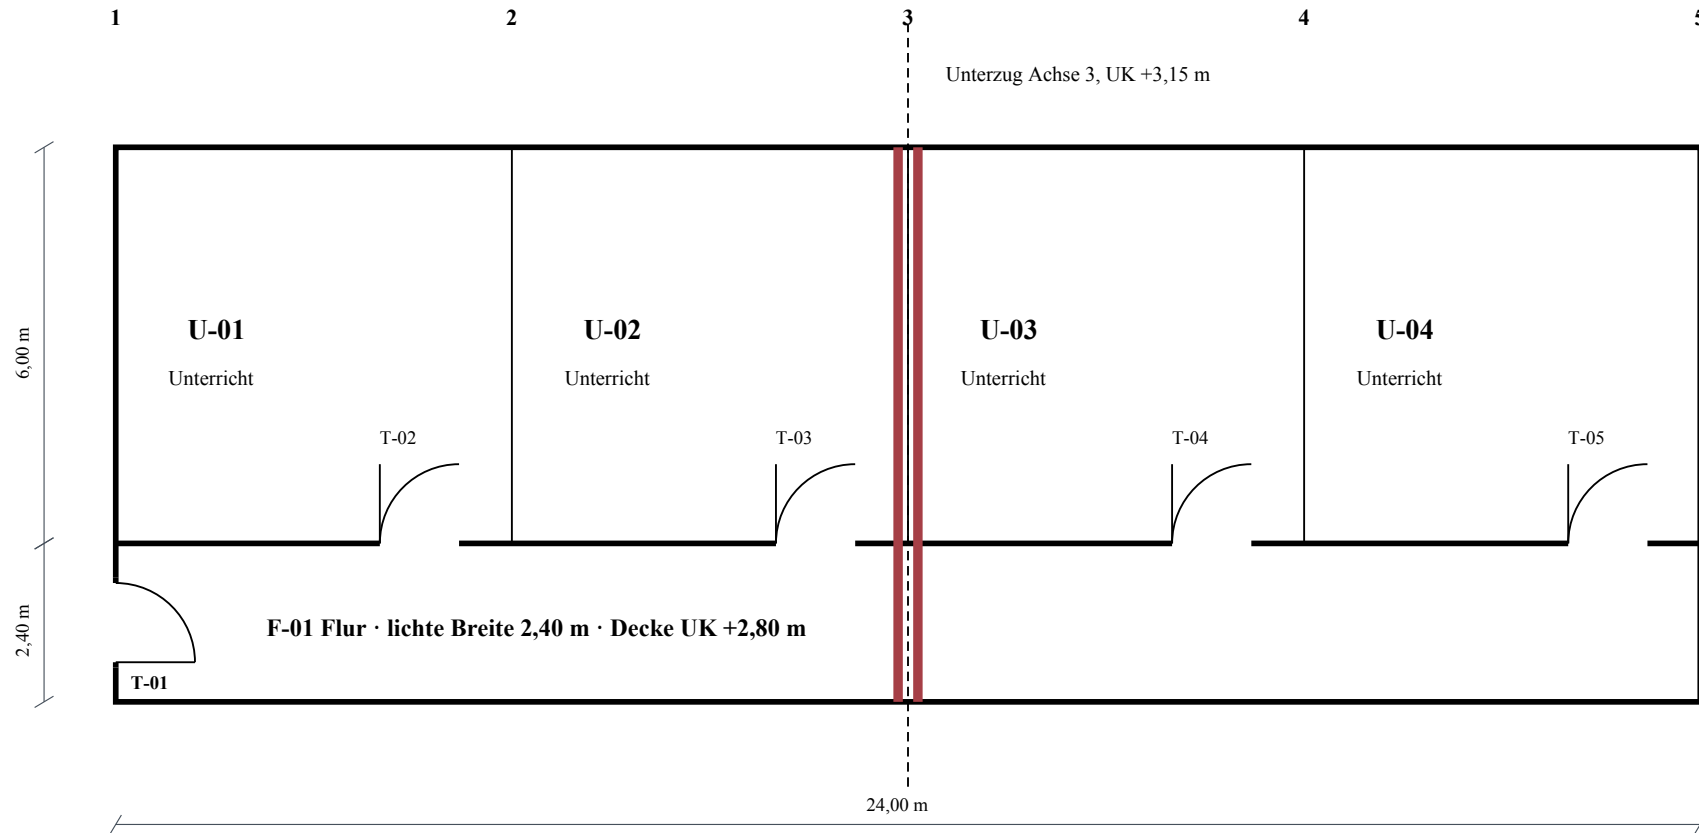

Türfeld T-01 am Eingang West: Rohbau 1,36 m, gefordert lichte Breite 1,20 m.


TGA-Route und Deckenraster siehe L-301/D und K-07; Planstand zur Koordination.

Bezugshöhe: FFB EG = 0,00 m. Nordfeld Architektur · gez. Lea Wernicke

06_Tragwerksplan_T201B.pdf

Bestandsunterszug Achse 3

HM-BA26 · T-201/B · 08.09.2026 · Schnitt vermasst, nicht zur Maßentnahme

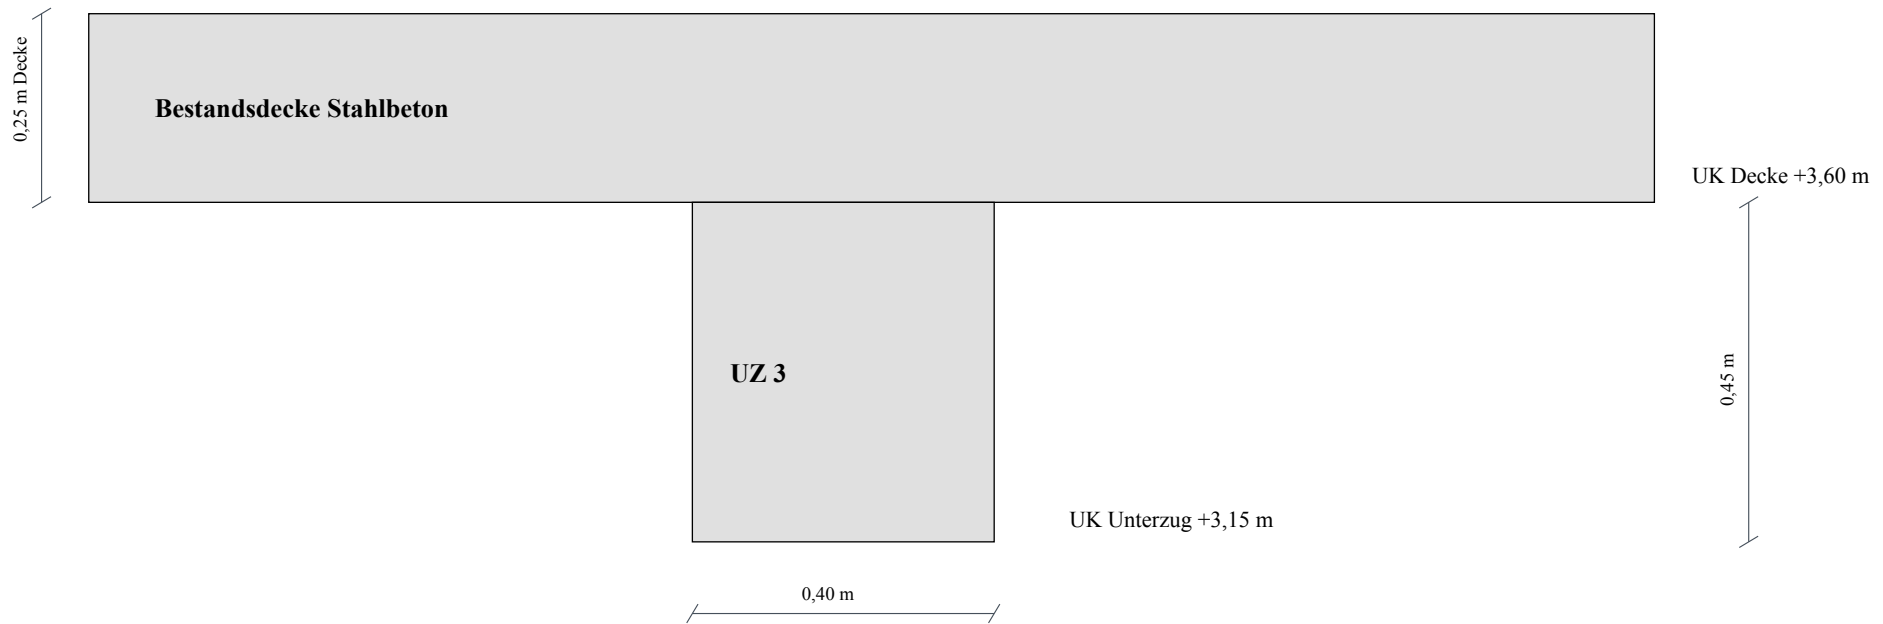

Unterzugbreite 0,40 m · Lage in Achse 3 · FFB EG = 0,00 m

Keine Bohrung oder Aussparung im Unterzug ohne gesonderten statischen Nachweis.



Befestigungslasten der TGA sind mit Lage und Lastangabe vorzulegen.

Rautenberg Tragwerksbüro · gez. Iven Rautenberg · Bestand aufgenommen 02.09.2026

07_TGA_Plan_L301D.pdf

Lüftung Flur F-01

HM-BA26 · L-301/D · 12.09.2026 · Grundriss mit Querschnitt

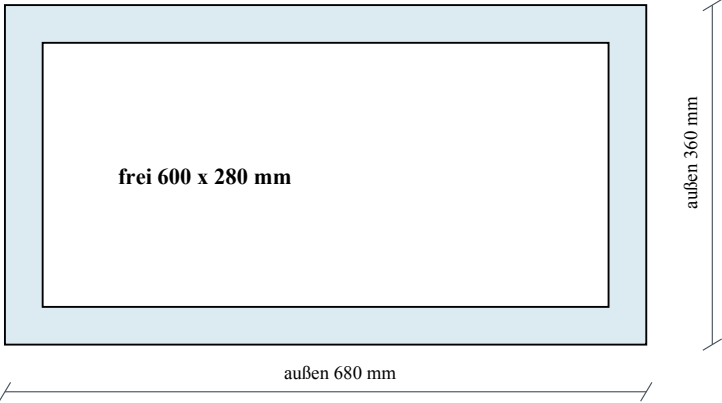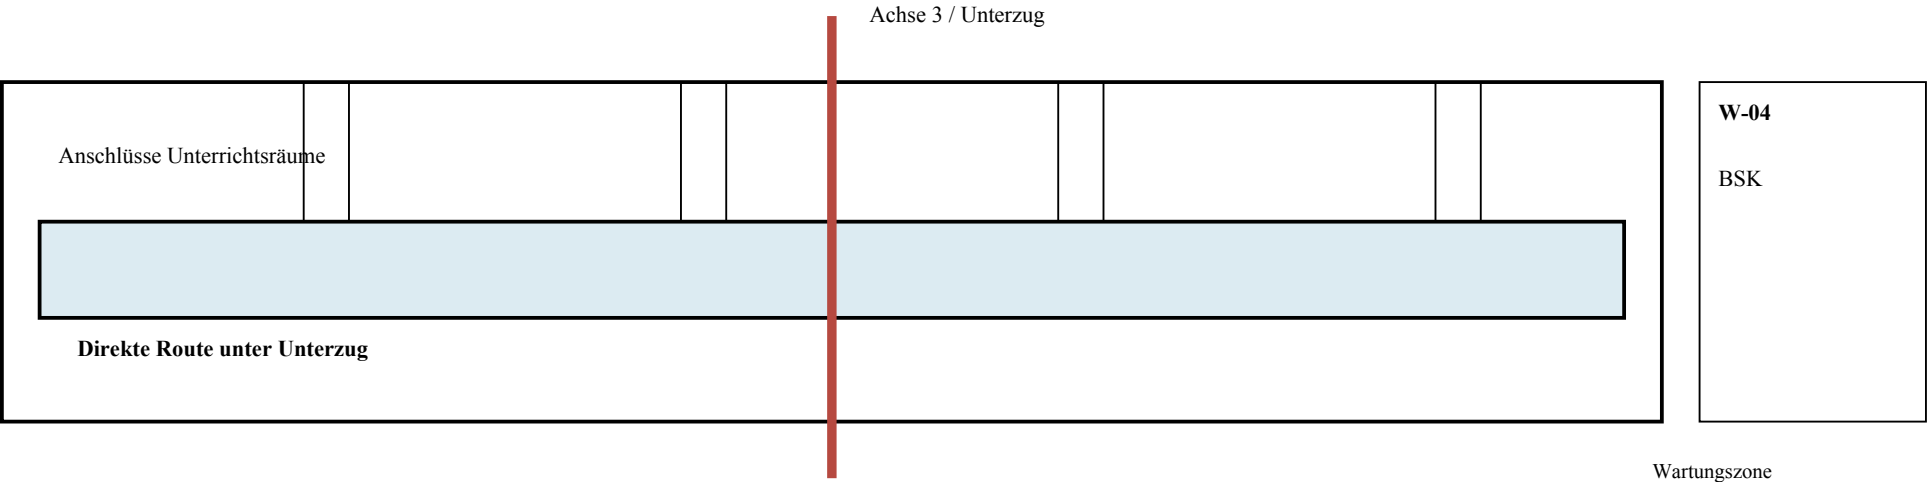


- Dämmung umlaufend 40 mm
- Montageabstand oben 50 mm
- Deckenunterkonstruktion 60 mm
- Keine bestätigte Querschnittsreduzierung
- Revision D enthält noch keine seitliche Route
- gez. Tammo Behrens

11_Montageplan_M17.pdf

Flurverglasung Türfeld T-01

HM-BA26 · M-17/0 · 11.09.2026 · Ansicht, Maße in mm

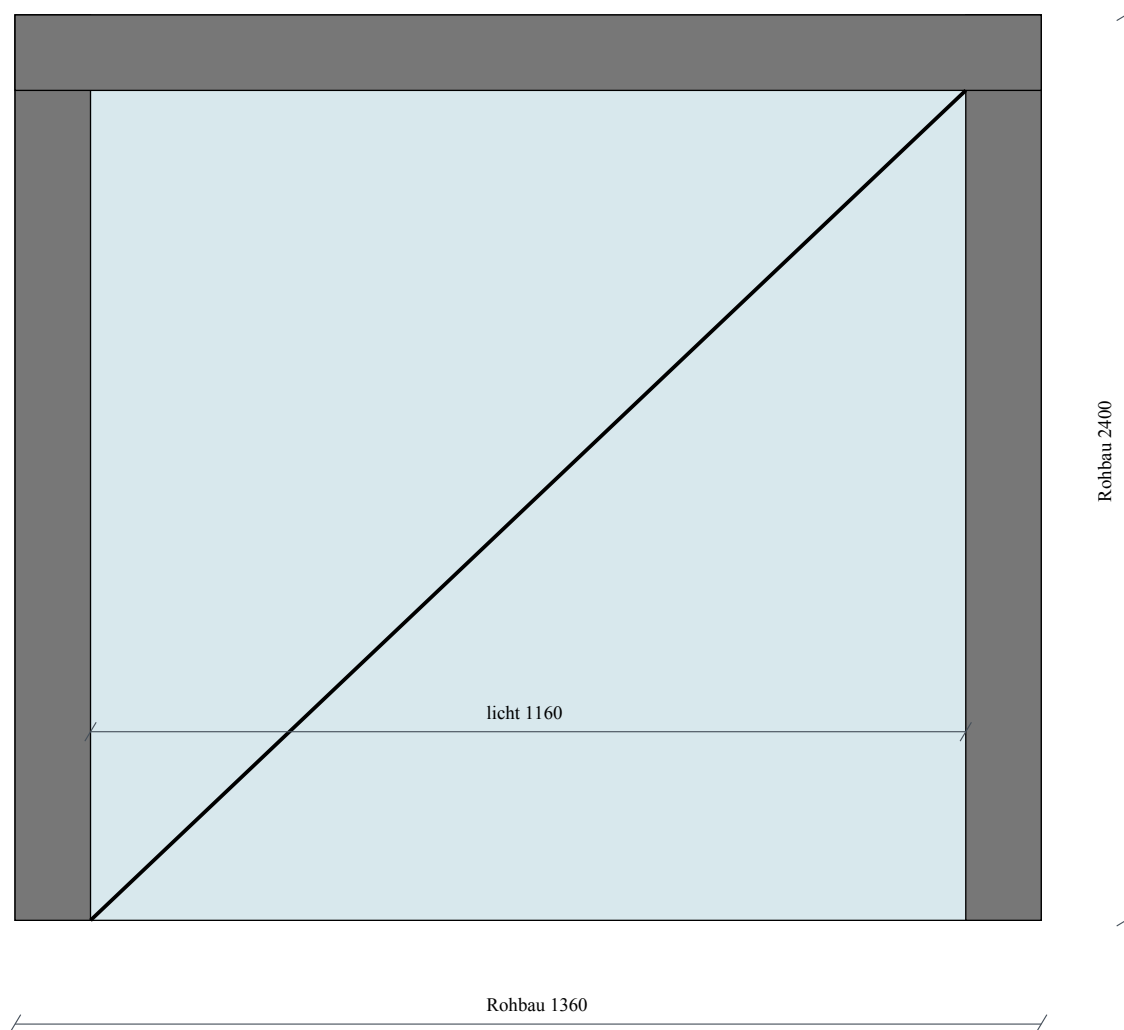

Grundlage A-101/B vom 02.09.2026

Profilansatz seitlich je 100 mm

Lichte Höhe nach Bodenanschluss prüfen

Türanschlag gemäß Ansicht

Status: zur Prüfung, nicht zur Fertigung


Maße vor Fertigung am Bau nehmen

gez. Fenja Lenz

16_Fensterdetail_D12.pdf

Fensterbrüstung Ostflügel

HM-BA26 · D-12/B · 16.09.2026 · Detail vermasst, schematischer Schnitt

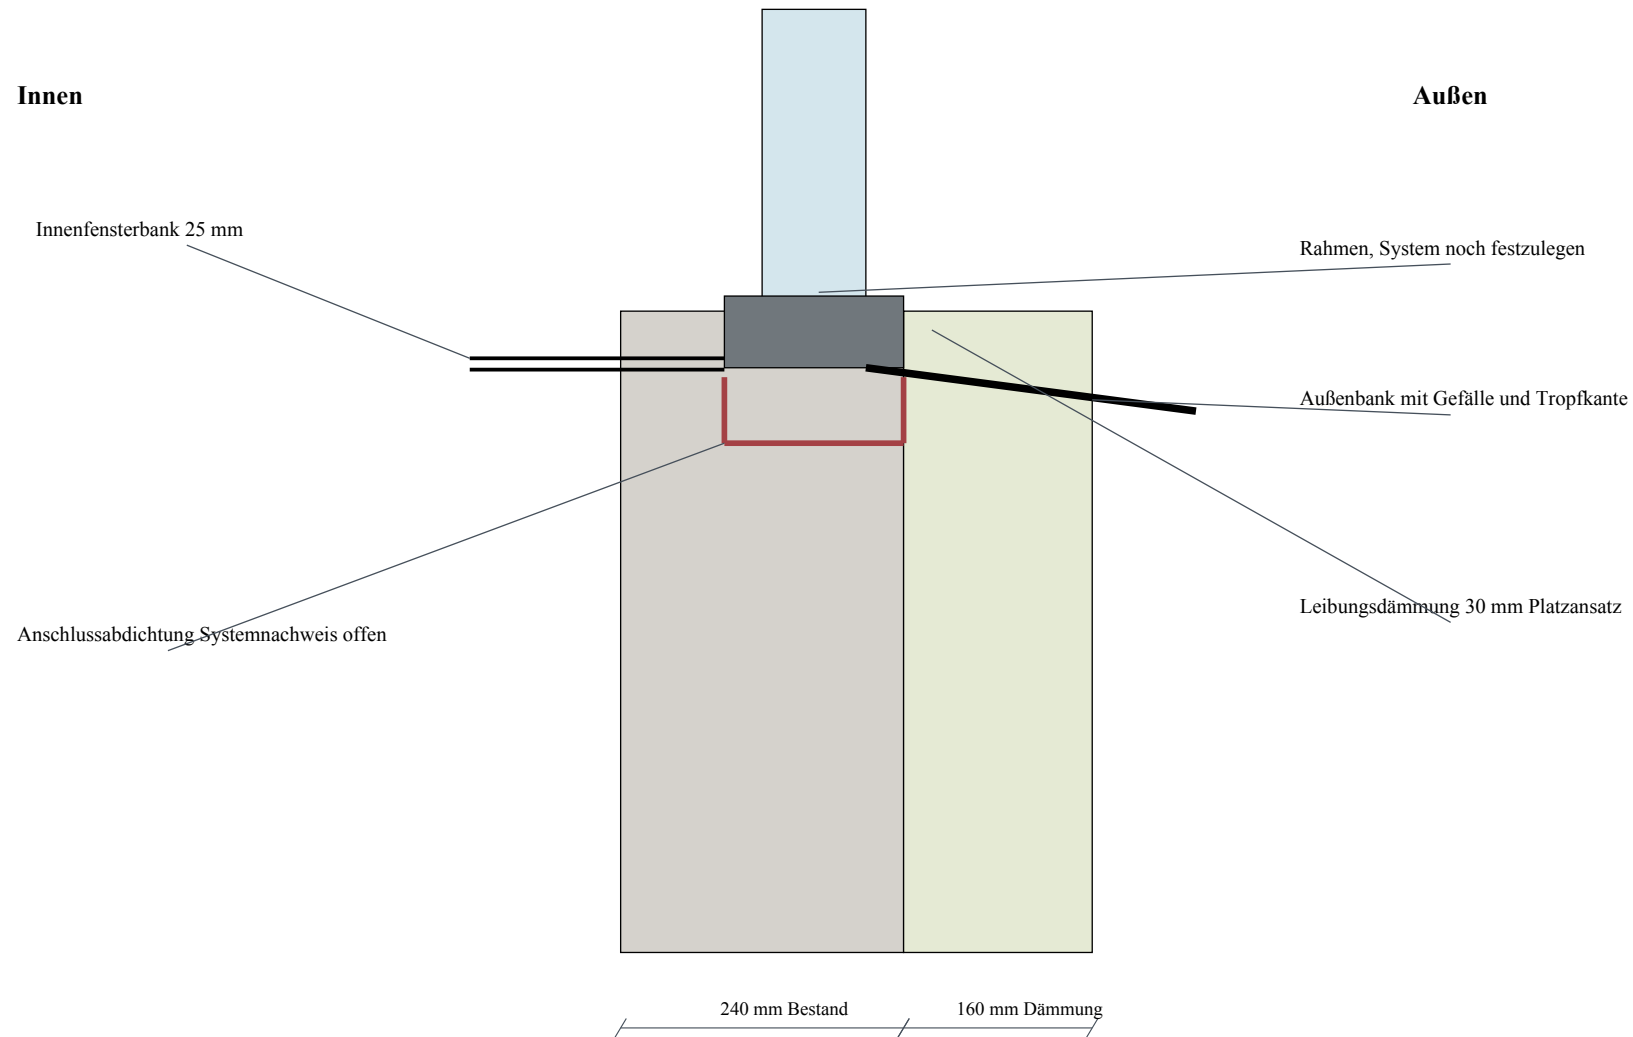

D-12/B ersetzt den Brüstungsanschluss A. Kein Nachweis des Wärmebrücken- oder Feuchteschutzes.

Nordfeld Architektur · gez. Lea Wernicke · zur bauphysikalischen Abstimmung

17_Brandschutz_Flur.pdf

Röwe Brandschutzkonzepte

Am Wiesensteg 2 · 31787 Hameln
s.roewe@roewe-brandschutz.example

Nordfeld Architektur
Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
Hameln, 18.09.2026 · Bezug HM-BA26

Flurdecke und Wartungszugang W-04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Schreiben bezieht sich auf den Brandschutzbeitrag BS-02 und die Koordinationsskizze K-07 vom 15.09.2026. Die geänderte Leitungsführung ist noch nicht abschließend im Gesamtzusammenhang bewertet. Insbesondere liegt uns kein revidierter TGA-Plan mit den endgültigen Revisionsöffnungen vor.

1 Wand W-04

Die Durchführung an W-04 bleibt an der im Fachplan bezeichneten Stelle. Die Brandschutzklappe muss für Inspektion und Instandhaltung erreichbar sein. Eine durchgehende Bekleidung ohne zugeordnete Revisionsöffnung entspricht nicht dem vorgesehenen Wartungszugang. Die genaue Öffnungsgröße ist mit dem ausgewählten System und der TGA-Planung abzustimmen.

2 Abgehängte Decke

Die im Entwurf dargestellte demontierbare Decke dient hier nicht als pauschaler Ersatz für die erforderlichen Abschottungen der durchdrungenen Bauteile. Die Leitungsrouten darf keine offenen Durchführungen schaffen. Die Anforderungen an den jeweiligen Abschluss sind positions- und bauteilbezogen in der Ausführungsplanung zu übernehmen.

Wir benötigen für die weitere Prüfung die Lage der zusätzlichen Revisionsstelle, den Abstand zu Leuchten und das Anschlussdetail an W-04. Eine Zustimmung zur seitlichen Route in der TGA-Mail beantwortet diese Punkte nicht vollständig. Dieses Schreiben ist keine Freigabe des Montageplans M-17 oder der gesamten Ausführungsplanung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sören Röwe, Brandschutzplanung

Anlagen: keine
