

18_Fristenuebernahme.txt

Mühlenwiese Betreuung gGmbH, Kinderbogen 32, 27283 Verden
14.08.2026 | VM-26 | Bearbeitung: Fenja Rost, Objektverwaltung
An Rundbogen Architektur
Betreff: Übernahme der Vertragsdaten aus unserem Ordner

Sehr geehrte Frau Wenke,
für unsere Terminverwaltung haben wir die folgenden Angaben aus den unterschriebenen
Gewerkeprotokollen erfasst. Es handelt sich um Vertragsdaten, nicht um eine Bestätigung späterer
Änderungen des Fristverlaufs.

Dach Allerfirst: Vertrag 10.04.2026; fünf Jahre ab Abnahme; Abnahme 30.07.2026; Vermerk Ende
30.07.2031. Rohbau Haenel: Vertrag 12.02.2026; fünf Jahre; Abnahme 18.06.2026; Vermerk Ende
18.06.2031. Fenster/Türen Lichtkante: Vertrag 23.03.2026; fünf Jahre; Abnahme 05.08.2026; Vermerk
Ende 05.08.2031. Elektro Wulken: Vertrag 25.03.2026; fünf Jahre; Abnahme 10.08.2026; Vermerk Ende
10.08.2031.

Die drei letztgenannten Abnahmeoriginale verbleiben im Schrank der Geschäftsführung. Der Eintrag für
Rundbogen ist noch leer, weil eine gesonderte Abnahme der Architektenleistung nicht protokolliert wurde.
Die Schlüsselübergabe vom heutigen Tag haben wir separat erfasst. Zu den beiden Dachmängeln führen
wir weiterhin die Kennungen M-01 und M-02.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Fenja Rost
Objektverwaltung
Anlagen: keine

04_Planversand.eml

Von	"Elisa Wenke", Architektin <objekt@rundbogen.example>
An	Allerfirst Dachbau GmbH <bauleitung@allerfirst.example>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 10:35:00 +0200
Betreff	VM-26-D D-21 C jetzt im Verteiler Dach

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anbei erhalten Sie D-21 Revision C vom 03.07.2026. Der Plan lag seit Freitag im Ordner Fachkoordination; der Versand an Ihre Bauleitung wurde versehentlich nicht ausgelöst. Ihr Ausdruck B im Baustellencontainer ist damit zu ersetzen. Die Änderung betrifft die Aufkantung neben T-03 und den seitlichen Anschluss der Rinne, nicht die ebene Dachfläche.

Herr Gerdes teilte heute telefonisch mit, die Anschlussbahn sei bereits am 06.07.2026 nach B eingebaut und am 07.07. durch das Türelement verdeckt worden. Die Begehung am 09.07.2026 um 08:30 Uhr ist mit Frau Lühr abgestimmt. Eine Preiszusage enthält diese Nachricht nicht. Bitte bewahren Sie Ihre Einbaufotos im ursprünglichen Format auf.

Mit freundlichen Grüßen

Elisa Wenke, Architektin

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden

Anlagen: 03_Detail_D21_C.png

10_Teilbeauftragung.eml

Von	"Tessa Lühr", Geschäftsführerin <bau@muehlenwiese.example>
An	Allerfirst Dachbau GmbH <bauleitung@allerfirst.example>
Datum	Sat, 11 Jul 2026 10:35:00 +0200
Betreff	VM-26-D N1 bestätigt; Wartezeit nicht bestätigt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich beauftrage den angebotenen Zusatzanschluss N1.1 und N1.2 zu insgesamt 900,00 EUR netto zuzüglich 171,00 EUR Umsatzsteuer. Ausführung wie beschrieben am 13.07.2026; Rundbogen wird vor dem Schließen informiert. Der verdeckte Anschluss T-03 ist nicht Gegenstand dieser Beauftragung.

Die 980,00 EUR Wartezeit N2 werden nicht beauftragt oder anerkannt. Bitte übermitteln Sie die angekündigten Personal- und Gerätestunden mit Darstellung der an diesen Tagen ausgeführten übrigen Tätigkeiten. Eine abschließende Beurteilung ist damit nicht verbunden. Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Tessa Lühr, Geschäftsführerin
Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden

Anlagen: 09_Nachtragsangebot_N1_N2.pdf

15_Fertigmeldung.eml

Von	"Nils Gerdes", Bauleitung <bauleitung@allerfirst.example>
An	Rundbogen Architektur <objekt@rundbogen.example>
Datum	Sat, 08 Aug 2026 10:35:00 +0200
Betreff	VM-26-D Abnahmepunkte erledigt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Monteur war gestern auf dem Dach. Die beiden Laubfangkörbe sind jetzt befestigt. Am Anschluss T-03 hat er außen eine zusätzliche Bahn aufgebracht; nach seiner Meldung ist der Punkt damit erledigt.

Die Türfirma war nicht vor Ort. Eine Öffnung des Türfußes wurde deshalb nicht vorgenommen. Eine neue Revisionsskizze wird nach dem Urlaub unseres Zeichners geliefert. Bitte berücksichtigen Sie die Erledigung bei der Zahlung unserer Schlussrechnung. Fotos befinden sich auf dem Baustellentelefon, sie sind dieser Nachricht nicht beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Gerdes, Bauleitung

Allerfirst Dachbau GmbH

Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln

Anlagen: keine

20_Bauherrin_Schlussstand.eml

Von	"Tessa Lühr", Geschäftsführerin <bau@muehlenwiese.example>
An	Rundbogen Architektur <objekt@rundbogen.example>
Datum	Tue, 18 Aug 2026 10:35:00 +0200
Betreff	VM-26-D Dachrechnung und noch offene Anschlussstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unsere Kasse hat die Dachschlussrechnung noch nicht bezahlt. Es gingen bislang nur die beiden Abschlüsse über zusammen 29.750,00 EUR ab. Die Rechnung nennt 222 m²; im Aufmaß stehen 216 m². Herr Gerdes beruft sich auf die zusätzlichen sechs Meter am Nordrand.

Die Türfirma kann am 24.08.2026 um 08:00 Uhr einen Monteur stellen. Für die Öffnung und den späteren Wiederverschluss wurde noch kein Preis vereinbart. Zur Höhe möglicher Beseitigungskosten am Anschluss T-03 liegt uns keine belastbare Angabe vor. Die zusätzliche Bahn aus der Fertigmeldung kann ich als Bauherrin nicht technisch beurteilen.

Die Betreiberin möchte am 31.08. die neuen Gruppenräume belegen. Die offenen Unterlagen bleiben im Übergabeverzeichnis vermerkt. Ich habe weder auf Mängelrechte verzichtet noch eine zusätzliche Wartezeitvergütung bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

Tessa Lühr, Geschäftsführerin
Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden

Anlagen: keine

05_Bautagebuch.csv

Tag: 2026-06-29

Zeitraum: 08:10-09:00

Beobachter: Elisa Wenke

Ort: Dach gesamt

Tätigkeit und Befund: Vier Monteure; Schutzgerüst vorhanden; Schalung trocken an zugänglichen Stellen. Messprotokoll Holzfeuchte liegt beim Tragwerksbüro.

Quelle: Ortsnotiz 31

Tag: 2026-07-01

Zeitraum: 14:00-14:45

Beobachter: Elisa Wenke

Ort: Dach West

Tätigkeit und Befund: Dampfsperre West offen sichtbar; Nahtprobe durch Polier vorgeführt. Ostbereich nicht betreten.

Quelle: Ortsnotiz 32

Tag: 2026-07-03

Zeitraum: 11:00

Beobachter: Nils Gerdes

Ort: Dach

Tätigkeit und Befund: Dämmung eingebaut; Material gemäß Lieferschein. Rundbogen nicht vor Ort. Wetter laut Polier trocken.

Quelle: Telefonmeldung 33

Tag: 2026-07-06

Zeitraum: 16:20

Beobachter: Nils Gerdes

Ort: T-03

Tätigkeit und Befund: Anschluss nach Ausdruck D-21 B eingebaut; am 07.07. kommt Türfirma. Zwei Fotos auf Telefon des Poliers.

Quelle: E-Mail in Projektpostfach 34

Tag: 2026-07-08

Zeitraum: 10:35

Beobachter: Elisa Wenke

Ort: Büro

Tätigkeit und Befund: D-21 C an Allerfirst versandt. Einbauzustand T-03 nicht selbst gesehen.

Quelle: Planversand 35

Tag: 2026-07-09

Zeitraum: 08:30-09:35

Beobachter: Wenke und Gerdes

Ort: T-03 und Nordrand

Tätigkeit und Befund: Anschluss hinter Türfuß nicht sichtbar. Sichtbare seitliche Höhe 110 mm gemessen; Sollangabe C daneben 150 mm.

Quelle: Kontrollprotokoll 36

Tag: 2026-07-13

Zeitraum: 09:00-09:40

Beobachter: Elisa Wenke

Ort: Nordrand

Tätigkeit und Befund: Zusatzanschluss sechs Meter offen sichtbar. Gerdes nennt zwei Tage Wartezeit; Personalnachweis noch nicht vorgelegt.

Quelle: Ortsnotiz 37

Tag: 2026-07-17

Zeitraum: 13:15-14:00

Beobachter: Wenke und Gerdes

Ort: Dach

Tätigkeit und Befund: Gemeinsame Längenaufnahme; ebene Dachmaße 18 mal 12 m. Zwei Laubfänge liegen noch lose neben Ablauf 7 und 8.

Quelle: Aufmaß 38


11_Zahlungsjournal.csv

Buchungstag	Beleg	Kreditor	Soll_brutto_E UR	Ist_Zahlung_E UR	Status	Verwendungs zweck
2026-06-19	AD-26042	AD-12	17850.00	17850.00	ausgeführt	Abschlag 1 Dach
2026-07-17	AD-26066	AD-12	11900.00	11900.00	ausgeführt	Abschlag 2 Dach
2026-08-03	AD-26081	AD-12	17421.60	0.00	zur Prüfung	Schlussrechn ung Dach
2026-08-17	SR-Plan-06	RA-08	8330.00	8330.00	ausgeführt	Planung Abschlag; nicht Dachvertrag

Rundbogen Architektur

D-21 Revision C, Dach und Türanschluss T-03

VM-26-D | 2026-07-03 | Elisa Wenke, Architektin

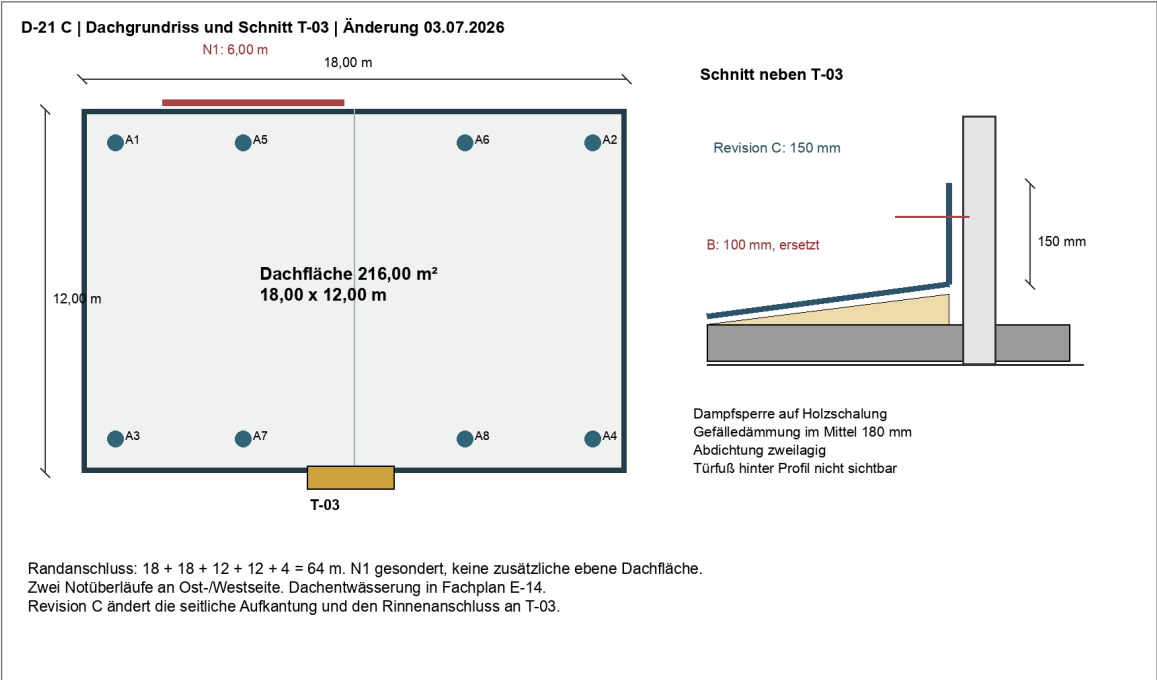


Maße haben Vorrang. Ausdruck nicht maßstäblich. Bezug und Revisionsstand im Planfeld.
Planerzeile 29, 27283 Verden | objekt@rundbogen.example

Bilddatei: 03_Detail_D21_C.png

Rundbogen Architektur

Terminplan TP-06, Fortschreibung 14.07.2026

VM-26-D | 2026-07-14 | Elisa Wenke, Architektin

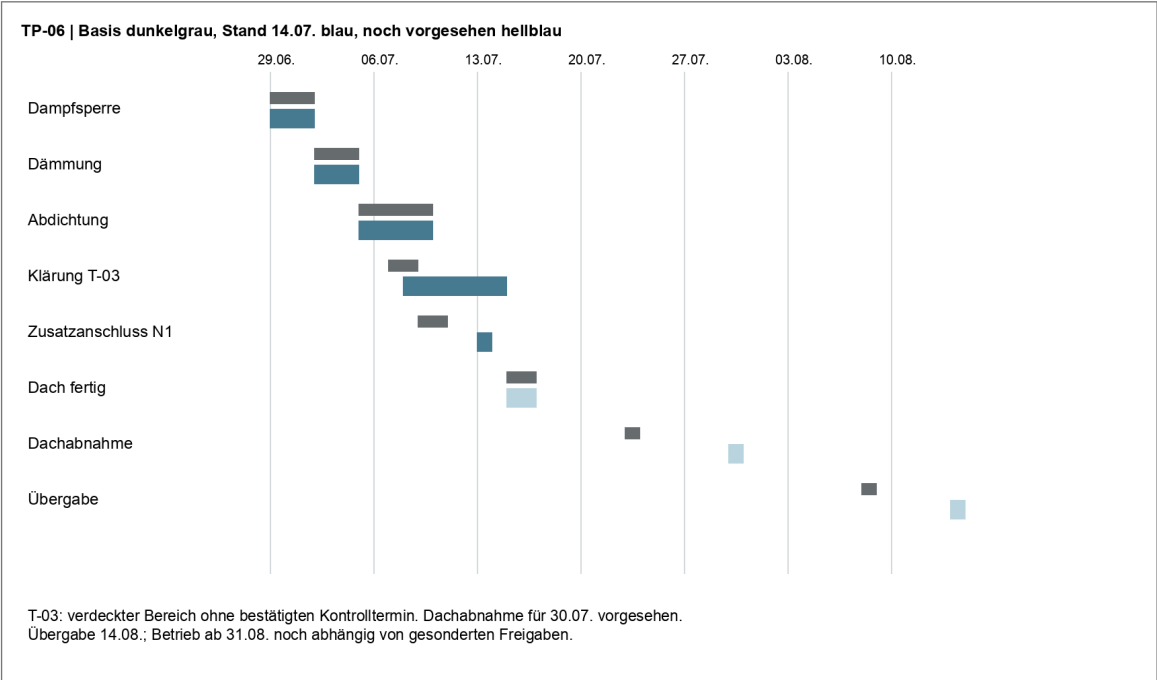

Maße haben Vorrang. Ausdruck nicht maßstäblich. Bezug und Revisionsstand im Planfeld.
Planerzeile 29, 27283 Verden | objekt@rundbogen.example

Bilddatei: 13_Balkenterminplan.png

12_Kostenjournal.xlsx

Kita Mühlenwiese, Kostenjournal

Fenja Rost | 17.08.2026 | Vertrags- und Rechnungseingangsstand

Verträge mit Änderungen netto EUR	394.586,00		
Rechnungseingang netto EUR		377.840,00	
Rechnungseingang brutto EUR			448.964,60

Gewerk / Bezug	Vertrag netto	Änderung netto	Summe netto	Rechnung netto	Steuer	Rechnung brutto
Rohbau, SR-H2607	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	19%	199.920,00
Dach, AD-26081	36.986,00	900,00	37.886,00	39.640,00	19%	47.171,60
Fenster/Türen, LK-2608	44.000,00	1.200,00	45.200,00	45.200,00	19%	53.788,00
Elektro, EW-2608	62.000,00	0,00	62.000,00	61.500,00	19%	73.185,00
Planung, RA-2606	78.000,00	0,00	78.000,00	60.000,00	19%	71.400,00
Gebühren, G-26-041	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0%	3.500,00

Quelle: Kassenordner VM-26, Rechnungseingänge bis 17.08.2026.
Eingangsrechnungen sind erfasst, nicht durch diese Tabelle technisch geprüft.
Dach: Vertrag 10.04. und N1 11.07.; Rechnung AD-26081. N2 steht nur in der Rechnung.
Andere Schlussbelege verwahrt die Kasse; in dieser Dachakte nicht als Original enthalten.

Gebühren ohne Umsatzsteuer. Zahlungen stehen im gesonderten Journal, nicht in Spalte E.

Erfasst: Fenja Rost. Planung: Abschlagsstand, noch keine Schlussrechnung.

01_Objektueberwachungsvertrag.docx

Mühlenwiese Betreuung gGmbH

Kinderbogen 32, 27283 Verden
bau@muehlenwiese.example

Rundbogen Architektur
Planerzeile 29, 27283 Verden

Verden, 02.03.2026 | VM-26-D

Abruf Objektüberwachung, Kita Mühlenwiese

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mühlenwiese Betreuung gGmbH ruft für den eingeschossigen Erweiterungsbau mit zwei Gruppenräumen am Kinderbogen 32 in Verden die Gebäude-LPH 8 aus dem Architektenvertrag vom 12.08.2025 ab. Rundbogen Architektur übernimmt die vereinbarten Überwachungs- und Dokumentationsaufgaben einschließlich gemeinsamen Aufmaßes, Rechnungsprüfung, Kostenfeststellung, Abnahmeorganisation, Übergabe und Verfolgung der bei Abnahme festgestellten Mängel.

1. Zuständigkeiten

Elisa Wenke ist Ansprechpartnerin der Objektüberwachung. Die öffentlich-rechtliche Bauleiterbestellung liegt bei Bauingenieur Jan Toben auf Grundlage gesonderter Bestellung der Bauherrin. Die Prüfung des Tragwerks erfolgt durch das gesondert beauftragte Tragwerksbüro; die Fachüberwachung der technischen Anlagen durch Prüfbüro Querschnitt. Rundbogen koordiniert die Beiträge, übernimmt aber keine fremden Prüfbescheinigungen als eigene.

2. Kontrolle und Dokumentation

Kontrolltermine sind nach Bauablauf und erforderlichen Prüfungen vor Verdeckung abzustimmen. Eine tägliche dauernde Anwesenheit wird nicht vereinbart. Die Berichte müssen erkennen lassen, wer tatsächlich vor Ort war und welche Bereiche untersucht wurden. Die Bauherrin erhält wöchentlich den Termin- und Kostenstand sowie unverzüglich Mitteilungen über erhebliche Abweichungen. Ein gesonderter Zahlungsplan und betriebliche Buchhaltung sind nicht beauftragt.

3. Honorar und Vollmacht

Das Pauschalhonorar beträgt 28.000,00 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Preisänderungen, zusätzliche Unternehmeraufträge, Abnahmeerklärungen und Zahlungen bleiben Tessa Lühr vorbehalten. Rundbogen darf Prüf- und Abstimmungsschreiben vorbereiten und nach gesonderter Freigabe versenden. LPH 9 ist nicht abgerufen. Die Geschäftsführerin zeichnet am 02.03.2026; Elisa Wenke bestätigt den Abruf am selben Tag.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Tessa Lühr, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

02_Dachbauvertrag.docx

Mühlenwiese Betreuung gGmbH

Kinderbogen 32, 27283 Verden
bau@muehlenwiese.example

Allerfirst Dachbau GmbH
Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln

Verden, 10.04.2026 | VM-26-D

Bauvertrag Dach Erweiterung, VM-26-D

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mühlenwiese Betreuung gGmbH beauftragt Allerfirst Dachbau GmbH mit dem vollständigen Dachaufbau des Erweiterungsbaus. Die Grundfläche beträgt 18,00 m mal 12,00 m. Es gelten die folgenden acht Positionen sowie Plan D-21 Revision B vom 02.04.2026. VOB/B wird nicht einbezogen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen geometrischen Mengen; Randanschlüsse werden zusätzlich nach Länge abgerechnet, aber nicht nochmals zur ebenen Dachfläche addiert.

1. Preisvereinbarung

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Einrichtung und Schutz	1 psch	3.200,00	3.200,00
1.02	Dampfsperre	216 m²	18,00	3.888,00
1.03	Gefälledämmung	216 m²	72,00	15.552,00
1.04	Abdichtung zweilagig	216 m²	39,00	8.424,00
1.05	Randanschlüsse	64 m	48,00	3.072,00
1.06	Dachabläufe	8 St	165,00	1.320,00
1.07	Notüberläufe	2 St	440,00	880,00
1.08	Prüfung und Dokumentation	1 psch	650,00	650,00

Auftragssumme netto 36.986,00 EUR, Umsatzsteuer 19 Prozent 7.027,34 EUR, brutto 44.013,34 EUR. Die Einheitspreise gelten einschließlich Material, Transport, Montage, Entsorgung und üblicher Nebenarbeiten.

2. Beschaffenheit

Die Dampfsperre wird auf der freigegebenen Holzschalung verklebt. Die Dämmung wird als Gefälledämmung mit im Mittel 180 mm Dicke nach Plan geliefert. Die zweilagige bituminöse Abdichtung umfasst vollflächige Unterlage und Oberlage. Randanschlüsse erhalten 150 mm Höhe über fertiger Dachoberfläche, ausgenommen der gesondert gezeichnete Türanschluss T-03. Acht Abläufe und zwei Notüberläufe werden an den gezeichneten Stellen eingebaut. Dichtheitskontrolle, Produktunterlagen und Revisionskizze gehören zur Position 1.08.

3. Termine, Änderung und Zahlung

Ausführung vom 29.06. bis 17.07.2026. Der Unternehmer meldet geplante Verdeckung kontrollbedürftiger Anschlüsse zwei Arbeitstage vorher. Änderungen und Zusatzpreise vereinbart allein Tessa Lühr. Abschläge werden nach nachgewiesener Leistung gezahlt. Die Schlussrechnung ist nach Abnahme und prüfbarer Abrechnung binnen 30 Tagen zahlbar. Eine pauschale Vertragssicherheit ist nicht vereinbart. Mängelansprüche für die Bauwerksleistung verjähren nach vereinbarter Frist von fünf Jahren ab Abnahme. Abnahme erfolgt in gemeinsamem Termin durch die Geschäftsführerin.

Für die Bauherrin: gez. Tessa Lühr. Für Allerfirst: gez. Nils Gerdes mit schriftlich vorgelegter Abschlussvollmacht der Geschäftsführung. Ausfertigungen an beide Parteien und Rundbogen Architektur.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tessa Lühr, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

06_Kontrollprotokoll.docx

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden

Verden, 09.07.2026 | VM-26-D

Kontrolltermin T-03, 09.07.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 09.07.2026 waren Elisa Wenke, Nils Gerdes und Tessa Lühr von 08:30 bis 09:35 Uhr an Tür T-03 anwesend. Die Wetterlage war trocken, etwa 19 Grad Celsius nach dem Baustellenthermometer. Besichtigt wurden der sichtbare seitliche Dachanschluss, die Rinne und der nördliche Rand; die Fläche hinter dem montierten Türfuß war nicht zugänglich.

1. Beobachtung

Wenke maß links neben T-03 mit Stahlmaßstab 110 mm zwischen fertiger Dachoberfläche und oberem sichtbaren Bahnrand. Der zugehörige Punkt ist im Plan D-21 C mit 150 mm bezeichnet. Gerdes legte einen Ausdruck B vor, der an dieser Stelle 100 mm zeigt. Das Foto auf seinem Telefon vom 06.07. zeigt den Anschluss vor der Türmontage, jedoch keinen Maßstab. Eine Kopie wurde beim Termin nicht übergeben.

2. Erklärungen

Gerdes erklärte, C erst am 08.07. erhalten zu haben. Lühr bestätigte, dass die Türfirma den Fuß bereits am 07.07. geschlossen hatte. Wenke bat um einen gemeinsam abgestimmten Zugang zur verdeckten Stelle. Eine Öffnung wurde während des Termins nicht vorgenommen. Über die technische Erfüllung an der verdeckten Stelle wurde keine Feststellung getroffen.

3. Weiterer Ablauf

Lühr sagte einen Termin mit der Türfirma für den 14.07. zu. Der nördliche Zusatzanschluss kann vorher offen kontrolliert werden. Eine Preisvereinbarung wurde hier nicht getroffen. Das Protokoll wurde am 10.07. an alle drei Teilnehmer versandt; Gerdes bestätigte am 11.07. die Maßangabe, nicht aber eine Kostenübernahme. gez. Elisa Wenke.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine

17_Objektuebergabe.docx

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden

Verden, 14.08.2026 | VM-26-D

Übergabe Erweiterung Kita Mühlenwiese

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 14.08.2026 um 14:00 Uhr wurden die Räume G1, G2, Garderobe und Sanitärbereich des Erweiterungsbaus an Tessa Lühr und Kita-Leitung Marit Heese übergeben. Die Schlüsselübergabe umfasst zwölf Raumschlüssel und zwei Zugangstransponder. Sie ersetzt keine noch fehlende Gewerkeabnahme und keine öffentlich-rechtliche oder technische Nutzungsfreigabe.

Unterlage/Einweisung	Stand	Empfang
Revisionsgrundriss A-20	12.08.2026	Papier und PDF übergeben
Elektroprüfung E-09	10.08.2026	PDF übergeben
Türbedienung T1 bis T4	14.08.2026	Heese und Bahr eingewiesen
Dachdokumentation	Teilmappe 08.08.2026	Produktdaten vorhanden; T-03-Skizze fehlt
Heizungsbedienung	12.08.2026	Bahr eingewiesen

Die Dachabnahme fand am 30.07.2026 statt. Rohbau wurde am 18.06.2026, Fenster/Türen am 05.08.2026 und Elektro am 10.08.2026 gesondert abgenommen; die Originalprotokolle der übrigen Gewerke verwahrt die Bauherrin. Die Übergabeakte enthält diese drei Protokolle nicht. Der Status des Dachpunkts M-01 wird durch die Schlüsselübergabe nicht verändert.

Hausmeister Bahr verwahrt die Wartungsunterlagen im Technikraum. Die Betreiberin übernimmt die turnusmäßige Sichtkontrolle der zugänglichen Abläufe nach der übergebenen Pflegeanleitung. Die Frage der Anschlussausführung T-03 bleibt davon unberührt. Empfang bestätigt: gez. Tessa Lühr, gez. Marit Heese. Übergeben: gez. Elisa Wenke.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine

07_Gemeinsames_Aufmass.pdf

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Allerfirst Dachbau GmbH
Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
Verden, 17.07.2026 | VM-26-D

Gemeinsames Aufmaß Dach, Blatt A-04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Elisa Wenke und Nils Gerdes haben am 17.07.2026 von 13:15 bis 14:00 Uhr die nachstehende Geometrie gemeinsam aufgenommen. Bezug sind Dachgrundriss D-21 und die Vertragspositionen vom 10.04.2026. Gemessen wurde mit Bandmaß, die Dachfläche wurde nicht auf die geneigte Oberfläche umgerechnet.

Bereich	Messansatz	Ergebnis	Zuordnung
Dachfläche	18,00 m mal 12,00 m	216,00 m²	1.02 bis 1.04
Randanschluss	18 + 18 + 12 + 12 + 4 m	64,00 m	1.05
Zusatzanschluss Nord	6,00 m	6,00 m	Angebot N1
Abläufe	8 Stück vorhanden	8 St	1.06
Notüberläufe	2 Stück vorhanden	2 St	1.07

Die vier zusätzlichen Meter in Position 1.05 betreffen die beiden Wangen am Türvorbau und sind im Vertrag ausdrücklich enthalten. Die sechs Meter des Zusatzanschlusses Nord gehören nicht zur ebenen Dachfläche und werden nicht zu deren 216 m² addiert. Die sichtbaren Ränder wurden gemessen; der verdeckte Türfuß T-03 wurde nicht geöffnet.

Die Unterschriften bestätigen ausschließlich die gemeinsame Aufnahme der aufgeführten Maße und Stückzahlen. Vergütungsgrund, Preis und technische Vertragsgerechtigkeit sind damit nicht anerkannt. Eine Abnahme wird nicht erklärt. Die Prüfung der Dichtheit und des verdeckten Anschlusses ist nicht Gegenstand dieses Aufmaßblatts.

Aufgenommen und am 17.07.2026 gegengezeichnet: gez. Elisa Wenke; gez. Nils Gerdes. Planbezug: D-21 C, Maßketten Dachrechteck und Nordanschluss.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine

08_Schlussrechnung_AD26081.pdf

Allerfirst Dachbau GmbH

Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
bauleitung@allerfirst.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 03.08.2026 | VM-26-D

Schlussrechnung AD-26081, Leistungszeit Juni/Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir rechnen die Dacharbeiten am Erweiterungsbau Kita Mühlenwiese abschließend ab. Die Mengen beruhen auf unseren Ausführungsaufzeichnungen und dem gemeinsamen Aufmaß A-04. Unsere Zusatzflächen an der Nordseite werden in den Flächenpositionen mitgeführt. Rechnungszugang per E-Mail am 03.08.2026.

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Einrichtung und Schutz	1 psch	3.200,00	3.200,00
1.02	Dampfsperre	222 m²	18,00	3.996,00
1.03	Gefälledämmung	222 m²	72,00	15.984,00
1.04	Abdichtung zweilagig	222 m²	39,00	8.658,00
1.05	Randanschlüsse	64 m	48,00	3.072,00
1.06	Dachabläufe	8 St	165,00	1.320,00
1.07	Notüberläufe	2 St	440,00	880,00
1.08	Prüfung und Dokumentation	1 psch	650,00	650,00
N1	Zusatzanschluss/Rüsten	1 psch	900,00	900,00
N2	Wartezeit	2 Tage	490,00	980,00

Gesamtleistung netto 39.640,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent 7.531,60 EUR. Gesamtleistung brutto 47.171,60 EUR. Erhaltene Abschläge: 17.850,00 EUR am 19.06.2026 und 11.900,00 EUR am 17.07.2026, zusammen 29.750,00 EUR brutto. Verbleibender Zahlungsbetrag 17.421,60 EUR.

Die Wartezeit N2 betrifft den 09. und 10.07.2026. Wir setzen dafür 490,00 EUR je Tag für Mannschaft und Geräte an. Ein gesonderter Stundenbericht ist dieser Rechnung nicht beigelegt. Den Zusatzanschluss N1 haben wir zu dem per E-Mail bestätigten Preis ausgeführt. Die Beseitigung der im Abnahmeprotokoll benannten Punkte ist für den 07.08. vorgesehen.

Zahlbar gemäß Vertrag nach Abnahme und prüfbarer Abrechnung. Zahlungsweg ist das bei der Auftraggeberin hinterlegte Kreditorenkonto AD-12; dieses Dokument enthält keine neue Bankverbindung. Freistellungs- und steuerliche Stammdaten werden im Kreditorenstamm geführt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nils Gerdes, Bauleitung

Anlagen: keine

09_Nachtragsangebot_N1_N2.pdf

Allerfirst Dachbau GmbH

Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
bauleitung@allerfirst.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 10.07.2026 | VM-26-D

Nachtragsangebot zum Nordanschluss und Wartezeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach dem am 08.07. zugegangenen Detail C bieten wir den ergänzten nördlichen Anschluss an. Der Anschluss wird auf sechs Metern mit zusätzlichem Anschlussstreifen und höherer Aufkantung hergestellt. Der vorhandene Aufbau wird örtlich geöffnet und wieder geschlossen. Die Ausführung kann am 13.07. erfolgen.

Teil	Ansatz	Netto EUR
N1.1 Anschlussstreifen	6 m mal 120,00 EUR	720,00
N1.2 örtliches Rüsten	1 psch	180,00
N1 zusammen		900,00
N2 Wartezeit 09./10.07.	2 Tage mal 490,00 EUR	980,00
Angebot gesamt netto		1.880,00
19 Prozent Umsatzsteuer		357,20
Angebot gesamt brutto		2.237,20

N1 ersetzt keine der vereinbarten 216 m² Dachfläche und betrifft nicht den verdeckten Türfuß. Für N2 gehen wir von zwei nicht produktiven Tagen aus. Die Mannschaft war auf der Baustelle gemeldet; einen Stundenbeleg reichen wir nach. Andere Arbeiten wurden nach Mitteilung des Poliers teilweise fortgesetzt. Wir bitten um Bestätigung des Leistungsumfangs und der Preise vor Beginn von N1.

Das Angebot ist bis 14.07.2026 bindend. Nur die Geschäftsführung oder deren bevollmächtigte Vertreter können unsere Preise ändern. Eine technische Freigabe durch die Architektin ersetzt die Beauftragung durch die Bauherrin nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nils Gerdes, Bauleitung

Anlagen: keine

14_Abnahme_Dach.pdf

Mühlenwiese Betreuung gGmbH

Kinderbogen 32, 27283 Verden
bau@muehlenwiese.example

Allerfirst Dachbau GmbH
Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
Verden, 30.07.2026 | VM-26-D

Abnahmeprotokoll Dachvertrag VM-26-D

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 30.07.2026 um 10:00 Uhr fand die Abnahmebegehung der Dacharbeiten mit Tessa Lühr, Elisa Wenke und Nils Gerdes statt. Die Erklärung betrifft den Dachvertrag vom 10.04.2026 einschließlich N1 vom 11.07.2026, nicht die Tür-, Elektro- oder Tragwerksleistungen. Frau Lühr erklärte um 11:15 Uhr die Abnahme unter den nachstehenden Vorbehalten.

1. Festgestellte Punkte

M-01: Am seitlichen Anschluss neben T-03 ist weiterhin eine sichtbare Höhe von etwa 110 mm dokumentiert. Der Bereich hinter dem Türfuß ist verdeckt; eine gemeinsame Öffnung hat noch nicht stattgefunden. Die Bauherrin behält ihre Rechte wegen der abweichenden Anschlussausführung vor. Allerfirst soll mit der Türfirma einen Kontroll- und Beseitigungstermin bis 07.08. abstimmen. Gerdes bestreitet eine alleinige Verantwortung wegen des verspäteten Planversands.

M-02: Die Laubfangkörbe der Abläufe 7 und 8 sitzen lose und sind gegen Herausheben zu befestigen. Die Bauherrin behält ihre Rechte wegen dieses Mangels vor. Beseitigung bis 07.08.2026. Gerdes bestätigt die Ausführung ohne Zusatzpreis.

2. Unterlagen und Erklärungen

Eine Dichtheitsprüfaufzeichnung für die ebenen Flächen wurde vorgelegt. Sie enthält keine Aussage zum verdeckten Türfuß. Die Revisionsskizze zum Anschluss T-03 fehlt. Eine Zahlung oder Anerkennung der Schlussrechnung wird nicht erklärt. Ein Vertragsstrafenvorbehalt wird nicht aufgenommen, weil dieser Vertrag keine Vertragsstrafe enthält.

Die Bauherrin nimmt mit den ausdrücklich genannten Mängelvorbehalten ab. Die Teilnehmer unterschreiben für ihre jeweiligen Erklärungen: gez. Tessa Lühr, gez. Elisa Wenke, gez. Nils Gerdes. Gerdes erklärt mit seiner Unterschrift keine Zustimmung zu der Ursachenbewertung von M-01.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tessa Lühr, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

16_Nachkontrolle.pdf

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 11.08.2026 | VM-26-D

Nachkontrolle M-01 und M-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Elisa Wenke führte am 11.08.2026 von 09:00 bis 09:40 Uhr mit Hausmeister Levin Bahr eine Sichtkontrolle der im Abnahmeprotokoll bezeichneten Stellen durch. Allerfirst war trotz Einladung nicht vertreten. Das Dach war trocken und zugänglich; der Türfuß blieb geschlossen.

1. Tatsächliche Feststellungen

M-02: Beide Laubfangkörbe ließen sich bei Handprüfung nicht mehr aus ihrer vorgesehenen Halterung anheben. Die Befestigung war sichtbar. M-01: Seitlich neben T-03 ist eine zusätzliche obere Bahn zu sehen. Der untere Anschluss hinter dem Türfuß und die Verbindung zur Rinne waren nicht sichtbar. Eine Funktionsprüfung bei Wasserbelastung wurde nicht durchgeführt.

2. Dokumentation

Levin Bahr bestätigte, dass seit 08.08. keine Türfirma tätig war. Eine Öffnungserlaubnis oder ein abgestimmter Termin lagen bei dieser Kontrolle nicht vor. Der Bericht belegt daher nur den sichtbaren Zustand und die Handprüfung der Laubfänge. Er enthält keine vollständige technische Bestätigung des Anschlusses T-03.

Die Revisionsskizze T-03 lag auch am 11.08. nicht vor. Versand dieses Berichts an Bauherrin und Allerfirst am 12.08.2026. gez. Elisa Wenke.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine

19_Fachbeitrag_Pruefung.pdf

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 10.08.2026 | VM-26-D

Fachbericht E-09, Elektroinstallation Erweiterung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sven Rölke begleitete am 10.08.2026 die Funktionsprüfung der Elektroinstallation im Erweiterungsbau. Die ausführende Elektro Wulken GmbH legte ihre Messprotokolle vor. Betrachtet wurden Beleuchtung, Steckdosenkreise, Auslösung der Fehlerstromschutzeinrichtungen und die Schnittstelle zur Türsteuerung.

1. Prüfumfang

Die Messprotokolle EW-142 bis EW-148 sind der Betreiberakte beigelegt. Die geprüften Stromkreise wurden durch den ausführenden Elektromeister freigegeben. Die Funktionsprüfung der Türsteuerung betraf die elektrische Ansteuerung und Rückmeldung, nicht die Abdichtung oder die mechanische Befestigung des Türfußes. Bei Ausfall der Versorgung wurde die vorgesehene Rückmeldung ausgelöst.

2. Abgrenzung

Eine Prüfung des Dachanschlusses T-03, des Tragwerks oder der öffentlich-rechtlichen Bauleiterpflichten ist nicht Gegenstand dieses Berichts. Die Mitwirkung an der Elektroabnahme ersetzt keine Bauabnahme des Dachloses. Die Betreiberunterweisung wurde mit Levin Bahr durchgeführt und von ihm auf Blatt E-09-2 bestätigt.

Die detaillierten elektrischen Messwerte verbleiben in der Betreiberakte; aus dieser Zusammenfassung sollen keine Ersatzmesswerte abgeleitet werden. gez. Sven Rölke. Empfang am 10.08.2026 bestätigt durch Tessa Lühr.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sven Rölke, Fachplaner

Anlagen: keine
