

10_Projektpostfach.txt

Kommunaler Gebäudeverbund Finkenstiege | Projektraum KGF-26-41

Export von Jana Wendel, 25.09.2026, 08:45 Uhr. Zeitzone Europe/Berlin.

21.09.2026 09:00: Paket V01 freigeschaltet. Enthalten: LB-02 vom 16.09., RB-03 vom 15.09., EL-B-07 vom 15.09., NK-02 vom 17.09., Angebotsformblatt. Keine PN-04. Dateiinhalte gegenüber internem Stand unverändert.

22.09.2026 10:12: Nachricht Q-001, Stromfeld Ausbau, Menge Ausbau und Nordregal. Eingang im Projektraum. Export als 07_Bieterfrage_Mengen.eml.

23.09.2026 08:47: Nachricht Q-002, Hellpfad Elektrotechnik, Gleichwertigkeit und Deckenraster. Export als 08_Bieterfrage_Fabrikat.eml.

24.09.2026 13:26: Nachricht Q-003, Schaltgarten Anlagenbau, Steuerung und Arbeitsfenster. Export als 09_Bieterfrage_Steuerung.eml.

24.09.2026 16:10: Hausdienst telefonisch wegen Ortstermin am 28.09. angefragt. Keine Bestätigung im Projektraum.

25.09.2026 08:45: Keine Antwort veröffentlicht. Keine Unterlagenrevision V02 hochgeladen. Angebotsfrist in der Plattform weiterhin 09.10.2026, 10:00 Uhr.

Der Export bildet den Posteingang ab. Namen der fragenden Unternehmen sind in diesem internen Export sichtbar; über die Fassung einer Veröffentlichung entscheidet die Vergabestelle. Es besteht keine private Zusage an einen der Absender.

01_Vorabpruefung.eml

Von	Jana Wendel <j.wendel@kgf-celle.example>
An	Daria Schenk <d.schenk@kgf-celle.example>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 08:10:00 +0200
Betreff	KGF-26-41: Leistungsbeschreibung vorab durchsehen

Sehr geehrte Frau Schenk,

bitte sehen Sie die Leistungsbeschreibung vor der vorgesehenen Veröffentlichung auf unklare Angaben und Produktvorgaben durch. Ich brauche für die Abstimmung die konkrete Stelle und die fehlende Information, nicht bereits eine stillschweigend geänderte Angebotsgrundlage. Die Produktnotiz liegt intern bei; sie gehört bislang nicht zum veröffentlichten Paket.

Die Mengen im Raumbuch und die Anforderungen an die Steuerung verdienen einen Blick. Ich möchte keine nur scheinbar genaue Antwort weitergeben, solange Herr Tamm den Bestand nicht abschließend kennt. Bitte kennzeichnen Sie Fragen, die wir technisch klären müssen. Eine Rechtsprüfung oder eine Freigabe durch Sie allein ist nicht beauftragt.

Unsere interne Runde ist heute um 14:00 Uhr. Danach entscheide ich mit der zuständigen Leitung über das weitere Vorgehen. Bitte versenden Sie keine Unterlagen an mögliche Bieter. Den Schriftverkehr führe ich über den Projektraum, damit alle Unternehmen denselben Stand erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Jana Wendel
Zentrale Beschaffung

Anlagen:
03_Leistungsbeschreibung_02.docx
05_Produktnotiz.docx

07_Bieterfrage_Mengen.eml

Von	Pia Kröger <p.kroeger@stromfeld.example>
An	Vergabestelle KGF <vergabe@kgf-celle.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 10:12:00 +0200
Betreff	KGF-26-41 / Frage 1 / Anzahl Leuchten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bearbeiten das veröffentlichte Paket V01 vom 21.09.2026. In Position 01.020 sollen 32 Leuchten ausgebaut werden, während Position 02.010 36 neue Leuchten enthält. Das Raumbuch nennt sechs Reihen mit jeweils sechs Bestandsleuchten. Sollen vier alte Leuchten weiterverwendet werden oder sind alle 36 auszubauen? Die vier Deckenergänzungen in Position 03.010 können wir anhand der Raumbuchbeschreibung nicht als Leuchtenausbau zuordnen.

Bitte teilen Sie außerdem mit, ob das nördliche Regalband zu dem vollständig zu erneuernden Bereich gehört. Für ein Angebot müssen wir wissen, ob Demontage, Entsorgung und Montage dort enthalten sind. Die Arbeit über den feststehenden Regalen benötigt bei uns einen anderen Aufwand als die frei zugänglichen Felder.

Wir bitten um eine im Projektraum bereitgestellte Klarstellung der betroffenen Mengen. Wir haben bisher kein Angebot abgegeben und kalkulieren keine zusätzliche Menge ohne eindeutige Vorgabe. Eine Besichtigung allein würde den Widerspruch zwischen den Textstellen für uns nicht auflösen.

Mit freundlichen Grüßen
Pia Kröger
Stromfeld Ausbau GmbH

08_Bieterfrage_Fabrikat.eml

Von	Moritz Runge <m.runge@hellpfad.example>
An	Vergabestelle KGF <vergabe@kgf-celle.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 08:47:00 +0200
Betreff	KGF-26-41 / Frage 2 / Leuchte und Gleichwertigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Position 02.010 ist Lichtkontur Lesa 420 oder gleichwertig genannt. Uns fehlt eine Liste der maßgeblichen Eigenschaften, anhand derer Sie die Gleichwertigkeit beurteilen wollen. Sind neben 4.000 K und höchstens 30 W ein bestimmter Lichtstrom, eine Blendungsbegrenzung oder bestimmte Abmessungen verbindlich? Welcher Nachweis soll bereits mit dem Angebot vorliegen, welcher erst vor Bestellung?

Unser vorgesehene Alternativprodukt hat andere Gehäuseaußenmaße als die uns bekannte Leuchte mit ähnlicher Bezeichnung. Im Raumbuch steht ein 600-mm-Raster, jedoch kein freies Einbaumaß. Müssen wir etwaige Anpassungen der Rasterdecke mit anbieten oder ist eine ohne Anpassung passende Leuchte erforderlich? Ein aktuelles Datenblatt des benannten Produkts finden wir in V01 nicht.

Die Frage betrifft aus unserer Sicht die gemeinsame Kalkulationsgrundlage. Wir bitten nicht um eine individuelle Vorabzulassung unseres Fabrikats, sondern um die für alle geltenden Merkmale. Technische Unterlagen können wir nach Festlegung der Anforderungen beifügen.

Mit freundlichen Grüßen

Moritz Runge

Hellpfad Elektrotechnik GmbH

09_Bieterfrage_Steuerung.eml

Von	Sibel Hartung <s.hartung@schaltgarten.example>
An	Vergabestelle KGF <vergabe@kgf-celle.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 13:26:00 +0200
Betreff	KGF-26-41 / Frage 3 / Steuerung und Bohrzeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Position 02.020 verlangt eine zum Bestand passende Steuerung mit drei Szenen. Im Bestandsbericht EL-B-07 ist das vorhandene System jedoch nicht identifiziert. Dürfen wir eine neue eigenständige Steuerung kalkulieren, oder müssen wir ein bestimmtes vorhandenes Protokoll anbinden? Bitte nennen Sie die für die Leitungsposition maßgebliche Aderzahl beziehungsweise die funktionale Abgrenzung der neu zu liefernden Leitungen.

Eine zweite Frage betrifft Position 01.010. Dort sind Arbeiten tagsüber vorgesehen, im Ablaufkalender sind für zwei Tage lärmintensive Arbeiten nur außerhalb der Veranstaltungen erwünscht. Gelten die genannten Zeitfenster verbindlich für die Angebotskalkulation? Bitte stellen Sie klar, ob Abschaltungen während der Öffnungszeit der Ausleihe zulässig sind und wer die dafür notwendigen Termine abstimmt.

Wir haben keine eigene Bestandsöffnung vorgenommen. Unsere Kalkulation kann daher weder eine vorhandene Busleitung noch eine vollständige Neuverkabelung voraussetzen. Sofern sich die Angaben nach dem Fachtermin ändern, benötigen wir die aktualisierten Unterlagen mit einheitlichem Versionsstand.

Mit freundlichen Grüßen

Sibel Hartung

Schaltgarten Anlagenbau GmbH

15_Bieterpost_buendeln.eml

Von	Jana Wendel <j.wendel@kgf-celle.example>
An	Daria Schenk <d.schenk@kgf-celle.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 09:00:00 +0200
Betreff	KGF-26-41: Eingegangene Fragen für die gemeinsame Antwort

Sehr geehrte Frau Schenk,

inzwischen liegen drei Bieternachrichten vor. Bitte bündeln Sie die angesprochenen Themen und bereiten Sie einen Antwortentwurf für die Veröffentlichung an alle Bieter vor. Ich brauche neben dem Entwurf die Zuordnung, welche Punkte lediglich erläutert werden können und wo wir erst die Beschreibung oder Mengen ändern müssten. Offene technische Angaben dürfen im Entwurf nicht durch Annahmen ersetzt werden.

Die Vorabprüfung vom 18.09. ist noch nicht als abgeschlossener Prüfvermerk in unserer Ablage. Das Paket V01 ging am 21.09. mit LB-02 unverändert online. Eine Mitteilung V02 oder eine beantwortete Bieterfrage gibt es bisher nicht. Bitte behandeln Sie die drei Absender gleich und nehmen Sie keine individuelle Produktfreigabe in eine Antwort auf.

Herr Tamms ergänzender Ortstermin ist weiterhin nicht bestätigt. Sobald uns das Ergebnis vorliegt, prüfen wir auch, ob die Angebotsfrist angepasst werden muss. Ein Versand oder eine Veröffentlichung durch Sie ist mit dieser E-Mail nicht beauftragt. Ich werde die abgestimmte Fassung über den Projektraum bereitstellen.

Mit freundlichen Grüßen
Jana Wendel

20_Runge_Lieferauskunft.eml

Von	Moritz Runge <m.runge@hellpfad.example>
An	Vergabestelle KGF <vergabe@kgf-celle.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 10:45:00 +0200
Betreff	KGF-26-41 / Ergänzung zu Frage 2 / Schnittstelle und Lieferzeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer Frage vom 23.09. reichen wir die inzwischen eingegangene Lieferauskunft von Linienlicht ein. Sie betrifft ausdrücklich die Variante 840-S. Der Lieferant bietet unter derselben Gehäusebezeichnung auch ein anderes Betriebsgerät an. Eine Kalkulation nur nach dem äußeren Leuchtenmaß und 4.000 K führt daher noch nicht zu einem eindeutigen Steuerungsumfang.

Gilt für das Angebot eine bestimmte Schnittstelle, oder sollen wir eine eigene Steuerung einschließlich der dafür nötigen Leitung anbieten? Uns ist aus V01 weiterhin nicht ersichtlich, wie die drei Szenen an die vorhandene Bedienstelle angebunden werden sollen. Die beigefügte Auskunft soll diese Unsicherheit verdeutlichen; wir beantragen damit keine nur für uns geltende Produktzulassung.

Unser Lieferant nennt für eine zusammenhängende Serie den 02.10. als gewünschten Bestelleingang. Das liegt vor Ihrem Angebotsende am 09.10. Wir werden deshalb nicht jetzt schon im Vertrauen auf einen späteren Zuschlag bestellen. Bitte teilen Sie im gemeinsamen Projektraum mit, welche Ausführungs- und Materialanforderungen bei der Angebotsabgabe zugrunde zu legen sind und ob die veröffentlichten Ausführungszeiten unverändert bleiben. Von einer Ortsaufnahme Ihrer Planer haben wir keine neuen Unterlagen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Moritz Runge
Hellpfad Elektrotechnik GmbH

Anlagen:
16_Lieferantendaten_LB595.pdf

11_ Leuchtenzaehlung.csv

Reihe	Lage	Bestand_Stück	Zähldatum	Erfasserin	Bemerkung
1	West	6	2026-09-14	Finja Paulsen	vollständig sichtbar
2	westliche Mitte	6	2026-09-14	Finja Paulsen	vollständig sichtbar
3	Mitte	6	2026-09-14	Finja Paulsen	vollständig sichtbar
4	Mitte	6	2026-09-14	Finja Paulsen	vollständig sichtbar
5	östliche Mitte	6	2026-09-14	Finja Paulsen	Nordfeld über festem Regal
6	Ost	6	2026-09-14	Finja Paulsen	Nordfeld über festem Regal

19_Rasterablesungen.csv


Messfeld	Zeitpunkt	Freie_Weite _West_Ost_ mm	Freie_Weite _Nord_Süd_ mm	Plattenauße nmaß_mm	Aufnahmear t	Erfasser	Begrenzung
Reihe 1 / Feld 2	2026-09-28 T07:36:00+ 02:00	576	575	595 × 595	Stahlmaß; sichtbare Profilkanten	Erik Tamm / Anke Freese	keine Lastprüfung
Reihe 2 / Feld 3	2026-09-28 T07:42:00+ 02:00	575	574	595 × 595	Stahlmaß; sichtbare Profilkanten	Erik Tamm / Anke Freese	keine Lastprüfung
Reihe 3 / Feld 4	2026-09-28 T07:49:00+ 02:00	576	576	595 × 595	Stahlmaß; sichtbare Profilkanten	Erik Tamm / Anke Freese	keine Lastprüfung
Reihe 5 / Feld 3	2026-09-28 T07:55:00+ 02:00	574	575	595 × 595	Stahlmaß; sichtbare Profilkanten	Erik Tamm / Anke Freese	Nordrand nicht geöffnet

12_Leuchtenschema.png

LS-03 | Lesesaal Finkentieg | 36 Bestandsleuchten

14.09.2026 | Finja Paulsen

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

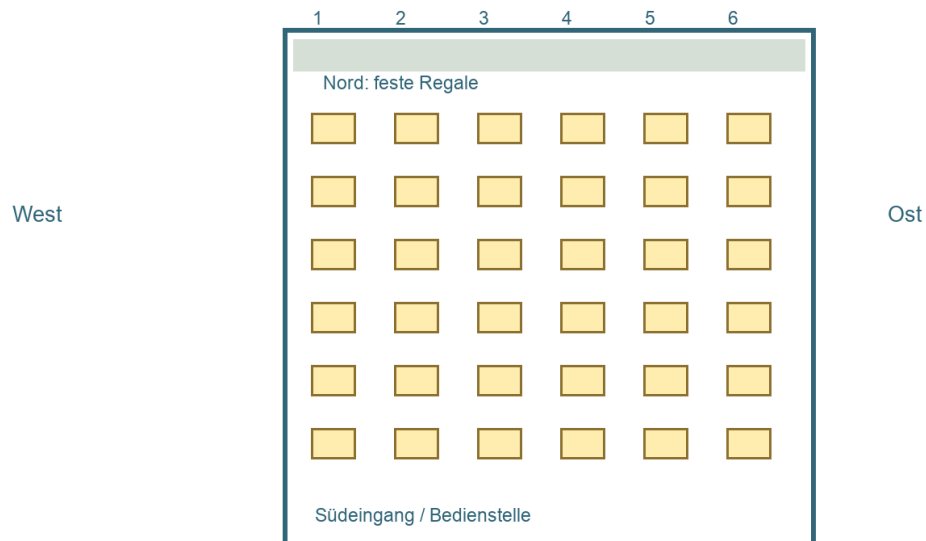

6 Reihen mit jeweils 6 Leuchten | Raum 12,00 × 12,00 m

Schematische Bestandsskizze. Keine lichttechnische Berechnung und kein Einbaumaßblatt.

Bilddatei: 12_Leuchtenschema.png

03_Leistungsbeschreibung_02.docx

Leistungsbeschreibung Lesesaal Finkentieg

Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

An: Zentrale Beschaffung | Jana Wendel

16.09.2026 | KGF-26-41 / LB-02 / technischer Arbeitsstand

1 Baustelle und Vorhaltung

Die Arbeiten finden im Lesesaal im Erdgeschoss Finkentieg 8 in Celle statt. Der Saal hat eine Grundfläche von 144,00 m². Die benachbarte Ausleihe bleibt werktags geöffnet. Der Zugang für Personal und Material erfolgt über den Hof. Der Auftragnehmer schützt die bestehenden Regale und die angrenzende Ausleihe gegen Staub und Beschädigung. Mobile Regale im Saal werden vor Beginn durch den Nutzer verschoben; an die Wand geschraubte Regale verbleiben im Raum.

Position 01.010 umfasst das Einrichten, Vorhalten und Räumen der erforderlichen Arbeitsbereiche und Abdeckungen für die gesamte Ausführungszeit. Die Baustelle kann tagsüber betrieben werden. Geräuschintensive Arbeiten sind mit dem Nutzer abzustimmen. Menge: 1 pauschal. Einen festen Zeitkorridor für Bohrungen nennt diese Position nicht. Der Ablaufkalender ist bei der Einsatzplanung zu berücksichtigen.

Position 01.020 umfasst den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Rasterleuchten einschließlich Leuchtmittel. Im Raumbuch sind 36 Leuchten aufgeführt. Menge in dieser Position: 32 Stück. Die betroffenen Stromkreise sind vor Beginn der Arbeiten durch die ausführende Elektrofachkraft zu sichern. Der Bestand in der Ausleihe bleibt in Betrieb und wird nicht mit ausgebaut.

2 Neue Beleuchtung

Position 02.010 umfasst die Lieferung und betriebsfertige Montage von LED-Einbauleuchten, Fabrikat Lichtkontur, Typ Les 420, oder gleichwertig. Die Leuchten werden in die vorhandene Rasterdecke eingesetzt. Gehäuse weiß, Lichtfarbe 4.000 K, Anschlussleistung höchstens 30 W. Eine Gleichwertigkeit ist mit Produktunterlagen darzustellen. Abmessungen, Lichtstrom und Blendungsbegrenzung werden in dieser Position nicht beziffert. Menge: 36 Stück.

Die Lichtverteilung muss für die vorhandenen Leseplätze geeignet sein. Eine projektspezifische lichttechnische Berechnung ist vor Bestellung vorzulegen. Der Auftraggeber hat noch keine Produktbemusterung freigegeben. Eine gelieferte Produktserie darf nicht allein aufgrund ihrer Typbezeichnung als technisch geeignet betrachtet werden.

Daria Schenk | LB-02, Seite 1

3 Steuerung und Leitungen

Position 02.020 umfasst die Steuerung der Leuchten über eine zentrale Bedienstelle am Eingang und die Anbindung an die vorhandene Steuerung. Das System ist passend zum Bestand auszuführen. Die Leuchten müssen dimmbar sein. An der Bedienstelle sind drei Szenen abzurufen: Reinigung, Lesebetrieb und Veranstaltung. Die genauen Helligkeitswerte werden bei der Inbetriebnahme mit dem Nutzer festgelegt. Menge: 1 Anlage.

Position 02.030 umfasst neue Leitungsabschnitte von den vorhandenen Abzweigstellen zu den neuen Leuchten, einschließlich Befestigung und Anschluss. Angesetzt sind 180,00 m. Die Leitungsart und die Zahl zusätzlich benötigter Steueradern werden nach Aufnahme des Bestands festgelegt. Leitungen, die nach Prüfung weiterverwendet werden können, sollen erhalten bleiben. Der Bestandsbericht EL-B-07 ist zu beachten; ein vollständig geöffnetes Leitungsnetz liegt nicht vor.

Position 02.040 umfasst die erforderlichen Anpassungen im vorhandenen Unterverteiler UV-L. Freie Platzreserven sind vorhanden. Der Auftragnehmer prüft die Eignung vor Ausführung und dokumentiert die vorgenommenen Änderungen. Menge: 1 pauschal. Ein neuer Verteiler ist nicht ausgeschrieben. Die Anlage in der Ausleihe darf außerhalb der abgestimmten Abschaltzeiten nicht außer Betrieb gesetzt werden.

4 Decke

Position 03.010 umfasst das Schließen von vier nicht mehr benötigten Deckenausschnitten mit zum Bestand passenden Platten. Die sichtbare Oberfläche soll sich in Farbe und Raster an den Bestand anpassen. Menge: 4 Stück. Für mögliche zusätzliche Anpassungen infolge abweichender Leuchtenabmessungen enthält das LV keine weitere Position. Neue Leuchten sind in vorhandene Rasterfelder einzubauen; ein vollständiger Deckentausch ist nicht Teil des Auftrags.

Die Deckenplatten dürfen nur in den Arbeitsfeldern aufgenommen werden. Beschädigte Bestandsplatten sind vor Beginn fotografisch zu dokumentieren und dem Auftraggeber anzuzeigen. Der Nutzer weist auf einen alten Wasserfleck im nordöstlichen Randfeld hin. Der Bericht enthält keine Aussage über die Ursache oder den Zustand verdeckter Tragteile.

Daria Schenk | LB-02, Seite 2

5 Inbetriebnahme und Unterlagen

Position 04.010 umfasst die Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung, die elektrische Prüfung durch die Fachfirma und die Einweisung zweier Mitarbeiter des Nutzers. Die Einweisung soll 90 Minuten dauern. Der Auftragnehmer übergibt Stromlaufunterlagen, Produktdaten, eine Beschreibung der programmierten Szenen und das Prüfprotokoll in elektronischer Form. Menge: 1 pauschal. Die elektrische Prüfung ist von einer bloßen Bedienprobe zu unterscheiden.

Für die Abnahme ist ein gemeinsamer Termin vorgesehen. Der Betrieb einer einzelnen Leuchte während der Montage ist keine in dieser Beschreibung vereinbarte Abnahmehandlung. Die Zugänglichkeit der Anschlussstellen ist vor dem Schließen der Rasterdecke zu prüfen. Der Auftragnehmer meldet verdeckte Abweichungen der Projektleitung, bevor darauf aufbauende Arbeiten ausgeführt werden.

6 Ausführung und Nutzerbetrieb

Die Ausführung ist vom 09.11. bis 20.11.2026 vorgesehen. Die Ausleihe bleibt Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Lesesaal selbst ist gesperrt; die Verbindungstür zur Ausleihe dient während dieser Zeit nicht als Materialzugang. Der Hofzugang steht von 07:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Anlieferungen nach 17:00 Uhr sind nur nach gesonderter Abstimmung möglich.

In der bisherigen Kostenschätzung wurden Montagearbeiten an zehn Werktagen angesetzt. Das ist keine zugesagte tägliche Vollverfügbarkeit jedes Raums. Die Nutzertermine im Ablaufkalender wurden nach Erstellung der Kostenschätzung ergänzt. Die Belegung des Nebenraums am 12.11. und 17.11. ist bei der konkreten Abstimmung zu berücksichtigen. Die dortigen Veranstaltungen werden durch diese Beschreibung nicht abgesagt.

7 Unterlagenstand

Die Leistungsbeschreibung umfasst drei Seiten und trägt den Index 02. Ihr gehen die Raumbuchfassung RB-03 und die Bestandsaufnahme EL-B-07 als eigenständige Unterlagen bei. Die Produktnotiz PN-04 ist eine gesonderte interne Notiz. In dieser Fassung werden keine Bieterfragen beantwortet. Die technische Projektleitung hat den Text am 16.09.2026 an die Beschaffung übergeben.

Daria Schenk | d.schenk@kgf-celle.example

05_Produktnotiz.docx

Produktnotiz zur Kostenermittlung

Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

An: Jana Wendel | Zentrale Beschaffung

08.09.2026 | PN-04 / intern

1 Herkunft der Bezeichnung

Für die vorläufige Kostenermittlung habe ich die Bezeichnung Lichtkontur Lesa 420 aus dem Altprojekt unseres Büros übernommen. Es liegt für den Lesesaal Finkentstiege kein aktuelles Angebot dieses Lieferanten und keine projektspezifische Freigabe vor. Die Typbezeichnung in meiner Notiz ist deshalb keine geprüfte Festlegung der hier erforderlichen Eigenschaften. Ein Herstellerdatenblatt habe ich der Vergabeakte bislang nicht beigelegt.

Die Hausmeister haben von guten Erfahrungen mit der Bedienung der Beleuchtung im Nachbargebäude berichtet. Ich habe daraus zunächst die Produktbezeichnung übernommen, nicht aber einen technischen Nachweis der Anschlussfähigkeit an UV-L. Die Anlagen der beiden Gebäude wurden zu unterschiedlichen Zeiten errichtet. Eine Gleichheit der Steuerung ist nicht nachgewiesen. Insbesondere ist offen, ob die vorhandene Bedienstelle nur einen Schaltkontakt oder einen Steuerbus bedient.

2 Anforderungen aus der Nutzung

Der Lesesaal benötigt eine Beleuchtung für längeres Lesen an den Tischen und für die Reinigung. Der Nutzer möchte zusätzlich eine gedimmte Veranstaltungsszene. In meiner Skizze stehen 4.000 K und maximal 30 W je Leuchte. Ein erforderlicher Lichtstrom je Leuchte, eine Blendungsbegrenzung und die Nachweise für die konkrete Raumgeometrie sind noch nicht in Zahlen beschrieben. Die fehlenden Angaben lassen sich nicht zuverlässig durch einen Produktnamen ersetzen.

Die Einbauleuchten müssen zur vorhandenen Rasterdecke passen. Ein vollständiger Deckenaustausch war im Budgetansatz nicht enthalten. Für Alternativprodukte müssen wir daher noch festhalten, welche geometrischen und funktionalen Eigenschaften zu erfüllen sind und welche Unterlagen die Prüfung ermöglichen. Ich habe hierfür noch keine abschließende Merkmalsliste unterschrieben.

3 Weitergabe

Bitte behandeln Sie diese Notiz als Herkunftsnachweis meines Kostenansatzes. Sie ist nicht zur Übersendung als Bieterantwort formuliert. Vor einer verbindlichen technischen Festlegung möchte ich die Bestandsergebnisse und die Nutzervorgaben nebeneinanderlegen. Eine vergaberechtliche Begründung für eine Beschränkung auf ein Fabrikat enthält diese Notiz nicht.

Daria Schenk | 08.09.2026, 16:00 Uhr

14_Nutzernotiz.docx

Bedienung des Lesesaals

Livia Berg | Leitung Lesesaal Finkenstieg

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung

18.09.2026 | KGF-26-41 / Nutzervermerk 05

1 Alltag

Sehr geehrte Frau Schenk, die Beschäftigten möchten die neue Beleuchtung ohne Tablet und ohne Anmeldung an einem Benutzerkonto bedienen können. Die vorhandene Stelle am Südeingang ist für uns richtig gelegen. Wir benötigen gut erkennbare Tasten für normalen Lesebetrieb, Reinigung und eine reduzierte Beleuchtung bei Vorträgen. Die Helligkeit im Vortragsbetrieb möchten wir bei einer gemeinsamen Einweisung ausprobieren, weil die Projektionsfläche an der Nordwand steht.

Die Wünsche beschreiben die Bedienung aus Nutzersicht. Ob die vorhandene Verkabelung dafür ausreicht, können wir nicht beurteilen. Herr Tamm hat die Wandstelle angesehen und wollte für die weitere Aufnahme nochmals kommen. Ein bestimmtes Steuerungssystem oder Fabrikat haben wir nicht ausgewählt. Die Bezeichnung Lesa 420 war mir bis zu Ihrer Kostennotiz nicht bekannt.

2 Bestand und Reinigung

In den letzten Monaten wurden einzelne Leuchtmittel ersetzt. Die vier Leuchten über dem nördlichen Regalband gehören weiterhin zum Saal. Sie sollen aus unserer Sicht nicht als Altbestand stehen bleiben. Über dem Regalband ist das Reinigen schwierig; der Abstand zum oberen Regalboden beträgt nur ungefähr 80 cm. Die Montagefirma muss hierfür geeignete Arbeitsmittel mitbringen. Wir können die fest verschraubten Regale nicht vor Beginn abnehmen.

3 Einweisung

Für die Einweisung stehen Livia Berg und Hausmeisterin Anke Freese zur Verfügung. Ein Termin am 20.11. ist grundsätzlich möglich, aber noch nicht fest bestätigt. Wir benötigen die Bedienbeschreibung auch als ausdruckbare Datei für den Hausmeisterordner. Die Dokumentation soll die tatsächlich programmierten Szenen benennen; eine allgemeine Herstellerbroschüre ohne Bezug auf unsere Bedienstelle reicht uns im Betrieb nicht.

Die beiden Lesungen im Nebenraum bleiben gebucht. Bitte stimmen Sie eine Änderung der Bauzeiten mit uns ab, bevor wir Einladungen zurücknehmen. Von einer verlängerten Schließung des Lesesaals wissen wir bislang nichts.

Mit freundlichen Grüßen

Livia Berg | l.berg@kgf-celle.example

17_Aufnahme_Steuerleitungen.docx

Zweite Bestandsaufnahme Lesesaal

Erik Tamm | Fachplanung Strompfad

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

28.09.2026, 09:10 Uhr | EL-B-08 / Ergänzung der örtlichen Aufnahme

1 Zugang und Abschaltung

Frau Freese bestätigte den Termin am Freitag um 15:50 Uhr telefonisch. Heute öffnete sie um 07:02 Uhr. Ich arbeitete bis 08:22 Uhr im Lesesaal; eine örtliche Elektrofachkraft des Hausdienstes schaltete die betroffenen Lichtabgänge für die Aufnahme frei. Die Ausleihterminals blieben in Betrieb. Um 08:15 Uhr wurde die Beleuchtung wieder eingeschaltet, bevor der Nutzer um 09:00 Uhr öffnete. An der Anlage wurde nichts dauerhaft geändert.

2 Zugängliche Leitungsabschnitte

An den drei geöffneten Abzweigstellen über den Reihen 1, 3 und 5 führten jeweils dreiadrige Leitungsabschnitte zu den dort zugänglichen Leuchten. Die freie Länge ließ sich nur bis zum nächsten Profelfeld verfolgen. Ob weiter zurück in einer Trasse zusätzliche unbenutzte Leitungen liegen, blieb verdeckt. Eine Gesamtlänge haben wir nicht aufgenommen. Aus drei geöffneten Punkten ergibt sich deshalb keine belastbare neue Menge für die bislang angesetzten 180,00 m.

Hinter der Bedienstelle waren erneut zwei angeschlossene Leiter sichtbar. Der Einsatz hatte keine lesbare Typkennzeichnung. Im Verteiler war ein Relais mit handschriftlichem Schild „Saal“ erkennbar. Eine Verbindung dieses Relais zu jedem einzelnen Abgang ließ sich in dem kurzen Zeitfenster nicht vollständig verfolgen. Die sechs freien Teilungseinheiten aus EL-B-07 sind weiterhin vorhanden. Ein für die neue Anlage geeigneter Steuerbus wurde heute nicht identifiziert; die Aufnahme beweist aber auch nicht, dass im gesamten Gebäude keine Busleitung liegt.

3 Raster und Rückbau

Frau Freese und ich maßen bei vier geöffneten Feldern die lichte Weite zwischen den sichtbaren Profilkanten. Die Einzelwerte stehen in der gesonderten Messliste. Die vorhandenen Platten lagen auf Profilen auf und wurden nicht zwischen Federklammern gehalten. Wir haben keinen Belastungsversuch an der Unterkonstruktion vorgenommen. Die Leuchten am nördlichen Regalband blieben bei dieser Aufnahme eingebaut, weil die vorgesehene kleine Arbeitsplattform dort nicht aufgestellt werden konnte.

Das alte Verteilerschema aus dem Hausmeisterordner zeigt nur die Abgangsbezeichnungen und enthält kein vollständiges Steuerungsschema. Frau Freese fand keine jüngere Fassung. Ich habe alle geöffneten Platten wieder eingelegt. Dieser Bericht dokumentiert den Bestand an zugänglichen Punkten. Eine geänderte Leistungsbeschreibung oder freigegebene Steuerungsauslegung liegt damit nicht vor.

Erik Tamm | e.tamm@strompfad.example

02_Vergabedaten.pdf

Vergabedaten Lesesaal Finkentstieg

Kommunaler Gebäudeverbund Finkentstieg | Zentrale Beschaffung

An: Jana Wendel | Vergabesachbearbeitung

17.09.2026 | KGF-26-41 / Verfahrensblatt 02

1 Vorhaben

Der Kommunale Gebäudeverbund Finkentstieg beschafft Bauleistungen für die Modernisierung des Lesesaals Finkentstieg 8, 29221 Celle. Gegenstand sind die Erneuerung der Beleuchtung und der zugehörigen Leitungsabschnitte, eine örtliche Deckenergänzung sowie die Inbetriebnahme der Steuerung. Der Gebäudeverbund ist im vorliegenden Verfahren öffentlicher Auftraggeber. Es handelt sich nicht um eine private Angebotseinholung. Verfahrensverantwortlich ist Jana Wendel, technische Projektleiterin ist Daria Schenk.

Die zentrale Beschaffungsstelle hat das Verfahren als öffentliche Ausschreibung nach dem ersten Abschnitt der VOB/A angelegt. Die Prüfung der Verfahrenswahl und der einschlägigen Landesvorgaben liegt in der zentralen Vergabeakte; dieses Blatt ist keine vergaberechtliche Stellungnahme. Eine EU-Bekanntmachung ist in diesem Vorgang nicht angelegt. Es gibt ein Los für die zusammenhängenden Arbeiten im Lesesaal. Nebenangebote sind nach dem vorbereiteten Datenblatt nicht zugelassen.

2 Unterlagen und Kommunikation

Für den vorgesehenen Versand sind LB-02 vom 16.09.2026, Raumbuch RB-03, Bestandsaufnahme EL-B-07, der Ablaufkalender sowie das Formblatt zur Angebotsabgabe vorgesehen. Die Produktnotiz PN-04 ist bisher eine interne Beschaffungsnotiz und nicht als verbindlicher Planerentscheid freigegeben. Daria Schenk prüft die technische Vollständigkeit. Jana Wendel verantwortet die Einstellung in den Projektraum der Vergabeplattform.

Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über den Projektraum KGF-26-41. Technische Mitarbeiter dürfen vor Ort Bestandsmerkmale erläutern, sollen aber keine abweichenden Ausführungszusagen an einzelne Unternehmen geben. Inhaltliche Antworten und Unterlagenänderungen werden von der Beschaffungsstelle geprüft und einheitlich bereitgestellt. Ein mündliches Gespräch ersetzt keine dokumentierte Änderung der Leistungsbeschreibung.

3 Termine

Der interne Vorabcheck ist am 18.09. vorgesehen. Die Freischaltung ist für den 21.09. um 09:00 Uhr geplant. Angebote sollen bis 09.10.2026 um 10:00 Uhr eingehen. Der Termin am 01.10. um 12:00 Uhr ist als organisatorischer Zieltermin für Rückfragen vermerkt, nicht als Zusage, spätere Hinweise auf Unterlagenfehler unbeachtet zu lassen. Ob eine Änderung die Angebotsfrist berührt, entscheidet die Vergabestelle nach Prüfung des konkreten Inhalts.

Jana Wendel | j.wendel@kgf-celle.example

04_Raumbuch.pdf

Raumbuch Lesesaal

Finja Paulsen | Gebäudedokumentation KGF

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung

15.09.2026 | RB-03 / Finkentstieg 8

1 Raumaufnahme

Der Lesesaal wurde am 14.09.2026 von Finja Paulsen und Daria Schenk begangen. Die lichte Länge beträgt 12,00 m, die Breite 12,00 m, die Höhe bis Rasterdecke 3,20 m. Die Ausleihe wurde nicht vermessen. An drei Wänden stehen feste Regale; in der Saalmitte gibt es sechs bewegliche Tische mit insgesamt 24 Leseplätzen. Die Rasterfelder sind als 600-mm-Raster angelegt. Das tatsächlich nutzbare Einbaumaß einer Leuchte muss am System geprüft werden.

2 Leuchtenbestand

Bei der Zählung wurden sechs Reihen mit jeweils sechs Leuchten erfasst. Die Reihen sind von West nach Ost als 1 bis 6 bezeichnet. Alle 36 Leuchten waren sichtbar. Vier Leuchten am Nordrand gehören weiterhin zum Lesesaal, obwohl sie in einem älteren Belegungsplan über dem Regalband liegen. Sie wurden nicht als Ausleihe ausgesondert.

Merkmal	Feststellung	Quelle
Raumfläche	144,00 m²	lichte Maße 12,00 × 12,00 m
Leuchten	36 Stück	6 Reihen mit je 6 Stück
Deckenausschnitte ohne Leuchte	4 Stück	ehemalige Lautsprecherstellen
Bedienstelle	1 am Südeingang	vorhandener Taster; Funktion vor Ort nicht geöffnet

3 Offene Bestandsmerkmale

Die Rasterdecke wurde nur an zwei Stellen angehoben. Typenschild und Schaltgeräte der Leuchten wurden dort nicht vollständig erfasst. Ob sämtliche Bestandsleitungen für die neue Steuerung genutzt werden können, ist aus dieser Aufnahme nicht abzuleiten. Die vier ungenutzten Deckenausschnitte sind keine ausgebauten Leuchten; sie stammen nach Auskunft des Nutzers von früheren Lautsprechern. Ein Austausch von nur 32 Leuchten würde vier Bestandsleuchten im Saal belassen.

Finja Paulsen | erfasst am 15.09.2026, 10:10 Uhr

06_Bestandsaufnahme.pdf

Bestandsaufnahme Unterverteiler und Bedienstelle

Erik Tamm | Fachplanung Strompfad

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

15.09.2026 | EL-B-07 / Ortstermin 14.09.2026

1 Besichtigung

Am 14.09.2026 von 07:30 bis 08:40 Uhr habe ich mit Hausmeisterin Anke Freese den Unterverteiler UV-L und zwei geöffnete Rasterfelder im Lesesaal angesehen. Die Ausleihe wurde währenddessen nicht abgeschaltet. Die Aufnahme war eine begrenzte Bestandsbesichtigung, keine wiederkehrende elektrische Prüfung. Wir haben keine Leiter unter Spannung umgeklemmt und keine Leitungswege vollständig verfolgt.

Im Verteiler sind sechs unbestückte Teilungseinheiten sichtbar. Daraus folgt allein noch nicht, dass jede denkbare Steuerung ohne weitere Anpassung eingebaut werden kann. Die Wärmebelastung, Absicherung und Anschlussbedingungen wurden bei diesem Termin nicht für eine neue Anlage berechnet. Ein vollständiger aktueller Stromlaufplan konnte im Hausmeisterraum nicht gefunden werden.

2 Bedienstelle

Am Südeingang sitzt ein Taster mit zwei Wippen. Nach Angabe von Frau Freese lässt sich damit bislang nur ein- und ausschalten. Hinter der Abdeckung sind an der zugänglichen Stelle zwei angeschlossene Leiter erkennbar. Eine eindeutige Typkennzeichnung des dortigen Geräts wurde nicht aufgenommen. In einem alten Plan ist daneben handschriftlich „Dimmen später“ notiert. Das belegt keine tatsächlich vorhandene Busleitung.

Oberhalb der zwei geöffneten Deckenfelder liegen Leitungen in unterschiedlichen Trassen. Eine Aderzahl wurde nicht für alle Abgänge festgestellt. Die pauschale Annahme, die neue dimmbare Anlage könne ohne zusätzliche Steuerleitung angeschlossen werden, kann ich aus diesem Termin nicht bestätigen. Ebenso wenig kann ich schon sagen, dass sämtliche vorhandenen Leitungen ersetzt werden müssen.

3 Nächster Fachtermin

Vor der abschließenden Ausführungsplanung ist eine gezielte Aufnahme bei abgestimmter Abschaltung erforderlich. Dafür schlage ich den 28.09. von 07:00 bis 08:30 Uhr vor. Der Nutzer hat den Termin noch nicht bestätigt. Änderungen der Leistungsbeschreibung müssen danach anhand der tatsächlichen Erkenntnisse geprüft werden; dieser Bericht legt kein bestimmtes Steuerungsprotokoll fest.

Erik Tamm | e.tamm@strompfad.example

13_Ablaufkalender.pdf

Betriebszeiten während der Lesesaalarbeiten

Anke Freese | Hausdienst Finkenstieg

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung

17.09.2026 | KGF-26-41 / NK-02

1 Regelbetrieb

Die Ausleihe bleibt während der vorgesehenen Arbeiten vom 09.11. bis 20.11.2026 werktags von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Lesesaal wird in dieser Zeit für Besucher geschlossen. Der Hof kann für Anlieferungen von 07:00 bis 17:00 Uhr genutzt werden. Die Zufahrt ist 3,20 m breit. Eine dauerhafte Lagerung auf dem markierten Rettungsweg im Hof ist nicht vorgesehen. Einen abschließbaren Lagerraum können wir nur mit 8 m² im Erdgeschoss anbieten.

2 Veranstaltungen

Am 12.11. und 17.11. finden im Nebenraum jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr bereits gebuchte Lesungen statt. Dabei stören Bohr- und Stemmarbeiten im Lesesaal erheblich. Aus Nutzersicht sollen solche Arbeiten an diesen beiden Tagen vor 09:30 Uhr oder nach 13:30 Uhr liegen. Ob die Ausschreibung diese Zeitfenster verbindlich vorgibt, muss die Projektleitung mit der Vergabestelle abstimmen. Der Hausdienst kann die Veranstaltungen nicht eigenständig absagen.

Für gewöhnliche Montage ohne erhebliche Geräuscentwicklung bestehen diese besonderen Veranstaltungsfenster nicht. Die erforderlichen Stromabschaltungen müssen wir jedoch gesondert abstimmen, weil Ausleihterminals und Eingangsbeleuchtung nicht unbemerkt ausfallen dürfen. Im Kalender ist bisher kein Abschalttermin während der Ausführungszeit bestätigt.

3 Zugang und Einrichtung

Die beweglichen Tische und Regale im Lesesaal werden bis 06.11. nachmittags durch den Nutzer zur Seite gestellt. Die fest verschraubten Wandregale bleiben stehen. Der Hausdienst kann keine Hubarbeitsbühne stellen. Die Höhe bis Decke beträgt im Saal 3,20 m. Vor Arbeitsbeginn erfolgt die Schlüsselübergabe an eine benannte verantwortliche Person des Auftragnehmers. Eine tägliche Öffnung vor 07:00 Uhr ist bislang nicht zugesagt.

Dieser Kalender wurde am 17.09. um 11:45 Uhr an Frau Schenk übermittelt. Er ist gegenüber NK-01 um die beiden Lesungstermine ergänzt. Der Ausführungszeitraum selbst wurde nicht verändert.

Anke Freese | a.freese@kgf-celle.example

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

16_Lieferantendaten_LB595.pdf

Technische Lieferauskunft LB 595

Jochen Lau | Leuchtwerk Linienlicht GmbH

An: Moritz Runge | Hellpfad Elektrotechnik GmbH

25.09.2026, 14:15 Uhr | LL-26-911 / Auskunft zur Anfrage vom 23.09.

1 Angefragtes Gerät

Sehr geehrter Herr Runge, die nachstehenden Daten betreffen unsere Einlegeleuchte LB 595 in der Ausführung 840-S. Sie haben uns einen Auszug aus Position 02.010 für den Lesesaal in Celle übermittelt. Für diese Ausführung nennen wir die folgenden Lieferdaten; die ebenfalls lieferbare Ausführung 840-B hat ein anderes Betriebsgerät und ist in diesen Werten nicht mitbeschrieben.

Merkmal	LB 595 / 840-S	Anmerkung
Außenmaß / Gehäusekörper	595 × 595 / 568 × 568 mm	Einlegebauart; keine Klemmbefestigung im Ausschnitt
Lichtfarbe / Anschlussleistung	4.000 K / 29 W	Nennbetrieb einschließlich Betriebsgerät
Lichtstrom	3.600 lm	Herstellerangabe für die beschriebene Ausführung
Betriebsgerät	Steuereingang 1 bis 10 V	zusätzlicher geschalteter Netzanschluss

2 Montage und Steuerung

Der 595-mm-Rand liegt auf den tragenden Rasterprofilen auf. Das kleinere Gehäusemaß ist nicht das Maß der erforderlichen Auflage. Wir haben weder die Profilgeometrie noch die zulässige Belastung Ihrer Bestandsdecke geprüft. Die Angabe „600-mm-Raster“ allein reicht uns deshalb nicht für eine Montagebestätigung. Eine raumbezogene Aussage zur Blendungsbegrenzung setzt die konkrete Anordnung und Blickrichtungen voraus; mit diesem Brief liefern wir keine Berechnung für die 24 Leseplätze.

Die Ausführung 840-S ist nicht unmittelbar über einen vorhandenen Zweidrahttaster dimmbar. Ein Taster und die Steuerschnittstelle des Betriebsgeräts sind unterschiedliche Bauteile. Ob zusätzliche Leitungen gebraucht werden, kann ich aus Ihrem Auszug nicht feststellen. Für die Ausführung 840-B würde eine andere Schnittstelle gelten; diese Variante wurde von Ihnen bislang nicht angefragt.

3 Lieferung

Nach heutiger Werksplanung wären 36 Stück aus einer Fertigungsserie in Kalenderwoche 44 lieferbar, wenn die endgültige Bestellung bis 02.10. eingeht. Diese Angabe ist noch keine Reservierung. Gegenüber unserem allgemeinen Sortimentsblatt vom Juni ist die Lieferzeit neu, nicht das Außenmaß. Wir haben weder eine Gleichwertigkeitsbestätigung zum genannten Lichtkontur-Produkt abgegeben noch eine Bemusterung für den Auftraggeber durchgeführt. Ein vollständiger Deckenumbau ist nicht Teil unserer Lieferauskunft.

Jochen Lau | j.lau@linienlicht.example

18_Zugang_Aufmass.pdf

Aufnahme des Materialwegs vom Hof

Anke Freese | Hausdienst Finkenstieg

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

28.09.2026, 10:20 Uhr | KGF-26-41 / Zugang Z-01

1 Hof und Tür

Nach dem Termin mit Herrn Tamm habe ich mit unserer Kollegin Livia Berg den Weg vom Hoftor zum Lesesaal abgemessen. Die 3,20 m breite Hofzufahrt aus NK-02 ist richtig. Hinter der Zufahrt führt der Weg jedoch durch eine zweiflügelige Außentür. Mit nur dem täglich benutzten Flügel beträgt die freie Breite 0,93 m; bei zusätzlich entriegeltem Standflügel haben wir 1,47 m gemessen. Die freie Höhe liegt bei 2,04 m. Am Boden steht eine 22 mm hohe Schwelle vor. Der Standflügel lässt sich öffnen, muss aber nach der Lieferung wieder verriegelt werden.

Hinter dieser Tür knickt der Flur nach 2,10 m rechtwinklig zum Saal ab. Zwischen Wand und festem Heizkörper bleiben dort 1,26 m. Wir haben mit keinem beladenen Transportwagen eine Fahrprobe gemacht. Aus diesen Maßen kann ich nicht zusagen, dass eine bestimmte vormontierte Arbeitsplattform in den Saal gelangt. Eine ebene Überfahrhilfe für die Schwelle steht beim Hausdienst nicht zur Verfügung.

2 Abstellmöglichkeiten

Der abschließbare Raum neben dem Hof misst $2,00 \times 4,00$ m und entspricht den bereits genannten 8 m². Die Tür schlägt nach innen auf. Die gesamte Grundfläche kann deshalb nicht gleichzeitig mit Kartons belegt werden. Ein wandfestes Regal an der kurzen Rückwand bleibt stehen. Steckdose und Leuchte waren heute benutzbar; eine besondere Lademöglichkeit für Arbeitsmaschinen wurde nicht eingerichtet.

Die Hoffläche direkt vor der Tür dient morgens auch der Rückgabe von Bücherkisten. Am 09.11. ist zwischen 08:15 und 08:45 Uhr eine bereits disponierte Abholung angekündigt. Der Lieferwagen benötigt dort nur die markierte Ladefläche und fährt danach wieder ab. Ich habe dem späteren Bauunternehmen keinen Vorrang zugesagt und keinen anderen Zufahrtsweg versprochen. Der Rettungsweg bleibt frei.

3 Hausbetrieb

Die Betriebszeiten und die beiden Lesungen aus NK-02 bleiben unverändert. Die heutige frühe Abschaltung war eigens für die Bestandsaufnahme vereinbart und ist keine Zusage gleicher Abschaltzeiten im November. Livia Berg hatte bisher angenommen, mobile Arbeitsgeräte ließen sich ohne Zerlegen durch die Hoftür schieben; nach der Aufnahme möchte sie das nicht mehr pauschal bestätigen. Eine Tragfähigkeitsangabe des Saalbodens ist beim Hausdienst nicht vorhanden.

Anke Freese | a.freese@kgf-celle.example
