

08_Bautagebuch.txt

Porta Hallenbau GmbH | Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica

Bautagebuch HW-26, Bauleiter Timo Fricke. Auszug der Tagesblätter 09.03. bis 08.06.2026.

1 März

09.03., 07:00: F17 Süd fehlt; vier Fachkräfte, Norden Aushub. 10.03.: Aushub Nord beendet, Süd offen. 11.03.: drei Fachkräfte, Beginn Fundamente West nach Abruf F17B; Regen ab 13:00, Abdeckung. 12.03.: drei Fachkräfte, sechs Personenstunden Räumen, sonst kein Betonieren; Wasser auf Planum. 13.03.: drei Fachkräfte, Schalung Nord; Abschalttermin entfällt. 16.03.: sechs Fachkräfte; Südtrasse gesperrt, Schalung West. Kran 4,0 Betriebsstunden. 17.03.: Nordbewehrung, Materialumlagerung; Kran 3,5 Stunden. 18.03.: Fundamente West fertig. 19.03.: Bodenplatte Nord begonnen. 20.03.: F17C ab 11:05 freigegeben, Südtrasse weiter gesperrt. 23.03.: sechs Fachkräfte, Bodenplatte Nord, Kran 5,0 Stunden. 24.03.: Bodenplatte Mitte, Kran 4,5 Stunden. 25.03.: Bodenplatte letzter Teil Nord fertig. 26.03.: Wandbeginn Nord. 27.03.: Telefon Freischaltung Süd 09:20; Kolonne an Wänden. 30.03.: südliche Fundamentergänzung ausgeführt, Kran hierfür 2,0 Stunden. 31.03.: südlicher Plattenrand geschlossen, Bodenplatte damit vollständig.

2 April

14.04.: Wände einschließlich Süd geschlossen. 15.04.: Deckenschalung begonnen. 22.04.: Team auf acht Fachkräfte erhöht. 23.04.: acht Fachkräfte, zusätzliche Schicht dokumentiert. 24.04.: acht Fachkräfte. 27.04.: acht Fachkräfte. 28.04.: Deckenbetonage abgeschlossen. 29.04. bis 05.05.: Erhärtung, tägliche Kontrolle durch zwei Personen.

3 Mai und Juni

06.05.: Dachunterkonstruktion begonnen. 13.05.: Dachunterkonstruktion fertig. 15.05.: Abdichtung begonnen. 22.05.: Abdichtung geschlossen. 26.05.: Fassadenanker begonnen. 02.06.: Fassadenanker beendet. 03.06.: Räumen und Mängeldurchgang. 05.06.: Reststellen geschlossen. 08.06.: Übergabe um 10:00 Uhr, Nutzer erhält Schlüssel.

Die Einträge wurden tagesbezogen geführt und hier am 08.06. für den Auftraggeber ausgegeben. Die Wetterwerte stehen gesondert im Messprotokoll. Zusätzliche Schichtstunden werden im Personalexport geführt. Gez. Timo Fricke, Bauleiter. Gegenzeichnung des Auftraggebers für diesen Auszug liegt nicht vor.

05_Planfreigaben.eml

Von	"Dr. Rolf Stein" <planung@tragwerk-hunte.example>
An	Timo Fricke <projekt@porta-hallenbau.example>
Datum	Fri, 20 Mar 2026 11:18:00 +0100
Betreff	HW-26: F17 Revision C freigegeben

Sehr geehrter Herr Fricke,

F17 Revision C ist seit 11:05 Uhr im Projektraum freigegeben. Die Freigabe betrifft die südlichen Stützenfüße. Die mit Revision B am 10.03. um 16:20 Uhr freigegebenen westlichen und nördlichen Fundamente bleiben unverändert. Nach unserem Planversandbuch wurde Revision B von Ihnen am 11.03. um 06:48 Uhr abgerufen.

Die zusätzliche Ankerlage war nach der Kollisionsprüfung mit der Bestandsleitung erforderlich. Wir bestätigen nicht, dass seit 09.03. sämtliche Fundamentarbeiten stillstanden. Bitte setzen Sie die offenen Abschnitte nach den freigegebenen Maßen fort und melden Sie abweichende Bestandslagen vor dem Betonieren. Eine Kostenübernahme erklären wir als Tragwerksplanung nicht. Diese Nachricht bestätigt die Freigabezeiten; der zeichnerische Plan verbleibt im Projektraum. Es wird kein Plan als E-Mail-Anlage übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rolf Stein

Tragwerksplaner

14_Erwidernng_Verband.eml

Von	Ines Reuter <bau@wesertor-logistik.example>
An	Stefan Köster <projekt@porta-hallenbau.example>
Datum	Fri, 12 Jun 2026 14:35:00 +0200
Betreff	HW-26: Forderung BZ01 wird derzeit nicht freigegeben

Sehr geehrter Herr Köster,

wir können Ihre Forderung BZ01 auf Grundlage der bisherigen Unterlagen nicht zur Zahlung freigeben. Sie rechnen Plan- und Leitungstage nebeneinander ab, obwohl sich beide Anzeigen auf denselben Südabschnitt beziehen. Bitte erläutern Sie anhand des Vertragsablaufs, welche konkrete Tätigkeit wann nicht ausgeführt werden konnte und wie sie den Übergabetermin beeinflusst hat.

Die Personalübersicht zeigt vom 09. bis 13.03. eine kleinere Kolonne als vorgesehen. Zudem wurde bei Regen am 12.03. nicht betoniert. Die Gerätestunden im Norden widersprechen einem vollständigen Kranstillstand. Ihre 160 Zusatzstunden stimmen nicht mit den 144 Stunden aus der Lohnbuchhaltung überein. Das bedeutet nicht, dass wir sämtliche Mehrkosten ausschließen; eine Zuordnung fehlt uns jedoch. Bitte senden Sie eine nachvollziehbare Ergänzung bis 19.06.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Reuter

Verbandsleitung

03_Isttermine.csv

Vorgang	Leistung	Istbeginn	Istende	Erfassungsbeleg	Bearbeiter
V01	Einrichtung	2026-03-02	2026-03-02	Tagesabschluss 2026-03-02 / Fricke	Timo Fricke
V02	Aushub	2026-03-03	2026-03-10	Tagesabschluss 2026-03-10 / Fricke	Timo Fricke
V03	Fundamente	2026-03-11	2026-03-30	Tagesabschluss 2026-03-30 / Fricke	Timo Fricke
V04	Bodenplatte	2026-03-19	2026-03-31	Tagesabschluss 2026-03-31 / Fricke	Timo Fricke
V05	Wände	2026-03-26	2026-04-14	Tagesabschluss 2026-04-14 / Fricke	Timo Fricke
V06	Decke	2026-04-15	2026-04-28	Tagesabschluss 2026-04-28 / Fricke	Timo Fricke
V07	Erhärtung	2026-04-29	2026-05-05	Tagesabschluss 2026-05-05 / Fricke	Timo Fricke
V08	Dachunterkonstruktion	2026-05-06	2026-05-13	Tagesabschluss 2026-05-13 / Fricke	Timo Fricke
V09	Abdichtung	2026-05-15	2026-05-22	Tagesabschluss 2026-05-22 / Fricke	Timo Fricke
V10	Fassadenanker	2026-05-26	2026-06-02	Tagesabschluss 2026-06-02 / Fricke	Timo Fricke
V11	Räumen und Kontrolle	2026-06-03	2026-06-05	Tagesabschluss 2026-06-05 / Fricke	Timo Fricke
V12	Übergabe	2026-06-08	2026-06-08	Tagesabschluss 2026-06-08 / Fricke	Timo Fricke

09_Wettermessungen.csv

Datum	Temperatur_07U hr_C	Niederschlag_m m_24h	Windmaximum_k mh	Beobachtung	Messort
2026-03-09	4	0	18	trocken	Container Nord
2026-03-10	5	2	21	feucht	Container Nord
2026-03-11	3	18	32	Regen ab 13 Uhr	Container Nord
2026-03-12	2	26	39	Wasser auf Planum	Container Nord
2026-03-13	4	12	28	Schalung nass	Container Nord
2026-03-16	5	1	17	kein Wasserstau Nord	Container Nord
2026-03-20	6	0	20	trocken	Container Nord
2026-03-23	7	0	16	trocken	Container Nord
2026-03-27	8	2	19	leichter Regen	Container Nord
2026-03-30	9	0	14	trocken	Container Nord


10_Personalstunden.csv

Datum	Soll_Fachkraefte	Ist_Fachkraefte	Regelstunden_g esamt	Zusatzstunden_g esamt	Disposition
2026-03-09	6	4	32	0	zwei Personen auf Auftrag PW-18
2026-03-10	6	4	32	0	PW-18 nicht beendet
2026-03-11	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-12	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-13	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-16	6	6	48	0	Stammkolonne vollständig
2026-04-22	6	8	64	24	Beschleunigung
2026-04-23	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-24	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-27	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-28	6	8	64	24	Beschleunigung

16_Baufeldskizze.png

Gerätehalle Wesertor | Baufeld 16.03.2026

Lageskizze der Tragwerksplanung, ohne Maßstab

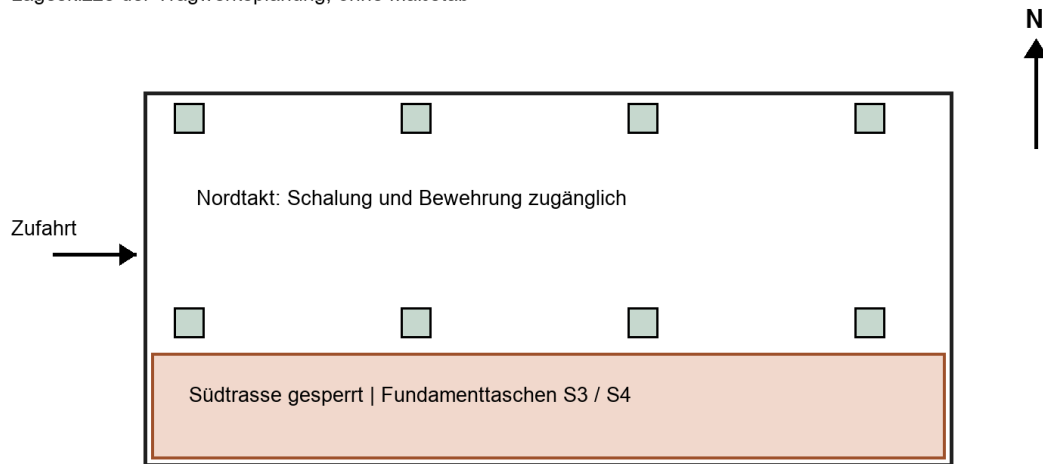

Freigabe Nord/West: F17B vom 10.03.2026

F17C Süd am Zeichnungsdatum noch nicht freigegeben.

Gez. Dr. Rolf Stein | Tragwerk Hunte | HW-26 / Skizze S06

Bilddatei: 16_Baufeldskizze.png

02_Vertragsablauf.xlsx

Vertragsablauf Gerätehalle

Porta Hallenbau / Stefan Köster | 2026-02-13

Vorgang	Leistung	Beginn	Ende	Kalendertage	Vorgänger
V01	Einrichtung	02.03.2026	02.03.2026	1.00	
V02	Aushub	03.03.2026	06.03.2026	4.00	V01
V03	Fundamente	09.03.2026	13.03.2026	5.00	V02
V04	Bodenplatte	16.03.2026	20.03.2026	5.00	V03
V05	Wände	23.03.2026	31.03.2026	9.00	V04
V06	Decke	01.04.2026	10.04.2026	10.00	V05
V07	Erhärtung	11.04.2026	17.04.2026	7.00	V06
V08	Dachunterkonstruktion	20.04.2026	24.04.2026	5.00	V07
V09	Abdichtung	27.04.2026	30.04.2026	4.00	V08
V10	Fassadenanker	04.05.2026	08.05.2026	5.00	V09
V11	Räumen und Kontrolle	11.05.2026	13.05.2026	3.00	V10
V12	Übergabe	15.05.2026	15.05.2026	1.00	V11

Datumsbänder zeigen Kalenderbelegung einschließlich Wochenenden und Erhärtung.

Montage an Arbeitstagen; Feiertage 03.04., 06.04., 01.05. und 14.05. sind arbeitsfrei.

V03/V04 abschnittsweise Nord vor Süd. Kolonne Rohbau: sechs Fachkräfte.

gez. Stefan Köster und Ines Reuter; abgestimmt am 13.02.2026.

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

13_Forderungsberechnung.xlsx

Berechnung BZ01 des Auftragnehmers

Porta Hallenbau / Stefan Köster | 2026-06-10

Kostenart	Bezug	Einheit	Anzahl	Satz netto EUR	Betrag netto EUR
Mobilkran	B01 und B02	Tag	20.00	420.00	8,400.00
Container	B01 und B02	Tag	20.00	90.00	1,800.00
Bauleitung und Polier	B01 und B02	Tag	20.00	560.00	11,200.00
Zaun und Einrichtung	B01 und B02	Tag	20.00	45.00	900.00
Zusatzschichten	April	h	160.00	60.00	9,600.00
Tageskosten					22,300.00
Geschäftskosten	8.0%				1,784.00
Forderung netto					33,684.00
Umsatzsteuer	19.0%				6,399.96
Forderung brutto					40,083.96

Ansätze der Forderung, keine Anerkennung durch die Auftraggeberin.

Tage: zehn wegen Planung zuzüglich zehn wegen Leitung laut Schreiben vom 10.06.

gez. Stefan Köster; Stundenansatz April gemäß erster Bauleitermeldung.

01_Bauvertrag_Termine.docx

Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

09.02.2026 | Zeichen: HW-26 / Los Rohbau

Bauvertrag Gerätehalle Wesertor

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Bauleistung

Porta Hallenbau übernimmt den Rohbau und die Dachunterkonstruktion der Gerätehalle am Standort Wesertor zum Einheitspreisvolumen von 684.000 EUR netto. Leistungsbeginn ist der 02.03.2026, die Übergabe der geschlossenen Rohbauhülle ist für 15.05.2026 vereinbart. Der Ablaufplan vom 13.02. wird nach gemeinsamer Abstimmung als Vertragsanlage geführt. Arbeitswoche ist Montag bis Freitag; Sonn- und Feiertagsarbeiten sind nicht vorausgesetzt.

2 Mitwirkungen

Die freigegebene Fundamentplanung soll bis 06.03. und die Leitungsfreigabe für die Südtrasse bis 13.03. vorliegen. Die Freigabe von Nordtrasse und westlichen Fundamenten ist davon getrennt möglich. Der Auftragnehmer organisiert seine Kolonnen und zeigt konkret behinderte Leistungen mit Beginn, Ort und möglicher Ausweicarbeit an. Im Vertrag wird VOB/B vereinbart; ein pauschaler Tagesentschädigungssatz wurde nicht festgelegt.

3 Dokumentation

Baubesprechungen finden montags statt. Tagesberichte nennen Personal, Geräte und tatsächlich bearbeitete Achsen. Geänderte Termine werden nicht allein durch Eintrag im Bericht Vertragsfristen. Die Bauherrin erteilt technische Freigaben über die Projektleitung; eine Anerkennung zusätzlicher Vergütung bedarf der gesonderten Erklärung der Verbandsleitung.

gez. Ines Reuter, Verbandsleitung
gez. Stefan Köster, Geschäftsführer

04_Behinderungsanzeige_Plan.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

09.03.2026 | Zeichen: HW-26 / Anzeige B01

Behinderungsanzeige Fundamentplanung

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Fehlende Freigabe

Heute um 07:00 Uhr lag die für 06.03. angekündigte Fundamentplanung noch nicht vollständig vor. Das Detail F-17 der südlichen Stützenfüße ist offen. Ohne Bewehrungsführung und Ankermaße können wir dort die Fundamentbewehrung nicht verlegen. Die Aushubarbeiten im Norden werden zunächst fortgesetzt.

2 Betroffene Ressourcen

Für diese Woche waren sechs Fachkräfte und der Mobilkran vorgesehen. Tatsächlich sind heute vier Fachkräfte anwesend. Wir ordnen drei Personen dem nördlichen Aushub und eine Person der Materialvorbereitung zu. Das südliche Fundamentband war im Vertragsablauf ab heute vorgesehen. Eine belastbare Dauer der Beeinträchtigung können wir ohne Freigabetermin noch nicht nennen.

3 Aufforderung

Bitte teilen Sie bis morgen 12:00 Uhr mit, wann F-17 freigegeben wird und ob ein abschnittsweises Vorgehen zugelassen ist. Wir behalten uns Kosten- und Terminfolgen vor. Diese Anzeige nennt den gegenwärtigen Zustand; eine konkrete Verlängerungsberechnung wird damit noch nicht vorgelegt. Den Umfang möglicher Ausweicarbeiten halten wir in den Tagesberichten fest.

gez. Timo Fricke, Bauleiter

06_Behinderungsanzeige_Leitung.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

16.03.2026 | Zeichen: HW-26 / Anzeige B02

Behinderungsanzeige Südtrasse

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Leitungsbereich

Die vom Netzbetreiber angekündigte Freischaltung der Leitung im südlichen Arbeitsstreifen ist heute um 07:30 Uhr nicht erfolgt. Der Leitungsbereich ist durch eine rot markierte Absperrung gesichert. Unsere Kolonne darf in diesem Streifen weder ausheben noch Anker setzen. Betroffen sind die südöstlichen Fundamenttaschen S3 und S4 sowie der anschließende Plattenrand.

2 Arbeitsablauf

Für dieselben südlichen Stützenfüße steht außerdem F17 Revision C noch aus. Im Norden wird die Schalung geschlossen; hier kann weitergearbeitet werden. Wir haben den Kran für diese Umsetzungen genutzt. Die Bodenplatte kann in der geplanten zusammenhängenden Taktfolge nicht hergestellt werden. Welcher Zeitanteil auf die fehlende Zeichnung und welcher auf die Leitung entfällt, wurde vor Ort nicht festgelegt.

3 Erforderliche Mitteilung

Bitte nennen Sie einen verbindlichen Freischalttermin. Wir melden den Wegfall der Behinderung, sobald Netzbetreiber und Projektleitung die Arbeitsfläche freigeben. Eine veränderte Ausführung der Fundamente in Leitungsnähe erfolgt nicht ohne technische Freigabe. Wir verlangen Ersatz der hieraus entstehenden zusätzlichen Kosten und behalten die Bezifferung vor.

gez. Timo Fricke, Bauleiter

12_Bauzeitforderung.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

10.06.2026 | Zeichen: HW-26 / Forderung BZ01

Forderung wegen verlängerter Bauzeit

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Unsere Zeitberechnung

Wir fordern wegen der verspäteten Fundamentplanung und der verspäteten Leitungsfreigabe zusätzliche Vergütung. Für den fehlenden Plan setzen wir die zehn Arbeitstage vom 09. bis 20.03. an. Für die gesperrte Südtrasse setzen wir weitere zehn Arbeitstage vom 16. bis 27.03. an. Wir gelangen damit zu zwanzig vergütungspflichtigen Tagen. Die Übergabe erfolgte tatsächlich erst am 08.06. statt am 15.05.2026.

2 Kostenforderung

Unsere beigefügte Berechnung ergibt 33.684,00 EUR netto, zuzüglich 6.399,96 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 40.083,96 EUR. Darin enthalten sind verlängerte Tageskosten, zusätzliche Personalstunden und acht Prozent allgemeine Geschäftskosten auf die Tageskosten. Wir verlangen Zahlung binnen 21 Tagen. Die April-Schichten betrachten wir als notwendige Beschleunigung zur Begrenzung weiteren Verzugs.

3 Begründung unserer Forderung

Wir halten die Bauherrin für die fehlende Planung und die nicht freigegebene Leitung verantwortlich. Unsere Anzeigen vom 09. und 16.03. liegen vor. Aus unserer Sicht gehen die späteren Verschiebungen auf diese Ereignisse zurück. Dass im Norden gearbeitet wurde, beseitigt nach unserer Auffassung die Belastung durch vorgehaltene Ressourcen nicht. Eine rechtliche Anerkennung der Forderung durch den Verband behaupten wir nicht; über Grundlage und Umfang besteht noch keine Einigung.

gez. Stefan Köster, Geschäftsführer

15_Besprechung_Beschleunigung.docx

Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

20.04.2026 | Zeichen: HW-26 / Besprechung 12

Besprechung zu den Deckenschichten

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Stand

Die Besprechung fand um 09:00 Uhr am Container statt. Die Deckenarbeiten hatten am 15.04. begonnen. Herr Fricke erklärte, dass mit der bisherigen Besetzung eine Fertigstellung der Decke vor Ende April unsicher sei. Frau Reuter bat um Vorschläge zur Begrenzung der weiteren Verschiebung, ohne einen neuen Übergabetermin verbindlich zu vereinbaren.

2 Zusätzliche Schichten

Herr Fricke schlug zwei zusätzliche Fachkräfte und verlängerte Schichten vom 22. bis 28.04. vor. Er rechnete zunächst mit 160 zusätzlichen Personenstunden. Frau Reuter erklärte, sie werde die Auswirkungen mit der Verbandsleitung besprechen. Eine Vergütungszusage gab sie nicht ab. Herr Fricke sagte, die Firma werde die Einteilung wegen der Betonbestellung bereits am selben Tag veranlassen.

3 Nachweise

Die tatsächlich geleisteten Zusatzstunden sollen aus der Zeiterfassung kommen. Der Auftragnehmer wird angeben, welche Regelstunden ohnehin zur Vertragserfüllung angefallen wären. Ein gesonderter Beschleunigungspreis wurde in der Besprechung nicht verhandelt. Die Ursache einzelner Verschiebungen blieb zwischen den Beteiligten streitig.

gez. Ines Reuter, Protokoll
Zur Kenntnis: Timo Fricke

07_Netzbetreiber_Freigabe.pdf

Wesertrasse Netzdienste GmbH
Leitungsring 11, 32423 Minden
betrieb@wesertrasse.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

27.03.2026 | Zeichen: WT-2617 / Südtrasse Gerätehalle

Freigabe des südlichen Arbeitsstreifens

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Umschaltung

Die Leitung im südlichen Baufeld wurde am 26.03.2026 um 15:40 Uhr außer Betrieb genommen. Die Endkontrolle erfolgte am 27.03. zwischen 08:00 und 09:00 Uhr. Ab 27.03., 09:15 Uhr, kann der markierte Arbeitsstreifen nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung wieder bearbeitet werden. Die seit 16.03. geltende Zutrittsbeschränkung wird aufgehoben.

2 Verzögerungsgrund

Der ursprünglich für 13.03. geplante Termin konnte nicht gehalten werden, weil ein zugesagter Abschaltpunkt im Nachbarbetrieb nicht verfügbar war. Die technische Klärung wurde am 24.03. abgeschlossen. Die Absperrung betraf ausschließlich die Südtrasse, nicht die nördliche Zufahrt oder das westliche Fundamentband.

3 Übergabe

Herr Fricke wurde telefonisch um 09:20 Uhr informiert. Er erklärte, die Geräte würden zunächst für die laufenden Wandarbeiten benötigt; der südliche Bereich solle am folgenden Arbeitstag wieder besetzt werden. Mit diesem Schreiben wird keine Bewertung der Bauzeitforderung oder der vertraglichen Verantwortlichkeit vorgenommen.

gez. Janne Ahlers, Betriebsverantwortliche

11_Geraete_und_Gemeinkosten.pdf

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Geschäftsführung Porta Hallenbau

05.05.2026 | Zeichen: HW-26 / Kostenblatt K05

Kostenbelege Gerätehalle März bis April

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Geräte

Für den Mobilkran liegt Mietrechnung KM-260331 über 22 berechnete Arbeitstage im März zu 420,00 EUR netto vor. Wochenenden sind nicht berechnet. Die Rechnungssumme beträgt 9.240,00 EUR netto. Die Rechnung unterscheidet nicht zwischen produktivem Einsatz und Stillstand. Nach den Gerätestundenkarten gab es am 16., 17., 23. und 24.03. produktive Hubarbeiten.

2 Tagesansätze

Die Containerkosten werden aus dem Projektmietvertrag mit 90,00 EUR netto pro berechnetem Arbeitstag angesetzt. Baustelleneinrichtung und Zaun sind mit 45,00 EUR je Arbeitstag intern verteilt. Für Bauleitung und Polier setzt die Kostenstelle gemeinsam 560,00 EUR je Tag an. Diese Personen betreuten während der fraglichen Wochen auch die fortgesetzten Arbeiten im Norden; getrennte Stunden nach Störungsursache sind nicht erfasst.

3 Zusatzschichten

Die Lohnbuchhaltung weist für 22. bis 28.04. insgesamt 144 zusätzliche Personenstunden aus. Der interne Vollkostensatz beträgt 60,00 EUR je Stunde einschließlich Zuschlägen. Herr Fricke hatte zunächst 160 Stunden angekündigt. Eine Rechnung eines externen Beschleunigungsunternehmens besteht nicht. Die Geschäftsführung möchte außerdem acht Prozent allgemeine Geschäftskosten auf die verlangten verlängerten Tageskosten ansetzen; eine projektbezogene Mehrkostenaufstellung hierzu liegt nicht vor.

gez. Jana Brüggemann, kaufmännische Projektbetreuung
