

03_Randnotizen_Lenz.txt

Heike Lenz | Kieselgarten | Notizbuch Seite 38

22.09.2026, 09:05 bis 10:35 Uhr. Übertragen um 15:55 Uhr.

09:05 Maren hat Schlüssel. Niemand von Quellwerk da. Im Kalender steht noch Riemann, bitte Firmenkarte ansehen, jetzt Voß.

09:14 Riss links T03. Ich meine, Freitag war nichts zu sehen. Am Freitag war ich aber nur an der Tür, nicht bei gutem Seitenlicht. Maren hält Karte hin. Nicht selbst gemessen.

09:22 F07 unten offen, ungefähr eine Handbreit. Mein Handy blieb im Büro. Maren zeichnet die Stelle später. Ich habe keine Fotos aufgenommen.

09:25 Falk kommt. Er sagt, Band sei von Fenstertreu. Ich erinnere mich an Milan mit Spachtel am Freitag. Nicht sicher, ob genau diese Ecke.

09:30 Wasser aus 2-Liter-Becher am Ablauf. Um 09:38 noch Pfütze links neben Rost. Nicht nachgegossen. Danach mit Lappen aufgenommen.

09:41 WT2: Wasser an Hand beim Ventil. Lappen lag schon im Schrank; war eventuell noch feucht. Eimer hingestellt, Schild geschrieben. Kein Tropfen gezählt.

09:50 Bödeker im Flur. L14 geht nicht zweimal, dann doch. Auf Containerzettel steht L12. Maren liest das Schild L14 ab.

10:10 Etiketten fehlen noch, zwei Stück. D09 sieht ordentlich aus. Bericht Datenleitung immer noch nicht bei mir angekommen.

10:30 Möbel am 30.09. morgens. Falk sagt Freitag denkbar; keine feste Zusage, keine Frist von mir.

29.09. bleibt Besichtigungstermin mit Firmen, Ausgang offen.

Nachtrag 22.09., 15:50 Uhr: Frau Voß hat gemailt, muss ihren Termin noch bestätigen. Ich kann am 24.09. erst ab 08:30 Uhr vor Ort sein. Frau Döring hat keine Vollmacht für meine Abnahmeerklärung. Elektroblatt vom 10.09. in Ordner EL-01 gefunden.

12_Zugangskalender.txt

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz

Zugangskalender, Stand 23.09.2026, 08:45 Uhr | KG-26/ZK-06

24.09.2026: Schlüsselübergabe frühestens 08:30 Uhr durch Lenz. Quellwerk hat 08:00 bis 09:00 vorgeschlagen; Überschneidung noch abzusprechen. Elektro Faden schlägt 13:00 Uhr vor. Kein durchgehend offenes Haus.

25.09.2026: Leineputz möchte eventuell am Fensteranschluss arbeiten. Gemeinsamer Termin mit Fenstertreu bisher nicht bestätigt. Fertigstellung Ausbau laut AU-04 vorgesehen; kein neuer Termin vereinbart.

28.09.2026: Reinigung von 10:00 bis 14:00 Uhr, Schlüssel bei Lenz. Waschraum 0.06 nur nach Rücksprache betreten. WT2 bleibt bis zur fachlichen Prüfung abgesperrt.

29.09.2026: Firmenbesichtigung um 09:00 Uhr, Einladungen vom 18.09. Frau Lenz entscheidet über etwaige Abnahmeerklärungen. Ausbau, Sanitär und Bauelemente getrennt dokumentieren. Elektrotermin ist nicht neu angesetzt; bestehendes Blatt bleibt in EL-01.

30.09.2026: Möbelanlieferung von 08:00 bis 11:00 Uhr über Seiteneingang. Bodenflächen nicht mit Werkzeug zustellen. Das ist eine Lieferung, keine Eröffnung des Hauses.

03.10.2026: Ursprünglich angefragter Vereinsnachmittag wurde am 21.09. abgesagt. Es gibt keine freigegebene öffentliche Nutzung.

Dieser Kalender hält Zugangsmöglichkeiten fest. Er enthält keine an Firmen gerichteten Beseitigungsfristen. Änderungen bestätigt Heike Lenz über heike.lenz@kieselgarten.example.

01_Lenz_an_Doering.eml

Von	Heike Lenz <heike.lenz@kieselgarten.example>
An	Maren Döring <m.doering@doering-stettner.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 16:20:00 +0200
Betreff	Kieselgarten: Unterlagen vom Rundgang

Sehr geehrte Frau Döring,

anbei gehen meine Randnotizen und die aktuelle Gewerkkarte in die gemeinsame Ablage. Könnten Sie aus Ihrem Sprachmemo, den Notizen und Ihren beiden Bildskizzen ein ordentliches Begehungsprotokoll machen? Ich benötige die einzelnen Beobachtungen je Gewerk und Firma, damit ich die Termine nicht durcheinanderbringe. Bitte belassen Sie unklare Ursachen als unklar. Besonders beim Fenster haben zwei Firmen gearbeitet.

Mir ist wichtig, dass Elektro bereits am 10.09. abgenommen wurde, während Ausbau, Bauelemente und Sanitär noch vor ihrer vorgesehenen Abnahme stehen. Die passende rechtliche Grundlage und etwaige Fristen möchte ich mit Ihnen prüfen, bevor etwas an die Firmen versandt wird. Bitte nehmen Sie den von Herrn Falk genannten Freitag nicht als von uns gesetzte Frist auf.

Das Möbelunternehmen kommt am 30.09. um 08:00 Uhr. Ich habe heute nur den nassen Platz unter WT2 gesperrt und keine andere Nutzung freigegeben. Für die Bildeinträge liegen uns Ihre Skizzen vor, keine Baustellenfotografien. Die Beschriftungen sollen das auch im Protokoll deutlich sagen.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Lenz

Vorstand Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

Anlagen:

03_Randnotizen_Lenz.txt

05_Gewerkekarte.pdf

08_Quellwerk_Rueckmeldung.eml

Von	Alina Voß <a.voss@quellwerk.example>
An	Maren Döring <m.doering@doering-stettner.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 14:18:00 +0200
Betreff	WT2 und Bodenablauf im Kieselgarten

Sehr geehrte Frau Döring,

ich bestätige unser Telefonat um 10:42 Uhr. Am Waschtisch WT2 haben wir am 16.09. das Eckventil ersetzt. Unser Monteur hat die Verbindung anschließend bei geöffneter Armatur angesehen; ein förmliches Dichtheitsprotokoll für diese einzelne Verbindung wurde nicht erstellt. Ich kann aus der Ferne nicht entscheiden, woher das von Ihnen geschilderte Wasser stammt. Lassen Sie den Platz bitte bis zu unserer Prüfung unbenutzt.

Ich kann am 24.09. zwischen 08:00 und 09:00 Uhr kommen. Den Termin habe ich mit Frau Lenz noch nicht bestätigt. Wir prüfen Ventil, Anschluss und Siphon. Beim Bodenablauf wollen wir gleichzeitig die Einbaulage des Rostrahmens ansehen. Den Fliesenanschluss hat nicht unsere Firma hergestellt. Daraus leite ich aber noch keine Ursache für das stehende Wasser ab; dafür fehlen mir Höhenmessungen.

In unserer Ablage steht bislang nur ein Inbetriebnahmetermin, keine Abnahme. Bitte schicken Sie mir das genaue Raumkürzel und Ihre Beobachtung mit Zeitpunkt. Ersatzteile für das Ventil bringen wir mit. Eine Zusage zu einer vollständigen Beseitigung noch am selben Tag kann ich ohne Befund nicht machen.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Voß

Quellwerk Sanitär GmbH

14_Elektro_Termin.eml

Von	Nils Bödeker <n.boedeker@elektro-faden.example>
An	Heike Lenz <heike.lenz@kieselgarten.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 08:15:00 +0200
Betreff	Flurleuchte L14 und Beschriftungen

Sehr geehrte Frau Lenz,

nach dem gestrigen Rundgang habe ich unseren Prüfbericht vom 09.09. nochmals gelesen. Darin ist L14 im Flur verzeichnet; der Zettel mit L12 war eine handschriftliche Vormerkung aus der Montagephase. Für die jetzige Meldung verwenden wir L14. Ob das Schaltverhalten vom Melder, Anschluss oder Leuchtenbauteil kommt, müssen wir am Gerät prüfen. Ich werde das nicht vorab als bloßen Bedienfehler abtun.

Wir schlagen Donnerstag, 24.09., 13:00 Uhr vor. Dabei bringe ich die noch fehlenden Stromkreiskennzeichnungen für S07 und S08 mit. Die Abdeckung D09 haben wir am 17.09. befestigt. Den Datenmessbericht habe ich im Büro angefordert; der Bericht liegt dieser E-Mail noch nicht bei. Bitte tragen Sie ihn daher nicht als übergeben ein.

Die Arbeiten im Waschraum sind nicht Teil unseres Auftrags. Falls dort Wasser in die Nähe einer elektrischen Anschlussstelle gelangt, geben Sie uns bitte sofort Bescheid und lassen Sie den Bereich nicht benutzen. Eine solche Beobachtung wurde mir gestern nicht geschildert.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Bödeker

Elektro Faden GmbH

09_Ablesungen.csv

Befund_ID: B01**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:14:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** T03 links oben**Größe:** Rissbreite**Wert:** 0,4**Einheit:** mm**Methode:** Risskarte**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** größte von drei Ablesungen; keine Öffnung

Befund_ID: B01**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:16:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** T03 links oben**Größe:** Risslänge**Wert:** 62**Einheit:** cm**Methode:** Zollstock**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** ungefähr

Befund_ID: B02**Zeitpunkt:** 2026-09-22T09:22:00+02:00**Raum:** 0.03**Bauteil:** F07 unten**Größe:** sichtbarer offener Anschluss**Wert:** 18**Einheit:** cm**Methode:** Zollstock**Ableserin:** Maren Döring**Grenze:** keine verdeckte Prüfung

Befund_ID: B03

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:28:00+02:00

Raum: 0.05

Bauteil: T05 Bandseite

Größe: Luft zum Boden

Wert: 3

Einheit: mm

Methode: Zollstock

Ableserin: Maren Döring

Grenze: Schätzung

Befund_ID: B04

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:30:00+02:00

Raum: 0.06

Bauteil: Ablauf

Größe: ausgegossenes Wasser

Wert: 2

Einheit: l

Methode: Messbecher

Ableserin: Heike Lenz

Grenze: einmalig

Befund_ID: B04

Zeitpunkt: 2026-09-22T09:38:00+02:00

Raum: 0.06

Bauteil: neben Ablauf

Größe: Wassertiefe

Wert: 4

Einheit: mm

Methode: Zollstock

Ableserin: Maren Döring


Grenze: maximal ungefähr; kein Nivellement

10_Skizze_F07.png

SK-01 | Ostfenster F07 | Raum 0.03

22.09.2026, 11:35 Uhr | Maren Döring

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

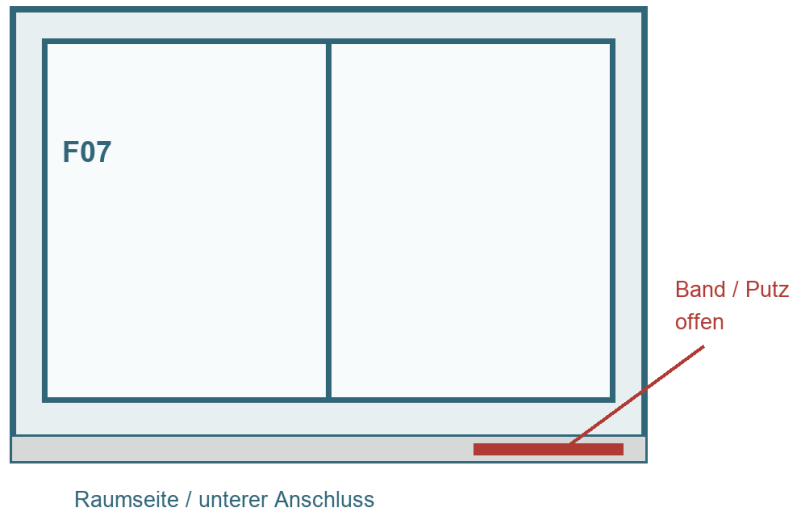

Offener Anschluss unten rechts: etwa 18 cm

Befund B02 aus dem Rundgang 09:22 Uhr. Band und Putz nicht geöffnet.


Bilddatei: 10_Skizze_F07.png

11_Skizze_Waschraum.png

SK-02 | Bodenablauf | Waschraum 0.06

22.09.2026, 11:50 Uhr | Maren Döring

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

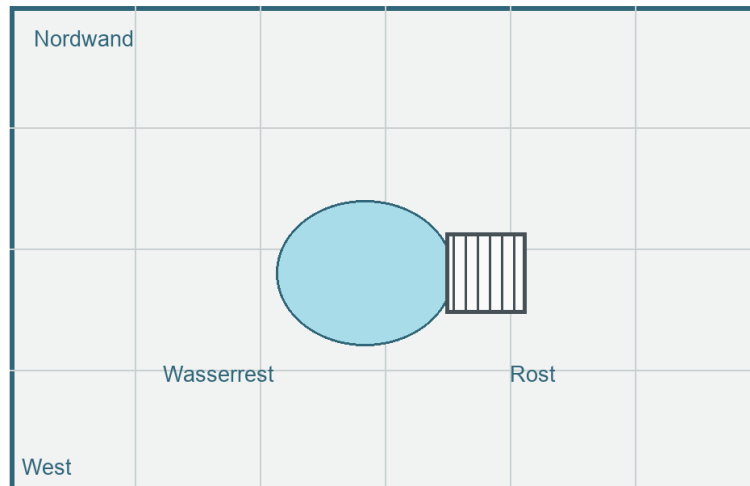

Wasserrest westlich des Rosts, etwa 4 mm tief

Befund B04 um 09:38 Uhr. Kein Nivellement; Flächenform nur schematisch.

Bilddatei: 11_Skizze_Waschraum.png

02_Begehungsmemo.docx

Begehungsmemo Kieselgarten

Maren Döring | Bauüberwachung Döring und Stettner

An: Projektablage KG 26 | Heike Lenz

22.09.2026, 12:10 Uhr | KG-26 / BM-09 / Fassung 1

1 Rundgang am 22 September

Ich war von 09:05 bis 10:35 Uhr im Nachbarschaftshaus Kieselgarten, Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck. Heike Lenz vom Verein war durchgehend dabei. Jonas Falk von Leineputz kam um 09:25 Uhr hinzu und ging um 10:05 Uhr. Nils Bödeker von Elektro Faden war von 09:50 bis 10:20 Uhr anwesend. Weder Glaserei Fenstertreu noch Sanitärbetrieb Quellwerk waren vertreten. Das Haus war für Besucher geschlossen; im Erdgeschoss arbeiteten zwei Maler.

Wir begannen im Mehrzweckraum 0.03. Links neben Tür T03 verläuft ein schräger Riss von der oberen linken Zargenecke in Richtung Fenster. Ich habe drei Stellen mit der Risskarte verglichen. Die größte abgelesene Breite lag bei etwa 0,4 mm, nicht bei 4 mm, wie es mein erster Zuruf gewesen sein könnte. Die Linie war rund 62 cm lang. Ob nur der Anstrich oder auch der Putz betroffen ist, haben wir nicht geöffnet. Herr Falk vermutet Bewegung im Anschluss; Frau Lenz sagte, die Linie sei am Freitag noch nicht aufgefallen.

2 Fenster und Tür im Erdgeschoss

Am Ostfenster F07 in Raum 0.03 ist das untere innere Anschlussband auf ungefähr 18 cm nicht mit dem Putz verbunden. Der sichtbare Spalt liegt zwischen Band und Laibung, nicht zwischen Flügel und Rahmen. Bei geschlossenem Fenster habe ich mit dem Handrücken einen Luftzug zu spüren geglaubt; eine Messung fand nicht statt. Ich habe hierfür die Skizze SK-01 angefertigt. Die Zuständigkeit am Anschluss haben Falk und Lenz unterschiedlich beschrieben. Die Glaserei hat laut Lenz das Band eingebaut, Leineputz den Anschluss überspachtelt.

Tür T05 zum Abstellraum streifte bei vier von fünf Öffnungen am Boden. Der Boden war trocken und frei von Verpackung. Auf der Bandseite beträgt der sichtbare Luftspalt unten ungefähr 3 mm, gegenüber weniger als 1 mm. Ich habe weder an Bändern noch am Türschließer gedreht. Die Tür ist kein ausgewiesener Rettungswegausgang. Der Planstand in meiner Mappe war KG-A-12/03 vom 08.09.2026.

Aufgezeichnet von Maren Döring am 22.09.2026 nach dem Rundgang. Die Reihenfolge folgt meinem Weg, nicht den Firmenverträgen.

3 Waschraum und Beleuchtung

Im Waschraum 0.06 blieb am Bodenablauf eine kleine Wasserfläche stehen. Frau Lenz hatte um 09:30 Uhr etwa zwei Liter Leitungswasser aus einem Messbecher ausgegossen. Um 09:38 Uhr stand neben dem Rost noch Wasser, maximal etwa 4 mm tief nach unserem Zollstock. Wir haben kein Raster nivelliert. Die Fuge an der Nordwand war trocken. Die Fläche wurde danach aufgenommen, damit niemand ausrutscht. Meine Skizze SK-02 zeigt die Lage, aber keine vermessenen Höhenlinien.

Am Waschtisch WT2 tropfte es nach dem Öffnen der Armatur unterhalb des Eckventils. Wir stellten die Armatur nach etwa 20 Sekunden wieder ab und stellten einen Eimer darunter. Es blieb offen, ob Wasser vom Anschluss oder aus dem vorher nassen Lappen kam. Frau Lenz sperrte den Platz mit einem Zettel; der Waschraum wird noch nicht öffentlich genutzt. Quellwerk wurde um 10:42 Uhr telefonisch erreicht. Die E-Mail von Frau Voß soll folgen.

Im Flur 0.01 zündete Leuchte L14 bei Betätigung des Schalters zweimal nicht; beim dritten Versuch leuchtete sie. Die benachbarte L13 funktionierte jedes Mal. Herr Bödeker öffnete nichts und sagte, er wolle zuerst den Bewegungsmelder prüfen. Auf dem alten Zettel im Container steht L12. Ich habe den Aufkleber an der betroffenen Leuchte heute selbst als L14 gelesen. Im Technikraum war keine Störung angezeigt. Über die Ursache kann ich nichts sagen.

4 Letzte Beobachtungen und Unterlagen

Im Flur fehlen bei zwei Steckdosen die Beschriftungen, die im Abnahmeblatt Elektro unter Punkt 3 genannt sind. Herr Bödeker zeigte einen Ausdruck mit zwei nachgelieferten Etiketten, brachte sie während des Rundgangs aber nicht an. Die im selben Blatt genannte Abdeckung an Dose D09 sitzt inzwischen fest. Wir haben die Dose nicht geöffnet. Der Netzwerkmesbericht lag heute nicht vor.

Frau Lenz nannte den 30.09.2026 als geplanten Möbelliefertermin. Sie bat ausdrücklich darum, Reparaturen am Waschraum nicht auf den Vormittag dieser Lieferung zu legen. Eine Frist habe ich keiner Firma gesetzt. Herr Falk bot mündlich einen Besuch am 25.09. an, wollte aber zuvor wissen, ob die Glaserei kommt. Für die Ausbaugewerke ist am 29.09. ein Termin vorgesehen; ob dabei eine Abnahme erfolgen kann, soll Frau Lenz nach Rücksprache entscheiden.

Maren Döring | Abschluss der Niederschrift um 12:10 Uhr

04_Vertrag_Ausbau.docx

Vereinbarung über die Ausbauarbeiten

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz, Vorstand

An: Leineputz Ausbau GmbH | Jonas Falk

06.07.2026 | KG-26 / AU-04 / beiderseits bestätigte Vertragsausfertigung

1 Vertragsgegenstand

Der Verein Nachbarschaft Kieselgarten e. V., Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck, beauftragt die Leineputz Ausbau GmbH, Flechtgasse 8, 37574 Einbeck, mit den Putz-, Maler- und Bodenfliesenarbeiten im Erdgeschoss des Nachbarschaftshauses. Vertragsunterlagen sind diese Vereinbarung, das Angebot LP-26061 vom 30.06.2026, die Raumausbauliste KG-R-04 vom 27.06.2026 und die VOB/B in der Ausgabe 2016. Die Unterlagen wurden beiden Parteien vor Unterzeichnung vollständig übergeben. Bei inhaltlichen Widersprüchen werden die Parteien die betroffene Leistung vor ihrer Ausführung gemeinsam klären.

Der Auftrag umfasst 286 m² Wandoberflächen, 114 m² Deckenanstrich und 18 m² Bodenfliesen im Waschraum 0.06. Zum Fensteranschluss gehören das Einbetten des bauseits montierten Anschlussbands und das Überarbeiten der Laibungen. Lieferung und Befestigung des Bands sowie das Einstellen von Fenstern und Türen gehören nicht zum Auftrag. Die Zuordnung beschreibt die vereinbarte Leistung; die Parteien treffen damit keine Feststellung über Ursachen späterer Schäden.

2 Vergütung und Ablauf

Die Angebotssumme beträgt 31.800,00 EUR netto zuzüglich 6.042,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 37.842,00 EUR brutto. Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Mengen zu den vereinbarten Einheitspreisen. Die Arbeiten beginnen am 13.07.2026. Die Fertigstellung ist für den 25.09.2026 vereinbart. Die Überprüfung am 22.09. ist ein Baustellenrundgang vor dem vorgesehenen Abnahmetermin am 29.09.2026. Durch den Rundgang wird keine förmliche Abnahme erklärt.

Die Parteien vereinbaren eine förmliche Abnahme. Eine Abnahmeerklärung des Vereins darf Heike Lenz abgeben. Bauüberwacherin Maren Döring darf Beobachtungen aufnehmen und technische Rückfragen stellen; sie erhält durch diesen Vertrag keine Vollmacht zur Abnahme, zum Anerkennen von Nachträgen oder zum Verzicht auf Rechte. Die Nutzung einzelner Räume zur Zwischenlagerung der Vereinsmöbel wird gesondert abgestimmt.

3 Ansprechpartner und Zugang

Jonas Falk koordiniert die Ausführung; seine geschäftliche Kontaktadresse lautet j.falk@leineputz.example. Der Verein ist über heike.lenz@kieselgarten.example erreichbar. Reparaturtermine werden mit Frau Lenz abgestimmt, weil der Zugang außerhalb der Arbeitszeit verschlossen ist. Ausführung und technische Prüfung bleiben Aufgabe der jeweils zuständigen Fachfirma.

Für den Verein: Heike Lenz. Für Leineputz Ausbau GmbH: Jonas Falk. Beide Bestätigungen wurden am 06.07.2026 in der Projektablage erfasst.

07_Montagebericht_Tueren.docx

Montagebericht Bauelemente Erdgeschoss

Tessa Ahrens | Glaserei Fenstertreu GmbH

An: Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

17.08.2026, 16:40 Uhr | BE-02 / Montagezettel 217

1 Ausführung am 17 August

Unser Montageteam, Tessa Ahrens und Leon Witte, war heute von 07:15 bis 16:00 Uhr am Kieselgartenweg 14. Wir haben die Innentüren T03, T04 und T05 eingehängt sowie die Fenster F06 und F07 abschließend eingestellt. Der Boden im Abstellraum 0.05 war mit Schutzvlies abgedeckt. Bei T05 fehlte vor der Tür noch der endgültige Übergang zur Flurfläche. Wir konnten deshalb die endgültige untere Luft an dieser Stelle nicht beurteilen.

T05 ließ sich nach dem Einhängen ohne erkennbaren Kontakt mit dem damals sichtbaren Boden bewegen. Das ist keine Aussage über den späteren Fliesenaufbau im Flur. Wir haben die Bänder in mittlerer Stellung belassen. Ein Kürzen des Türblatts wurde weder vereinbart noch ausgeführt. Der Bauüberwachung war bei unserem Telefonat um 15:20 Uhr bekannt, dass nach den Bodenarbeiten ein Einstelltermin erforderlich sein kann.

2 Anschluss am Ostfenster

Das innere Anschlussband an F07 wurde unten über die gesamte Rahmenbreite von 1,36 m am Rahmen befestigt und auf den vorbereiteten Untergrund geführt. Die Laibung war an der unteren rechten Ecke staubig; dort haben wir vor der Verklebung nachgereinigt. Das Band wurde nicht überputzt. Die Putzarbeiten übernimmt laut Leistungsverteilung Leineputz. Eine Öffnung oder Haftzugprüfung des späteren Anschlusses ist nicht Bestandteil unseres heutigen Montageberichts.

Beim Verlassen der Baustelle war das Band sichtbar und nicht mit einer Schutzleiste verdeckt. Die Breite der auf dem Untergrund liegenden Klebefläche haben wir nicht nachgemessen. Wir haben keine Fotos in die Projektablage übertragen. Die Eintragung im Tageszettel bezeichnet das Fenster als F07, Ostseite Raum 0.03; ein älterer Aufkleber F7 ist dieselbe Stelle.

3 Weitere Abstimmung

Bitte teilen Sie uns nach Abschluss der Boden- und Putzarbeiten einen gemeinsamen Termin mit. Dabei wollen wir die Bedienung der Türen und Fenster erneut prüfen und die Anschlussflächen mit der Bauüberwachung ansehen. Eine Abnahme ist heute nicht durchgeführt worden. Die Montageleistung wurde von Leon Witte auf diesem Bericht als ausgeführt erfasst; die Bestätigung der Leistungserbringung durch den Verein steht noch aus.

Tessa Ahrens | t.ahrens@fenstertreu.example

05_Gewerkekarte.pdf

Vertragskontakte Kieselgarten

Heike Lenz | Nachbarschaft Kieselgarten e. V.

An: Maren Döring | Bauüberwachung

21.09.2026, 16:25 Uhr | KG-26 / Kontakte / Stand 3

1 Beauftragte Firmen

Die folgende Karte ersetzt meine Liste vom 04.09.2026. Frau Döring, bitte verwenden Sie für die Terminabstimmung die Firmenadressen und nicht die privaten Telefonnummern der Monteure. Der Westanbau gehört nicht zum gegenwärtigen Bauabschnitt. Im Erdgeschoss gibt es vier getrennte Verträge; eine Abnahme bei einer Firma sagt nichts über die übrigen Leistungen aus.

Gewerk / Vertrag	Firma und Kontakt	Umfang
Ausbau / AU-04	Leineputz Ausbau GmbH Jonas Falk j.falk@leineputz.example	Putz, Anstrich, Bodenfliesen; Anschlussband einbetten
Bauelemente / BE-02	Glaserei Fenstertreu GmbH Tessa Ahrens t.ahrens@fenstertreu.example	Fenster, Innentüren, Bandmontage, Einstellen der Beschläge
Sanitär / SA-03	Quellwerk Sanitär GmbH Alina Voß a.voss@quellwerk.example	Waschtische, Eckventile, Leitungen, Ablaufkörper
Elektro / EL-01	Elektro Faden GmbH Nils Bödeker n.boedeker@elektro-faden.example	Leuchten, Schalter, Beschriftung, Datendosen

2 Stand meiner Ablage

Elektro wurde am 10.09.2026 gesondert abgenommen. Das Blatt liegt unter EL-01/AB-01. Für Ausbau, Bauelemente und Sanitär gibt es bisher kein Abnahmeprotokoll. Die Firmen sollen am 29.09. um 09:00 Uhr erscheinen; Einladungen sind am 18.09. versandt worden. Ich habe niemandem zugesagt, dass unabhängig vom Befund abgenommen wird. Der Verein hat das Haus noch nicht für den Betrieb geöffnet.

Bei Sanitär ist seit 18.09. Frau Voß zuständig; der bisher aufgeschriebene Herr Riemann arbeitet nicht mehr für Quellwerk. Tür T05 und Fenster F07 wurden am 17.08. durch Fenstertreu montiert. Wer den Anschluss an F07 zuletzt bearbeitet hat, kann ich nicht aus der Rechnung erkennen. Die Karte enthält hierzu keinen Befund.

Heike Lenz | Verteiler: Bauüberwachung und Vereinsablage

06_Abnahme_Elektro.pdf

Abnahme der Elektroinstallation

Nachbarschaft Kieselgarten e. V. | Heike Lenz

An: Elektro Faden GmbH | Nils Bödeker

10.09.2026, 14:00 bis 15:05 Uhr | KG-26 / EL-01 / AB-01

1 Gegenstand und Erklärung

Im Nachbarschaftshaus Kieselgarten, Kieselgartenweg 14, 37574 Einbeck, haben Heike Lenz und Nils Bödeker die Leistungen des Elektrovertrags EL-01 vom 02.07.2026 gemeinsam besichtigt. Maren Döring nahm als Bauüberwacherin teil. Erfasst sind ausschließlich die Elektroarbeiten im Erdgeschoss nach Angebot EF-2628 vom 29.06.2026. Die Beleuchtung des Westanbaus ist nicht Gegenstand dieses Vertrags.

Heike Lenz erklärt für den Verein die Abnahme der Leistungen des Elektrovertrags. Die nachstehend festgehaltenen Punkte bleiben vorbehalten. Diese Erklärung betrifft keine Ausbau-, Fenster-, Türen- oder Sanitärleistungen anderer Firmen. Eine gemeinsame Abnahme des Gesamtgebäudes ist nicht erklärt worden.

2 Beobachtungen beim Termin

Die Raumbeleuchtung ließ sich im Rahmen der Bedienprobe in sämtlichen zugänglichen Räumen einschalten. An Leuchte L14 wurde bei dieser Probe kein Aussetzer festgestellt. Eine vollständige elektrische Prüfung wurde durch die Anwesenden nicht wiederholt; Herr Bödeker übergab den Prüfbericht EF-P26-28 vom 09.09.2026 an Frau Lenz. Die dort aufgeführten Messungen sind von der Fachfirma vorgenommen worden.

3 Vorbehaltene Punkte

Im Flur 0.01 fehlen an den Steckdosen S07 und S08 die vereinbarten Stromkreiskennzeichnungen. An der Datendose D09 im Mehrzweckraum sitzt die Abdeckung locker. Der vereinbarte Messbericht für die Datenverkabelung wurde nicht übergeben. Herr Bödeker sagt zu, die Kennzeichnungen und die Befestigung bis 18.09.2026 zu erledigen und den Bericht bis zu diesem Datum zu senden. Eine technische Neubewertung anderer Gewerke ist damit nicht verbunden.

Frau Lenz behält wegen dieser drei Punkte die Rechte des Vereins vor. Die Abnahmeerklärung wird hierdurch nicht zurückgenommen. Im heutigen Termin werden weder ein Vergleich über Ansprüche noch ein Verzicht auf noch unbekannte Mängel vereinbart. Über den Umfang einer Schlusszahlung wird in diesem Protokoll keine Entscheidung getroffen.

4 Bestätigung

Das Protokoll wurde den Beteiligten am Ende des Termins vorgelesen und am 10.09.2026 um 15:05 Uhr von Heike Lenz und Nils Bödeker bestätigt. Maren Döring hat eine Ausfertigung zur Bauakte genommen. Ablagevermerk von Heike Lenz, 10.09.2026, 16:20 Uhr.

13_Tagesbericht_Ausbau.pdf

Tagesbericht Ausbau vom 18 September

Jonas Falk | Leineputz Ausbau GmbH

An: Projektablage KG-26

18.09.2026, 16:15 Uhr | LP-26061 / TB-31

1 Arbeiten und Besetzung

Von 07:00 bis 15:45 Uhr waren Milan Otte und Sarah Köster im Erdgeschoss tätig. Sie haben die Wandflächen in Raum 0.03 fertig gestrichen und die Sockelfugen im Waschraum 0.06 geschlossen. Jonas Falk war von 11:10 bis 11:40 Uhr zur Abstimmung vor Ort. Die Räume 0.03 und 0.06 wurden anschließend für weitere Arbeiten der Folgegewerke offen gelassen. Das Gebäude war nicht öffentlich zugänglich.

Am Fenster F07 wurde ein etwa handbreiter Bereich unten rechts nachgespachtelt. Milan Otte berichtet, dass an der Übergangsstelle zum inneren Band kein neuer Bandstreifen eingesetzt wurde. Die Oberfläche wurde nach dem Trocknen gestrichen. Der Tagesbericht sagt nichts darüber aus, ob die verdeckte Verklebung auf der ganzen Länge tragfähig war. Eine gesonderte Prüfung der Luftdichtheit wurde nicht beauftragt und nicht vorgenommen.

2 Waschraum

Der Ablaufrost wurde zum Reinigen herausgenommen und wieder eingelegt. An der gegenüberliegenden Wand standen währenddessen zwei geschlossene Farbeimer. Die Bodenfläche wurde mit einem feuchten Schwamm gereinigt, nicht geflutet. Wir haben dabei keine Wasserprobe am Ablauf gemacht. Die Fugen waren um 15:00 Uhr äußerlich trocken; zur Restfeuchte unter den Fliesen enthält dieser Bericht keine Messung.

Die sichtbare Oberfläche liegt am Rand des Ablaufrahmens nach unserer Richtsicht nicht überall auf gleicher Höhe. Wir haben das heute nicht protokolliert vermessen. Alina Voß von Quellwerk war nicht anwesend. Den Ablaufkörper haben wir nicht verändert. Eine Festlegung, ob der Rahmen oder die angrenzende Fliese nachzuarbeiten ist, wurde nicht getroffen.

3 Termine

Der letzte Restanstrich im Abstellraum ist für den 24.09.2026 vorgesehen. Beim Rundgang am 22.09. kann ich ab etwa 09:25 Uhr teilnehmen. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob die Glaserei ebenfalls erscheint; ohne sie möchte ich den Fensteranschluss nicht nochmals öffnen. Der Fertigstellungstermin 25.09. bleibt in unserer Wochenplanung stehen. Eine Fertigmeldung haben wir mit diesem Tagesbericht nicht erklärt.

Jonas Falk | erfasst am 18.09.2026 um 16:15 Uhr
