

02_Diktat_Kroll.txt

David Kroll | Massivbau Dammert | Baustelle Schilfrain, Soest

Sprachnotiz am 16.09.2026, 07:48 bis 07:52 Uhr. Textübertragung 08:02 Uhr.

Ich komme gerade von der Ostplatte. Heute ist Mittwoch. Es ist nicht die ganze Baustelle zu, aber über der Technikrinne geht es noch nicht. Das war Montag schon so. Wir waren um sieben da, um zehn nach sieben stand ich an der Rinne. Rohrsteg hatte zwei Bündel drin, aber die Formstücke fehlten und die Befestigungen waren nicht fertig. Ich habe mit Malz gesprochen, Simmen kam kurz nach acht. Sie hat nicht gesagt, wir dürften zudecken.

Ich hatte am Montag fünf Leute einschließlich mir. Aydin und Seifert konnten die Matten daneben anfangen. Schulz und Weber haben im Westen weitergemacht. Nach Mittag ging Schulz nach Osten. Also bitte nicht schreiben, fünf Leute standen zwei Tage herum. Was in welcher Stunde war, steht in der Liste, ich habe sie gestern noch korrigiert. Die Pausen sind extra.

Dann noch der Plan. Montag sagte Simmen, die Öffnungen müssten anders liegen. Den neuen Plan habe ich Dienstag um zehn nach fünf bekommen, nein, zehn Uhr fünf morgens. Index vier. Zwei Öffnungen 120 Millimeter weiter nach Norden, Detail sechs anders. Dafür brauche ich noch die Bestätigung von der Statik, ob unser geschnittener Stahl passt. Das ist nicht dasselbe wie die offene Rinne. Beides hält jetzt die Fertigstellung des Ostfelds auf.

Gestern Nachmittag war Rohrsteg fertig mit Einsetzen, aber Simmen wollte noch eine Halterung mehr. Sie kommt heute halb zehn. Ich weiß also nicht, wann wir wirklich freikommen. Beton heute um sieben habe ich gestern um 15:25 abgesagt. Wilke hat Freitag zehn Uhr angeboten, aber nur vorläufig. Eine Rechnung für die Absage habe ich nicht. Die Pumpe muss ich noch separat anrufen.

Die Westschalung kam gestern 12:45. Damit können zwei Leute arbeiten, vielleicht nachher drei, das muss Aydin sehen. Es fehlt nicht an allem Material. Den Rohbautermin Ende Oktober kann ich jetzt nicht seriös neu berechnen. Erst muss ich wissen, wann der Osten betoniert wird. Bitte im Brief klar sagen, was konkret betroffen ist, und nichts von vier Wochen Verzögerung erfinden. Den Brief muss ich noch ansehen. Frau Reuter hat von mir dazu bislang nur den üblichen Jour-fixe-Kalender, kein Schreiben mit diesen Einzelheiten.

12_Telefonnotizen.txt

Baustelle SR-26 | Notizbuch David Kroll | Stand 16.09.2026, 08:25 Uhr

14.09. 07:18, Gespräch mit Eike Malz/Rohrsteg an der Rinne: zwei Formstücke fehlen. Malz erwartet Nachricht aus Lager, nennt keine Uhrzeit.

14.09. 08:05, Petra Simmen vor Ort: Rinne offen, keine Überdeckung. Hinweis auf Ausweichflächen West. Kein Gespräch mit Amelie Reuter.

14.09. 11:18, Simmen telefonisch: neuer Öffnungsplan in Arbeit, Durchführungen Achse 5. Kein Plananhang zum Telefonat.

14.09. 16:10, Simmen telefonisch: Westfeld für die vorgesehenen Schalungsarbeiten technisch freigegeben. Ostfeld ausdrücklich ausgenommen.

15.09. 14:30, Simmen vor Ort: zusätzliche Halterung in der Rinne erforderlich. Malz hört mit. Keine schriftliche Abschlussbestätigung.

15.09. 15:10, Wilke/Betonwerk: heutige Disposition braucht Entscheidung. Kroll will Rückmeldung zur Rinne abwarten.

15.09. 15:25, Kroll an Wilke: Termin 16.09., 07:00 abgesagt. Noch keine Kosten genannt.

16.09. 07:35, Wilke: 18.09., 10:00 möglich, Rückmeldung bis 12:00. Bestätigung als 07_Beton_Disposition.pdf angekündigt.

16.09. 08:25: Keine E-Mail oder förmliche Anzeige von Kroll an bau@werkraum-schilfrain.example im Ausgang. Entwurf wird angefordert. Dieses Notizbuch bleibt intern.

01_Kroll_Buero.eml

Von	David Kroll <d.kroll@massivbau-dammert.example>
An	Lea Friese <l.friese@massivbau-dammert.example>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 08:32:00 +0200
Betreff	Schilfrain: Diktat und Unterlagen für das Schreiben

Guten Morgen Frau Friese,

ich habe auf dem Weg zum Container die Fakten ins Telefon gesprochen. Die Textübertragung liegt als Datei 02 bei; bitte machen Sie daraus einen Entwurf der förmlichen Behinderungsanzeige an unsere Auftraggeberin. Ich kontrolliere Daten, Ursachen und den tatsächlichen Arbeitsablauf vor dem Versand. Bitte setzen Sie nicht einfach alle Anwesenheitsstunden als Stillstand an. Im Westen arbeiten wir weiter.

Der Vertrag und beide Ablaufstände liegen ebenfalls im Ordner. Das Gespräch mit Frau Simmen ist noch kein von mir versandtes Schreiben. Insbesondere weiß ich nicht, ob Frau Reuter die einzelnen Auswirkungen bereits kennt. Ich möchte einen nachvollziehbaren Text darüber, welche Arbeiten seit wann betroffen sind, was wir trotzdem tun und welche Rückmeldungen wir brauchen. Eine abschließende Forderung über Tage oder Geld kann ich heute nicht freigeben.

Für die Kontaktadresse verwenden Sie bitte die im Vertrag benannte Auftraggeberadresse und nehmen Frau Simmen in Kopie. Senden Sie selbst noch nichts ab. Nach dem Termin um 09:30 Uhr könnte eine Ergänzung erforderlich sein. Der Betonlieferant hält Freitag nur bis heute Mittag vor.

Freundliche Grüße
David Kroll

Anlagen:
02_Diktat_Kroll.txt
04_Ablauf_01.docx
11_Ablauf_02.docx

08_Simmen_Plan.eml

Von	Petra Simmen <p.simmen@kontur-bauleitung.example>
An	David Kroll <d.kroll@massivbau-dammert.example>
Datum	Tue, 15 Sep 2026 10:05:00 +0200
Betreff	SR-26: Öffnungsplan S-17 Index 04

Sehr geehrter Herr Kroll,

der Öffnungsplan S-17/04 steht seit 09:55 Uhr im Projektraum. Gegenüber Index 03 sind die beiden Durchführungen bei Achse 5 um jeweils 120 mm nach Norden versetzt. Der Abstand zwischen den Durchführungen bleibt 800 mm. Die ergänzende Bewehrung ist im Detail 6 geändert. Bitte prüfen Sie mit der Tragwerksplanung, ob die bereits zugeschnittenen Stäbe unverändert genutzt werden können; ich erteile hierzu keine statische Freigabe.

Rohrsteg meldet für heute Vormittag die fehlenden Formstücke. Ich komme um 14:30 Uhr zur Technikrinne. Eine Freigabe zur Überdeckung kann ich vor Prüfung des ausgeführten Zustands nicht bestätigen. Ihr Hinweis gestern um 08:05 Uhr ist in meinem Tagesvermerk aufgenommen. Eine von Ihnen an die Auftraggeberin gerichtete förmliche Anzeige ist damit nicht dokumentiert.

Bitte geben Sie den freien Westbereich nicht ungenutzt auf. Die Freigabe des Westfelds für die vorgesehenen Schalungsarbeiten ist Ihnen bereits am 14.09. um 16:10 Uhr mitgeteilt worden. Welche Mannschaftsstärke dort sinnvoll eingesetzt werden kann, stimmen Sie mit Ihrem Polier ab. Zusätzliche Vergütung oder eine Änderung des Vertragstermins sage ich nicht zu.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Simmen

09_Stundenliste.csv


Datum	Person	Anwesenheit_h	Pause_h	Ost_freier_Abschnitt_h	West_Arbeiten_h	Koordination_Warten_h	Erfasst_von
2026-09-14	David Kroll	9,0	0,5	0,0	0,0	8,5	David Kroll
2026-09-14	Mehmet Aydin	9,0	0,5	7,0	0,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Ronja Seifert	9,0	0,5	7,0	0,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Benno Schulz	9,0	0,5	3,0	4,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Janis Weber	9,0	0,5	0,0	7,0	1,5	David Kroll
2026-09-15	David Kroll	9,0	0,5	0,0	0,0	8,5	David Kroll
2026-09-15	Mehmet Aydin	9,0	0,5	5,0	0,0	3,5	David Kroll
2026-09-15	Ronja Seifert	9,0	0,5	5,0	0,0	3,5	David Kroll
2026-09-15	Benno Schulz	9,0	0,5	0,0	6,0	2,5	David Kroll
2026-09-15	Janis Weber	9,0	0,5	0,0	6,0	2,5	David Kroll

10_Arbeitsfelder.png

SR-26 | Arbeitsfelder Bodenplatte | Index 04

15.09.2026 | David Kroll

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

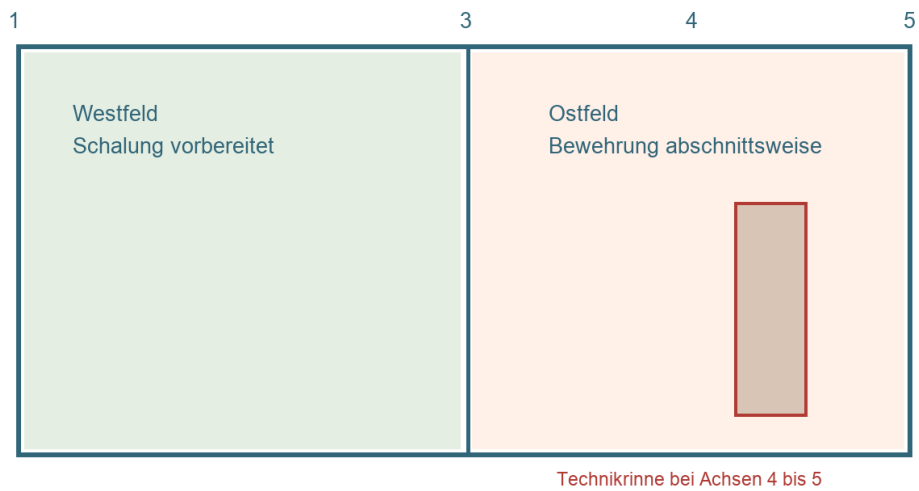

Westfeld Achsen 1 bis 3 | Ostfeld Achsen 3 bis 5

Schematische Lageübersicht. Rinne im Ostfeld; kein Schal- oder Bewehrungsplan.

Bilddatei: 10_Arbeitsfelder.png

03_Vertrag_Rohbau.docx

Rohbauauftrag Werkstatt Schilfrain

Werkraum Schilfrain GmbH | Geschäftsführerin Amelie Reuter

An: Massivbau Dammert GmbH | Geschäftsführer Stefan Lück

24.08.2026 | SR-26 / RB-01 / Vertragsausfertigung

1 Leistung und Vertragsunterlagen

Die Werkraum Schilfrain GmbH, Schilfrain 19, 59494 Soest, beauftragt die Massivbau Dammert GmbH, Feldbogen 6, 59494 Soest, mit dem Rohbau des eingeschossigen Werkstattgebäudes. Vertragsgrundlagen sind dieser Auftrag, das Angebot MD-26108 vom 18.08.2026, das LV RB-07 und die VOB/B Ausgabe 2016. Diese Unterlagen sind beiden Parteien bei Unterzeichnung ausgehändigt worden. Der Auftrag umfasst Fundamente, Bodenplatte, Stahlbetonwände und die im LV beschriebenen Öffnungen; die technische Fachplanung wird durch die Auftraggeberin gestellt.

Die Auftragssumme auf Grundlage der ausgeschriebenen Mengen beträgt 286.400,00 EUR netto zuzüglich 54.416,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 340.816,00 EUR brutto. Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Mengen und vereinbarten Einheitspreisen. Über Nachträge wird nur aufgrund einer gesonderten nachvollziehbaren Beschreibung entschieden. Dieser Vertrag vereinbart keine pauschale Vergütung für ungeklärte spätere Störungen.

2 Mitwirkung und Freigaben

Die Auftraggeberin stellt die abgestimmten Schal- und Bewehrungspläne rechtzeitig vor den betreffenden Arbeiten bereit. Im Bereich der Technikrinne unter der Bodenplatte verlegt ihr gesonderter Auftragnehmer Rohrstege Haustechnik die Leitungen. Die Rohrlage und der Abschluss seiner Arbeiten sind vor dem darüberliegenden Bewehrungseinbau gemeinsam zu prüfen. Eine Überdeckung ohne die erforderliche technische Kontrolle ist nicht vorgesehen.

Für den Schriftverkehr über Ausführung und Termine ist die Auftraggeberin unter bau@werkraum-schilfrain.example erreichbar. Eine Kopie geht an die Objektüberwachung. Fachplanerin oder Objektüberwachung dürfen technische Abläufe koordinieren; rechtsgeschäftliche Vereinbarungen über Vergütungsänderungen oder geänderte Vertragstermine trifft Amelie Reuter. Die Vertragsparteien benennen damit Ansprechpartner, ohne die Wirksamkeit einzelner künftiger Erklärungen vorwegzunehmen.

3 Termine

Arbeitsbeginn ist der 31.08.2026. Der Rohbau soll bis 30.10.2026 fertiggestellt werden. Der von den Parteien bestätigte Detailablauf RB-T-01 vom 25.08. liegt der Koordination zugrunde; seine einzelnen Zwischenansätze sind keine gesondert vereinbarten Vertragsfristen. Die Auftraggeberin und der Auftragnehmer werden erkennbare Abweichungen zeitnah besprechen und die betroffenen Vorgänge dokumentieren.

Amelie Reuter und Stefan Lück | Vertragsbestätigung am 24.08.2026

04_Ablauf_01.docx

Arbeitsfolge Bodenplatte und Wände

David Kroll | Bauleitung Massivbau Dammert

An: Amelie Reuter und Objektüberwachung Petra Simmen

25.08.2026 | RB-T-01 / bestätigt zur Koordination am 27.08.2026

1 Geplanter Ablauf

Die Bodenplatte wird in zwei Feldern hergestellt. Feld West liegt zwischen den Achsen 1 bis 3, Feld Ost zwischen 3 bis 5. Beide Felder sind durch eine geplante Arbeitsfuge getrennt. Das Westfeld ist unabhängig zugänglich. Die Technikrinne quert ausschließlich das Ostfeld zwischen Achsen 4 und 5. Der Kolonnenansatz beträgt fünf Beschäftigte mit acht Anwesenheitsstunden je regulärem Arbeitstag, einschließlich einer halben Stunde Pause.

Die nachstehende Folge geht von fertig verlegten Leitungen in der Technikrinne bis zum 11.09. um 12:00 Uhr und einer anschließenden Kontrolle aus. Die Bewehrung kann im Bereich der Rinne erst danach geschlossen werden. Im übrigen Ostfeld kann sie abschnittsweise vorbereitet werden; eine vollständige Betonage setzt den Abschluss sämtlicher Vorarbeiten im Feld voraus.

Vorgang	Geplanter Zeitraum	Abhängigkeit
Westfeld Bewehrung	07.09. bis 09.09.	Sauberkeitsschicht vorhanden
Westfeld Betonage	10.09., 07:00 Uhr	Kontrolle am 09.09.
Ostfeld Bewehrung	14.09. bis 15.09.	Technikrinne fertig und kontrolliert
Ostfeld Betonage	16.09., 07:00 Uhr	Bewehrung und Öffnungsdetails freigegeben
Wandschalung West	17.09. bis 18.09.	technische Freigabe des Westfelds
Wandschalung Ost	21.09. bis 23.09.	Ostplatte ausreichend für Folgearbeiten

2 Arbeitsmittel und Ausweichfläche

Die Wandschalung für das Westfeld kommt am 15.09. mittags. Zuvor können an der Westseite Randabschlüsse nachbearbeitet und Schalungsträger sortiert werden. Diese Tätigkeiten bieten nicht für die gesamte Kolonne zwei volle Tage Arbeit. Für das Ostfeld sind Bewehrungsstahl und Abstandhalter ab 11.09. auf der Baustelle verfügbar. Die Betonbestellung wird durch David Kroll abgestimmt.

3 Fortschreibung

Die Vorgänge werden bei Änderungen einzeln fortgeschrieben. Ein verschobener Betontermin wird nicht ohne Prüfung als gleich lange Verschiebung des Rohbauendes übernommen. Die Westarbeiten und Liefermöglichkeiten sind dafür gesondert anzusehen. Die Terminansätze dienen der Ausführungskoordination, nicht einer bereits erklärten Bewertung möglicher Ansprüche.

David Kroll | d.kroll@massivbau-dammert.example

11_Ablauf_02.docx

Wochenplanung ab 16 September

David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

An: Polier Mehmet Aydin und Disposition

16.09.2026, 08:20 Uhr | RB-T-02 / vorläufiger Kolonnenplan

1 Stand am Mittwochmorgen

Die Technikrinne im Ostfeld ist noch nicht zur Überdeckung freigegeben. Frau Simmen hat für heute 09:30 Uhr einen weiteren Termin angekündigt. Auch die Rückfrage zum Bewehrungsdetail an den geänderten Durchführungen ist noch offen. Der Betontermin von heute 07:00 Uhr ist abgesagt. Eine neue Lieferung für Freitag ab 10:00 Uhr kann bis heute 12:00 Uhr angemeldet werden; Pumpe und Freigaben sind noch nicht bestätigt.

2 Kolonneneinsatz

Aydin und Seifert halten zunächst die vorbereiteten Bewehrungsbereiche im Ostfeld frei und prüfen die für das Änderungsdetail bereits gelieferten Stäbe gegen die neue Liste, ohne Stäbe eigenständig umzubiegen. Schulz und Weber beginnen nach der bereits vorliegenden technischen Freigabe des Westfelds mit dem Sortieren und Vorbereiten der Wandschalung. Kroll nimmt am Termin zur Technikrinne teil und stimmt die Liefermöglichkeiten ab. Die Baustelle ist deshalb nicht insgesamt ohne Arbeit.

Für Donnerstag ist das Stellen der ersten Westwände vorgesehen. Ob gleichzeitig die Ostbewehrung abgeschlossen werden kann, hängt von den noch offenen Rückmeldungen ab. Eine vollständige Verlagerung aller fünf Beschäftigten in die Westwände ist wegen des begrenzten Arbeitsraums heute nicht sinnvoll. Der konkrete Einsatz wird im Tagebuch und in der Stundenliste fortgeschrieben, nicht pauschal als Stillstand eingetragen.

3 Annahmen und Termine

Wenn Rinne und Detail heute freigegeben werden, könnte die Ostbewehrung nach derzeitiger Einschätzung am Donnerstag fertig werden. Das ist eine Arbeitsannahme und keine zugesagte Fertigmeldung. Der mögliche Betontermin am Freitag würde weitere Abstimmung über die anschließenden Wände erfordern. Auswirkungen auf den vertraglichen Rohbautermin 30.10. werden damit noch nicht beziffert. Die vorausgehende Planung RB-T-01 bleibt als Vergleichsstand erhalten.

Diese Wochenplanung geht nur an die Kolonne und die Disposition. Sie ist keine an die Auftraggeberin gerichtete förmliche Erklärung. Bitte tatsächliche Beginn- und Endzeiten weiterhin erfassen und bei einer Freigabe deren Zeitpunkt und Gegenstand notieren.

David Kroll | Stand 16.09.2026, 08:20 Uhr

05_Bautagebuch.pdf

Bautagebuch Bodenplatte

David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

An: Baustellenablage SR-26

15.09.2026, 17:20 Uhr | BT-12 / Einträge 14. und 15.09.2026

1 Montag 14 September

Arbeitsbeginn 07:00 Uhr. Anwesend: David Kroll, Mehmet Aydin, Ronja Seifert, Benno Schulz und Janis Weber. Gegen 07:10 Uhr war die Technikrinne zwischen Achsen 4 und 5 auf etwa 9 m Länge noch offen. Es lagen zwei Leitungsbündel ohne abschließende Befestigung in der Rinne. Herr Malz von Rohrsteig war vor Ort und sagte, zwei Formstücke fehlten. Einen schriftlichen Fertigtermin nannte er nicht. Petra Simmen kam um 08:05 Uhr.

Bis 08:30 Uhr wurden Lage und freier Arbeitsraum angesehen. Es gab keine Freigabe zum Schließen der Bewehrung über der Rinne. Ab 08:30 Uhr stellten Aydin und Seifert im freien Ostabschnitt Abstandhalter und erste Matten. Schulz und Weber arbeiteten an Randabschalungen im Westen. Kroll koordinierte Lieferung und Planrückfrage. Ab 13:00 Uhr half Schulz im freien Ostabschnitt; Weber räumte weiter im Westen auf. Die Kolonne war bis 16:00 Uhr anwesend, Pause 12:00 bis 12:30 Uhr.

Um 11:18 Uhr erhielt ich von Petra Simmen die Ankündigung eines geänderten Öffnungsplans. Das betraf zwei Durchführungen nahe Achse 5. Der Plan war um 16:00 Uhr noch nicht in unserem Projektraum. Im freien Abschnitt war Bewehrung möglich, im Bereich der Durchführungen nicht abschließend. Das Tagebuch ordnet die heute eingesetzten Stunden Tätigkeiten zu; daraus ergibt sich nicht automatisch eine vergütungsfähige Stillstandszeit.

2 Dienstag 15 September

Beginn 07:00 Uhr mit derselben Kolonne. Die Formstücke wurden laut Rohrsteig um 09:40 Uhr angeliefert. Der Einbau dauerte bis etwa 12:20 Uhr. Frau Simmen führte um 14:30 Uhr eine Sichtkontrolle durch und bat um eine Ergänzung der Halterung. Eine vollständige Freigabe zur Überdeckung lag um 16:00 Uhr nicht vor. Die Wandschalung West kam um 12:45 Uhr; Schulz und Weber entluden und sortierten sie.

Um 10:05 Uhr erreichte uns der Öffnungsplan S-17/04. Ein öffnungsnahes Bewehrungsdetail wurde darin gegenüber S-17/03 verändert. Kroll bat die Tragwerksplanung um Bestätigung, wie mit den bereits vorbereiteten Stäben zu verfahren sei. Um 15:10 Uhr sagte die Disposition des Betonwerks, der alte Termin 16.09., 07:00 Uhr könne nicht beliebig bis zum Vorabend offen gehalten werden. Kroll stornierte ihn um 15:25 Uhr telefonisch. Eine Stornorechnung lag zum Ende des Tages nicht vor.

David Kroll | fortgeschrieben 15.09.2026, 17:20 Uhr

06_Lieferbeleg.pdf

Lieferbeleg Wandschalung West

Schalgerät Linden GmbH | Disposition Frauke Dorn

An: Massivbau Dammert GmbH | Baustelle Schilfrain 19

15.09.2026, 12:45 Uhr | Lieferschein SG-26194

1 Lieferung

Die nachstehenden Teile wurden am 15.09.2026 mit Fahrzeug SG-18 an die Baustelle Schilfrain 19 in Soest geliefert. Fahrer war Uwe Strack. Ankunft 12:35 Uhr, Beginn Entladung 12:45 Uhr, Ende 13:25 Uhr. Benno Schulz und Janis Weber nahmen die Teile an. Einsetzen und Ausrichten der Schalung sind nicht Leistungen dieser Lieferung.

Teil	Menge	Zuordnung
Rahmenelement 2,70 × 0,90 m	18 Stück	Wände Westfeld
Rahmenelement 2,70 × 0,60 m	8 Stück	Wände Westfeld
Richtstütze	12 Stück	Wände Westfeld
Verbindungskiste	2 Stück	Zubehör; verschlossen übergeben

2 Zustand und Übernahme

Schulz vermerkte bei der Übernahme zwei verschmutzte Elementrückseiten. Ein Schaden an der Schalhaut wurde beim Entladen nicht festgestellt. Eine vollständige Prüfung sämtlicher Zubehörteile fand während der Entladung nicht statt. Die Teile wurden auf Lagerfläche West abgelegt; der Zugang zur Technikrinne blieb frei. Die Lieferung war für den 15.09. zwischen 12:00 und 14:00 Uhr angekündigt und lag innerhalb dieses Fensters.

3 Mietbeginn

Die vereinbarte Mietzeit beginnt am 15.09.2026. Ein anderer Mietbeginn oder eine kostenfreie Verlängerung ist auf diesem Lieferschein nicht vereinbart. Die Disposition erhielt keine Mitteilung über eine Stilllegung der gesamten Baustelle. Eine Rückholung wurde nicht angefragt. Frau Dorn kann über eine spätere Verlängerung erst nach Mitteilung des tatsächlich benötigten Enddatums entscheiden.

Frauke Dorn | f.dorn@schalgeraet-linden.example. Übernahme durch Benno Schulz am 15.09.2026, 13:25 Uhr in der Lieferablage bestätigt.

07_Beton_Disposition.pdf

Disposition Bodenplatte Ost

Henning Wilke | Betonwerk Körnig GmbH

An: David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

16.09.2026, 08:05 Uhr | BK-26-883 / Telefonbestätigung

1 Bestellung und Absage

Sehr geehrter Herr Kroll, wir bestätigen den Verlauf unserer Disposition für die Bodenplatte Ost in Soest. Sie hatten am 10.09.2026 eine Lieferung von 42,00 m³ Beton für den 16.09. ab 07:00 Uhr angemeldet. Pumpe und Lieferfolge sollten wir gemeinsam mit Ihnen am Vortag endgültig abstimmen. Am 15.09. um 15:25 Uhr haben Sie den Termin telefonisch abgesagt, weil die Fläche nach Ihrer Mitteilung nicht betonierbereit sei.

Die Absage ist bei uns vor Beladung eingegangen. Es wurde für diese Baustelle kein Beton produziert oder abgefahren. Die von einem anderen Unternehmen gestellte Pumpe haben wir nicht in Ihrem Namen storniert. Etwaige Kosten dieses Unternehmens können wir deshalb weder bestätigen noch beziffern. Über eigene Dispositionskosten haben wir noch keine Rechnung gestellt.

2 Neue Liefermöglichkeit

Unser nächstes derzeit frei planbares Zeitfenster ist Freitag, 18.09.2026, ab 10:00 Uhr. Wir halten es bis heute 12:00 Uhr unverbindlich vor. Für eine feste Bestellung benötigen wir bis dahin Ihre Bestätigung der Betonierbereitschaft, der Menge und des Pumpentermins. Die Menge von 42,00 m³ ist aus der alten Anmeldung übernommen; eine aktualisierte Mengenprüfung haben wir nicht vorgenommen.

Eine Lieferung am Donnerstagmorgen können wir zurzeit nicht zusagen. Falls ein anderer Auftrag ausfällt, melden wir uns, möchten Ihre Bauablaufplanung aber nicht auf diese ungewisse Möglichkeit stützen. Die vorgesehene Lieferdauer am Freitag beträgt bei ungestörter Abnahme etwa vier Stunden. Zufahrt und Standfläche der Pumpe müssen frei sein.

3 Reichweite dieser Bestätigung

Wir kennen weder die Ursache der fehlenden Betonierbereitschaft noch die vertraglichen Termine zwischen Ihnen und Ihrem Auftraggeber. Dieses Schreiben hält ausschließlich Bestell- und Lieferinformationen fest. Eine Übernahme von Kosten oder eine Anerkennung einer Bauzeitverlängerung ist damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Wilke | h.wilke@beton-koernig.example
