

40_2024-04-08_Archivverzeichnis.txt

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7, 37574 Einbeck

Dokumentenregister R-01 / Bürgerhaus Leinewinkel, Lindengasse 18

Stand 08.04.2024 / Empfänger: Vorstand und Hauswart

Bezug: Übergabe vom 05.04.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Aufbewahrung und Vollständigkeit

Die nachstehende Liste bezeichnet die beim Verein übergebenen Originalmappen. Die Papiermappen stehen im verschlossenen Büroschrank des Vereinsraums. Eine digitale Kopie liegt im Vereinsarchiv. Die Liste selbst ersetzt die bezeichneten Gewerkeunterlagen nicht. Der Vorstand hat den Empfang der Mappen am 05.04.2024 bestätigt. Die unterschriebenen Abnahmeblätter der weiteren Gewerke sind in dieser Arbeitszusammenstellung nicht nochmals enthalten.

2 Gewerkeunterlagen und Abrechnungsregister

Nr. 1: Leinebau, Los 1. Vertrag 18.04.2023, Abnahme 18.03.2024, fünfjährige Mängelfrist ab Abnahme. Schlussrechnung LB-240301 vom 01.03.2024 und Prüfung vom 11.03.2024. Gerätebereitschaft bleibt streitig. Kein pauschaler Einbehalt.

Nr. 2: Mertens Installation, Heizung und Sanitär. Vertrag MI-230512, Abnahme 22.03.2024, fünf Jahre vereinbart. Schlussrechnung MI-240322: 54.200,00 EUR netto, 10.298,00 EUR Umsatzsteuer, 64.498,00 EUR brutto.

Nr. 3: Lichtpfad Elektrotechnik, Vertrag LP-230519. Abnahme 25.03.2024, fünf Jahre vereinbart. Schlussrechnung LP-240325: 27.400,00 EUR netto, 5.206,00 EUR Umsatzsteuer, 32.606,00 EUR brutto.

Nr. 4: Weserwerk Fenster und Ausbau, Vertrag WW-230531. Abnahme 27.03.2024, fünf Jahre vereinbart. Schlussrechnung WW-240327: 61.800,00 EUR netto, 11.742,00 EUR Umsatzsteuer, 73.542,00 EUR brutto.

Nr. 5: Hofraum Außenanlagen, Vertrag HR-230602. Abnahme 02.04.2024, fünf Jahre vereinbart. Schlussrechnung HR-240402: 23.600,00 EUR netto, 4.484,00 EUR Umsatzsteuer, 28.084,00 EUR brutto.

Nr. 6: Bewegliche Ausstattung Raumgut, Lieferung 02.04.2024, Rechnung RG-240402: 12.900,00 EUR netto, 2.451,00 EUR Umsatzsteuer, 15.351,00 EUR brutto. Keine Zuordnung zur Bauwerksfrist vorgenommen.

Nr. 7: Hartwig Architektur, Vertrag 18.01.2021. Gesamt vereinbart 54.000,00 EUR netto, 10.260,00 EUR Umsatzsteuer, 64.260,00 EUR brutto.

Davon sind zum Stand der Rechnungsprüfung 960,00 EUR netto für die noch laufende Objektbetreuung nicht als erbrachte Leistung festgestellt. Eine gesonderte Abnahmeerklärung der Planungsleistungen liegt in dieser Mappe nicht.

Nr. 8: Untersuchung und Vermessung, Rechnungen VM-210210 und VM-230817, zusammen 4.650,00 EUR netto, 883,50 EUR Umsatzsteuer, 5.533,50 EUR brutto.

Nr. 9: Genehmigungsgebühr 63-2022-041 und Entwässerungsgebühr, zusammen 1.780,00 EUR ohne Umsatzsteuer. Keine Bauleistung.

3 Pläne und Nachweise

Genehmigung 63-2022-041 mit L-01, G-01, B-01 und BS-02; AP-01 und D-12; Tragwerksmappe T-02 mit Vorlagebestätigung vom 17.08.2023; Revisionsplan der umgelegten Pumpenleitung; Produktunterlagen der Türen und Dachbahnen;

Elektroprüfung, Heizungsprobelauf und Einweisungsprotokolle.

Die Koordinationsfassung TGA-04 ist als solche archiviert. Sie ist kein Ersatz für den freigegebenen Rampenanschluss D-12. Ein gesondertes unterschriebenes Nivellementblatt des Rinneneinbaus befindet sich nicht in R-01.

4 Laufende Vorgänge

Die Meldung des Vereins zur gewünschten Gymnastiknutzung wurde nicht in einen Ausführungsauftrag überführt. Der Hauswart nutzt den Raum weiterhin als Besprechungsraum. N01.5 ist weder anerkannt noch abschließend zurückgewiesen. Eine gemeinsame Untersuchung später gemeldeter Mängel wird über den Vorstand koordiniert. Sämtliche Originalmappen verbleiben beim Verein.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: keine

06_2021-03-25_Variantenentscheidung.eml

Von	"Maren Döring", Vorsitzende <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de>
An	"Lena Hartwig", Architektin <projekt@hartwig-architektur.de>
Datum	Thu, 25 Mar 2021 09:24:00 +0100
Betreff	BH-21-04 / Weiterplanung des Nordanbaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand hat gestern die Varianten vom 18.03.2021 einschließlich Ihrer Kostentabelle besprochen. Wir wählen den Nordanbau mit 80 m² Bruttofläche. Für den Seniorenkreis wäre ein kleinerer Saal keine brauchbare Dauerlösung. Die Kostenschätzung von 383.180,00 EUR brutto liegt noch innerhalb unseres Rahmens von 430.000,00 EUR.

Bitte arbeiten Sie den Entwurf auf dieser Grundlage aus. Im Vereinsraum bleibt es bei Besprechungen mit höchstens 18 Personen. Die beiden Suchschlitze an der Nordwand sind freigegeben. Für eine Untersuchung des gesamten Hofes möchten wir zunächst ein konkretes Angebot mit Wiederherstellung der Pflasterfläche sehen. Herr Winter meint weiterhin, dass die Pumpenleitung stillliegt; wir möchten das aber nicht als gesicherte Bestandsangabe behandeln.

Die Veranstaltung im Oktober 2022 muss im Haus stattfinden können. Der Baubeginn im August 2023 passt deshalb. Die Terminabstimmung mit den Fachplanern kann jetzt erfolgen. Im Anhang übersenden wir Ihre Variantenuntersuchung unverändert als Bezug für unseren Beschluss. Diese Nachricht ruft noch keine Bauleistungen und noch nicht die weiteren Planungsphasen ab.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Döring, Vorsitzende

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Anlagen: 05_2021-03-18_Variantenuntersuchung.pdf

15_2022-02-03_Nachforderung.eml

Von	"Klara Brandes", im Auftrag <bauaufsicht@einbeck.de>
An	"Lena Hartwig", Architektin <projekt@hartwig-architektur.de>
Datum	Thu, 03 Feb 2022 09:24:00 +0100
Betreff	BH-21-04 / Nachforderung zum Bauantrag 63-2022-041

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bauantrag für das Bürgerhaus Lindengasse 18 vom 20.01.2022 ist unter dem Aktenzeichen 63-2022-041 erfasst. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir eine ergänzte Darstellung der Rettungswege aus dem Vereinsraum und der Begrenzung der Gesamtbelegung. Die Bezeichnung Besprechungsraum allein genügt dafür nicht.

Bitte geben Sie die lichte Breite der Türen, die Lauflänge bis ins Freie und die Betriebsweise bei gleichzeitig genutztem Saal und Vereinsraum an. Der Bauherr soll bestätigen, wie die höchstens 120 anwesenden Personen einschließlich Helfern erfasst werden. Die Rampe muss auch während Veranstaltungen frei bleiben. Im bisherigen Grundriss ist der nördliche Ausgang dargestellt; die Möblierung vor diesem Ausgang ist nicht eingetragen.

Reichen Sie außerdem eine Zuordnung der Raumbezeichnungen zwischen Grundriss und Baubeschreibung nach. Änderungen der Kubatur sind nach heutigem Bearbeitungsstand nicht verlangt. Bitte verwenden Sie für die Ergänzung die vorhandene Projektnummer, damit die Unterlagen dem Antrag zugeordnet werden können. Vor Erteilung der Genehmigung darf nicht mit der beantragten Baumaßnahme begonnen werden. Es sind keine Dateien an diese Nachricht angehängt.

Mit freundlichen Grüßen
Klara Brandes, im Auftrag
Stadt Einbeck · Bauaufsicht
Teichenweg 1 · 37574 Einbeck
bauaufsicht@einbeck.de

Anlagen: keine

Von	"Maren Döring", Vorsitzende <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de>
An	"Lena Hartwig", Architektin <projekt@hartwig-architektur.de>
Datum	Thu, 28 Apr 2022 09:24:00 +0200
Betreff	BH-21-04 / Abruf weiterer Planung und Überwachung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Eingang der Baugenehmigung vom 17.03.2022 rufen wir die im Vertrag vom 18.01.2021 vereinbarten Leistungsphasen 5 bis 9 ab. Die Vergütung richtet sich unverändert nach diesem Vertrag. Herr Feldmann stimmt diesem Abruf als zweites vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied zu. Der verfügbare Gesamtrahmen bleibt bei 430.000,00 EUR brutto.

Bitte führen Sie die Ausführungsplanung einschließlich Rampenanschluss, Rinne und Sockelübergang fort. Den Rahmenterminplan vom 25.04.2022 bestätigen wir als Abstimmungsgrundlage. Die Veranstaltung im Oktober 2022 bleibt unangetastet. Die Angebote sollen erst im Frühjahr 2023 eingeholt werden; die aktuelle Kostenberechnung ersetzt dafür keine Marktpreise.

Die Tragwerksunterlagen müssen vor den tragenden Arbeiten bei der Bauaufsicht vorliegen. Bitte erinnern Sie uns vor Ausschreibung nochmals an die Leitungssuche. Wir haben bisher nur die beiden Suchschlitze bezahlt, keine flächige Ortung. Das Haus wird ab dem 21.08.2023 vollständig für die Bauarbeiten geräumt. Im Anhang befinden sich die Genehmigung und der bestätigte Rahmenterminplan. Die Vergabevollmacht verbleibt beim Vorstand.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Döring, Vorsitzende
Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Anlagen: 17_2022-03-17_Baugenehmigung.pdf; 19_2022-04-25_Rahmenterminplan.xlsx

29_2023-08-14_Vereinsraumnutzung.eml

Von	"Maren Döring", Vorsitzende <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de>
An	"Lena Hartwig", Architektin <projekt@hartwig-architektur.de>
Datum	Mon, 14 Aug 2023 09:24:00 +0200
Betreff	BH-21-04 / Neue Anfrage zur Nutzung des Vereinsraums

Sehr geehrte Damen und Herren,

der örtliche Bewegungskreis fragt an, ob er den Vereinsraum nach Wiedereröffnung an zwei Vormittagen in der Woche für Gymnastik nutzen kann. Gedacht ist an zwölf Teilnehmerinnen und eine Übungsleiterin, ohne Musikverstärker. Im ursprünglichen Konzept stand nur Besprechungsnutzung. Eine Zusage haben wir dem Kreis noch nicht erteilt.

Herr Winter hält den bisherigen Boden für zu hart und schlägt einen elastischen Belag vor. Außerdem sollen die Schränke in das neue Lager. Bitte sagen Sie uns, ob dies Änderungen an Raumakustik, Lüftung, Rettungswegen oder dem genehmigten Nutzungskonzept auslöst. Die bisherige Grenze von 120 Personen insgesamt möchten wir nicht überschreiten. Wir wünschen noch keine Ausführung zusätzlicher Leistungen.

Herr Feldmann möchte zunächst eine belastbare Kostenangabe und die Rückmeldung der Bauaufsicht. Der Bauantrag und die Ergänzung BS-02 sind dafür maßgeblich. In der nächsten Baubesprechung soll geklärt werden, ob der geplante Boden auch bei unveränderter Besprechungsnutzung genügt. Die neue Nutzung darf nicht als bereits freigegeben in die Bestellung der Ausbauarbeiten eingehen. Bitte führen Sie diesen Wunsch getrennt von den jetzt laufenden Rohbauarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Döring, Vorsitzende
Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Anlagen: keine

34_2023-09-15_Nachtragsauftrag.eml

Von	"Maren Döring", Vorsitzende <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de>
An	"Torsten Albrecht", Bauleiter <bauleitung@leinebau-hochbau.de>
Datum	Fri, 15 Sep 2023 09:24:00 +0200
Betreff	BH-21-04 / Auftrag N01 ohne Gerätebereitschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Döring und Herr Feldmann bestätigen gemeinsam den Auftrag für die Positionen N01.1 bis N01.4 Ihres Angebots vom 12.09.2023 mit 3.706,00 EUR netto zuzüglich 704,14 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 4.410,14 EUR brutto. Bitte führen Sie die Umlegung wie angeboten am 18. und 19.09.2023 aus und dokumentieren Sie den neuen Verlauf vor Verfüllung.

Die Position N01.5 über 1.240,00 EUR netto beauftragen oder anerkennen wir nicht. Frau Hartwig prüft hierzu noch die Tagesberichte und die Einsatzmöglichkeiten im Bestandsbereich. Herr Winter berichtet, dass am 06.09.2023 weiter abgebrochen wurde. Daraus ziehen wir heute noch keine abschließende Aussage über Ihren Geräteeinsatz. Bitte legen Sie die Einsatzaufzeichnungen vor.

Der Auftrag umfasst keine Änderung der Vereinsraumnutzung. Zusätzliche Leitungsgrabenmengen dürfen nicht zugleich als Fundamentaushub abgerechnet werden. Die Bauleitung darf die Maße und den technischen Anschluss kontrollieren; eine darüber hinausgehende Vergütungszusage ist damit nicht verbunden. Im Anhang befindet sich das vollständige Nachtragsangebot als Bezug. Die nicht bestätigte Geräteposition bleibt sichtbar und wurde von uns nicht aus Ihrer Datei entfernt.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Döring, Vorsitzende

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Anlagen: 33_2023-09-12_Nachtragsangebot.pdf

41_2026-09-08_Mängelmeldung.eml

Von	"Maren Döring", Vorsitzende <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de>
An	"Lena Hartwig", Architektin <projekt@hartwig-architektur.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 09:24:00 +0200
Betreff	BH-21-04 / Feuchteflecken und Wasser am Eingang

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Vorbereitung des Seniorennachmittags am 07.09.2026 hat Herr Winter erneut abblätternde Farbe und einen feuchten Rand an der nördlichen Saalwand festgestellt. Betroffen ist die Ecke links vom Fenster, nicht der neue Technikraum. Das beigefügte Foto wurde von Herrn Winter gestern um 10:18 Uhr aufgenommen. Es zeigt die zugängliche Oberfläche; wir haben den Putz nicht geöffnet.

Außerdem blieb nach dem Regen vom 04.09.2026 Wasser unmittelbar vor der Eingangstür stehen. Die Rinne war am 03.09.2026 gereinigt worden, allerdings gibt es dazu nur den Kalendereintrag des Hauswarts. Beim Kehren ist ihm aufgefallen, dass der Rost am letzten Element etwas tiefer liegt. Ob sich das Pflaster abgesenkt hat oder die Rinne selbst, können wir nicht sagen.

Bitte nehmen Sie diese Punkte im Rahmen der vereinbarten Objektbetreuung auf und laden Sie Leinebau zur Begehung ein. Die Feuchte im Altbau war schon vor dem Umbau ein Thema; für uns ist unklar, ob sie mit dem neuen Anschluss zusammenhängt. Der Vereinsraum wird weiter nur für Besprechungen genutzt. Eine Forderungssumme können wir derzeit nicht nennen. Die Veranstaltungen laufen mit freigehaltenem Wandbereich weiter; bei erneutem Wassereintritt sperrt Herr Winter den betroffenen Zugang und informiert uns.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Döring, Vorsitzende
Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Anlagen: 42_2026-09-07_Feuchte_Saalnordwand.png

49_2026-09-28_Rueckfragen_Geraetebereitschaft.eml

Von	Lena Hartwig <projekt@hartwig-architektur.example>
An	Torsten Albrecht <bauleitung@leinebau-hochbau.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 10:20:00 +0200
Betreff	BH-21-04 Gerätebereitschaft und ergänzender Rechnungsabgleich

Sehr geehrter Herr Albrecht,

vielen Dank für Ihre Erläuterung vom 24.09.2026 (Datei 47). Die drei Bestandteile ergeben rechnerisch 620,00 EUR je Tag. Die Rechnung beantwortet noch nicht, welcher Anteil zusätzlich entstanden ist und welcher Teil auf tatsächlich geleistete Sicherungs- oder Rückbauarbeiten entfällt. Bitte reichen Sie die vorhandenen Lohnstundenaufzeichnungen, den Geräteeinsatzkalender und die Grundlage des Vorhaltungssatzes nach. Nicht vorhandene Aufzeichnungen kennzeichnen Sie bitte ausdrücklich.

In der Datei 48 steht die Ausgangsprüfung weiterhin bei 0,00 EUR für N01.5. Das bedeutet, dass der Betrag bisher nicht freigegeben ist. Es ist keine neue abschließende Zurückweisung. Eine Eingabe von 50 Prozent ergäbe 620,00 EUR netto und 737,80 EUR brutto zusätzlich; dies wäre lediglich ein Rechenszenario. Der Vorstand hat einen solchen Vergleich nicht beschlossen.

Der Grundauftrag ergibt nach AM-07 weiterhin 110.447,80 EUR netto. Mit den beauftragten Nachtragsleistungen sind es 114.153,80 EUR netto. Der historische Vorschlag nach Abschlägen beträgt 52.543,02 EUR brutto. Bitte nennen Sie den seit März 2024 tatsächlich eingegangenen Schlusszahlungsbetrag und senden Sie einen zuordenbaren Zahlungsnachweis. Unsere Projektmappe enthält dazu keine Bestätigung.

Die Mängeluntersuchung führen wir als eigenen Vorgang. Die Höhe des Zahlungsansatzes legt die Ursache der aktuellen Erscheinungen nicht fest.

Mit freundlichen Grüßen
Lena Hartwig

Anlagen: keine. Die genannten Dateien liegen als eigenständige Unterlagen in der Projektmappe.

55_2026-10-06_Vorstand_Untersuchungsumfang.eml

Von	Maren Döring <vorstand@buergerhaus-leinewinkel.example>
An	Lena Hartwig <projekt@hartwig-architektur.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:20:00 +0200
Betreff	BH-21-04 Umfang der Untersuchung und noch fehlende Unterlagen

Sehr geehrte Frau Hartwig,

Herr Feldmann und ich haben Ihre Ergänzungen und das Angebot von Leinebau gelesen. Wir haben heute weder die Wahlposition zur Öffnung noch die Pauschale für die Untersuchung beauftragt. Bitte klären Sie zunächst, wer die Grundstücksleitung aus dem Los Außenanlagen vertritt und ob dessen Teilnahme zusätzliche Kosten verursacht. Den 09.10.2026 können wir deshalb noch nicht als gemeinsamen Termin bestätigen.

Uns ist nach Ihrer Tabelle klarer, weshalb die vier Kubikmeter Leitungsgraben nicht nochmals in den 66 Kubikmetern Fundamentaushub stehen. Das ursprüngliche Blatt vor Betonage haben wir im Vereinsordner noch nicht gefunden. Herr Feldmann sucht am Donnerstag weiter. Die Mengen unterschreiben wir heute nicht neu.

Zur Gerätebereitschaft enthält die Erklärung des Bauleiters weiterhin keine getrennten Stunden. Wir stimmen dem angesprochenen Ansatz von 50 Prozent derzeit nicht zu. Die Suche nach den Kontoauszügen über die Schlusszahlung läuft bei unserer früheren Kassenwartin. Bitte behandeln Sie den Betrag aus 2024 daher weiterhin als damaligen Prüfungsvorschlag, nicht als festgestellten heutigen Rückstand.

In der Honorarübersicht ist bei Phase 8 eine offene Belegfrage vermerkt, obwohl der rechnerische Anteil vollständig angesetzt ist. Wir möchten im Gespräch verstehen, welche Unterlagen dazu fehlen und ob der Eintrag im Übergabeprotokoll zur Nachkontrolle ausreicht. Die Existenz der Tabelle bedeutet keine Zustimmung zu einem Leistungsgrad. Die gesonderte Abnahme der Architektenleistungen ist im heute durchgesehenen Ordner nicht auffindbar.

Herr Winter hält den Wandbereich frei und protokolliert neue Wasserbeobachtungen. Bitte schicken Sie uns nach der Abstimmung einen klar begrenzten Untersuchungsvorschlag mit Gesamtpreis und Teilnehmern. Eine Bauteilöffnung soll erst nach einer gesonderten Entscheidung erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Döring

für den Vorstand des Bürgerhauses Leinewinkel e.V.

Anlagen: keine. Die genannten Dateien liegen als eigenständige Unterlagen in der Projektmappe.

30_2024-03-18_Bautagebuch.csv

Datum	Witterung	Beschäftigte Los 1	Tagesbericht BH-21-04	Aufgenommen und gezeichnet
2023-08-21	trocken 22 Grad	5	Baustelle eingerichtet; Haus geräumt. Zaun und Staubschutz kontrolliert. Keine Veranstaltung im Haus.	Hartwig / Albrecht
2023-08-22	trocken 23 Grad	5	Rückbau Boden und Einbauten begonnen. Saalsockel unverändert fleckig. Keine Putzfreigabe erteilt.	Hartwig
2023-08-24	bewölkt 21 Grad	4	Suchbereiche an Nordwand markiert. Flächige Ortung noch nicht dokumentiert. Hauswart will Altunterlagen beschaffen.	Hartwig / Winter
2023-08-28	leichter Regen 18 Grad	5	Aushub Ostfundament begonnen. Graben gegen Oberflächenwasser gesichert. Keine Leitung an den beiden Suchstellen sichtbar.	Albrecht
2023-09-05	trocken 20 Grad	5	Leitung im Westgraben 08:10 freigelegt. Aushub dort angehalten. Zwei Beschäftigte in Rückbau umgesetzt; drei im Grabenbereich mit Sicherung und Klärung.	Hartwig / Albrecht
2023-09-06	trocken 23 Grad	5	Bagger am Westgraben nicht eingesetzt. Fahrer bei Sicherung und Materialtransport. Zwei Facharbeiter im Saalrückbau. Einzelne Stillstandsstunden nicht getrennt erfasst.	Albrecht

Datum	Witterung	Beschäftigte Los 1	Tagesbericht BH-21-04	Aufgenommen und gezeichnet
2023-09-07	trocken 24 Grad	4	Beton für Westabschnitt abbestellt. Innenrückbau fortgesetzt. Gerät auf Baustelle. Stundenliste zur Bereitschaft noch angefordert.	Hartwig
2023-09-11	trocken 22 Grad	3	Leitung durch Wasserprobe dem Nebengebäude zugeordnet. Hauswart bestätigt privaten Pumpenstrang. Noch keine Umlegung begonnen.	Hartwig / Winter
2023-09-15	bewölkt 19 Grad	4	Auftrag N01.1 bis N01.4 vom Vorstand eingegangen. Geräteposition ausdrücklich nicht bestätigt. Materialabruf für Montag.	Hartwig / Albrecht
2023-09-18	Regen 17 Grad	4	Zusätzlichen Leitungsgraben geöffnet. Menge 4 m³ separat aufgenommen. Keine Vermischung mit Fundamentaushub.	Albrecht
2023-09-19	trocken 18 Grad	4	14 m Rohrleitung umgelegt; Anschlussarbeiten zwei Personen je acht Stunden. Sicht- und Durchlaufprobe ohne Auffälligkeit.	Hartwig / Albrecht
2023-09-20	trocken 18 Grad	5	Gründungsabschnitt vor Betonage kontrolliert. Fundamentvolumen 25,2 m³. Standsicher- heitsunterlagen liegen laut Vorlagebestätigung vom 17.08.2023 bei Bauaufsicht.	Hartwig / Steinbach

Datum	Witterung	Beschäftigte Los 1	Tagesbericht BH-21-04	Aufgenommen und gezeichnet
2023-10-03	trocken 15 Grad	3	Sockelabdichtung im freigelegten Bereich 42 m². Schutzlage abschnittsweise sichtbar. Anschluss an Türbereich noch offen. Innenputz noch nicht begonnen.	Hartwig / Albrecht
2023-10-12	bewölkt 14 Grad	5	Mauerwerk Anbau begonnen. Erste Abschlagszahlung 35.700 EUR brutto laut Vereinsbestätigung eingegangen.	Albrecht
2023-11-02	Regen 11 Grad	4	Dachtragwerk und Anschlüsse zum Bestand kontrolliert. Bewegungsfuge vorhanden. Dachabdichtung wegen Regen verschoben.	Hartwig
2023-11-08	trocken 10 Grad	4	Dachabdichtung abgeschlossen. Durchdringungen sichtbar geprüft. Regenwasseranschluss noch provisorisch.	Hartwig / Albrecht
2023-11-15	trocken 8 Grad	3	Außentüren aufgemessen. Rinnenhöhe nach D-12 besprochen. TGA-04 nicht als Gebäudeplan freigegeben.	Hartwig / Albrecht
2023-12-04	Frost 0 Grad	3	Außenarbeiten ruhen; Installationen innen fortgesetzt. Gebäudebeheizung provisorisch. Wandfeuchte nicht als Masseprozent bestimmt.	Albrecht
2023-12-18	bewölkt 5 Grad	3	Zweite Abschlagszahlung 47.600 EUR brutto bestätigt. Rinnenmaterial eingelagert. Innenputzbereich trocken erscheinend.	Albrecht

Datum	Witterung	Beschäftigte Los 1	Tagesbericht BH-21-04	Aufgenommen und gezeichnet
2024-01-16	trocken 4 Grad	4	Innenputz im Saal erneuert. Relative Sockelanzeige 57 bis 64, obere Vergleichsstelle 33 bis 37. Keine Laborprobe beauftragt.	Hartwig / Albrecht
2024-02-06	bewölkt 8 Grad	4	Rampe und Anschlussstreifen hergestellt. Höhen vor Einbau Rinne besprochen; gesondertes Nivellementblatt nicht in Tagesmappe.	Albrecht
2024-02-16	trocken 10 Grad	3	Schlussaufmaß AM-07 gemeinsam aufgenommen. Rinne 9,4 m; Rampenfläche 21,45 m² einschließlich Anschlussstreifen. Keine Anerkennung von N01.5.	Hartwig / Albrecht
2024-02-29	trocken 9 Grad	2	Rinnenanschluss und Türen eingebaut. Durchlauf mit Wasser ohne sichtbaren Rückstau bei diesem Versuch. Menge und Dauer nicht notiert.	Albrecht
2024-03-11	bewölkt 11 Grad	2	Rechnungsprüfung abgeschlossen. Geräteposition 1.240 EUR netto weiterhin ungeklärt. Einstellarbeiten an T-03 offen.	Hartwig
2024-03-15	trocken 13 Grad	2	Fertigmeldung Los 1. Gemeinsame Abnahme für 18.03. vereinbart. Keine Behinderung mehr angezeigt.	Albrecht
2024-03-18	trocken 12 Grad	2	Förmliche Abnahme Los 1 mit M-01 und M-02. Kein Berechnungsversuch. Saalwand optisch ohne neue Ablösung.	Hartwig / Döring / Albrecht

BAUPLAN / BH-21-04 Bürgerhaus Einbeck

Planstandportal

Projektordner > Gebäude > freigegebene Pläne

Aufnahme: 07.03.2023, 16:42 Angemeldet: Lena Hartwig

Datei / Planstand	Revision	Status	Datum
AP-01 Gebäude Erdgeschoss	00	Freigegeben	02.06.2022
D-12 Rampenanschluss	00	Freigegeben	06.06.2022
TGA-04 Leitungen Hof	04	Zur Koordination	07.03.2023
G-01 Bauzeichnung	01	Genehmigungsstand	20.01.2022

Details zu TGA-04 / Revision 04

Hochgeladen von Paul Mertens am 07.03.2023 um 15:58.

Kommentar: Leitungsstützen geändert. Höhenbezug Eingang noch abstimmen.

Planvermerk: Rinne 112,40 m. D-12 nennt Rost 112,38 m.

Freigabe Objektplanung: ausstehend. Keine Ablösung von D-12.

Verteiler: Hartwig, Vorstand. Leinebau noch nicht in diesem Ordner.

Bilddatei: 22_2023-03-07_Planstandportal.png

BAUPLAN / BH-21-04 Bürgerhaus Einbeck

Baustellengruppe Bürgerhaus

6. September 2023 / 5 Teilnehmende / Export 18:10

08:12 · Torsten Albrecht

Leitung ist noch nicht zugeordnet. Im Westgraben bleibt der Bagger stehen.
Die beiden Leute gehen heute erst einmal in den Rückbau.

08:31 · Ralf Winter

Die Leitung müsste von der alten Pumpe kommen. Ich suche den Schlüssel
zum Nebengebäude. Bitte noch nichts abtrennen.

09:05 · Lena Hartwig

Bitte Stunden und Gerätestand getrennt dokumentieren. Der Vorstand muss
die Umlegung freigeben. Ich habe dafür keine Auftragsvollmacht.

11:42 · Torsten Albrecht

Im TGA-Blatt 04 steht die Rinne bei 112,40. Ich habe D-12 noch mit 112,38.
Welcher Plan geht an den Polier?

12:08 · Lena Hartwig

D-12 bleibt freigegeben. TGA-04 ist nur zur Koordination eingestellt.
Die Anschlusslage prüfen wir zusammen vor dem Einbau.

Bilddatei: 32_2023-09-06_Bauleiterchat.png

42_2026-09-07_Feuchte_Saalnordwand.png



Bilddatei: 42_2026-09-07_Feuchte_Saalnordwand.png

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

09_2021-06-14_Kostenberechnung.xlsx

Kostenberechnung Gebäude und Projekt

Hartwig Architektur · an den Vorstand · 14.06.2021 · BH-21-04

Leistungsbereich	Menge	Einheit	Ansatz netto EUR	Netto EUR	Brutto EUR	Beleg / Herleitung
Bestandumbau	216	m²	340.00	73,440.00	87,393.60	04 / Bestandsfläche × Ansatz Juni 2021
Anbau	80	m²	1,150.00	92,000.00	109,480.00	07 / Anbaugrundfläche × Ansatz Juni 2021
Rampe mit Podest	1	psch	4,500.00	4,500.00	5,355.00	07 / örtlicher Ansatz für Gesamtanlage
Technische Anlagen	296	m²	250.00	74,000.00	88,060.00	10 / Abstimmung Mertens
Außenanlagen	300	m²	70.00	21,000.00	24,990.00	01 / Bedarf und 10 / Abstimmung
Bewegliche Ausstattung	1	psch	12,000.00	12,000.00	14,280.00	01 / Raumprogramm
Architektur und Nebenkosten	1	psch	54,000.00	54,000.00	64,260.00	02 / individuell vereinbartes Honorar
Untersuchung und Vermessung	1	psch	4,500.00	4,500.00	5,355.00	03 / Untersuchungsbedarf
Gebührenansatz	1	psch	1,800.00	1,800.00	2,142.00	10 / Planungsansatz, ohne Umsatzsteuer
Kostenstand netto				337,240.00	401,315.60	

Steuerpauschale Kostenplanung 19.0%

Kostenberechnung Gebäude und Projekt

Hartwig Architektur · an den Vorstand · 14.06.2021 · BH-21-04

Leistungsbereich	Menge	Einheit	Ansatz netto EUR	Netto EUR	Brutto EUR	Beleg / Herleitung
Finanzrahmen brutto					430,000.00	
Abstand zum Finanzrahmen					28,684.40	
Vergleich Schätzung 18.03.2021				322,000.00	383,180.00	05 / Variante 1
Mehrkosten seit Vorplanung				15,240.00	18,135.60	

Stand: frühe Kostenplanung, keine Rechnungssteuer.

Auf Gebühren ist hier vorsorglich die Steuerpauschale enthalten.

Die spätere Kostenfeststellung behandelt Gebühren ohne Umsatzsteuer.

gez. Lena Hartwig · Bezug: Entwurf E-01 · Anlagen: keine

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

19_2022-04-25_Rahmenterminplan.xlsx

Rahmenterminplan Bürgerhaus

Hartwig Architektur · an Vorstand und Fachplaner · 25.04.2022 · BH-21-04

Vorgang	Start	Dauer Tage	Ende	Abstand Tage	Zuständig	Grundlage
Ausführungsplanung	2022-05-02	36	2022-06-06		Hartwig	18 / Abruf, Ziel 06.06.2022
Vereinsveranstaltungen	2022-06-07	242	2023-02-03	0	Vorstand	01 / Nutzung bis Winter 2022
Vergabeunterlagen	2023-02-06	31	2023-03-08	2	Hartwig	18 / Abruf
Angebotsfrist	2023-03-09	27	2023-04-04	0	Vorstand	Vergabeplanung, 04.04.2023
Prüfung und Zuschlag	2023-04-05	14	2023-04-18	0	Hartwig / Vorstand	Vorgesehener Zuschlag 18.04.2023
Bauvorbereitung	2023-04-19	124	2023-08-20	0	Vorstand / Firmen	Räumung bis 20.08.2023
Rückbau und Gründung	2023-08-21	40	2023-09-29	0	Los 1	Vertragstermin noch anzubieten
Hülle und Dach	2023-09-30	61	2023-11-29	0	Los 1	Anschluss nach Gründung
Technik und Innenausbau	2023-11-30	91	2024-02-28	0	Fachfirmen	Abstimmung mit Gebäudeplanung
Restarbeiten Los 1	2024-02-29	16	2024-03-15	0	Los 1	Ziel Fertigstellung 15.03.2024

Rahmenterminplan Bürgerhaus

Hartwig Architektur · an Vorstand und Fachplaner · 25.04.2022 · BH-21-04

Vorgang	Start	Dauer Tage	Ende	Abstand Tage	Zuständig	Grundlage
Abnahmen und Einweisung	2024-03-16	20	2024-04-04	0	Vorstand / Firmen	Gewerke einzeln abnehmen
Übergabe	2024-04-05	1	2024-04-05	0	Vorstand / Hauswart	Nutzungsbeginn nach Freigaben
Objektbetreuung Begehung	2026-09-01	30	2026-09-30	878	Hartwig	02 / Vertrag; Termin noch abzustimmen

Kalendertage einschließlich Beginn und Ende; keine Werktagsannahme.

Starts sind abgestimmte Meilensteine; Verschiebungen nicht automatisch freigegeben.

Abstand negativ: Überschneidung. Abstand positiv: geplanter Zwischenraum.

gez. Lena Hartwig · Anlagen: keine · Stand ohne spätere Ist-Daten

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

24_2023-03-08_Bepreistes_LV.xlsx

Bepreistes Leistungsverzeichnis Los 1

Hartwig Architektur · interne Kostenkontrolle an den Vorstand · 08.03.2023

Position und Leistung	Menge	Einheit	EP netto EUR	Gesamt netto EUR	Quelle	Mengenbasis
2.1 Baustelleneinrichtung	1.00	psch	8,500.00	8,500.00	23 / Position 1	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.2 Selektiver Rückbau	216.00	m²	38.00	8,208.00	23 / Position 2	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.3 Fundamentaushub	60.00	m³	85.00	5,100.00	23 / Position 3	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.4 Streifenfundamente	24.00	m³	310.00	7,440.00	23 / Position 4	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.5 Bodenplatte Anbau	80.00	m²	145.00	11,600.00	23 / Position 5	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.6 Außenmauerwerk Anbau	95.00	m²	128.00	12,160.00	23 / Position 6	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.7 Abdichtung Bestandssockel	36.00	m²	185.00	6,660.00	23 / Position 7	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.8 Innenputz Bestand	144.00	m²	48.00	6,912.00	23 / Position 8	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.9 Dach Anbau	80.00	m²	245.00	19,600.00	23 / Position 9	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.10 Außentüren	3.00	St	2,450.00	7,350.00	23 / Position 10	AP-01 / örtlicher Ansatz
2.11 Zugangsrampe	20.25	m²	240.00	4,860.00	23 / Position 11	12 × 1,5 + 1,5 × 1,5
2.12 Entwässerungsrinne	9.00	m	155.00	1,395.00	23 / Position 12	AP-01 / örtlicher Ansatz

Bepreistes Leistungsverzeichnis Los 1

Hartwig Architektur · interne Kostenkontrolle an den Vorstand · 08.03.2023

Position und Leistung	Menge	Einheit	EP netto EUR	Gesamt netto EUR	Quelle	Mengenbasis
Los 1 netto				99,785.00		
Umsatzsteuer	19.0%			18,959.15		
Los 1 brutto				118,744.15		

Baukonstruktion Kostenberechnung	169,940.00	09 / Bestand, Anbau und Rampe
Für übrige Baukonstruktion verfügbar	70,155.00	

Rest betrifft Fenster und weitere Ausbauleistungen, nicht eine Baureserve.

Einheitspreise sind Planeransätze März 2023, keine Unternehmerangebote.

gez. Lena Hartwig · Bezug BH-21-04 · Anlagen: LV 08.03.2023

37_2024-04-08_Kostenfeststellung.xlsx

Prüfung Schlussrechnung Los 1

Kostenabschluss 08.04.2024 · Prüfung 11.03.2024 · LB-240301, Zugang 04.03.2024

Position	Menge	EP netto EUR	Verlangt EUR	Geprüft EUR	Differenz EUR	Beleg / Befund
2.1 Baustelleneinrichtung	1	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.2 Selektiver Rückbau	216	41.00	8,856.00	8,856.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.3 Fundamentaushub	66	92.00	6,072.00	6,072.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.4 Streifenfundamente	25.2	330.00	8,316.00	8,316.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.5 Bodenplatte Anbau	80	152.00	12,160.00	12,160.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.6 Außenmauerwerk Anbau	98	135.00	13,230.00	13,230.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.7 Abdichtung Bestandssockel	42	205.00	8,610.00	8,610.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.8 Innenputz Bestand	150	52.00	7,800.00	7,800.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.9 Dach Anbau	80	268.00	21,440.00	21,440.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.10 Außentüren	3	2,590.00	7,770.00	7,770.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.11 Zugangsrampe	21.45	260.00	5,577.00	5,577.00		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
2.12 Entwässerungsrinne	9.4	172.00	1,616.80	1,616.80		0.00 35 / AM-07; 25 / Angebot
N01.1 Rohrleitung	14	145.00	2,030.00	2,030.00		0.00 33 / Angebot; 34 / Auftrag
N01.2 Zusatzgraben	4	92.00	368.00	368.00		0.00 33 / Angebot; 34 / Auftrag
N01.3 Abtransport	1	380.00	380.00	380.00		0.00 33 / Angebot; 34 / Auftrag
N01.4 Anschlussstunden	16	58.00	928.00	928.00		0.00 33 / Angebot; 34 / Auftrag
N01.5 Gerätebereitschaft	2	620.00	1,240.00	0.00	1,240.00	34 / nicht bestätigt; Nachweise offen

Prüfung Schlussrechnung Los 1

Kostenabschluss 08.04.2024 · Prüfung 11.03.2024 · LB-240301, Zugang 04.03.2024

Position	Menge	EP netto EUR	Verlangt EUR	Geprüft EUR	Differenz EUR	Beleg / Befund
Gesamt netto			115,393.80	114,153.80	1,240.00	
Umsatzsteuer	19.0%		21,924.82	21,689.22	235.60	
Gesamt brutto			137,318.62	135,843.02	1,475.60	
Gezahlt 12.10.2023 brutto			35,700.00			36 / vereinnahmter Abschlag
Gezahlt 18.12.2023 brutto			47,600.00			36 / vereinnahmter Abschlag
Offener Rechnungsbetrag			54,018.62	52,543.02	1,475.60	

N01.5 nicht freigegeben. Kein abschließender Anspruchsausschluss.

Zahlungsvorschlag ohne Mängelrechte oder Abnahme vorwegzunehmen.

gez. Lena Hartwig · Anlagen: Schlussrechnung und Aufmaß

Kostenfeststellung zum 08.04.2024

Hartwig Architektur · an Vorstand · Objektbetreuung und Streitbetrag getrennt ausgewiesen.

Leistung	Netto EUR	Steuersatz	Brutto EUR	Status	Quelle
Los 1 schlussgeprüft	114,153.80	19%	135,843.02	Schlussrechnung geprüft	Rechnung!E24
Heizung und Sanitär	54,200.00	19%	64,498.00	Schlussrechnung MI-240322	40 / Abrechnungsregister
Elektro	27,400.00	19%	32,606.00	Schlussrechnung LP-240325	40 / Abrechnungsregister
Fenster und Ausbau	61,800.00	19%	73,542.00	Schlussrechnung WW-240327	40 / Abrechnungsregister
Außenanlagen	23,600.00	19%	28,084.00	Schlussrechnung HR-240402	40 / Abrechnungsregister
Bewegliche Ausstattung	12,900.00	19%	15,351.00	Rechnung RG-240402	40 / Abrechnungsregister
Architektur erbrachter Anteil	53,040.00	19%	63,117.60	Ohne offene Objektbetreuung	02 und 40 / 54.000 abzüglich 960
Untersuchung und Vermessung	4,650.00	19%	5,533.50	Abgerechneter Stand	40 / VM-210210 und VM-230817
Gebühren	1,780.00	0%	1,780.00	Ohne Umsatzsteuer	40 / Gebührenregister
Festgestellter Kostenstand	353,523.80		420,355.12		

Kostenfeststellung zum 08.04.2024

Hartwig Architektur · an Vorstand · Objektbetreuung und Streitbetrag getrennt ausgewiesen.

Leistung	Netto EUR	Steuersatz	Brutto EUR	Status	Quelle
Offene Objektbetreuung		960	0.19	1,142.40	
Finanzrahmen brutto			430,000.00		
Abstand einschließlich Betreuung			8,502.48		
Streitbetrag zusätzlich brutto			1,475.60		
Kosten mit Betreuung und Streit			422,973.12		

Stand nach Bauausführung; strittige Vergütung nicht als anerkannt behandelt.

Andere Gewerke nach Register R-01, Einzelbelege beim Verein.

Eine Zahlung oder Abnahme wird durch diesen Stand nicht bestätigt.

gez. Lena Hartwig · Bezug BH-21-04 · Anlagen: keine

48_2026-09-25_Aufmass_und_Rechnungsabgleich.xlsx

Aufmaß und Schlussrechnung Los 1

Hartwig Architektur · 25.09.2026 · Fortführung zu 35, 36 und 37

Position	Menge laut Rechnung	AM 07 Menge	EP netto EUR	Verlangt EUR	Prüfansatz EUR	Differenz EUR	Beleg
2.1 Einrichtung	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.2 Rückbau	216.00	216.00	41.00	8,856.00	8,856.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.3 Aushub	66.00	66.00	92.00	6,072.00	6,072.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.4 Fundamente	25.20	25.20	330.00	8,316.00	8,316.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.5 Bodenplatte	80.00	80.00	152.00	12,160.00	12,160.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.6 Mauerwerk	98.00	98.00	135.00	13,230.00	13,230.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.7 Sockel	42.00	42.00	205.00	8,610.00	8,610.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.8 Innenputz	150.00	150.00	52.00	7,800.00	7,800.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.9 Dach	80.00	80.00	268.00	21,440.00	21,440.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.10 Türen	3.00	3.00	2,590.00	7,770.00	7,770.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
2.11 Rampe	21.45	21.45	260.00	5,577.00	5,577.00	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung

Position	Menge laut Rechnung	AM 07 Menge	EP netto EUR	Verlangt EUR	Prüfansatz EUR	Differenz EUR	Beleg
2.12 Rinne	9.40	9.40	172.00	1,616.80	1,616.80	0.00	25 / Preis; 35 / Menge; 36 / Rechnung
N01.1 Leitung	14.00	14.00	145.00	2,030.00	2,030.00	0.00	33, 34 und 35
N01.2 Graben	4.00	4.00	92.00	368.00	368.00	0.00	33, 34 und 35
N01.3 Abtransport	1.00	1.00	380.00	380.00	380.00	0.00	33, 34 und 35
N01.4 Anschluss	16.00	16.00	58.00	928.00	928.00	0.00	33, 34 und 35
N01.5 Bereitschaft	2.00	nicht bestätigt	620.00	1,240.00	0.00	1,240.00	33 und 47; 34 ohne Freigabe
Gesamt netto				115,393.80	114,153.80		
Umsatzsteuer				21,924.82	21,689.22		
Gesamt brutto				137,318.62	135,843.02		
Nach bekannten Abschlägen				54,018.62	52,543.02	1,475.60	

Rest nach späterer Zahlung

Zahlungsbeleg fehlt

1 Lesen: Verlangt folgt Rechnung 36. Prüfansatz folgt AM-07 und dem Anteil auf Prüfannahmen.

2 Ausgangsstand: 114.153,80 EUR netto geprüft; N01.5 mit 1.240,00 EUR netto weiter streitig.

3 F30 ist ein historischer Prüfungsvorschlag. F32 bleibt bis zum späteren Zahlungsnachweis offen.

Änderungen in Mengen oder Prüfannahmen wirken auf die Berechnung, nicht auf die alten Originale.

Mengenherleitung aus AM 07

Übertragung vom 23.09.2026 (46). Keine neue Vermessung verdeckter Bauteile.

Position	Basis	Faktor	Zusatz	AM 07 Menge	Einheit	Quelle und Grenze
2.1 Einrichtung	1.00	1.00	0.00	1.00	psch	35, AM-07; eine Pauschale.
2.2 Rückbau	18.00	12.00	0.00	216.00	m²	35, AM-07: 18,00 × 12,00 m.
2.3 Aushub	60.00	1.00	6.00	66.00	m³	35 und 46: ohne 4 m³ N01.2. Geometrisches Einzelblatt fehlt.
2.4 Fundamente	24.00	1.00	1.20	25.20	m³	35 und 46: verdeckte Verbreiterung übernommen.
2.5 Bodenplatte	10.00	8.00	0.00	80.00	m²	35: Anbau 10,00 × 8,00 m.
2.6 Mauerwerk	95.00	1.00	3.00	98.00	m²	35: Grund- und Zusatzfläche; Öffnungen gemäß LV abgezogen.
2.7 Sockel	36.00	1.00	6.00	42.00	m²	35: Feststellung vor Verfüllung am 03.10.2023.
2.8 Innenputz	144.00	1.00	6.00	150.00	m²	35: Zusatzfläche ohne neue Schadenszuordnung.
2.9 Dach	10.00	8.00	0.00	80.00	m²	35: Anbau 10,00 × 8,00 m.

Position	Basis	Faktor	Zusatz	AM 07 Menge	Einheit	Quelle und Grenze
2.10 Türen	3.00	1.00	0.00	3.00	St	35: drei Außentüren.
2.11 Rampe	12.00	1.50	3.45	21.45	m²	35 und 46: Läufe, Zwischenpodest und Anschlussstreifen.
2.12 Rinne	9.00	1.00	0.40	9.40	m	35: Endstück 0,40 m; keine Gefällemessung.
Zwischenpodest	1.50	1.50		2.25	m²	35: 1,50 × 1,50 m.
Anschlussstreifen				1.20	m²	35: Flächenwert ohne getrennte Kantenlängen.

Gelb = übertragene Eingabe, Schwarz = Rechnung. Basis × Faktor + Zusatz ergibt die Menge.

Einheiten sind positionsbezogen. Bei einfachen Mengenüberträgen ist der Faktor 1 dimensionslos.

Fehlende Eingaben werden angezeigt. Eine echte Null bleibt eine Null und ist keine fehlende Angabe.

Die ursprünglichen AM-07 Werte bleiben in Rechnung 36 und Datei 35 unverändert dokumentiert.

Prüfanteil und Zahlungsbelege

Eingaben gelb. Die ursprüngliche Prüfung 37 und die Rechnung 36 bleiben unverändert.

Eingabe oder Beleg	Wert	Einheit	Erläuterung
Prüfanteil N01.5	0% Anteil		0 % = bisher keine Freigabe. 50 % wäre ein unverbindliches Rechenszenario.
Umsatzsteuersatz	19% Anteil		36, Schlussrechnung: 19 Prozent.
Abschlag 12.10.2023	35,700.00 EUR brutto		36, Abschnitt 2: vereinnahmt zu LB-231002.
Abschlag 18.12.2023	47,600.00 EUR brutto		36, Abschnitt 2: vereinnahmt zu LB-231201.
Spätere Zahlung nachgewiesen	Offen		Offen lässt den heutigen Restbetrag unbestimmt. Null ist erst bei bestätigtem Zahlungsverlauf zulässig.
Späterer Zahlbetrag		EUR brutto	Nur belegte Zahlungen nach den beiden Abschlägen erfassen. Keine Summe aus dem Prüfungsvorschlag übertragen.
Beleg der späteren Zahlung			Kontoauszug oder Bestätigung mit Datum und Rechnungsbezug eintragen.
Aktueller Belegstatus	Zahlungsbeleg fehlt		

Eingabe oder Beleg	Wert	Einheit	Erläuterung
--------------------	------	---------	-------------

1 Bedienung

Nur gelbe Felder ändern. Formeln stehen in schwarzen Zellen. Beleg und Zahlung gemeinsam erfassen.

2 Rechenweg

Mengen × Vertragspreis ergeben den Grundauftrag. N01.5 wird mit dem eingegebenen Anteil bewertet.

3 Grenzen

Kein Zahlungsauftrag, Anerkenntnis oder Mängelabzug. Keine automatische Festlegung von Fälligkeit.

Prüfanteile zwischen 0 und 100 Prozent sind Recheneingaben und ersetzen keine Einigung.

53_2026-10-02_Maengel_und_Befundverfolgung.xlsx

Mängel und Befundverfolgung

Hartwig Architektur · Stand 02.10.2026 · Bestand, neue Befunde und Nachweise getrennt

Offene Vorgänge 3

Kennung und Vorgang	Prüfung erfolgt	Nachweis eingetragen	Erledigung bestätigt	Nächster Schritt	Beleg
M-01 Rinnenrost	Ja	39, Nachkontrolle 28.03.2024	Ja	Abgeschlossen	38/39: damaliges Klappern beseitigt.
M-02 Türschließer	Ja	39, Nachkontrolle 28.03.2024	Ja	Abgeschlossen	38/39: damalige Einstellung bestätigt.
B-01 Saalnordwand	Nein		Nein	Prüfung offen	41–44/50: Ursache weiterhin offen.
B-02 Rinnenanschluss	Nein		Nein	Prüfung offen	43/50/51: Ablauf und Höhen prüfen.
D-01 Architekturabnahme	Nein		Nein	Prüfung offen	39/40/45: gesonderte Erklärung fehlt.

1 Bedienung

Die gelben Spalten B bis D halten Bearbeitung und Nachweis fest. Die Kennung bleibt beim Vorgang.

2 Statusregel

Ein Vorgang endet erst mit Prüfung, bezeichnetem Nachweis und bestätigter Erledigung.

Kennung und Vorgang	Prüfung erfolgt	Nachweis eingetragen	Erledigung bestätigt	Nächster Schritt	Beleg
---------------------	-----------------	----------------------	----------------------	------------------	-------

3 Inhaltliche Grenzen

M-01 aus 2024 und B-02 aus 2026 sind getrennt. Ein fester Rost bestätigt keinen freien Ablauf.

Die Termine aus 44 bleiben dort geführt. Diese Mappe berechnet keine Verjährung oder Haftungsquote.

Kein Auftrag zur Öffnung liegt vor. Angebot 51 ist ein Vorschlag, keine bereits ausgeführte Untersuchung.

Messungen und Betriebsbeobachtungen

Keine Ursachenautomatik. Werte verschiedener Methoden sind nicht als Messreihe vergleichbar.

ID und Datum	Ort oder Methode	Wert von	Wert bis	Einheit	Beleg und Aussagegrenze
O-01 · 17.09.2026	Sockel, kapazitive Anzeige	86	92	Geräteeinheit	43, Abschnitt 1. Keine Masseprozente.
O-02 · 17.09.2026	Vergleich bei 1,20 m Höhe	34	39	Geräteeinheit	43, Abschnitt 1. Dasselbe Gerät, keine Materialprobe.
O-03 · 17.09.2026	Rost zum angrenzenden Belag	6	6	mm	43, Abschnitt 2. Ungefähre Höhendifferenz.
O-04 · 17.09.2026	Wasserversuch	10	10	Liter	43: langsamer Ablauf; Dauer nicht gemessen.
O-05 · 24.09.2026	Pfützentiefe, Zollstock	4	4	mm	50: punktuell abgelesen, kein Nivellement.
O-06 · 24.09.2026	Abstand zweier Rundgänge	35	35	Minuten	50: 17:35 bis 18:10 Uhr. Kein Beweis der gesamten Ablaufdauer.
Abstand Anzeigeintervalle		47	58	Geräteeinheit	Untere/obere Differenz der Intervalle, keine Schadens- oder Feuchtequote.

ID und Datum	Ort oder Methode	Wert von	Wert bis	Einheit	Beleg und Aussagegrenze
--------------	------------------	----------	----------	---------	-------------------------

1 Quellenzeilen

43 ist die gemeinsame Begehung. 50 ist die spätere Erklärung des Hauswarts, ohne neue Materialprüfung.

2 Auswertung

Die Intervallabstände sind ein Rechenvergleich. Sie erlauben keine Umrechnung in Masseprozent.

3 Weitere Angaben

Zu Pfützentiefe und Rinnenversatz fehlen gemeinsamer Bezugspunkt und identische Messmethode.

54_2026-10-05_Honorar_und_Belegstand.xlsx

Honorarzuordnung und Leistungsanteile

Hartwig Architektur · 05.10.2026 · Vertragspauschale, keine neue Honorarschlussrechnung

Pauschale Grundleistungen

48,000.00

02, Abschnitt 2

Leistungsphase	Vertragsanteil	Pauschale EUR	Rechenanteil	Ansatz EUR	Rest EUR	Belegstatus
1 Grundlagen	2%	960.00	100%	960.00	0.00	Belegt
2 Vorplanung	7%	3,360.00	100%	3,360.00	0.00	Belegt
3 Entwurf	15%	7,200.00	100%	7,200.00	0.00	Belegt
4 Genehmigung	3%	1,440.00	100%	1,440.00	0.00	Belegt
5 Ausführung	25%	12,000.00	100%	12,000.00	0.00	Rückfrage
6 LV und Mengen	10%	4,800.00	100%	4,800.00	0.00	Belegt
7 Vergabe	4%	1,920.00	100%	1,920.00	0.00	Belegt
8 Überwachung	32%	15,360.00	100%	15,360.00	0.00	Rückfrage
9 Betreuung	2%	960.00	0%	0.00	960.00	Laufend
Grundleistungen	100%	48,000.00		47,040.00	960.00	

Leistungsphase	Vertragsanteil	Pauschale EUR	Rechenanteil	Ansatz EUR	Rest EUR	Belegstatus
Bestandsarbeiten		3,000.00		3,000.00		02 und 04, gesonderte Pauschale
Nebenkosten		3,000.00		3,000.00		02, pauschal vereinbart
Gesamt netto		54,000.00		53,040.00	960.00	
Umsatzsteuer	19%			10,077.60		
Ansatz brutto				63,117.60		

Offene Belegfragen

3

Gelbe Rechenanteile sind Annahmen zur Pauschalzuordnung, keine Abnahme oder Fälligkeitsentscheidung.

100 Prozent in Phase 8 schließt die offenen Belegfragen nicht. Rückfragen stehen unabhängig im rechten Blatt.

Ausgangsstand wie 37/40: 53.040,00 EUR netto zugeordnet; 960,00 EUR für laufende Betreuung verbleiben.

Leistungsbelege und offene Fragen

Grundlage: Vertrag 02, Erläuterung 52 und vorhandene Projektunterlagen.

Phase	Beleg und konkretes Ergebnis	Offene Frage	Status
1 03/04: Untersuchungsbedarf und Bestandsaufnahme.		Zusatzleistung Bestand separat vergütet.	Belegt
2 05/06: Variantenvergleich und Nordanbauentscheidung.		Keine weitere Umnutzungsvariante beauftragt.	Belegt
3 07–10: Entwurf, Kosten und Fachplanerabstimmung.		Gebührenansatz in 09 ist frühe Steuerpauschale.	Belegt
4 11–17: Antrag, Ergänzung und Bescheid.		Späterer Gymnastikwunsch ist nicht mit umfasst.	Belegt
5 18–22: Abruf, AP-01, D-12 und Portalstände.		Auflösung abweichender Höheninformation prüfen.	Rückfrage
6 23/24: zwölf LV-Positionen mit Mengen und Preisen.		Kein Nachweis der tatsächlichen Ausführung allein durch LV.	Belegt

Phase	Beleg und konkretes Ergebnis	Offene Frage	Status
	7 25–28: Angebote, Preisspiegel und Zuschlag.	Nachtrag N01 wurde nur teilweise beauftragt.	Belegt
	8 30/35–40: Bauablauf, Aufmaß, Prüfung und Übergabe.	Einzelblatt Nachkontrolle und Architekturabnahme fehlen.	Rückfrage
	9 41–44/50/51: Begehung, Bewertung und Untersuchungsvorschlag.	Ursache offen; weitere Betreuung und Kontrollbegehung stehen aus.	Laufend

1 Bedienung

Status nur nach Belegabgleich ändern. Eine hohe Prozentzahl im Honorarblatt schließt keine Belegfrage.

2 Vertragsgrundlage

02 vereinbart 48.000 EUR für Grundleistungen sowie jeweils 3.000 EUR für Bestand und Nebenkosten.

3 Grenzen

Kein Saldo aus Rechnungen und Zahlungen. Keine automatische Honoraranpassung anhand der Baukosten.

Die Unterlage 52 erläutert die einzelnen Ergebnisse. Die Zuordnung behauptet keine lückenlose Überwachung.

01_2020-11-12_Bedarfsbeschluss.docx

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Hartwig Architektur
Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck

Einbeck, 12.11.2020 · Bezug BH-21-04

Bedarfsbeschluss zum Bürgerhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand hat am 12.11.2020 von 18:30 bis 20:15 Uhr im bisherigen Vereinsraum über den Umbau beraten. Anwesend waren Maren Döring, Kassierer Uwe Feldmann, Schriftführerin Silke Bertram und Hauswart Ralf Winter. Alle vier stimmen dem nachstehenden Raum- und Finanzierungsrahmen zu. Die Mitgliederversammlung hat den Vorstand am 28.10.2020 zur Planungsvorbereitung ermächtigt.

1 Nutzung und Bestand

Das eingeschossige Haus aus dem Jahr 1968 steht im Eigentum des Vereins. Der Saal wird für Seniorennachmittage, Chorproben und private Feiern genutzt. Die Belegung soll einschließlich Helfern 120 Personen nicht überschreiten. Im 24 m² großen Vereinsraum sind Besprechungen für höchstens 18 Personen vorgesehen, keine gewerbliche Küche und kein regelmäßiger Sportbetrieb. Der vorhandene Saal mit 120 m² muss erhalten bleiben.

Ein stufenfreier Zugang, ein barrierefrei nutzbares WC, getrennte weitere Sanitärräume und ein beheizbarer Eingangsbereich fehlen. Der alte Eingang liegt rund 60 cm über dem Hof. Bei Regen ist die Nordwand innen fleckig. Der Hauswart erinnert sich an eine Leitung zum inzwischen abgebauten Pumpenschacht, kennt ihren Verlauf jedoch nicht.

2 Flächen und Finanzierung

Bedarf	Nutzfläche	Betriebliche Anforderung
Saal im Bestand	120 m ²	Bestuhlung für 96 Gäste und bis zu 24 Helfer
Vereinsraum	24 m ²	18 Sitzplätze, abschließbarer Schrank
Anbau	etwa 65 bis 70 m ²	Foyer, Sanitär, Lager und Technik
Außenbereich	etwa 300 m ²	Rampe, Lieferzugang und Fahrradplätze

Der Verein setzt zunächst 430.000,00 EUR einschließlich Umsatzsteuer als verfügbaren Gesamtrahmen an. 180.000,00 EUR stammen aus Rücklagen und zugesagten Spenden, 150.000,00 EUR aus einem zugesagten Vereinsdarlehen und 100.000,00 EUR aus weiteren verbindlich zugesagten privaten Zuwendungen. Es werden keine öffentlichen Fördermittel beantragt. Eigenleistungen sind nur für bewegliche Ausstattung vorgesehen und dürfen die Baukalkulation nicht vermindern.

3 Auftrag zur Vorbereitung

Frau Hartwig soll einen Vertragsvorschlag für Gebäudeplanung sowie Vorschläge für Tragwerks- und Haustechnikplanung vorlegen. Vor Öffnung von Wänden ist ein gesonderter Untersuchungstermin abzustimmen. Der Chor kann während des Baus in die benachbarte Gaststätte ausweichen; das Archiv und die vereinseigene Küche werden vor Baubeginn geräumt. Die Fertigstellung wird für Frühjahr 2024 angestrebt. Eine Baustellenöffnung im Winter wird nicht vorausgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Döring, Vorsitzende; Silke Bertram, Schriftführerin

Anlagen: keine

03_2021-02-04_Grundlagengespraech.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 04.02.2021 · Bezug BH-21-04

Grundlagengespräch und Ortsbesichtigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 04.02.2021 haben wir das Gebäude zwischen 09:00 und 11:40 Uhr mit Frau Döring, Herrn Winter und Herrn Mertens begangen. Die Räume waren wegen ausgefallener Veranstaltungen nur zeitweise beheizt. Das Protokoll hält die erhobenen Angaben und die mit dem Vorstand abgestimmten nächsten Schritte fest.

1 Vorgefundene Bedingungen

Die Außenmaße des Bestands betragen ungefähr 18,00 m mal 12,00 m. Ein Dachraum ist nur über eine Wartungsluke erreichbar und wird nicht für Veranstaltungen genutzt. Der nördliche Sockel weist im Saal einen hellgrauen Rand bis etwa 25 cm über dem Fußboden auf. Mit einem kapazitiven Messgerät wurden erhöhte relative Anzeigewerte festgestellt; daraus lässt sich kein Wassergehalt in Masseprozent ableiten. Eine belastbare Aussage zur Ursache ist ohne weitere Untersuchung nicht möglich.

Herr Winter bezeichnet die im Hof sichtbare alte Leitung als stillgelegte Pumpenleitung. In der vom Verein vorgelegten Handskizze von 1992 endet sie vor der Nordwand. Ein Bestandsplan des Leitungsbetreibers ist nicht vorhanden. Frau Döring bittet, im ersten Schritt nur die beiden Anschlussstellen zu öffnen, weil der Hof noch als Stellfläche genutzt wird.

2 Untersuchungen und Beteiligte

Vereinbart werden das Bestandsaufmaß und zwei Suchschlitze unmittelbar an der Nordwand. Eine flächige Suche unter dem befestigten Hof wird zurückgestellt. Für die Tragwerksplanung soll Büro Steinbach aus Northeim beauftragt werden; Herr Mertens übernimmt die Planung für Heizung, Sanitär und Elektrokoordination. Die Beiträge sind vor Abschluss des Entwurfs zusammenzuführen. Für die Feuchtesituation wird nach Freilegung des Sockels entschieden, ob ein Baustofflabor nötig ist.

3 Randbedingungen

Die Planung geht von höchstens 120 gleichzeitig anwesenden Personen im gesamten Haus aus. Der Vereinsraum bleibt ein Besprechungsraum. Der Bauherr will das Grundstück nicht zusätzlich teilen. Öffentliche Verkehrsflächen werden durch die Rampe nicht berührt. Für die Bauaufsicht sind Nutzung, Stellplätze, Rettungswege und Anbaukubatur vorzubereiten. Die Genehmigungsfähigkeit ist heute weder beantragt noch bestätigt.

Frau Hartwig legt bis 18.03.2021 zwei räumlich ausgearbeitete Varianten vor. Der Vorstand entscheidet anschließend über die Weiterplanung. Die Entscheidung über eine etwaige vollständige Sockelsanierung bleibt bis zu den Befunden offen. Herr Winter erhält eine Kopie dieses Protokolls und hält den nördlichen Wandbereich bis zum nächsten Termin frei.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 01_2020-11-12_Bedarfsbeschluss.docx

08_2021-06-11_Objektbeschreibung.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 11.06.2021 · Bezug BH-21-04

Objektbeschreibung zum Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf E-01 vom 10.06.2021 konkretisiert den gewählten Nordanbau. Die Bruttofläche des Bestands beträgt 216 m², der Anbau ergänzt 80 m². Die gemeinsame Bruttofläche beträgt 296 m². Die Außenabmessungen und die Baukörperlage sind im Entwurfsplan bemaßt. Die Flächen nachstehend sind Nutzungsansätze, keine vermietbaren Flächen.

1 Raumordnung

Der Saal bleibt im südlichen Bestand. Vereinsraum, Küche und Lager liegen östlich davon. Der neue Eingang führt über die Hoframpe in das 32 m² große Foyer im Nordanbau. Der Sanitärbereich mit 20 m² enthält ein barrierefrei nutzbares WC sowie weitere getrennte WC-Räume. Technik und Lager beanspruchen je 8 m². Die 68 m² nutzbare Anbaufläche und 12 m² Wandfläche ergeben zusammen die Bruttofläche.

2 Konstruktion und Ausbau

Der Anbau erhält Streifenfundamente und eine gedämmte Bodenplatte, tragende Mauerwerkswände und ein leichtes Flachdach. Der Bestand behält sein Satteldach. Eine Bewegungsfuge trennt die Baukörper. Die neue Saalöffnung erhält einen statisch bemessenen Sturz. Die Ausführung darf erst nach abgestimmtem Tragwerksplan erfolgen.

Innen werden lose Sockelputze im Bestand entfernt und mineralisch erneuert. Die bisherige Feuchteerscheinung wird nicht allein durch Überstreichen behandelt. Die Kostenberechnung erfasst eine örtliche Außenabdichtung, aber keine umfassende Sanierung der historischen Bodenplatte. Die Daten aus den Suchschlitzen lassen die vorhandene Horizontalsperre weiterhin nicht sicher erkennen.

3 Höhen und Betrieb

Bezugshöhe ist der Fertigfußboden des Saals mit 112,40 m im projektspezifischen Höhensystem. Der Hof liegt am Rampenantritt bei 111,80 m. Zwei Läufe von je 6,00 m überwinden je 0,30 m. Die Eingangsschwelle wird ohne Absatz geplant. Eine unmittelbar vorgelagerte Rinne führt Niederschlagswasser zur Regenwasserleitung. Die Lage der Rinne und der seitliche Anschluss an den Altbausockel sind in der Ausführungsplanung zu detaillieren.

Die Planung setzt weiterhin höchstens 120 gleichzeitig anwesende Personen und Besprechungsnutzung im Vereinsraum voraus. Eine spätere Nutzung als Gymnastik-, Tanz- oder Veranstaltungsraum mit anderer Personenzahl ist nicht Bestandteil dieser Freigabe. Die neue Technik wird so bemessen, dass die festgelegten Betriebszeiten zwischen 08:00 und 22:00 Uhr abgedeckt sind.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 07_2021-06-10_Entwurfsplan.pdf

14_2022-01-20_Baubeschreibung.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Stadt Einbeck · Bauaufsicht
Teichenweg 1 · 37574 Einbeck

Einbeck, 20.01.2022 · Bezug BH-21-04

Baubeschreibung zum Bauantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Baubeschreibung B-01 gehört zum Antrag vom 20.01.2022 für das Bürgerhaus Lindengasse 18, Gemarkung Einbeck, Flur 14, Flurstück 83/7. Sie beschreibt das gesamte beantragte Vorhaben und die künftige Betriebsweise, nicht nur den neuen Gebäudeteil.

1 Gebäude und Nutzung

Das eingeschossige Gebäude wird ohne Keller genutzt. Die Oberkante Fertigfußboden liegt 0,60 m über dem Hofzugang. Der Bestand misst 18,00 m mal 12,00 m und hat einen nicht ausgebauten Dachraum. Der nördliche Anbau misst 10,00 m mal 8,00 m und erhält ein Flachdach mit Attika bei 3,50 m über dem Saalfußboden. Es entstehen keine Wohnungen und keine Übernachtungsräume.

Für die Nutzung werden maximal 120 Personen einschließlich Personal festgelegt. Der Saal umfasst 120 m², der Vereinsraum 24 m². Der neue Foyerbereich umfasst 32 m², Sanitär 20 m² sowie Lager und Technik jeweils 8 m². Veranstaltungen enden um 22:00 Uhr. Ein regelmäßiger Tanz-, Fitness- oder Gaststättenbetrieb ist nicht beantragt; Speisen werden nur angeliefert oder in der bestehenden Teeküche angerichtet.

2 Baustoffe und Erschließung

Der Anbau erhält Stahlbetonfundamente, eine gedämmte Bodenplatte, mineralisches Mauerwerk und ein leichtes gedämmtes Dach. Zwischen Bestand und Anbau wird eine Bewegungsfuge angeordnet. Das vorhandene Satteldach bleibt bestehen. Die tragende Öffnung zum Foyer wird nach gesondertem Tragwerksnachweis hergestellt. Dachwasser wird über einen getrennten Regenwasserstrang geführt. Schmutzwasser wird an die bestehende Grundstücksentwässerung angeschlossen.

3 Zugang und Rettungswege

Vom verbreiterten Stellplatz führt ein 1,50 m breiter Weg zur Rampe. Zwei Rampenläufe von je 6,00 m mit Zwischenpodest überwinden 0,60 m Höhe. Beidseitige Handläufe und Radabweiser werden ausgeführt. Die drei Außentüren haben jeweils 1,00 m lichte Durchgangsbreite. Der Saal besitzt zwei voneinander getrennte Ausgänge: direkt nach Süden und über das Foyer nach Norden. Türen in Fluchtrichtung sind während der Nutzung ohne Schlüssel zu öffnen.

Die Sanitärzone enthält einen von beiden Nutzungsgruppen unabhängig erreichbaren barrierefrei nutzbaren WC-Raum. Der Bewegungsbereich vor den Türen bleibt frei. Es werden zwölf Kfz-Stellplätze auf dem Grundstück vorgehalten; acht Fahrradplätze liegen westlich der Rampe. Der nordseitige Rettungsweg endet auf dem eigenen Hof und erreicht über den westlichen Weg die öffentliche Straße.

4 Bauvorbereitung

Vor Erdarbeiten wird der Leitungsbestand im Arbeitsbereich festgestellt. Die bisher nur punktuell untersuchte Bestandswand wird abschnittsweise freigelegt. Feuchte- und Salzbefunde sind vor dem Neuverputz zu dokumentieren. Der Bauherr nutzt das Gebäude während des Umbaus nicht für Veranstaltungen. Die Bauleitung stimmt die erforderlichen Anzeigen und Nachweisvorlagen mit der Bauaufsicht ab.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Entwurfsverfasserin; Maren Döring, Bauherrin

Anlagen: 12_2022-01-20_Lageplan.pdf; 13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf

23_2023-03-08_Leistungsverzeichnis.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck

Einbeck, 08.03.2023 · Bezug BH-21-04

Leistungsverzeichnis Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

für das Bürgerhaus Lindengasse 18 in Einbeck wird Los 1 Rohbau und Gebäudehülle zur Angebotsabgabe versandt. Auftraggeber ist der Bürgerhaus Leinewinkel e.V. Dieses Leistungsverzeichnis ist ein vollständiges Los; Haustechnik, Fenster, Innentüren, Bodenbeläge und lose Ausstattung werden gesondert vergeben. Der Bauherr ist ein privat finanzierter Verein. Es handelt sich um eine private Angebotsanfrage.

1 Vertrags- und Ausführungsbedingungen

Die Ausführung beginnt am 21.08.2023. Die vertraglich vorgesehene Fertigstellung ist der 15.03.2024. Abgerechnet werden die tatsächlich nachgewiesenen Mengen zu den angebotenen Einheitspreisen. Die VOB wird nicht als Vertragsbestandteil vereinbart. Stoffe und Nebenleistungen, die in der jeweiligen Position ausdrücklich genannt sind, sind im Einheitspreis enthalten. Pauschale Nebenangebote ohne Abgrenzung werden nicht gewertet.

Ausführungsgrundlagen sind AP-01 vom 02.06.2022 und D-12 vom 06.06.2022. Die technische Bearbeitung der Haustechnik vom 07.03.2023 ändert diese freigegebenen Gebäudepläne nicht. Vor verdeckenden Arbeiten ist die Bauleitung zur Kontrolle einzuladen. Der Verein beauftragt eine Leitungsortung vor Aushub; der Auftragnehmer prüft erkennbare Leitungen trotzdem und hält bei unklaren Funden Rücksprache. Aus der fehlenden Eintragung im Plan folgt keine Freigabe zum Durchtrennen.

Die Angebote sind bis 04.04.2023 um 12:00 Uhr an den Vorstand zu richten. Preise sind in EUR netto, Umsatzsteuer gesondert anzugeben. Die Bindefrist endet am 28.04.2023. Mit dem Angebot sind Ausführbarkeit, Personalansatz und Vorlauf für Türen und Dachmaterial zu bestätigen. Gerüste für die eigenen Leistungen und die Entsorgung eigener Verpackungen sind enthalten.

2 Leistungsverzeichnis

2.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen für Los 1 einschließlich Bauzaun, Baustromverteiler und Sanitärcontainer. Vorhaltung vom 21.08.2023 bis 15.03.2024. Betriebskosten eigener Geräte sind enthalten.

Menge: 1 psch. Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.2 Selektiver Rückbau

Aufnehmen der alten Bodenbeläge und nichttragenden Einbauten im 216 m² großen Bestand. Staubschutz zum südlichen Geräteanbau und sortenreine Entsorgung nicht gefährlicher Stoffe sind enthalten. Verdeckte Schadstoffe werden vor Bearbeitung angezeigt.

Menge: 216 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.3 Fundamentaushub

Aushub der Streifenfundamente und Anschlussgräben bis 1,20 m unter Gelände einschließlich seitlicher Lagerung. Leitungen dürfen nicht durchtrennt werden. Handschachtung an vorher georteten Querungen ist im Einheitspreis enthalten; Umlegungen sind nicht enthalten.

Menge: 60 m³. Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.4 Streifenfundamente

Betonfundamente nach Tragwerksplan T-02 mit 50 cm Breite und 80 cm Höhe einschließlich Schalung und Bewehrung gemäß Stahlliste, insgesamt 24 m³. Abrechnung nach tatsächlich eingebautem geometrischem Volumen.

Menge: 24 m³. Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.5 Bodenplatte Anbau

Gedämmte Bodenplatte für 80 m² Anbau einschließlich 20 cm Stahlbeton, 12 cm druckfester Dämmung und Sauberkeitsschicht. Anschlussfuge an den Bestand nicht starr überbrücken. Oberkante Rohplatte bei minus 0,16 m.

Menge: 80 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.6 Außenmauerwerk Anbau

24 cm tragendes Mauerwerk mit außenliegender 16 cm Mineralwolldämmung und mineralischem Putzsystem. Fensteröffnungen werden vollständig abgezogen. Stürze und Anschlüsse sind enthalten; Metallfenster werden separat vergeben.

Menge: 95 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.7 Abdichtung Bestandssockel

Freilegen, Reinigen und zweilagiges Abdichten der nördlichen Bestandswand im Anschlussbereich. Bearbeitung vom Fundamentansatz bis 30 cm über Gelände. Schutzlage und Wiederverfüllung sind enthalten. Die Abdichtung ersetzt keine nachträgliche Horizontalsperre.

Menge: 36 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.8 Innenputz Bestand

Lose Putzbereiche entfernen und mineralischen Neuputz herstellen, mittlere Dicke 20 mm, einschließlich Untergrundvorbereitung. Beschichtungsaufbau diffusionsoffen; Untergrundfeuchte vor Beginn gemeinsam dokumentieren. Eine chemische Horizontalsperre ist nicht enthalten.

Menge: 144 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.9 Dach Anbau

Flachdachaufbau einschließlich Holztragwerk nach T-02, Dampfbremse, Gefälledämmung im Mittel 20 cm, zweilagiger Abdichtung, Attika und Dachentwässerung bis zum Standrohr. Gefälle vom Bestandsanschluss wegführen.

Menge: 80 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.10 Außentüren

Drei thermisch getrennte Aluminiumtüren nach Türliste, lichte Durchgangsbreite jeweils 1,00 m, einschließlich Beschlägen, Dichtungen und Anschlussarbeiten. Hauptzugang mit niveaugleichem Durchgang, Rinne gemäß eigener Position.

Menge: 3 St. Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.11 Zugangsrampe

Stahlbetonrampe, zwei Läufe mit zusammen 12,00 m nutzbarer Länge und 1,50 m nutzbarer Breite. Höhendifferenz 0,60 m, Längsgefälle 5 Prozent. Einschließlich Zwischenpodest 1,50 m mal 1,50 m ergeben sich 20,25 m². Handläufe und Radabweiser sind enthalten.

Menge: 20,25 m². Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

2.12 Entwässerungsrinne

Linienrinne mit herausnehmbarem Rost am Eingangs- und Rampenanschluss, lichte Breite 150 mm, Anschluss an den Regenwasserstrang. Gefälle, Bettung und Dichtheitsprobe sind enthalten. Anschlussdetail D-12 ist Vertragsgrundlage.

Menge: 9 m. Einheitspreis und Gesamtpreis sind vom Bieter in seinem Angebot anzugeben.

3 Mengenermittlung und Schnittstellen

Die Rückbaufläche folgt dem Bestandsaufmaß, die Bodenplatte der Anbaugrundfläche. Beim Mauerwerk wurden Öffnungen abgezogen. Die Abdichtungsfläche setzt 36 m² freigelegten Sockel voraus. Der Innenputzansatz erfasst 144 m² Wandfläche, nicht die Bodenfläche. Die Rampe umfasst 18,00 m² Lauf- und 2,25 m² Podestfläche. Zusätzliche Anschlüsse an die Hofpflasterung werden gesondert aufgemessen.

Elektro und Sanitär liefern die erforderlichen Hülsenmaße vor Betonage. Für die Dichtheit der von Los 1 gelieferten Rinnenanschlüsse ist Los 1 zuständig, für die anschließende unterirdische Grundstücksleitung das gesonderte Tiefbauunternehmen. Die Schnittstelle liegt am ersten Rohrstutzen hinter der Rinne. Über die Bauleitung hinausgehende rechtsgeschäftliche Anordnungen dürfen nur Frau Döring und Herr Feldmann gemeinsam erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 20_2022-06-02_Ausführungsplan.pdf; 21_2022-06-06_Rampenanschluss.pdf

28_2023-04-18_Bauvertrag_Zuschlag.docx

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck

Einbeck, 18.04.2023 · Bezug BH-21-04

Bauvertrag und Zuschlag für Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bürgerhaus Leinewinkel e.V., vertreten durch Maren Döring und Uwe Feldmann, nimmt das Angebot LB-230404 der Leinebau Hochbau GmbH an. Leinebau bestätigt den Auftrag durch Henning Seidel. Für das Los 1 gelten abschließend die folgenden Vereinbarungen.

1 Leistung und Unterlagen

Geschuldet sind sämtliche zwölf Positionen des Leistungsverzeichnisses vom 08.03.2023 nach ihren vollständigen Langtexten. Vertragsgrundlagen sind dieser Vertrag, das Angebot LB-230404, das Leistungsverzeichnis sowie AP-01 vom 02.06.2022 und D-12 vom 06.06.2022 in dieser Reihenfolge. Bei technischen Widersprüchen ist vor Ausführung Rücksprache zu halten. Die VOB und sonstige Geschäftsbedingungen werden nicht einbezogen.

Die vorläufige Auftragssumme beträgt 107.172,00 EUR netto zuzüglich 20.362,68 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 127.534,68 EUR brutto. Es handelt sich um einen Einheitspreisvertrag. Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten und gemeinsam festgestellten Mengen. Die Auftragssumme ist deshalb keine unveränderliche Pauschale.

2 Termine und Mitwirkung

Die Arbeiten beginnen am 21.08.2023 und sind bis 15.03.2024 fertigzustellen. Das Gebäude wird ab Baubeginn nicht für Veranstaltungen genutzt. Der Auftraggeber gewährt Zugang, benennt vorhandene Leitungen und veranlasst die im Ausführungsplan vorgesehene Ortung. Leinebau sichert erkennbare Leitungen und zeigt unklare Bestandsverhältnisse unverzüglich mit betroffenen Arbeiten, Personal und voraussichtlichen Folgen an. Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

3 Änderungen und Dokumentation

Zusätzliche Leistungen werden dem Vorstand vor Ausführung mit Mengen, Preisen und Terminfolgen vorgelegt. Frau Döring und Herr Feldmann entscheiden gemeinsam. Frau Hartwig koordiniert technisch und prüft Angebote, darf aber den Verein nicht durch Nachtragsaufträge verpflichten. Bei akuter Gefährdung dürfen erforderliche Sicherungsmaßnahmen ausgeführt werden; Umfang und Anlass sind noch am selben Tag zu dokumentieren.

Aufmaße sind vor dem Verdecken gemeinsam aufzunehmen. Tagesberichte nennen Personalstärke, Witterung, ausgeführte Arbeiten und Unterbrechungen. Bauleitungsunterschriften auf Aufmaßen bestätigen zunächst die festgestellten Maße; eine zusätzliche Vergütungsvereinbarung entsteht dadurch nicht. Fotos sind mit Ort und Datum zuzuordnen.

4 Vergütung und Sicherheiten

Prüffähige Rechnungen sind binnen 21 Kalendertagen nach Zugang zahlbar. Abschläge werden auf die Schlussrechnung angerechnet und mit Nettobetrag sowie Umsatzsteuer ausgewiesen. Es werden weder Skonto noch pauschaler Gewährleistungseinbehalt vereinbart. Bei festgestellten Mängeln bleiben die gesetzlichen Rechte unberührt. Eine Vorauszahlung oder Vertragserfüllungsbürgschaft ist nicht geschuldet.

5 Abnahme und Mängel

Nach Fertigstellung findet ein gemeinsamer Abnahmetermin statt. Der Auftraggeber erklärt die Abnahme und bezeichnet bekannte Mängel sowie Vorbehalte im Protokoll. Die Übergabe von Schlüsseln, die Rechnungsprüfung und eine bloße technische Freigabe ersetzen die vereinbarte förmliche Abnahme nicht. Für die von Leinebau hergestellten Bauleistungen wird eine fünfjährige Mängelfrist ab ihrer Abnahme vereinbart. Beginn, Änderungen oder Unterbrechungen sind anhand des jeweiligen Vorgangs zu beurteilen; Fristen anderer Unternehmer werden dadurch nicht festgelegt.

6 Abschluss

Leinebau übergibt Revisionsangaben, Produktnachweise, Bedienhinweise und die für sein Los erforderlichen Prüfprotokolle. Änderungen dieses Vertrags werden in Textform dokumentiert. Deutsches Recht gilt. Beide Parteien erhalten eine gleichlautende Ausfertigung einschließlich der im Anlagenverzeichnis benannten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Döring und Uwe Feldmann, Vorstand; Henning Seidel, Geschäftsführer

Anlagen: 20_2022-06-02_Ausführungsplan.pdf; 21_2022-06-06_Rampenanschluss.pdf; 23_2023-03-08_Leistungsverzeichnis.docx; 25_2023-04-04_Angebot_Leinebau.pdf

39_2024-04-05_Übergabe.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 05.04.2024 · Bezug BH-21-04

Übergabe an den Gebäudebetrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 05.04.2024 wurde das umgebaute Bürgerhaus dem Verein und dem Hauswart Ralf Winter zur Nutzung übergeben. Die Übergabe fand von 09:00 bis 11:30 Uhr statt. Die Nutzung ist auf die genehmigte Betriebsweise und die nachstehenden Einweisungen bezogen. Sie ist keine Sammelabnahme sämtlicher Gewerke.

1 Übergebene Einrichtungen

Herr Winter erhält sechs Hauptschlüssel, zwei Technikschlüssel und zwei Schlüssel für den Putzmittelschrank. Die Schlüsselnummern BH-01 bis BH-06 sind im Schlüsselbuch eingetragen. Hauptschalter, Heizungsabspernung, Wasserabspernung und die Reinigungsöffnung der Entwässerungsrinne wurden vor Ort gezeigt. Die Rinne ist nach Laubfall und bei erkennbarem Rückstau zu reinigen; Arbeiten an elektrischen Einrichtungen bleiben Fachkräften vorbehalten.

Die Ausgänge und Bewegungsflächen bleiben frei. Die genehmigte Gesamtbelegung beträgt 120 Personen. Der Vereinsraum bleibt Besprechungsraum. Der im August 2023 angesprochene Gymnastikbetrieb ist weder beauftragt noch bauaufsichtlich geklärt worden und wird zur heutigen Übergabe nicht aufgenommen. Die übrigen Veranstaltungen dürfen nach der genehmigten Organisation stattfinden.

2 Abnahmen und Restpunkte

Leistung	Abnahme laut Gewerkeunterlage	Stand bei Übergabe
Los 1 Leinebau	18.03.2024	M-01 und M-02 am 28.03.2024 nachkontrolliert; Rost befestigt, Tür eingestellt.
Heizung und Sanitär Mertens Installation	22.03.2024	Einweisung und Funktionsprotokoll vom 22.03.2024 übergeben.
Elektro Lichtpfad	25.03.2024	Prüfprotokoll und Verteilerbeschriftung übergeben.
Fenster und Innenausbau Weserwerk	27.03.2024	Keine offenen Punkte im zugehörigen Abnahmeblatt.
Außenanlagen Hofraum	02.04.2024	Pflege der Fugen und Abläufe erläutert.

3 Planungsunterlagen und Betrieb

Übergeben werden die Genehmigung mit Bauvorlagen, die Revisionsmappe R-01, die Bedienunterlagen und das Dokumentenregister. Die Leitungsumlegung ist darin verzeichnet. Der Höhenanschluss wurde aus den Baustellenangaben übernommen. Eine zerstörende Prüfung der verdeckten Abdichtung erfolgte bei Übergabe nicht.

Die Planungs- und Überwachungsleistungen der Architektin bis einschließlich Objektüberwachung werden dem Vorstand in einem gesonderten Termin zur Abnahme vorgestellt. Heute wird lediglich der Erhalt der Unterlagen bestätigt. Die Objektbetreuung läuft weiter. Eine Begehung im September 2026 wird im Kalender vorgemerkt; sie ersetzt nicht die später erforderliche Überwachung der gewerkeweisen Fristen.

Herr Winter bestätigt die Einweisung und den Unterlagenerhalt. Frau Döring übernimmt die Organisation der Nutzungsbuchführung. Die Kostenübersicht ist als Stand der Rechnungsprüfung zu lesen; der Streit über die Gerätebereitschaft ist dadurch nicht erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig; Maren Döring; Ralf Winter, Hauswart

Anlagen: 17_2022-03-17_Baugenehmigung.pdf; 38_2024-03-18_Abnahme.pdf

44_2026-09-21_Gewährleistungsfeststellung.docx

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 21.09.2026 · Bezug BH-21-04

Feststellung zur laufenden Gewährleistung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anschluss an die Begehung vom 17.09.2026 erhalten Sie die fortgeschriebene gewerkeweise Übersicht und die fachliche Zuordnung der offenen Punkte. Die Übersicht dokumentiert den heutigen Aktenstand. Sie entscheidet weder den Streit um Verursachung noch rechtliche Fragen zu einer Veränderung des Fristlaufs.

1 Gewerkeweise Ausgangsdaten

Gewerk und Beleg	Abnahme	Vertragsdauer / rechnerisches Ende
Leinebau, Vertrag 18.04.2023 und Abnahmeprotokoll	18.03.2024	5 Jahre / 18.03.2029
Heizung und Sanitär, Register R-01 Nr. 2	22.03.2024	5 Jahre / 22.03.2029
Elektro, Register R-01 Nr. 3	25.03.2024	5 Jahre / 25.03.2029
Fenster und Ausbau, Register R-01 Nr. 4	27.03.2024	5 Jahre / 27.03.2029
Außenanlagen, Register R-01 Nr. 5	02.04.2024	5 Jahre / 02.04.2029
Architektur, Vertrag 18.01.2021	Keine gesonderte Erklärung in der vorliegenden Mappe	Fristbeginn nicht aus der Gebäudeübergabe übernommen

Die Daten 2029 sind ausschließlich rechnerische Kontrolltermine aus den dokumentierten Vertragsangaben, keine künftig eingetretenen Ereignisse. Die Registerangaben der anderen Gewerke sind vor einer Fristentscheidung mit den dort bezeichneten Originalen abzugleichen. Die Mängelmeldung vom 08.09.2026 wird nicht als automatische Verlängerung aller Fristen verbucht. Die Vereinbarung eines späteren Untersuchungstermins allein wird ebenfalls nicht als abschließende rechtliche Aussage zum Fristlauf behandelt.

2 Technischer Stand

Die 2024 bei Abnahme festgehaltenen Punkte M-01 und M-02 wurden laut Übergabeprotokoll am 28.03.2024 nachkontrolliert. Das jetzige Wasserbild am Eingang ist neu aufzunehmen; der feste Rost am Begehungstag beweist nicht die ausreichende Entwässerung. Der Wandbefund liegt im alten Saal und kann nicht ohne Untersuchung dem Anbau oder allein dem Bestand zugerechnet werden. Die angebotene Sockelabdichtung und die ausgeschlossene Horizontalsperre sind bei der technischen Prüfung auseinanderzuhalten.

3 Weitere Betreuung und Sicherheiten

Der Verein hat noch keinen Auftrag zur Bauteilöffnung erteilt. Leinebau hat kein Anerkenntnis abgegeben. Die Architektin hält die getrennte Aufnahme von Höhenanschluss, Rohrdurchgang und Wandaufbau für notwendig, bevor ein Sanierungsumfang bestimmt wird. Die Rückmeldung der Beteiligten ist offen. Nach dem Bauvertrag Los 1 besteht keine Gewährleistungsbürgschaft und kein pauschaler Gewährleistungseinbehalt; insoweit ist heute nichts freizugeben.

Die nächste Fristenkontrolle wird für September 2027 im Büro vorgemerkt. Eine weitere Begehung rechtzeitig vor den jeweiligen gewerkeweisen Endterminen bleibt vertraglich vorgesehen. Diese Vormerkung dokumentiert nur einen künftigen Arbeitsbedarf, keinen bereits eingetretenen Schaden. Dem Vorstand wird die vollständige Begehungsniederschrift übergeben; eine abschließende Sanierungs- oder Haftungsentscheidung enthält die heutige Feststellung nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 43_2026-09-17_Objektbegehung.pdf; 39_2024-04-05_Übergabe.docx; 40_2024-04-08_Archivverzeichnis.txt

45_2026-09-22_Nachlieferung_Projektunterlagen.docx

Einbeck, 22.09.2026

Nachlieferung der Projektunterlagen

Sehr geehrte Frau Döring, sehr geehrter Herr Feldmann, Sie baten im Gespräch vom 21.09.2026 darum, die Mengenänderungen und die noch offenen Leistungen anhand der Projektmappe erläutern zu können. Wir liefern dazu ergänzende Erläuterungen nach. Der Stand der ursprünglichen Kostenfeststellung vom 08.04.2024 bleibt bestehen.

1 Gegenstand der Nachlieferung

Die Dateien 09, 19, 24 und 37 sind abgeschlossene Arbeitsstände aus Planung und Bauausführung. Sie werden nicht rückwirkend geändert. Insbesondere ist der in Datei 37 ausgewiesene Betrag von 52.543,02 EUR brutto nach Abschlägen ein damaliger Zahlungsvorschlag. Die Unterlagen enthalten keinen Kontoauszug über eine spätere Schlusszahlung. Eine heute noch offene Geldforderung lässt sich daraus allein nicht bestimmen.

Für die Aufmaßbesprechung haben wir AM-07, das Angebot Leinebau und die Schlussrechnung nebeneinandergelegt. Bei der Rampe lässt sich der zusätzliche Anschlussstreifen aus dem gemeinsam festgehaltenen Rechenweg wiederfinden. Beim Rinnengefälle fehlt dagegen weiterhin ein unterschriebenes Nivellementblatt. Eine feststehende Abrechnungslänge ist kein Nachweis der Entwässerungsfunktion.

2 Fragen aus dem Vorstandsgespräch

Herr Feldmann fragte, weshalb der Fundamentaushub um sechs Kubikmeter gestiegen sei, obwohl bereits vier Kubikmeter Leitungsgraben beauftragt worden seien. Nach AM-07 sind dies verschiedene Mengen. Wir werden die Trennung in der ergänzenden Mengenrechnung sichtbar halten. Für eine Prüfung der verdeckten Geometrie wäre die ursprüngliche Aufnahme vor Betonage erforderlich; diese liegt in der hier zusammengestellten digitalen Mappe nicht als unterschriebenes Einzelblatt vor.

Frau Döring fragte außerdem, ob mit der Begehung vom 17.09.2026 die Objektbetreuung erledigt sei. Unser Vertrag sieht weitere Betreuung und spätere Kontrollen vor. Der aktuelle Befund ist noch nicht geklärt. Wir werden deshalb die seit 2024 dokumentierten Leistungen und die offenen Arbeitsschritte getrennt ausweisen. Eine Abnahmeerklärung für unsere Leistungen haben wir in dieser Mappe weiterhin nicht gefunden.

3 Weiteres Vorgehen

Leinebau wurde um eine Erläuterung des Tagessatzes und des tatsächlichen Geräteeinsatzes am 06. und 07.09.2023 gebeten. Der Hauswart stellt seine aktuellen Betriebsbeobachtungen zusammen. Für eine Untersuchung von Rinne und Sockel soll zunächst ein begrenzter Vorschlag mit Preis, Teilnehmern und ausdrücklich bezeichneten Eingriffen vorliegen. Der Vorstand entscheidet anschließend über den Umfang.

Die Nachlieferung entsteht im September und Oktober 2026. Spätere Erinnerungen werden als solche bezeichnet. Sie erhalten weder das Datum noch den Beweiswert einer während der Ausführung erstellten Messurkunde.

gez. Lena Hartwig, Architektin

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

46_2026-09-23_Erlaeuterung_Aufmass_AM07.docx

Einbeck, 23.09.2026

Erläuterung des Aufmaßes AM 07

Sehr geehrter Herr Albrecht, für die Rückfragen des Vorstands erläutern wir die am 16.02.2024 in AM-07 festgehaltenen Schlussmengen. Diese Erläuterung ist eine Übertragung aus Datei 35. Sie dokumentiert keine neue gemeinsame Vermessung und ergänzt keine fehlende Unterschrift unter einem ursprünglichen Messblatt.

1 Mengen mit einfachen Flächenbezügen

Der selektive Rückbau betrifft den Bestand mit 18,00 m mal 12,00 m und damit 216,00 m². Die Bodenplatte und das Dach des Anbaus sind jeweils mit 10,00 m mal 8,00 m und damit 80,00 m² erfasst. Bei der Rampe ergeben 12,00 m Lauflänge mal 1,50 m Breite 18,00 m². Hinzu kommen das Zwischenpodest mit 2,25 m² und der in AM-07 gesondert beschriebene Anschlussstreifen mit 1,20 m². Zusammen sind dies 21,45 m² statt des ursprünglichen Ansatzes von 20,25 m².

Für den Anschlussstreifen enthält AM-07 die Fläche, aber keine getrennten Kantenlängen. Die neue Rechentabelle übernimmt daher 1,20 m² als dokumentierte Zusatzfläche und erfindet keinen nachträglich bemaßten Plan. Bei der Rinne werden 9,00 m Grundlänge und 0,40 m angepasstes Endstück zu 9,40 m addiert.

2 Mengen verdeckter oder ergänzter Leistungen

Position	Übertrag aus AM-07	Verbleibende Nachweisfrage
2.3 Aushub	$60,00 + 6,00 = 66,00 \text{ m}^3$	Aufnahme vor Betonage vom 20.09.2023 nicht als Einzelblatt in dieser Mappe.
2.4 Fundamente	$24,00 + 1,20 = 25,20 \text{ m}^3$	Verbreiterung übernommen, keine neue geometrische Vermessung.
2.7 Sockelabdichtung	$36,00 + 6,00 = 42,00 \text{ m}^2$	Feststellung vor Verfüllung am 03.10.2023 in AM-07 referenziert.
2.8 Innenputz	$144,00 + 6,00 = 150,00 \text{ m}^2$	Zusatzfläche übernommen; keine flächige Feuchtemessung daraus ableitbar.

3 Trennung vom Nachtrag

Die 4,00 m³ Graben aus N01.2 betreffen die Leitungsumlegung und werden nur im Nachtragsblock gerechnet. Die 66,00 m³ der Position 2.3 enthalten diese Menge nach AM-07 ausdrücklich nicht. Würden beide Mengen in Position 2.3 zusammengeführt und N01.2 unverändert belassen, entstünde eine doppelte Mengenbasis. Die Nachtragsleitung beträgt 14,00 m, der Abtransport eine Pauschale und die Anschlussarbeit 16,00 Stunden.

Für N01.5 gibt es keine gemeinsame Mengenbestätigung. Zwei Tage zu 620,00 EUR sind die Behauptung von Leinebau. Der Auftrag vom 15.09.2023 ließ gerade diese Position offen. Die ergänzende Rechnung kann den geltend gemachten und einen frei einzugebenden Prüfteil gegenüberstellen; sie kann aus der Zahl der Tage keinen Anspruch ableiten.

Bitte benennen Sie die Ablagestelle der ursprünglichen verdeckten Aufnahmen. Bis zu deren Eingang bleibt die Erläuterung auf AM-07 beschränkt. Die Mengenfeststellung sagt nichts Abschließendes über Mängelfreiheit, Höhenanschluss oder eine Zahlung aus.

gez. Lena Hartwig, Architektin

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

47_2026-09-24_Geraetebereitschaft_Kalkulationsnotiz.docx

Einbeck, 24.09.2026

Erläuterung der Gerätebereitschaft N01 5

Sehr geehrte Frau Hartwig, wir halten den in unserer Schlussrechnung LB-240301 enthaltenen Ansatz von zwei Tagen Gerätebereitschaft zu jeweils 620,00 EUR netto aufrecht. Auf Ihre Nachfrage erläutern wir die Kalkulation und unsere Erinnerung an den Ablauf. Dies ist keine neue Rechnung und kein beiderseits unterzeichneter Tagesnachweis.

1 Zusammensetzung unseres Ansatzes

Bestandteil je Tag	Ansatz netto	Grundlage unserer Erklärung
Gerätevorhaltung Kompaktbagger	320,00 EUR	Kalkulatorischer Tagessatz unseres eigenen Geräts; kein Mietbeleg eines Dritten.
Fahrerbereitschaft	8 h × 32,50 EUR = 260,00 EUR	Interner Verrechnungssatz einschließlich Personalnebenkosten.
Baustellenorganisation	40,00 EUR	Interner Ansatz für Disposition und Sicherung.
Summe je Tag	620,00 EUR	Keine gesonderte Umsatzsteuer in den Komponenten.

Der Betrag von 320,00 EUR ist nicht der Anschaffungspreis und auch keine Stundenabrechnung nach Motorlaufzeit. Eine Aufteilung in Abschreibung, Verzinsung und tatsächliche Reparaturkosten liegt der Projektmappe nicht bei. Wir können dazu eine gesonderte Aufstellung anfordern. Die 40,00 EUR sind nicht durch eine zusätzliche Fremdrechnung belegt.

2 Erinnerung an den 06 und 07 September 2023

Am 06.09.2023 wurde im Bestandsbereich weiter zurückgebaut. Dies bestreiten wir nicht. Der für die Fundamentachse vorgesehene Bagger blieb nach unserer Erinnerung am offenen Graben. Der Fahrer half zeitweise beim Absperren und bei der Sicherung des Leitungsfundes. Einen damals gegengezeichneten Stundenzettel, der diese Arbeiten minutengenau von Wartezeit trennt, können wir heute nicht vorlegen.

Am 07.09.2023 warteten wir auf die Klärung, ob der Pumpenstrang in Betrieb bleiben musste. Es wurde Material umgelagert. Herr Albrecht erinnert eine Unterbrechung des Aushubs bis zur Entscheidung über den neuen Verlauf; Beginn und Ende einzelner Bewegungen des Baggers wurden im allgemeinen Bautagebuch nicht erfasst. Die Zuordnung des Strangs erfolgte erst am 11.09.2023. Daraus folgt aus unserer Sicht aber nicht, dass für jeden Zwischentag Gerätebereitschaft abgerechnet wurde.

3 Abgrenzung und offene Unterlagen

Wir haben nur den 06. und 07.09.2023 angesetzt. Der Fahrer war nicht durchgehend untätig. Wir sehen Sicherungsarbeiten als Teil der angeordneten Bereithaltung; eine gesonderte Vergütungsvereinbarung hierzu können wir nicht beifügen. Über den Einwand, dass Vorhaltung oder Personal bereits in der Baustelleneinrichtung beziehungsweise in ausgeführten Positionen enthalten sein könnten, besteht keine Einigung.

Eine von uns vorgeschlagene hälftige Anerkennung soll nicht stillschweigend in die Schlussprüfung eingetragen werden. Bitte teilen Sie uns mit, welche Unterlagen Sie für eine weitere Prüfung benötigen. Unsere Erläuterung ersetzt weder den Auftrag N01.1 bis N01.4 noch dessen ausdrücklichen Vorbehalt zu N01.5.

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

50_2026-09-29_Hauswart_Betriebsbeobachtungen.docx

Einbeck, 29.09.2026

Beobachtungen an Rinne und Saalwand

Frau Döring bat mich, meine Beobachtungen nach der Begehung vom 17.09.2026 schriftlich festzuhalten. Ich habe den Putz nicht geöffnet, keine elektrische Feuchtemessung vorgenommen und die Grundstücksleitung nicht gespült. Die nachstehenden Zeiten stammen aus meinen aktuellen Kalendereinträgen. Meine Erinnerung an die Reinigung vom 03.09.2026 habe ich davon getrennt.

1 Rückblick auf die erste Meldung

Am 03.09.2026 hatte ich Blätter und kleine Zweige vom Rost entfernt. In meinem Kalender steht nur „Eingang gekehrt, Rinne sauber“. Ob der Ablaufstutzen damals frei war, habe ich nicht geprüft. Am 04.09.2026 sah ich nach einem Regenschauer Wasser vor T-03. Niederschlagsmenge und Dauer habe ich nicht gemessen. Das Foto der Wand vom 07.09.2026 ist Datei 42; es zeigt keine Aufnahme des Wassers vor der Tür.

2 Beobachtungen seit der gemeinsamen Begehung

Zeitpunkt	Beobachtung	Was ich tatsächlich getan habe
21.09.2026, 08:10	Rost fest; wenige Blätter im Rinnenkasten. Keine Pfütze.	Blätter von Hand entfernt, Anschluss nicht geöffnet.
24.09.2026, 17:35	Nach einem Schauer Wasser am seitlichen Anschluss. Mit Zollstock etwa 4 mm tief.	Zugang vorübergehend abgesperrt. Kein Foto gefertigt.
24.09.2026, 18:10	Wasserfläche kleiner; schmaler Rand noch sichtbar.	Keine Reinigung zwischen beiden Beobachtungen.
28.09.2026, 09:20	Wand links vom Nordfenster unverändert fleckig; loser Farbspan am Boden.	Span beim Kehren entsorgt; keine Probe zurückgelegt.
29.09.2026, 08:45	Kein Wasser vor T-03; Rost lässt sich nicht klappernd bewegen.	Sichtkontrolle vor Öffnung des Hauses.

3 Grenzen meiner Angaben

Die Tiefe vom 24.09.2026 habe ich an einer erreichbaren Stelle abgelesen, nicht als vermessene Höhenlage des Bauteils. Sie lässt sich nicht unmittelbar mit dem Höhenversatz von etwa 6 mm aus der Begehung vergleichen. Der kleine Wasserrand war nach meinem zweiten Rundgang noch sichtbar; wann er vollständig verschwand, weiß ich nicht.

Die Verfärbung erschien mir an denselben Stellen wie am 07.09.2026. Ich habe die Ränder nicht markiert und keinen Maßstab angelegt. Deshalb kann ich weder eine sichere Ausbreitung noch eine Abnahme angeben. Die Türen bleiben im üblichen Betrieb nutzbar; bei Wasser vor dem Eingang leite ich Besucher zum freigehaltenen anderen Zugang und informiere den Vorstand.

Für einen Untersuchungstermin bin ich am 09.10.2026 vormittags verfügbar. Dieser Termin ist von der Firma noch nicht bestätigt. Ich werde vorher keine Bauteile entfernen, damit die Beteiligten den Ausgangszustand sehen können.

gez. Ralf Winter, Hauswart

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

51_2026-09-30_Angebot_Anschlussuntersuchung.docx

Einbeck, 30.09.2026

Angebot zur Untersuchung des Rinnenanschlusses

Sehr geehrte Frau Döring, aufgrund der Begehung vom 17.09.2026 und Ihrer Bitte um einen begrenzten Untersuchungsvorschlag bieten wir die nachstehenden Arbeiten an. Das Angebot betrifft die Ermittlung des Zustands. Ein Sanierungserfolg und die Kostentragung für eine spätere Mangelbeseitigung werden damit nicht vereinbart.

1 Untersuchung ohne Bauteilöffnung

Zum Pauschalpreis von 620,00 EUR netto nehmen wir die zugänglichen Höhen am letzten Rinnenelement, der Türschwelle und dem angrenzenden Belag mit Bezug auf einen gemeinsam festgelegten Punkt auf. Wir öffnen den herausnehmbaren Rost, dokumentieren vorhandenes Sediment und prüfen den zugänglichen Ablauf mit einer kleinen Kamera, soweit der Verlauf die Einführung erlaubt. Erst nach der Aufnahme wird ein begrenzter Wasserversuch mit protokollierter Menge durchgeführt.

Enthalten sind zwei Mitarbeiter für zusammen sechs Arbeitsstunden, Anfahrt und ein Protokoll mit Messpunktskizze. Eine flächige Reinigung, Druckspülung oder Demontage der Grundstücksleitung ist nicht enthalten. Ist die Leitung für die Kamera nicht passierbar, wird die Stelle dokumentiert und vor einem weiteren Eingriff Rücksprache gehalten. Aus dem bloßen Abbruch einer Kamerafahrt wird keine Ursache abgeleitet.

2 Wahlposition zur örtlichen Öffnung

Eine zusätzliche Öffnung am Übergang Rinne und Grundstücksleitung bieten wir als Wahlposition zu 980,00 EUR netto an. Sie umfasst die Aufnahme von bis zu 1,00 m² Pflaster, vorsichtige Freilegung bis 0,60 m Tiefe und die anschließende Wiederherstellung desselben Bereichs. Eine Öffnung des Saalwandputzes oder der Sockelabdichtung ist davon nicht umfasst. Für einen solchen Eingriff benötigen wir einen gesonderten Umfang und eine abgestimmte Sicherung der Proben.

Die Wahlposition wird nur nach gesonderter schriftlicher Beauftragung ausgeführt. Bei unerwarteten Leitungen oder einer erforderlichen größeren Öffnung unterbrechen wir die Arbeiten. Die erstmalige Wiederherstellung im angebotenen Umfang ist enthalten; zusätzliche Sanierungsarbeiten sind es nicht.

3 Preis und Abstimmung

Umfang	Netto EUR	Umsatzsteuer EUR	Brutto EUR
Nur Untersuchung nach Abschnitt 1	620,00	117,80	737,80
Zusätzliche Wahlposition nach Abschnitt 2	980,00	186,20	1.166,20
Beide Abschnitte zusammen	1.600,00	304,00	1.904,00

Wir schlagen den 09.10.2026 um 09:00 Uhr vor. Der Termin ist bis 06.10.2026 freizuhalten und danach erneut abzustimmen. Frau Hartwig und der Vertreter der Außenanlagen sollen Gelegenheit zur Teilnahme erhalten. Wir bitten den Verein um die Koordination. Bis zum heutigen Datum liegt uns keine Beauftragung vor.

Die Mitwirkung an der Untersuchung ist keine Erklärung zur Verursachung oder zur Übernahme aller Kosten. Wir halten unseren Hinweis auf die Bestandsfeuchte aufrecht. Zugleich wollen wir den Rinnenanschluss gemeinsam nachvollziehbar aufnehmen. Dieses Angebot gilt bis 14.10.2026.

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

52_2026-10-01_Leistungsnachweise_Hartwig.docx

Einbeck, 01.10.2026

Leistungsnachweise und offene Unterlagen

Sehr geehrte Frau Döring, Sie baten um eine Erklärung, welche Arbeitsergebnisse hinter den Phasenbezeichnungen unseres Vertrags stehen. Wir ordnen die vorhandenen Dateien den tatsächlich bearbeiteten Themen zu. Das ist unsere Darstellung des Leistungsstands am 01.10.2026, keine neue Honorarrechnung und keine Erklärung Ihres Vorstands zur Abnahme.

1 Planung bis zur Genehmigung

Aus dem Bedarfsbeschluss 01 ergaben sich Saal, Besprechungsraum und barrierearmer Zugang als Planungsaufgabe. Das Grundlagengespräch 03 und die Bestandsaufnahme 04 hielten die Untersuchungsstellen fest. Die Bestandsarbeiten sind nach Vertrag gesondert pauschal vergütet; sie werden nicht nochmals als Prozentanteil der Grundlagenermittlung berechnet.

In der Vorplanung wurden Süd- und Nordanbau anhand gleicher Nutzungsanforderungen verglichen (05). Die Entscheidung 06 gab den Nordanbau vor. Entwurf 07, Objektbeschreibung 08, Kostenberechnung 09 und Fachplanerabstimmung 10 bilden den anschließenden Stand. Die Kostenberechnung verwendete eine vorsichtige Steuerpauschale; die Kostenfeststellung 37 führt Gebühren später ohne Umsatzsteuer. Dieser Unterschied ist kein Wechsel der vertraglichen Honorarpauschale.

Die Genehmigungsplanung umfasst Antrag 11 und Bauvorlagen 12 bis 14. Auf die Nachforderung 15 wurde mit der Brandschutzergänzung 16 reagiert; 17 enthält den Genehmigungsbescheid. Der spätere Wunsch nach Gymnastiknutzung aus 29 wurde nicht als genehmigte Umplanung ausgeführt.

2 Ausführung und Vergabe

Nach dem Abruf 18 wurden die Ausführungsstände AP-01 und D-12 (20 und 21) sowie der Rahmenterminplan 19 geführt. Die Portalansicht 22 unterscheidet die Freigaben. Der Koordinationsstand TGA-04 ersetzt nach unserer Ablage nicht D-12. Ob die abweichende Höheninformation bei der Ausführung hinreichend eindeutig aufgelöst wurde, soll anhand des tatsächlichen Anschlusses geprüft werden.

Das Leistungsverzeichnis 23 und die bepreiste Fassung 24 enthalten dieselben zwölf Positionen. Die Angebote 25 und 26 sind im Preisspiegel 27 positionsbezogen verglichen. 28 dokumentiert den Zuschlag. Die zusätzliche Pumpenleitung wurde über Nachtragsangebot 33 und Teilauftrag 34 behandelt. Die ausgeschlossene Gerätebereitschaft wird nicht durch die technische Prüfung der Leitungsarbeiten zu einem Auftrag.

3 Überwachung und Betreuung

Bautagebuch 30, Aufmaß 35, Schlussrechnung 36 und Prüfung 37 zeigen den Bau- und Abrechnungsstand. Die gemeinsame Mengentabelle ersetzt keine Messung des Rinnengefälles. Zur Nachkontrolle von M-01 und M-02 enthält 39 einen Eintrag; ein eigenes Nachkontrollblatt vom 28.03.2024 ist in dieser Mappe nicht vorhanden. Die Abnahme 38 betrifft Los 1. Die gesonderte Abnahme unserer Planungs- und Überwachungsleistungen war bei Übergabe 39 noch vorgesehen.

Die Dateien 41 bis 44 dokumentieren Meldung, Foto, Begehung und laufende Betreuung. Die fachliche Zuordnung der heutigen Erscheinungen ist noch offen. Eine weitere Begehung vor den gewerkeweisen Kontrollterminen bleibt zu organisieren. Die Pauschale von 960,00 EUR netto für Phase 9 wird im bisherigen Kostenstand deshalb gesondert geführt; aus der einzelnen Begehung folgt kein automatischer voller Erledigungsgrad.

4 Bitte um Abgleich

Bitte teilen Sie uns mit, ob die gesonderte Abnahmeerklärung oder weitere Einzelblätter in Ihrem Papierarchiv liegen. Unsere ergänzende Arbeitsmappe wird Honorarzuordnung, rechnerisch angesetzten Leistungsanteil und Belegstatus getrennt zeigen. Prozente sind Rechengrößen aus dem individuell vereinbarten Vertrag. Sie ersetzen weder eine Prüfung einzelner Leistungen noch eine Entscheidung über Fälligkeit, Mängel oder Zahlung.

gez. Lena Hartwig, Architektin

Bezug: Die genannten Nummern bezeichnen eigenständige Unterlagen der Projektmappe. Anlagen: keine.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_2021-01-18_Architektenvertrag.pdf

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 18.01.2021 · Bezug BH-21-04

Architektenvertrag Gebäudeplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bürgerhaus Leinewinkel e.V., vertreten durch Maren Döring und Uwe Feldmann, beauftragt Hartwig Architektur, Inhaberin Lena Hartwig, mit Umbau und nördlichem Anbau des Bürgerhauses Lindengasse 18 in Einbeck. Die Parteien vereinbaren die folgenden Leistungen und Vergütungen individuell.

1 Leistungsgegenstand

Geschuldet sind die Grundleistungen des Leistungsbildes Gebäude für die Leistungsphasen 1 bis 9 nach Anlage 10 zur HOAI. Zunächst werden die Leistungsphasen 1 bis 4 abgerufen. Die Leistungsphasen 5 bis 9 werden erst nach schriftlichem Abruf ausgeführt. Die Gebäudeteile werden als ein funktional zusammenhängendes Objekt geplant. Die Abstimmung mit Tragwerks- und Haustechnikplanung gehört zum Auftrag; deren Fachleistungen sind nicht im Honorar enthalten.

Die vorhandenen Räume und der Bedarf folgen dem Vorstandsprotokoll vom 12.11.2020. Frau Hartwig führt die Ortsbesichtigung durch, stellt Varianten mit Kosten und Terminen gegenüber und klärt den Untersuchungsbedarf. Verdeckte Bauteile werden nicht ohne Zustimmung geöffnet. Bestandsaufmaß, vier Feuchtemessstellen und zwei Suchschlitze sind als zusätzliche Leistungen mit 3.000,00 EUR netto enthalten. Laboruntersuchungen oder eine flächendeckende Leitungssuche werden nur nach gesonderter Beauftragung ausgeführt.

2 Honorar

Leistungsphase	Anteil	Nettohonorar EUR
1	2 Prozent	960,00
2	7 Prozent	3.360,00
3	15 Prozent	7.200,00
4	3 Prozent	1.440,00
5	25 Prozent	12.000,00
6	10 Prozent	4.800,00
7	4 Prozent	1.920,00
8	32 Prozent	15.360,00
9	2 Prozent	960,00

Das individuell vereinbarte Pauschalhonorar für alle Grundleistungen beträgt 48.000,00 EUR netto. Die Prozentanteile dienen der Zuordnung dieser Pauschale zu den abgerufenen Leistungen und sind keine Behauptung einer zwingenden Mindestvergütung. Mit den 3.000,00 EUR für Bestandsarbeiten und 3.000,00 EUR pauschalen Nebenkosten ergibt sich bei vollständigem Abruf ein Nettohonorar von 54.000,00 EUR. Gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu. Änderungen der anrechenbaren Kosten allein ändern diese Pauschale nicht.

3 Abstimmung und Änderungen

Frau Döring entscheidet für den Bauherrn über Raumprogramm und Bemusterung. Vergaben und vergütungswirksame Leistungsänderungen bedürfen der gemeinsamen Bestätigung von Frau Döring und Herrn Feldmann. Die Architektin hat keine Vollmacht, Bauaufträge oder Nachträge namens des Vereins abzuschließen. Sie informiert den Vorstand vor weiterer Planung über absehbare Überschreitungen des verfügbaren Gesamtrahmens von 430.000,00 EUR brutto. Ein Erfolg unabhängig von Marktpreisen oder unerkanntem Bestand wird nicht zugesagt.

4 Rechnungen und Objektbetreuung

Abschläge dürfen nach dokumentiertem Leistungsfortschritt verlangt werden. Die Teilrechnungen bezeichnen den Bearbeitungsstand und bereits gezahlte Beträge. Nach Abschluss der Bauausführung werden die Planungs- und Überwachungsleistungen gesondert zur Abnahme vorgestellt. Die Übergabe des Gebäudes an den Hauswart ersetzt diese Erklärung nicht.

In der Objektbetreuung werden gemeldete Mängel fachlich bewertet und die Verantwortlichen zur gemeinsamen Besichtigung eingeladen. Die Architektin führt eine Begehung während der laufenden Gewährleistungszeiten sowie rechtzeitig vor deren jeweiligem Ablauf durch und wirkt bei der Freigabe vereinbarter Sicherheiten mit. Die Fristen werden gewerkeweise anhand der tatsächlichen Abnahmen und Vertragsunterlagen geführt. Eine rechtliche Prüfung von Hemmung, Neubeginn oder streitiger Anspruchsinhaberschaft ist nicht als Rechtsberatung beauftragt.

5 Unterlagen und Vertragsende

Planstände werden mit Datum und Revision geführt. Bauherr und ausführende Firmen erhalten die freigegebenen Unterlagen. Frau Hartwig übergibt bei Projektabschluss bearbeitbare Plandateien und einen geordneten Dokumentennachweis. Bei Beendigung des Vertrags werden bis dahin erbrachte Leistungen nachvollziehbar abgerechnet. Die Parteien vereinbaren deutsches Recht; Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht einbezogen.


Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring und Uwe Feldmann, Vorstand

Anlagen: 01_2020-11-12_Bedarfsbeschluss.docx

04_2021-02-10_Bestandsaufnahme.pdf

N

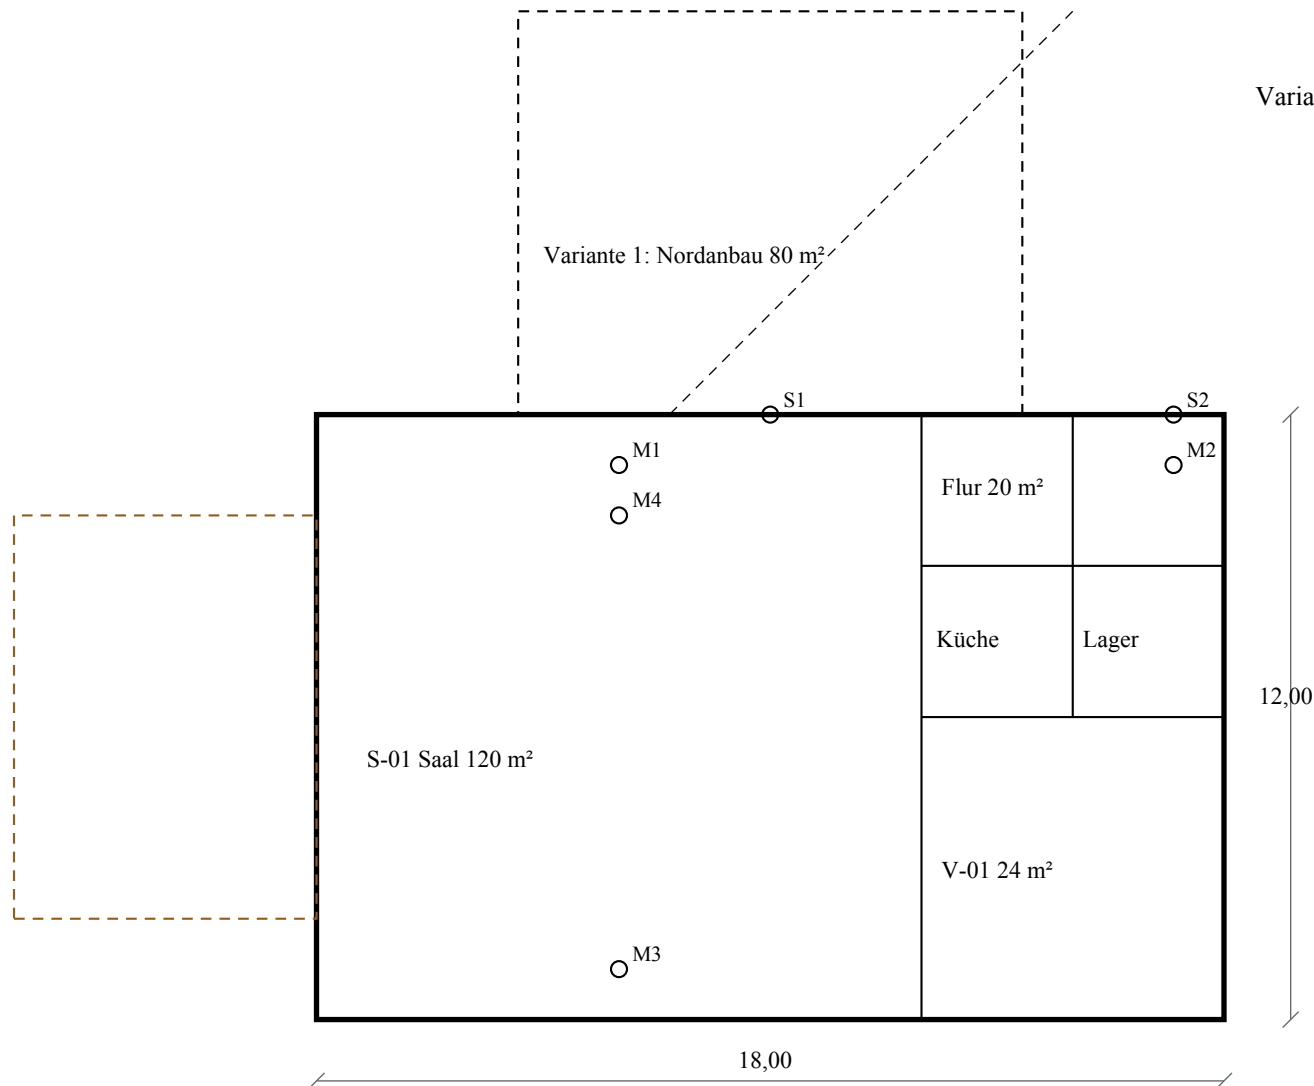

Variante 2: Westanbau 48 m²

Altleitung: nur Erinnerung des Hauswarts


Saalfußboden 112,40 m

Hof etwa 0,60 m tiefer

S1 und S2: punktuelle Suchschlitze. M1 bis M4: relative kapazitive Vergleichsanzeigen. Keine flächige Leitungssuche.

Die gestrichelten Baukörper sind untersuchte Varianten, keine Genehmigungs- oder Ausführungsplanung. Der Saalsockel ist örtlich verfärbt.

Maßstab 1:150 bei A4



1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Aufgemessen durch Lena Hartwig und Ralf Winter am 10.02.2021. Bestand außen 18,00 m mal 12,00 m, Bruttofläche 216 m². Nordpfeil und Maßketten beziehen sich auf das gesamte Bestandsgebäude. Räume: Saal 120 m², Vereinsraum 24 m², Küche 12 m², Lager 10 m² und Flur 20 m²; Wand- und Konstruktionsfläche 30 m².

Suchschlitz S1 liegt mittig an der Nordwand, S2 an der nordöstlichen Ecke. Beide wurden bis zur Fundamentoberkante geöffnet. Dort war eine Außenabdichtung nur in Resten erkennbar. Die genaue Lage einer Horizontalsperre konnte nicht festgestellt werden. Die nördliche Saalwand zeigt innen Verfärbung bis etwa 25 cm Höhe.

Kapazitive Vergleichsanzeigen: Messpunkt M1 am Saalsockel 84, M2 an der Nordostecke 79, M3 am südlichen Sockel 38 und M4 in 1,20 m Höhe an der Nordwand 35 Geräteeinheiten. Das Gerät liefert relative Vergleichswerte, keine Masseprozent. Die Aufnahmesituation war unbeheizt bei etwa 7 Grad Raumtemperatur.

Der gestrichelte Leitungsverlauf ist ausschließlich die Erinnerung des Hauswarts aus der Skizze von 1992. Er ist nicht geortet und darf nicht als gesicherte Lage für Erdarbeiten verwendet werden. Eine flächige Untersuchung des Hofes wurde nicht durchgeführt. Die Variantenfelder zeigen die Lage des möglichen Nordanbaus mit 10,00 mal 8,00 m und des alternativen Westanbaus mit 6,00 mal 8,00 m; sie sind keine Ausführungsfreigabe.

Empfänger: Bürgerhaus Leinewinkel e.V.. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

05_2021-03-18_Variantenuntersuchung.pdf

Vorplanung mit Varianten und Kostenschätzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage der Besichtigung und der Bestandsaufnahme legen wir zwei Varianten mit gleichem Nutzungsprogramm vor. Beide erhalten den 120 m² großen Saal und den 24 m² großen Vereinsraum. Für 120 Personen werden ein ebener Zugang, zeitgemäße Sanitärbereiche und eine getrennte Technikfläche vorgesehen. Die Beträge sind Preisansätze vom März 2021, keine Unternehmerangebote.

1 Variante 1 Anbau nach Norden

Der Anbau wird 10,00 m breit und 8,00 m tief. Er enthält Foyer 32 m², Sanitär 20 m², Lager 8 m² und Technik 8 m². Die 12 m² Differenz zur Bruttofläche entfallen auf Wände. Der Hofzugang erhält zwei Rampenläufe mit zusammen 12,00 m Länge. Die vorhandene nördliche Saalwand bleibt als Innenwand erhalten; die Verbindung wird durch eine neue Öffnung hergestellt. Die Bauarbeiten greifen in den ungesicherten Leitungsbereich ein.

2 Variante 2 Umbau mit kleinerem Westanbau

Ein 6,00 m mal 8,00 m großer Westanbau nimmt die Sanitärbereiche auf. Das Foyer wird im Bestand geschaffen und verkleinert den Saal um 24 m² auf 96 m². Um das gleiche Veranstaltungsprogramm zu ermöglichen, müssen Tische ausgelagert und zwei Termine des Seniorenkreises getrennt durchgeführt werden. Der längere Weg vom Parkplatz erfordert 24 m² Rampen- und Podestfläche. Der westliche Apfelbaum entfällt.

Ansatz netto EUR	Variante 1	Variante 2
Baukonstruktion	160.000,00	142.000,00
Technische Anlagen	70.000,00	74.000,00
Außenanlagen	20.000,00	29.000,00
Ausstattung	12.000,00	15.000,00
Planung, Untersuchungen, Gebühren	60.000,00	58.000,00
Summe netto	322.000,00	318.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	61.180,00	60.420,00
Summe brutto	383.180,00	378.420,00
Abstand zum Finanzrahmen 430.000 EUR	46.820,00	51.580,00

3 Vergleich und Terminannahmen

Der Mehrbetrag der Variante 1 beträgt 4.760,00 EUR brutto. Er erhält die Saalfläche und verkürzt interne Wege. Das Risiko unbekannter Leitungen ist dort größer. In beiden Varianten ist lediglich eine örtliche Sockelabdichtung angesetzt, keine flächige nachträgliche Horizontalsperre. Die Kostenschätzung enthält keine Vorsorge für einen gegebenenfalls notwendigen Austausch des alten Kanalanschlusses.

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Vorgesehen sind Entwurf bis Juni 2021, Abstimmung mit der Bauaufsicht und Antrag Anfang 2022, Ausführungsplanung bis Sommer 2022, Angebote im Frühjahr 2023 und Bau ab August 2023 bis März 2024. Dieser Ablauf berücksichtigt, dass der Verein für 2022 bereits Veranstaltungen angenommen hat. Er setzt rechtzeitige Freigaben voraus. Die Architektin regt vor dem Fundamentaushub eine Leitungsortung im Anbaubereich an.

Bitte teilen Sie mit, welche Variante weiterbearbeitet werden soll. Eine Entscheidung über den Verzicht auf zusätzliche Bestandserkundung wird mit der Variantenwahl nicht getroffen. Beide Varianten sind mit einer kleinen Grundrisskizze im Bestandsblatt räumlich verortet; das weiterzuentwickelnde Raumprogramm ist vorstehend vollständig aufgeführt.


Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 04_2021-02-10_Bestandsaufnahme.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_2021-06-10_Entwurfsplan.pdf

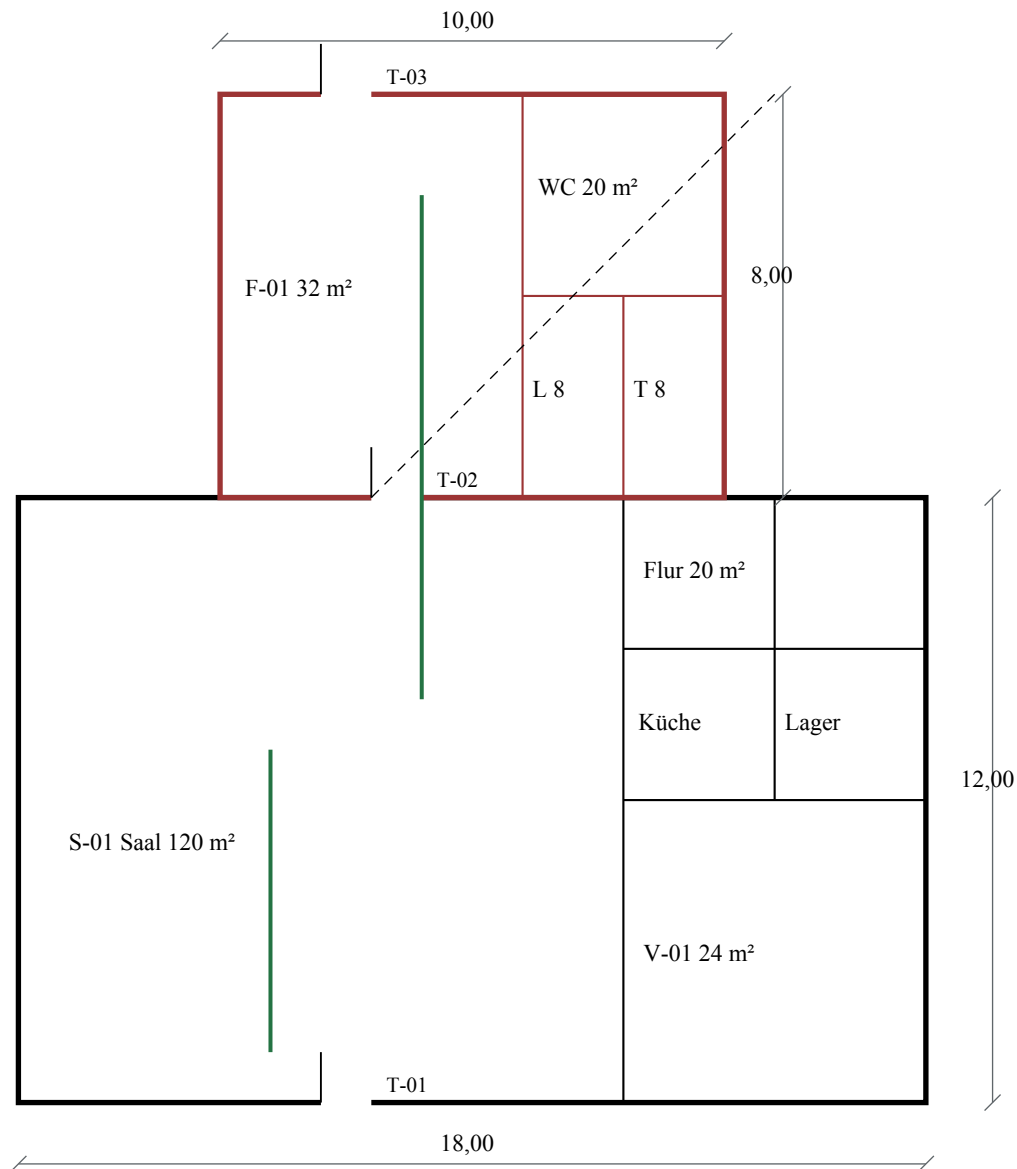

N

Grün: Wege zu den Ausgängen

Gestrichelt: ungeorteter Altleitungsverlauf

Fertigfußboden 112,40 m


Hof am Rampenantritt 111,80 m

Anbau: Wände 12 m², Nutzung 68 m²

Rampe nördlich des Foyers: zwei Läufe je $6,00 \times 1,50$ m, Zwischenpodest $1,50 \times 1,50$ m. Höhenunterschied 0,60 m; 5 Prozent Längsgefälle.

Wandstärken und Öffnungsrohbaumaße sind in AP-01 angegeben. Rinnen- und Sockelanschluss siehe D-12. Der Grundriss stellt keine Leitungserkundung dar.

Maßstab 1:150 bei Druck auf A4



1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Entwurf auf Grundlage der Variantenentscheidung vom 25.03.2021. Der 18,00 m mal 12,00 m große Bestand bleibt erhalten. Der Anbau liegt an der Nordseite, 4,00 m von der westlichen Bestandskante versetzt, und misst 10,00 m mal 8,00 m. Die Gesamtbruttofläche beträgt 296 m².

Foyer 32 m², Sanitärzone 20 m², Lager 8 m² und Technik 8 m² ergeben 68 m² Nutzfläche im Anbau. Die Außen- und Innenwände beanspruchen weitere 12 m². Die im Plan eingetragenen Raumflächen sind mit der Objektbeschreibung abgestimmt. Tür T-02 verbindet den Saal mit dem Foyer.

Höhenbezug: Saalfußboden 112,40 m, Hof am Rampenantritt 111,80 m. Die Rampe liegt nördlich des Foyers innerhalb des eigenen Grundstücks. Zwei Läufe von jeweils 6,00 m Länge überwinden mit 5 Prozent Gefälle je 0,30 m. Zwischenpodest 1,50 mal 1,50 m. Alle Höhen beruhen auf dem örtlichen Projektbezugspunkt, nicht auf einem amtlichen Nivellement.

Das Mauerwerk des Anbaus erhält eine eigenständige Gründung. Der Bestandsdurchbruch wird mit der Tragwerksplanung abgestimmt. Die in Rot eingetragenen Bauteile sind neu, schwarze Bauteile bleiben bestehen. Küchen- und Vereinsraumnutzung werden nicht erweitert. Entwurfsfreigabe durch den Vorstand am 15.06.2021; dieses Blatt ist keine Ausführungsunterlage.

Empfänger: Bürgerhaus Leinewinkel e.V.. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

10_2021-06-15_Fachplanerabstimmung.pdf

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 15.06.2021 · Bezug BH-21-04

Abstimmung mit den Fachplanern

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 15.06.2021 wurden der Entwurf und die Kostenberechnung mit Paul Mertens, Tragwerksplaner Dirk Steinbach und dem Vorstand abgestimmt. Die Besprechung fand von 10:00 bis 12:15 Uhr im Bürgerhaus statt. Die nachstehenden Festlegungen werden in die Bauvorlagen übernommen.

1 Tragwerk und Gebäudetechnik

Herr Steinbach legt für den Nordanbau eine vom Bestand getrennte Gründung zugrunde. Die Saalöffnung wird mit einem Stahlträger überdeckt; dessen Auflager dürfen nicht im geschädigten Sockelputz bemessen werden. Die Tragwerksunterlagen T-02 werden vor Freigabe der Ausführung durch die Architektin mit den Öffnungen im Gebäudeplan abgeglichen. Es werden keine Lasten des Anbaus in das alte Dach eingeleitet.

Herr Mertens sieht die neue Verteilung im nordöstlichen Technikraum vor. Abwasser quert die Fundamente nur in festgelegten Hülzen. Der Altstrang im Hof soll vor Baubeginn geortet werden. Der Verein beauftragt heute noch keine flächige Untersuchung; Frau Döring will den Umfang mit dem Hauswart besprechen. Dieser Punkt bleibt mit Verantwortlichem Bauherr und Wiedervorlage zur Ausführungsfreigabe offen.

2 Kostenabgleich

Die Kostenberechnung beträgt 337.240,00 EUR netto und 401.315,60 EUR brutto. Gegenüber der Schätzung vom 18.03.2021 ergibt sich ein Anstieg von 15.240,00 EUR netto beziehungsweise 18.135,60 EUR brutto. Hauptursachen sind konkretisierte Gründung, 74.000,00 EUR technische Anlagen und die Sockelarbeiten. Zum Finanzrahmen verbleiben 28.684,40 EUR brutto. Der Vorstand bestätigt den Entwurf, ohne den Gesamtrahmen anzuheben.

3 Genehmigung und Ablauf

Für den Bauantrag werden Lageplan, Grundriss, Ansichten, Schnitt und Baubeschreibung bis Januar 2022 zusammengestellt. Das Nutzungskonzept bleibt unverändert. Rettungswege aus dem Saal führen getrennt nach Süden und über das Foyer nach Norden. Die Verbindungstür darf nicht als Lagerfläche genutzt werden. Herr Mertens übergibt die Angaben zum Technikraum bis Ende Juni; die Architektin übernimmt sie in die Antragsfassung.

Der Vorstand erhält Kostenberechnung und Entwurfsplan. Die endgültige Bestellung von Bauleistungen erfolgt nach Genehmigung und Angebotsprüfung. Die Beteiligten stimmen dem Protokollinhalt zu; Herr Winter erhält den Abschnitt zum Leitungsbestand zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig; Paul Mertens; Dirk Steinbach; Maren Döring

Anlagen: 07_2021-06-10_Entwurfsplan.pdf; 09_2021-06-14_Kostenberechnung.xlsx

11_2022-01-20_Bauantrag.pdf

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Stadt Einbeck · Bauaufsicht
Teichenweg 1 · 37574 Einbeck
Einbeck, 20.01.2022 · Bezug BH-21-04

Bauantrag Umbau und Nordanbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen die Genehmigung des Umbaus und der Erweiterung unseres Bürgerhauses in Einbeck. Der Antrag bezieht sich auf die nachstehend eindeutig bezeichnete Baumaßnahme und die beigefügten Bauvorlagen. Zustellungsbevollmächtigte für Rückfragen und Bescheide ist Lena Hartwig, Mühlenweg 7, 37574 Einbeck.

1 Antragsteller und Baugrundstück

Angabe	Eintragung
Bauherr und Eigentümer	Bürgerhaus Leinewinkel e.V., Lindengasse 18, 37574 Einbeck
Vertretung	Maren Döring und Uwe Feldmann, Vorstand
Grundstück	Gemarkung Einbeck, Flur 14, Flurstück 83/7
Grundstücksfläche	1.512 m²; 42,00 m mal 36,00 m
Entwurfsverfasserin	Lena Hartwig, Architektin, Mühlenweg 7, 37574 Einbeck
Bauvorhaben	Umbau eines eingeschossigen Bürgerhauses und 80 m² Nordanbau

2 Umfang des Antrags

Beantragt werden eine neue Foyer- und Sanitärzone, der niveaugleiche Hauptzugang über eine Rampe, der Durchbruch zwischen Saal und Foyer sowie die Erneuerung der Innenoberflächen und technischen Anlagen. Der Saal wird nicht vergrößert. Im Haus werden höchstens 120 Personen gleichzeitig aufgenommen. Die Nutzung umfasst Vereinsbesprechungen, Chorproben, Seniorennachmittage und gelegentliche private Feiern ohne Übernachtung.

Der Bestand hat 216 m², der Anbau 80 m² Bruttofläche. Die überbaute Grundfläche beträgt nach Ausführung 296 m². Die Grundstückszufahrt erfolgt unverändert von der Lindengasse. Auf dem eigenen Grundstück werden zwölf Kfz-Stellplätze einschließlich eines verbreiterten Stellplatzes und acht Fahrradplätze nachgewiesen. Der Anbau bleibt 8,00 m von der nördlichen Grundstücksgrenze entfernt.

3 Erklärungen und Bauvorlagen

Die im Lageplan eingetragenen Grundstücksgrenzen und Maße entsprechen den vom Bauherrn zur Planung vorgelegten Unterlagen. Änderungen des Nutzungsprogramms werden vor ihrer Ausführung nachgereicht. Baubeginn ist für August 2023 vorgesehen. Die Auswahl ausführender Unternehmen ist noch nicht erfolgt. Der Bauherr bestätigt die Verfügungsbefugnis über das gesamte Baugrundstück.

Die Unterzeichnenden bestätigen die Übereinstimmung von Lageplan L-01, Bauzeichnung G-01 und Baubeschreibung B-01. Die Angaben zum Brandschutz sind in der Baubeschreibung enthalten. Tragwerksplanung T-02 und technische Ausführungsnachweise werden vor Beginn der betreffenden Arbeiten vorgelegt. Die Aktenführung soll unter der Projektbezeichnung BH-21-04 erfolgen.

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck


vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Döring und Uwe Feldmann, Bauherr; Lena Hartwig, Entwurfsverfasserin

Anlagen: 12_2022-01-20_Lageplan.pdf; 13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf; 14_2022-01-20_Baubeschreibung.docx

12_2022-01-20_Lageplan.pdf

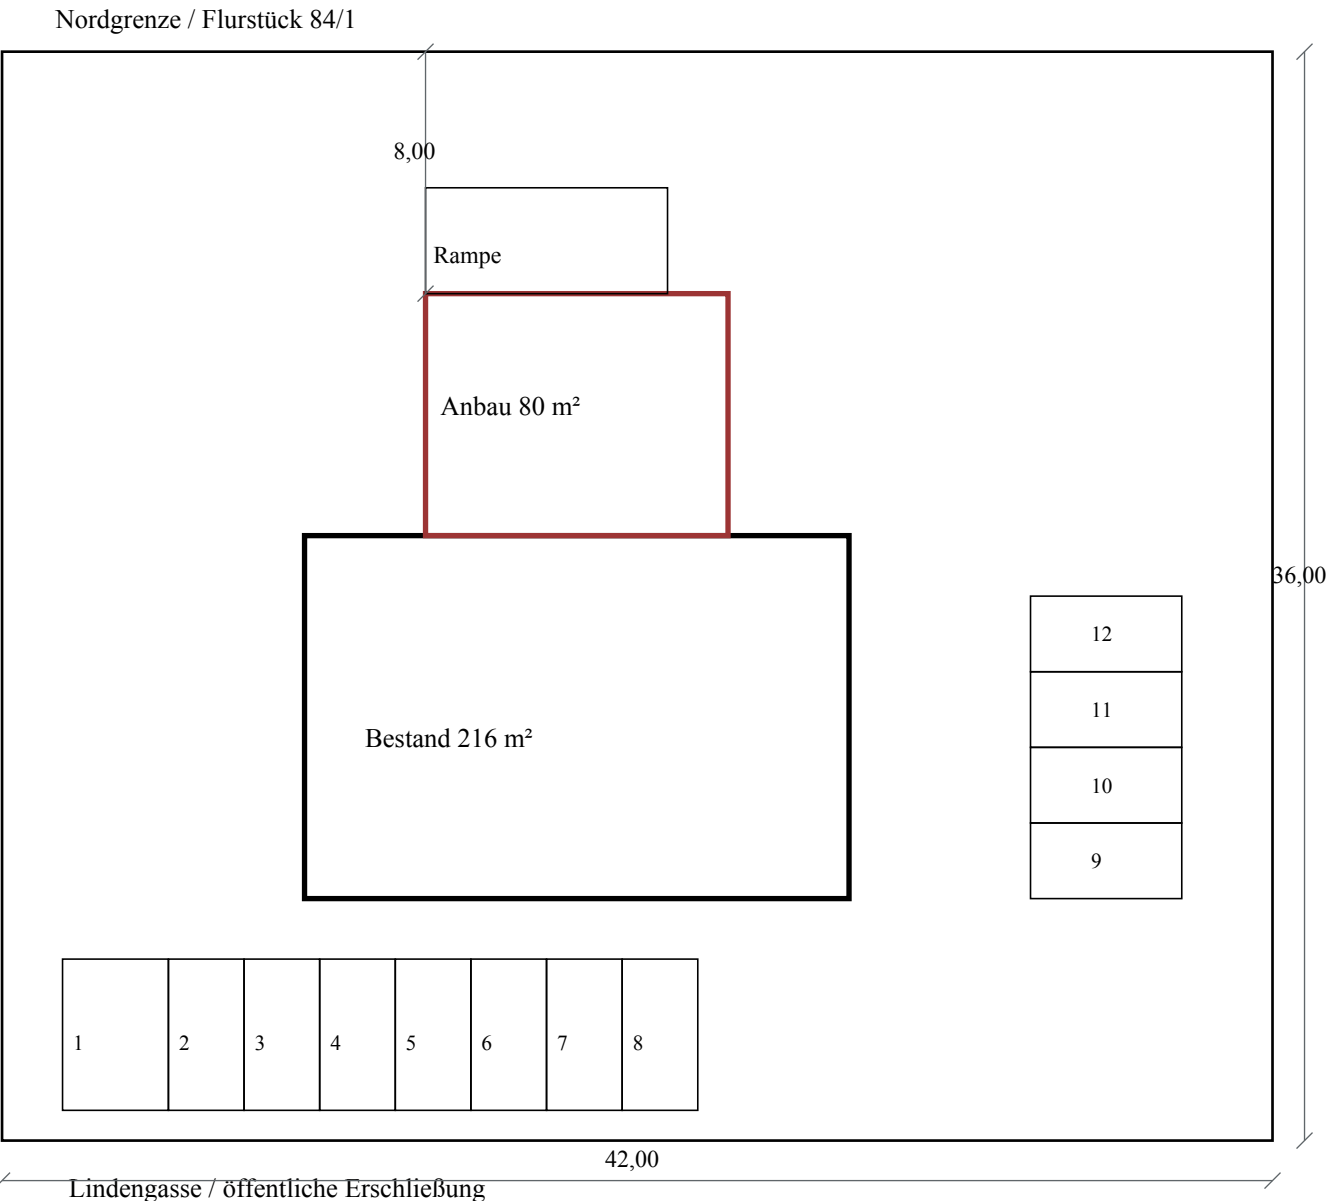

Flur 14 · Flurstück 83/7

- Grundstück: 1.512 m²
- Maßstab 1:250 bei A4
- Westnachbar: 83/6
- Ostnachbar: 83/8
- Zwölf Kfz-Stellplätze
- Acht Fahrradplätze westlich
- Regenwasseranschluss: Nordhof
- Keine Inanspruchnahme fremden Grunds

1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Bauherr: Bürgerhaus Leinewinkel e.V., Lindengasse 18, 37574 Einbeck. Entwurfsverfasserin: Lena Hartwig, Mühlenweg 7, 37574 Einbeck. Baugrundstück: Gemarkung Einbeck, Flur 14, Flurstück 83/7, Fläche 1.512 m². Das Blatt ist der objektbezogene Lageplan der Entwurfsverfasserin nach den vom Bauherrn übergebenen Grundstücksangaben; es wird kein amtliches Vermessungssiegel geführt.


Grundstück 42,00 m breit und 36,00 m tief. Der Bestand liegt 10,00 m von der Westgrenze und 8,00 m von der Straßengrenze entfernt. Seine Grundfläche beträgt 216 m². Der Anbau liegt 14,00 m von der Westgrenze entfernt und endet 8,00 m vor der Nordgrenze. Seine Grundfläche beträgt 80 m². Überbaute Fläche gesamt 296 m², Verhältnis zur Grundstücksfläche rund 0,196.

Der Abstand des Bestands zur Ostgrenze beträgt 14,00 m. Das Grundstück wird von Süden über die Lindengasse erschlossen. Zwölf Kfz-Stellplätze liegen südlich und östlich des Gebäudes; Stellplatz 1 ist auf 3,50 m verbreitert. Acht Fahrradplätze liegen westlich des Rampenzugangs. Der Zugang zu beiden Ausgängen bleibt auf dem eigenen Grundstück.

Nachbarflächen sind westlich Flurstück 83/6, nördlich 84/1 und östlich 83/8. Es ist keine Bebauung auf fremdem Grund beantragt. Die eingezeichnete Regenwasserleitung folgt dem geplanten Anschluss an den vorhandenen Grundstücksstrang; die endgültige Höhenlage wird vor Ausführung ermittelt. Grundlage der Beurteilung ist der Bauantrag vom 20.01.2022 mit Baubeschreibung B-01.

Empfänger: Stadt Einbeck · Bauaufsicht. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf

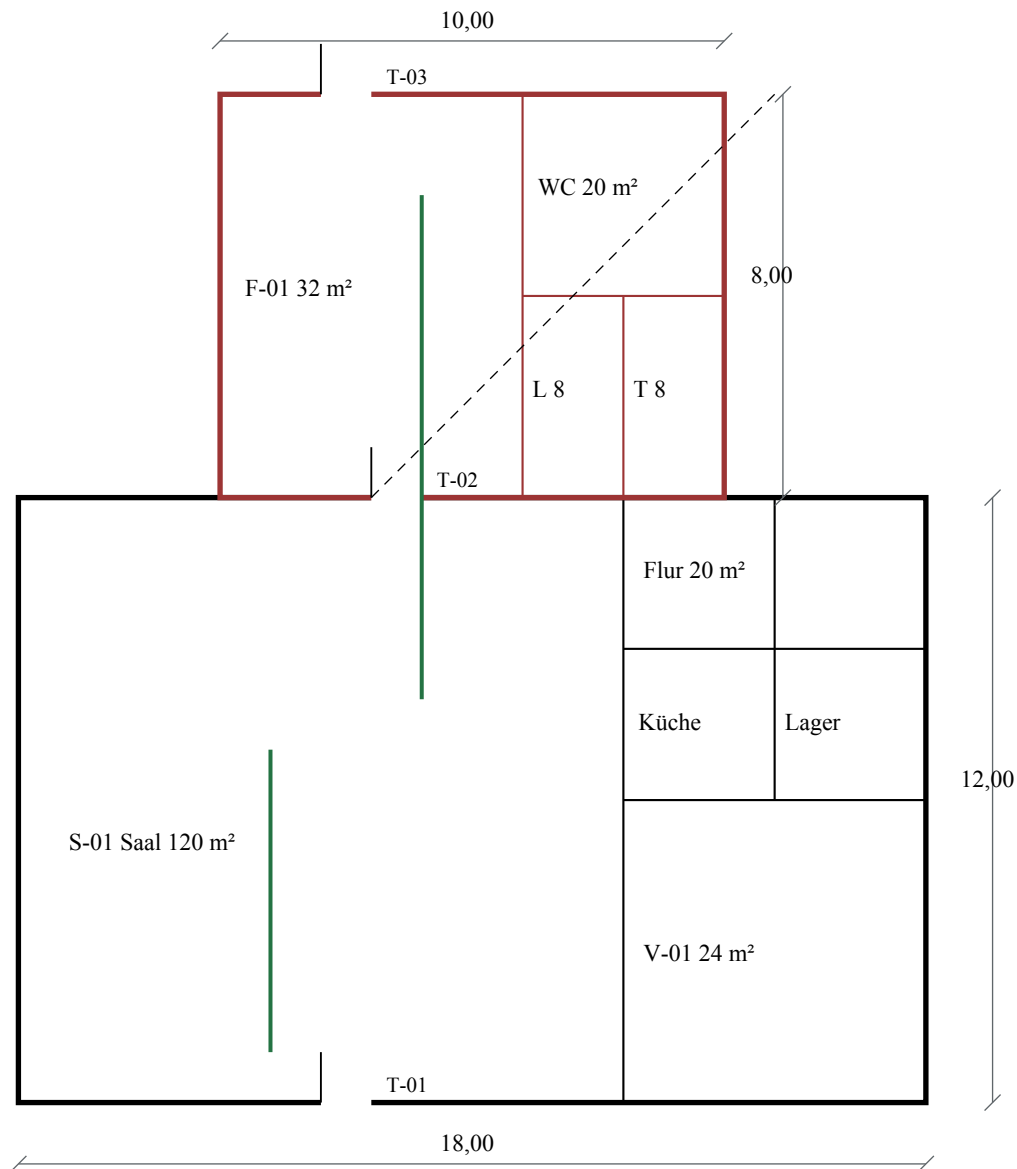

N

Grün: Wege zu den Ausgängen

Gestrichelt: ungeorteter Altleitungsverlauf

Fertigfußboden 112,40 m


Hof am Rampenantritt 111,80 m

Anbau: Wände 12 m², Nutzung 68 m²


Rampe nördlich des Foyers: zwei Läufe je $6,00 \times 1,50$ m, Zwischenpodest $1,50 \times 1,50$ m. Höhenunterschied 0,60 m; 5 Prozent Längsgefälle.

Wandstärken und Öffnungsrohbaumaße sind in AP-01 angegeben. Rinnen- und Sockelanschluss siehe D-12. Der Grundriss stellt keine Leitungserkundung dar.

Maßstab 1:150 bei Druck auf A4



1 Schnitt durch Bestand und Nordanbau · 1:150

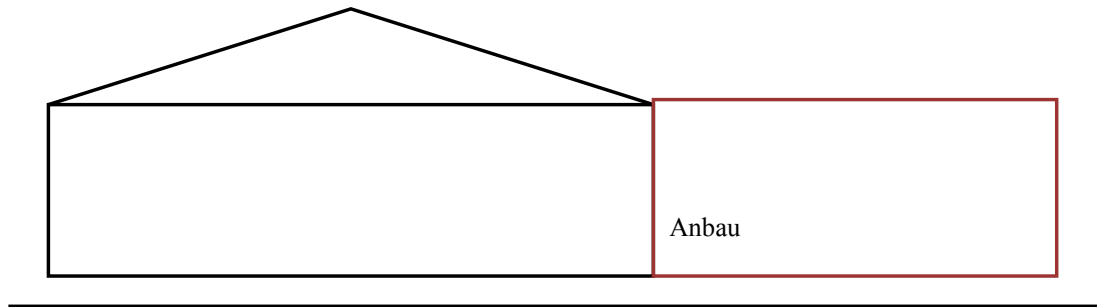

First 117,70


Attika 115,90

FFB 112,40


Rohplatte 112,24

Hof 111,80

2 Nordansicht Anbau · 1:150



3 Ostansicht Anbau · 1:150



Traufe Bestand 115,80 m. Attika Anbau 115,90 m. Der Bezugspunkt des Projekts ist örtlich festgelegt. Öffnungsmaße siehe Grundriss und Baubeschreibung.

1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Diese Bauzeichnung gehört zum Antrag 63-2022-041. Blatt 1 enthält den Grundriss des gesamten Erdgeschosses mit Nutzungsflächen, Türkennungen und Rettungswegen. Blatt 2 enthält den Gebäudeschnitt und die beiden für den Anbau maßgeblichen Ansichten. Der Bestand ist schwarz, der Anbau rot dargestellt. Sämtliche Maße sind in Metern angegeben.

Hauptabmessungen: Bestand 18,00 mal 12,00 m, Anbau 10,00 mal 8,00 m. Fertigfußboden 112,40 m im örtlichen Projektbezug. Bestandstraufe 115,80 m, Bestandsfirst 117,70 m, Attika Anbau 115,90 m. Die Nutzräume liegen auf einer Ebene. Das Dachgeschoss bleibt unausgebaut und ist kein Aufenthaltsbereich.

Die Türen T-01 und T-03 sind Außentüren mit 1,00 m lichter Breite. T-02 verbindet Saal und Foyer ebenfalls mit 1,00 m lichter Breite. Der freie Bestandsflur ist mindestens 1,20 m breit. Die Gesamtbelegung von 120 Personen und die Räume S-01, V-01 und F-01 entsprechen B-01 und der nachgereichten Ergänzung BS-02.

Die im Schnitt gezeigte Bodenplatte des Anbaus liegt mit ihrer Rohoberkante 0,16 m unter Fertigfußboden. Das Flachdach fällt vom Bestand weg nach Norden. Die Bewegungsfuge wird durch die Gebäudehülle geführt. Die nördliche Eingangstür wird stufenfrei an die Rampe angeschlossen. Konstruktions- und Bewehrungsdetails sind in der nachfolgenden Ausführungsplanung festzulegen.

Empfänger: Stadt Einbeck · Bauaufsicht. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

16_2022-02-14_Brandschutzergänzung.pdf

Ergänzung zum Rettungswegkonzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Nachforderung vom 03.02.2022 reichen wir die Ergänzung BS-02 zum Antrag 63-2022-041 ein. Die Baukörperlage und die Flächen des Bauantrags bleiben unverändert. Der Bauherr hat die nachstehende Belegungs- und Betriebsorganisation bestätigt.

1 Belegung und Raumzuordnung

Im Saal S-01 werden bei Bestuhlung 96 Gäste zugelassen. Bis zu sechs Helfer halten sich zusätzlich dort auf. Der Vereinsraum V-01 wird mit höchstens 18 Personen genutzt. Bei dieser gleichzeitigen Nutzung ist die Gesamtgrenze von 120 Personen ausgeschöpft. Der Foyerbereich ist Durchgangsfläche und wird nicht zusätzlich vermietet. Bei anderer Belegung verringert der Hauswart die zugelassene Personenzahl im Saal entsprechend.

2 Wege und Türen

Raum	Erster Weg	Weiterer Weg
Saal S-01	Südausgang T-01, 1,00 m licht, längster Weg 16,50 m	Durch T-02 in Foyer, Nordausgang T-03, jeweils 1,00 m licht, insgesamt 22,00 m
Vereinsraum V-01	Über Bestandsflur zum Südausgang, längster Weg 19,00 m	Über Verbindung zum Saal und Foyer zum Nordausgang, 24,00 m
Foyer F-01	Nordausgang T-03 direkt ins Freie	Durch T-02 und Saal zum Südausgang

Die Türen T-01 und T-03 öffnen nach außen. T-02 erhält einen während der Betriebszeit ohne Schlüssel bedienbaren Beschlag. Der lichte Weg von 1,20 m durch den Bestandsflur und der freie Bereich vor T-03 dürfen nicht durch Garderoben oder abgestellte Tische eingeengt werden. Der Möblierungsplan wird vom Hauswart beim Aufbau der Veranstaltungen kontrolliert.

3 Betrieb und technische Ausstattung

Der Verein benennt Ralf Winter als verantwortliche Person für Öffnen, Belegungskontrolle und Schlusskontrolle. Bei jeder Vermietung wird die Personenzahl schriftlich eingetragen. Die Küche bleibt Teeküche ohne Fritteuse, offenen Grill oder Gasgeräte. Feuerlöscher werden an den beiden Ausgängen angeordnet; die Kennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung der Wege wird mit der Elektroplanung umgesetzt.

Der Rettungsweg über den Hof ist auch während Winterveranstaltungen freizuhalten. Die laufende Unterhaltung des Wegs übernimmt der Verein. Eine Nutzung des Vereinsraums als regelmäßiger Gymnastikraum ist nicht Grundlage dieser Ergänzung. Die Architektin erklärt, dass die vorstehenden Tür- und Wegangaben mit der Bauzeichnung G-01 übereinstimmen. Der Bauherr verpflichtet sich zur beschriebenen Betriebsorganisation.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring, Vorsitzende

Anlagen: 13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf; 14_2022-01-20_Baubeschreibung.docx

17_2022-03-17_Baugenehmigung.pdf

Baugenehmigung 63-2022-041

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 20.01.2022 wird die Genehmigung für den Umbau und den nördlichen Anbau des Bürgerhauses auf dem Grundstück Lindengasse 18, Gemarkung Einbeck, Flur 14, Flurstück 83/7, nach Paragraph 70 NBauO erteilt. Maßgeblich sind die nachfolgend bezeichneten Bauvorlagen und die Nebenbestimmungen dieses Bescheids.

1 Genehmigter Umfang

Genehmigt ist die Erweiterung des eingeschossigen Bestands von 216 m² um einen 80 m² großen Anbau mit Foyer, Sanitär-, Lager- und Technikräumen. Die Gesamtbelegung wird auf 120 Personen einschließlich Helfern begrenzt. Der Vereinsraum wird als Besprechungsraum mit höchstens 18 Personen genutzt. Ein regelmäßiger Tanz-, Fitness- oder Gaststättenbetrieb und Übernachtungen sind nicht Gegenstand dieser Genehmigung.

2 Zugehörige Bauvorlagen

Kennung	Unterlage	Stand
L-01	Lageplan mit Stellplätzen und Grundstücksgrenzen	20.01.2022
G-01	Grundriss, Schnitt und Ansichten	20.01.2022
B-01	Baubeschreibung	20.01.2022
BS-02	Ergänzung zum Rettungswegkonzept	14.02.2022

3 Nebenbestimmungen

Vor Beginn der tragenden Arbeiten ist der Standsicherheitsnachweis für Gründung, Saalöffnung und Dachkonstruktion bei der Bauaufsicht vorzulegen. Abweichungen von den eingereichten Öffnungsmaßen oder der Baukörperlage sind vor ihrer Ausführung mitzuteilen. Mit den betroffenen Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die erforderlichen Nachweisvorlagen erfolgt sind.

Die Rettungswege und Türbreiten aus BS-02 sind während des Betriebs dauerhaft freizuhalten. Die Außentüren müssen von innen ohne Schlüssel geöffnet werden können. Die stufenfreie Erreichbarkeit des Foyers und des hierfür vorgesehenen WC-Raums ist vor Aufnahme der Nutzung herzustellen. Der Betrieb darf erst aufgenommen werden, wenn diese Einrichtungen und die erforderliche Rettungswegkennzeichnung vorhanden sind.

Die Belegungsgrenze gilt für das gesamte Haus. Der Hauswart hat die bei Vermietung vereinbarte Personenzahl zu dokumentieren. Eine Nutzungsänderung oder eine andere Belegungsorganisation ist vor Umsetzung mit der Bauaufsicht abzustimmen. Die zwölf im Lageplan bezeichneten Stellplätze und der Zugang von der Straße sind auf dem Grundstück zu erhalten.

Stadt Einbeck · Bauaufsicht

Teichenweg 1 · 37574 Einbeck
bauaufsicht@einbeck.de

4 Hinweise und Kosten

Private Rechte Dritter bleiben unberührt. Die Genehmigung ersetzt keine privatrechtliche Zustimmung für Eingriffe in fremde Leitungen. Die Kostenentscheidung ergeht gesondert. Die Bauaufsicht erhält die Benennung der Bauleitung und die Anzeige des vorgesehenen Baubeginns. Die genehmigten Unterlagen müssen auf der Baustelle zugänglich sein.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Einbeck, Teichenweg 1, 37574 Einbeck, erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in der gesetzlich zugelassenen elektronischen Form oder zur Niederschrift einzulegen. Eine einfache E-Mail genügt der vorgeschriebenen Form nicht.


Mit freundlichen Grüßen

gez. Klara Brandes, im Auftrag

Anlagen: 12_2022-01-20_Lageplan.pdf; 13_2022-01-20_Bauzeichnungen.pdf; 14_2022-01-20_Baubeschreibung.docx;
16_2022-02-14_Brandschutzergänzung.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

20_2022-06-02_Ausführungsplan.pdf

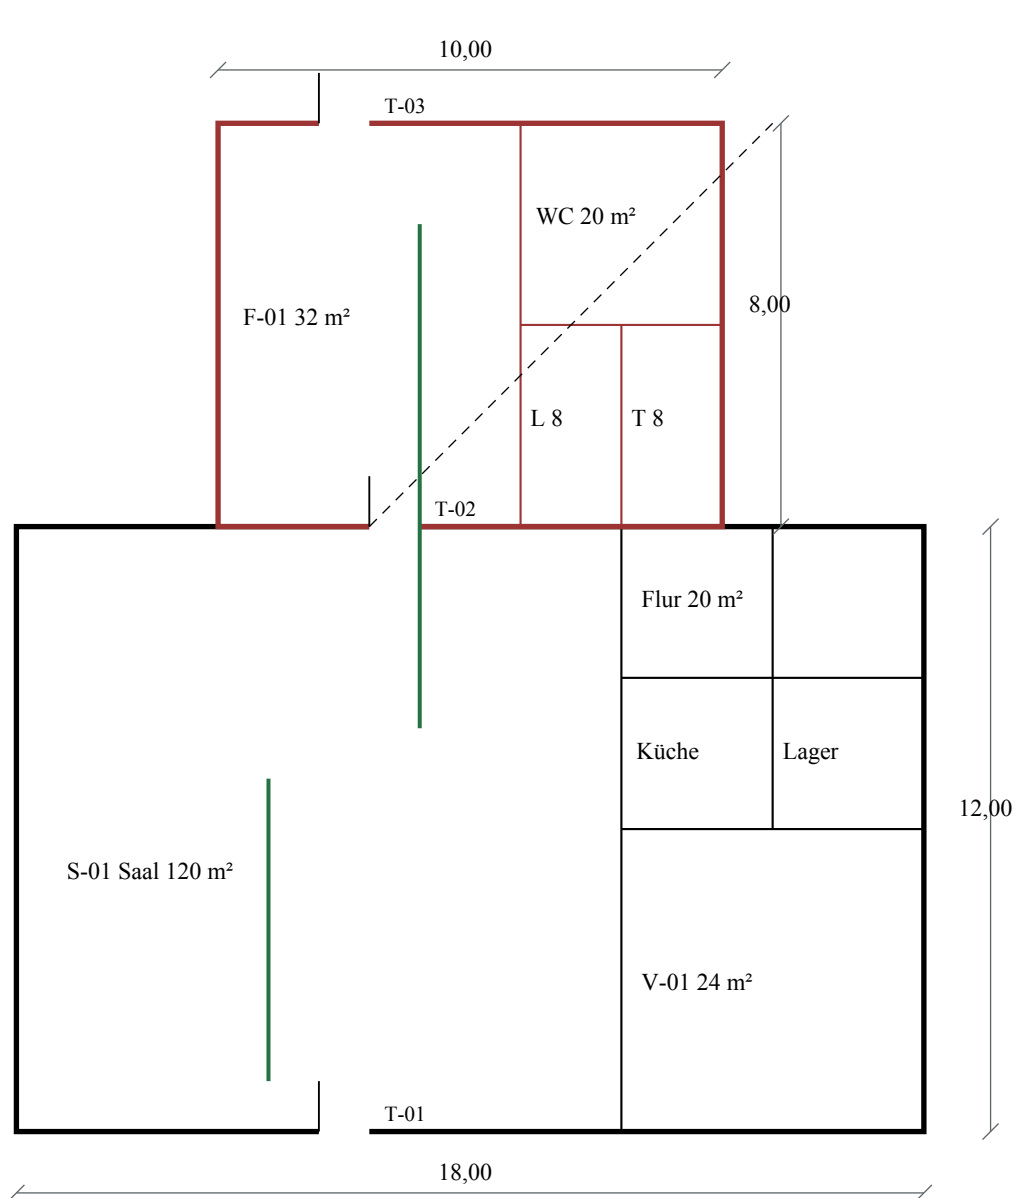

Grün: Wege zu den Ausgängen

Gestrichelt: ungeorteter Altleitungsverlauf

Fertigfußboden 112,40 m


Hof am Rampenantritt 111,80 m

Anbau: Wände 12 m², Nutzung 68 m²

Rampe nördlich des Foyers: zwei Läufe je $6,00 \times 1,50$ m, Zwischenpodest $1,50 \times 1,50$ m. Höhenunterschied 0,60 m; 5 Prozent Längsgefälle.

Wandstärken und Öffnungsrohbaumaße sind in AP-01 angegeben. Rinnen- und Sockelanschluss siehe D-12. Der Grundriss stellt keine Leitungserkundung dar.

Maßstab 1:150 bei Druck auf A4



1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Freigegebene Gebäudefassung Revision 00 vom 02.06.2022. Grundlage sind Genehmigung 63-2022-041, G-01 und Tragwerksplan T-02. Das Blatt legt Wandstärken, Rohbauöffnungen, Bewegungsfuge und Bezugshöhen für Los 1 fest. Maße vor Bestellung von Bauteilen örtlich prüfen. Abweichungen der Fachplanerblätter sind vor Ausführung über die Objektplanung zu klären.

Anbau außen 10,00 mal 8,00 m. Außenwand 24 cm Mauerwerk mit 16 cm Mineralwolldämmung und Putz. Bewegungsfuge zum Bestand 30 mm; keine starre Mörtelbrücke. Rohbauöffnung T-02 1,135 mal 2,135 m, T-03 1,135 mal 2,135 m. Fertige lichte Durchgangsbreite jeweils 1,00 m. Die Türanschlüsse werden am Rohbau gemeinsam aufgemessen.


Rohoberkante Bodenplatte 112,24 m, Fertigfußboden 112,40 m. Bodenaufbau 16 cm einschließlich Estrich und Belag. Fundamentbreite 50 cm, Höhe 80 cm gemäß T-02. Die Leitungsdurchführungen liegen in Hülсен und nicht im Auflagerbereich des Bestandssturzes. Die unbekannte Hofleitung ist vor Aushub zu lokalisieren; der gestrichelte Altverlauf ist kein Leitungsfreigabevermerk.

Detail D-12 regelt den Höhenanschluss. Solloberkante Rinnenrost 112,38 m, angrenzender Belag am Eingang 112,40 m. Die Oberfläche fällt zur Rinne. Das Dachgefälle ist mit 2 Prozent nach Norden vorgesehen. Vor Verfüllung sind Sockelabdichtung und Schutzlage durch die Objektüberwachung zu kontrollieren. Die Portalmarkierung einer technischen Koordinationsdatei ist keine Revision dieses freigegebenen Gebäudeplans.

Empfänger: Bürgerhaus Leinewinkel e.V.. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

21_2022-06-06_Rampenanschluss.pdf

Schnitt durch Tür T-03 und Rinne · Detail 1:10

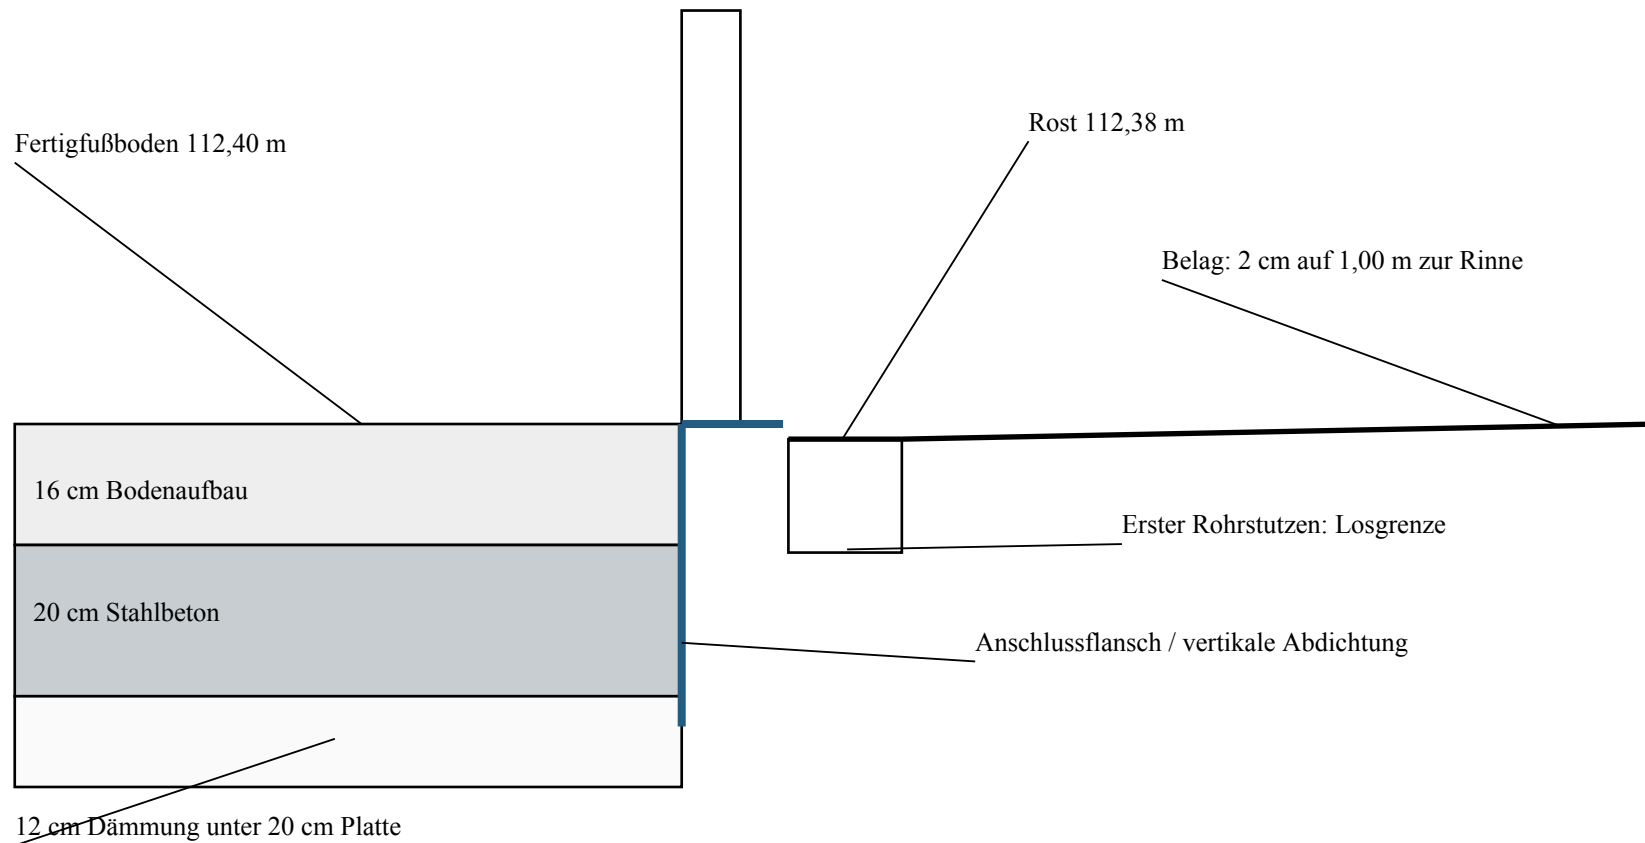

Blau: Abdichtungsführung. Höhen beziehen sich auf den örtlichen Projektbezug. Rinne 15 cm lichte Breite; Anschluss an den Türflansch vor Verdecken kontrollieren. Keine Horizontalsperre im Altbau enthalten.

1 Erläuterungen und Zeichnungsangaben

Detailblatt D-12 Revision 00, freigegeben durch Lena Hartwig am 06.06.2022. Das Detail gehört zu AP-01 und zum Leistungsverzeichnis Los 1. Es zeigt den örtlichen Eingangsanschluss im Schnitt; die Rampenlängen werden im Grundriss bestimmt. Es ist kein flächiger Sanierungsplan für den gesamten Altbau.

Der Fertigfußboden liegt bei 112,40 m. Der Rinnenrost unmittelbar vor dem Zugang erhält Sollhöhe 112,38 m. Der befestigte Anschlussbereich fällt auf einem Meter Länge um 2 cm zur Rinne. Die Türschwelle bildet keinen aufstehenden Absatz. Der Rinnenkasten ist gegen den Türanschluss abzudichten und am ersten Stutzen an die Grundstücksleitung anzuschließen.

Die zweilagige vertikale Sockelabdichtung wird auf tragfähigem gereinigtem Untergrund aufgebracht und mindestens bis 30 cm über anschließendes Gelände geführt, soweit keine Türöffnung liegt. Am niveaugleichen Türanschluss wird sie an den hierfür geeigneten Anschlussflansch geführt. Die Schutzlage darf beim Verfüllen nicht verrutschen. Der Übergang zur Bestandswand ist vor dem Verdecken fotografisch und im Bautagebuch festzuhalten.

Die Abdichtung im Sockelbereich ersetzt keine nachträgliche Horizontalsperre im Altbau. Vor Neuverputz sind die Befunde im Innenbereich aufzunehmen. Zuständig für Rinne und direkten Anschluss ist Los 1; ab dem ersten Rohrstutzen liegt die Leistung bei den Außenanlagen. Die Durchgängigkeit ist gewerkeübergreifend vor Übergabe zu prüfen. Geänderte Höhen aus Haustechnikblättern bedürfen einer ausdrücklichen Revision dieses Details.

Empfänger: Bürgerhaus Leinewinkel e.V.. Bezug: Bauvorhaben Lindengasse 18. Anlagen: keine. Zeichnung und Erläuterungsblatt bilden einen gemeinsamen Planstand.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_2023-04-04_Angebot_Leinebau.pdf

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 04.04.2023 · Bezug BH-21-04

Angebot LB-230404 für Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 08.03.2023 bieten wir das Los 1 für Umbau und Anbau des Bürgerhauses Lindengasse 18 zu den folgenden Einheitspreisen an. Die Langtexte des Leistungsverzeichnisses und die dort benannten freigegebenen Gebäudepläne sind Bestandteil unseres Angebots. Mengenänderungen werden zu den angebotenen Einheitspreisen abgerechnet.

1 Angebotspreise

Position / Leistung	Menge	Einheit	EP EUR	Gesamt EUR
2.1 Baustelleneinrichtung	1	psch	9.000,00	9.000,00
2.2 Selektiver Rückbau	216	m²	41,00	8.856,00
2.3 Fundamentaushub	60	m³	92,00	5.520,00
2.4 Streifenfundamente	24	m³	330,00	7.920,00
2.5 Bodenplatte Anbau	80	m²	152,00	12.160,00
2.6 Außenmauerwerk Anbau	95	m²	135,00	12.825,00
2.7 Abdichtung Bestandssockel	36	m²	205,00	7.380,00
2.8 Innenputz Bestand	144	m²	52,00	7.488,00
2.9 Dach Anbau	80	m²	268,00	21.440,00
2.10 Außentüren	3	St	2.590,00	7.770,00
2.11 Zugangsrampe	20,25	m²	260,00	5.265,00
2.12 Entwässerungsrinne	9	m	172,00	1.548,00
Summe netto				107.172,00
Umsatzsteuer 19 Prozent				20.362,68
Angebot brutto				127.534,68

2 Ausführung und Bindung

Wir bestätigen Baubeginn 21.08.2023 und Fertigstellung 15.03.2024. Für die Außentüren beträgt der heutige Beschaffungsvorlauf sechs Wochen ab Aufmaß und Freigabe. Geplant sind ein Polier und drei Fachkräfte; Beton- und Dacharbeiten werden mit eigenem Personal ausgeführt. Die Bindefrist 28.04.2023 wird bestätigt.

Die ausgewiesenen Einheitspreise enthalten die beschriebenen Nebenleistungen, Materiallieferung und eigene Entsorgung. Ein Nachlass und Skonto werden nicht angeboten. Eine automatische Stoffpreisgleitung wird nicht verlangt. Rechnungen sind binnen 21 Kalendertagen nach prüffähigem Zugang zahlbar. Abschläge werden nur für nachgewiesene Leistungen gestellt.

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

3 Bestand und Abgrenzung

Die Sockelposition umfasst den beschriebenen vertikalen Abdichtungsaufbau, keine Injektion einer Horizontalsperre. Die vorhandenen Leitungen müssen vor Beginn bezeichnet sein. Eine unbekannte Leitung wird nicht auf eigene Entscheidung entfernt. Der angebotene Preis enthält keine Stillstandstage aufgrund fremder Leitungsfreigaben.

Bitte erteilen Sie einen schriftlichen Auftrag mit Benennung der freigegebenen Planstände. Unsere Kalkulation beruht auf dem vollständigen Leistungsverzeichnis und nicht auf einer verkürzten Portalvorschau. Weitere Geschäftsbedingungen fügen wir nicht bei.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henning Seidel, Geschäftsführer

Anlagen: 23_2023-03-08_Leistungsverzeichnis.docx

26_2023-04-04_Angebot_Hagedorn.pdf

Hagedorn Bauhandwerk GmbH

Am Gewerbering 12 · 37586 Dassel
angebot@hagedorn-bauhandwerk.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 04.04.2023 · Bezug BH-21-04

Angebot HB-23041 für Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 08.03.2023 bieten wir das Los 1 für Umbau und Anbau des Bürgerhauses Lindengasse 18 zu den folgenden Einheitspreisen an. Die Langtexte des Leistungsverzeichnisses und die dort benannten freigegebenen Gebäudepläne sind Bestandteil unseres Angebots. Mengenänderungen werden zu den angebotenen Einheitspreisen abgerechnet.

1 Angebotspreise

Position / Leistung	Menge	Einheit	EP EUR	Gesamt EUR
2.1 Baustelleneinrichtung	1	psch	8.200,00	8.200,00
2.2 Selektiver Rückbau	216	m ²	45,00	9.720,00
2.3 Fundamentaushub	60	m ³	104,00	6.240,00
2.4 Streifenfundamente	24	m ³	315,00	7.560,00
2.5 Bodenplatte Anbau	80	m ²	168,00	13.440,00
2.6 Außenmauerwerk Anbau	95	m ²	142,00	13.490,00
2.7 Abdichtung Bestandssockel	36	m ²	175,00	6.300,00
2.8 Innenputz Bestand	144	m ²	58,00	8.352,00
2.9 Dach Anbau	80	m ²	285,00	22.800,00
2.10 Außentüren	3	St	2.710,00	8.130,00
2.11 Zugangsrampe	20,25	m ²	245,00	4.961,25
2.12 Entwässerungsrinne	9	m	190,00	1.710,00
Summe netto				110.903,25
Umsatzsteuer 19 Prozent				21.071,62
Angebot brutto				131.974,87

2 Ausführung und Bindung

Wir können den vorgesehenen Baubeginn am 21.08.2023 einhalten. Für die Außentüren rechnen wir mit zwölf Wochen ab Freigabe. Die Fertigstellung bis 15.03.2024 ist bei Freigabe der Türmaße bis 15.11.2023 möglich. Geplant sind ein Vorarbeiter und vier Fachkräfte. Das Angebot bleibt bis 28.04.2023 verbindlich.

Die ausgewiesenen Einheitspreise enthalten die beschriebenen Nebenleistungen, Materiallieferung und eigene Entsorgung. Ein Nachlass und Skonto werden nicht angeboten. Eine automatische Stoffpreisgleitung wird nicht verlangt. Rechnungen sind binnen 21 Kalendertagen nach prüffähigem Zugang zahlbar. Abschläge werden nur für nachgewiesene Leistungen gestellt.

Hagedorn Bauhandwerk GmbH

Am Gewerbering 12 · 37586 Dassel
angebot@hagedorn-bauhandwerk.de

3 Bestand und Abgrenzung

Unser Angebot umfasst auch die Schutzlage und Wiederverfüllung der Sockelabdichtung. Mit dem Ansatz ist keine nachträgliche Horizontalsperre verbunden. Nicht angeboten sind Leitungsumlegungen außerhalb der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten. Sollte eine unbekannte Leitung angetroffen werden, werden wir deren Klärung anzeigen und den betroffenen Bereich sichern.

Bitte erteilen Sie einen schriftlichen Auftrag mit Benennung der freigegebenen Planstände. Unsere Kalkulation beruht auf dem vollständigen Leistungsverzeichnis und nicht auf einer verkürzten Portalvorschau. Weitere Geschäftsbedingungen fügen wir nicht bei.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jens Hagedorn, Geschäftsführer

Anlagen: 23_2023-03-08_Leistungsverzeichnis.docx

27_2023-04-11_Angebotsprüfung.pdf

Angebotsprüfung und Vergabevorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die fristgerecht eingegangenen Angebote Leinebau vom 04.04.2023 und Hagedorn vom selben Tag wurden anhand des Leistungsverzeichnisses rechnerisch, mengenbezogen und auf Leistungsabgrenzungen geprüft. Es liegen zwei wertbare Hauptangebote vor. Die Prüfung betrifft die private Vergabe des Vereins und enthält keine Aussage über ein öffentliches Vergabeverfahren.

1 Preisspiegel netto EUR

Position	Planeransatz	Leinebau	Hagedorn
2.1 Baustelleneinrichtung	8.500,00	9.000,00	8.200,00
2.2 Selektiver Rückbau	8.208,00	8.856,00	9.720,00
2.3 Fundamentaushub	5.100,00	5.520,00	6.240,00
2.4 Streifenfundamente	7.440,00	7.920,00	7.560,00
2.5 Bodenplatte Anbau	11.600,00	12.160,00	13.440,00
2.6 Außenmauerwerk Anbau	12.160,00	12.825,00	13.490,00
2.7 Abdichtung Bestandssockel	6.660,00	7.380,00	6.300,00
2.8 Innenputz Bestand	6.912,00	7.488,00	8.352,00
2.9 Dach Anbau	19.600,00	21.440,00	22.800,00
2.10 Außentüren	7.350,00	7.770,00	8.130,00
2.11 Zugangsrampe	4.860,00	5.265,00	4.961,25
2.12 Entwässerungsrinne	1.395,00	1.548,00	1.710,00
Summe	99.785,00	107.172,00	110.903,25

2 Aufklärung am 06.04.2023

Herr Seidel bestätigte telefonisch und im gemeinsamen Gespräch, dass Schutzlage und Wiederverfüllung der Sockelabdichtung im Einheitspreis enthalten sind. Herr Hagedorn bestätigte die identische Leistung. Beide schließen eine Horizontalsperre aus, wie es auch der Langtext tut. Keiner hat einen Nachlass angeboten. Die Rinnenanschlussschnittstelle am ersten Rohrstutzen wurde von beiden Bietern bestätigt. Die Gesprächsteilnehmer waren Lena Hartwig, Uwe Feldmann, Henning Seidel und zeitversetzt Jens Hagedorn.

Leinebau liegt 7.387,00 EUR netto über dem Planeransatz und 3.731,25 EUR netto unter Hagedorn. Die Mengen und Umsatzsteuersummen sind rechnerisch richtig. Der längere Türvorlauf bei Hagedorn ist innerhalb des geplanten Ablaufs möglich, lässt aber weniger Spielraum bei späteren Maßänderungen. Eine von der Planung abweichende Ausführung wurde nicht angeboten.

3 Vergabevorschlag und Kostenkontrolle

Wir empfehlen den Auftrag an Leinebau zum geprüften Angebot. Vor Versand sind Vertragsfristen, Zahlungsfrist und Planstände ausdrücklich zu bestätigen. Für die weiteren Lose bleiben Angebote erforderlich. Das Los 1 darf nicht mit den vollständigen Baukonstruktionskosten von 169.940,00 EUR netto verwechselt werden: Fenster, Bodenbeläge, Innentüren und weitere Ausbauarbeiten liegen außerhalb dieses Loses.

Die Bauleitung erhält keine selbstständige Nachtragsvollmacht. Der Auftrag soll klarstellen, dass geänderte Mengen aufgemessen werden und zusätzliche Leistungen vor Ausführung preislich beschrieben werden müssen. Die Entscheidung über den Zuschlag verbleibt beim Vorstand. Frau Döring und Herr Feldmann erhalten beide Angebote und den bepreisten Planeransatz.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 24_2023-03-08_Bepreistes_LV.xlsx; 25_2023-04-04_Angebot_Leinebau.pdf; 26_2023-04-04_Angebot_Hagedorn.pdf

31_2023-09-05_Behinderungsanzeige.pdf

Behinderungsanzeige wegen Leitungsfund

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 05.09.2023 um 08:10 Uhr wurde im Fundamentgraben an der nordwestlichen Ecke des Anbaus eine nicht bezeichnete Leitung mit Außendurchmesser etwa 110 mm freigelegt. Die Leitung führt diagonal durch die geplante Fundamentachse. Bei Freilegung trat kein Wasser aus. Ob sie noch in Betrieb ist, konnte unser Polier nicht feststellen.

1 Betroffene Arbeiten

Der Aushub und die Betonage im westlichen Fundamentabschnitt von Achse 2 bis 4 können bis zur Klärung nicht fortgeführt werden. Die Leitung liegt etwa 0,65 m unter Hofniveau und würde die geplante Gründung kreuzen. Wir haben den Bereich mit Brettern gesichert und nicht weiter geöffnet. Der Betonabruf für diesen Abschnitt am 07.09.2023 wurde zunächst angehalten.

Betroffen sind ein Bagger mit Fahrer und zwei Facharbeiter. Zwei weitere Beschäftigte konnten in den Bestandsrückbau umgesetzt werden. Die Bauleitung wurde telefonisch um 08:35 Uhr informiert. Herr Winter erklärte vor Ort, dass er die Leitung für stillgelegt halte, konnte aber keinen Stilllegungsnachweis vorlegen. Die Suchschlitze von 2021 liegen östlich des jetzt angetroffenen Verlaufs.

2 Erforderliche Klärung

Bitte veranlassen Sie eine eindeutige Zuordnung und entscheiden Sie, ob eine Umlegung erforderlich ist. Ein Eingriff wird von uns ohne Freigabe des Eigentümers nicht vorgenommen. Die anderen zugänglichen Arbeitsbereiche werden weiterbearbeitet. Die Dauer der Unterbrechung hängt von der Klärung ab und lässt sich heute noch nicht abschließend angeben.

Wir behalten uns die Abrechnung nachgewiesener zusätzlicher Leistungen und belegter Stillstandskosten vor. Diese Anzeige enthält noch kein beziffertes Nachtragsangebot. Ein Fortschreiben des Terminplans erfolgt nach Freigabe. Als Beleg verweisen wir auf den Tagesbericht vom 05.09.2023; der Leitungsfund ist dort von der Bauleitung aufgenommen. Die Folgen für den Gesamtfertigstellungstermin sind heute nicht abschließend bestimmbar.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Anlagen: keine

33_2023-09-12_Nachtragsangebot.pdf

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 12.09.2023 · Bezug BH-21-04

Nachtragsangebot N01 Leitungsumlegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Freilegung und Abstimmung mit dem Hauswart bieten wir die Umlegung des privaten alten Pumpenstrangs an. Der Verein hat den Strang am 11.09.2023 dem eigenen Grundstücksbetrieb zugeordnet. Er führt weiterhin Wasser aus dem Nebengebäude ab und ist nicht stillgelegt. Der neue Verlauf liegt außerhalb der Fundamentachse.

1 Zusätzliche Bauleistungen

Position	Menge	EP netto EUR	Betrag EUR
N01.1 Rohrleitung mit Formteilen	14,00 m	145,00	2.030,00
N01.2 Zusätzlicher Graben	4,00 m³	92,00	368,00
N01.3 Abtransport Altmaterial	1 psch	380,00	380,00
N01.4 Anschlussarbeiten	16,00 h	58,00	928,00
Bauleistungen netto			3.706,00
N01.5 Gerätebereitschaft	2 Tage	620,00	1.240,00
Angebot gesamt netto			4.946,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			939,74
Angebot gesamt brutto			5.885,74

2 Ausführung und Nachweise

Die Umlegung kann nach Auftrag am 18. und 19.09.2023 erfolgen. Die Anschlussarbeiten enthalten zwei Beschäftigte für jeweils acht Stunden. Die Leitung wird vor Verfüllung auf freien Durchgang und sichtbare Undichtigkeiten geprüft. Der neue Verlauf wird im Aufmaß verzeichnet. Das Rohrmaterial wird nach Auftrag disponiert.

Die Gerätebereitschaft bezieht sich auf den 06. und 07.09.2023. Der Bagger stand auf der Baustelle; der Fahrer wurde teilweise mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Wir setzen hierfür jeweils 620,00 EUR an. Der Betrag wird unabhängig von den zusätzlichen Bauleistungen ausgewiesen, weil der Verein die Stillstandsdauer noch prüft. Die vollständige Rückbaukolonne war nicht durchgehend untätig.

3 Abgrenzung

Die zusätzlichen vier Kubikmeter Graben sind nicht in der späteren Fundamentaushubmenge der Position 2.3 enthalten. Der laufende Fundamentaushub wird separat aufgemessen. Eine doppelte Abrechnung erfolgt nicht. Arbeiten zur Umnutzung des Vereinsraums sind nicht Gegenstand dieses Nachtrags. Bitte bestätigen Sie Bauleistungen und Gerätebereitschaft gesondert. Wir halten die Preise bis 22.09.2023 aufrecht.

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Anlagen: 31_2023-09-05_Behinderungsanzeige.pdf

35_2024-02-16_Gemeinsames_Aufmaß.pdf

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
Einbeck, 16.02.2024 · Bezug BH-21-04

Gemeinsames Aufmaß AM-07

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16.02.2024 nahmen Lena Hartwig und Torsten Albrecht von 08:30 bis 11:15 Uhr die Schlussmengen des Loses 1 auf. Die bereits verdeckten Fundamente wurden anhand der Aufnahmen vor Betonage vom 20.09.2023 abgeglichen. Die nachstehende Mengenfeststellung bestätigt keine zusätzliche Vergütungsabrede.

1 Mengen und Rechenwege

Position	Rechenweg	Menge	Einheit
2.1 Baustelleneinrichtung	1 Baustelleneinrichtung	1	psch
2.2 Selektiver Rückbau	18,00 × 12,00	216	m²
2.3 Fundamentaushub	60,00 + 6,00	66	m³
2.4 Streifenfundamente	24,00 + 1,20	25,2	m³
2.5 Bodenplatte Anbau	10,00 × 8,00	80	m²
2.6 Außenmauerwerk Anbau	95,00 + 3,00	98	m²
2.7 Abdichtung Bestandssockel	36,00 + 6,00	42	m²
2.8 Innenputz Bestand	144,00 + 6,00	150	m²
2.9 Dach Anbau	10,00 × 8,00	80	m²
2.10 Außentüren	3 Außentüren	3	St
2.11 Zugangsrampe	12,00 × 1,50 + 1,50 × 1,50 + 1,20	21,45	m²
2.12 Entwässerungsrinne	9,00 + 0,40	9,4	m

2 Abgrenzungen

Bei Position 2.3 sind nur die Fundamentgräben einschließlich der örtlichen Verbreiterung erfasst. Die vier Kubikmeter Leitungsgraben aus N01 werden nicht nochmals angesetzt. Das Fundamentvolumen erhöht sich wegen der Verbreiterung um 1,20 m³. Die zusätzliche Sockelfläche von 6 m² wurde vor Wiederverfüllung am 03.10.2023 gemeinsam festgestellt; eine Horizontalsperre wurde nicht ausgeführt.

Die Rampenfläche enthält die zwei Läufe mit 18,00 m², das Zwischenpodest mit 2,25 m² und einen tatsächlich betonierten zusätzlichen Anschlussstreifen von 1,20 m². Die Rinne ist einschließlich des angepassten Endstücks 9,40 m lang. Die Türhöhe am Hauptzugang wurde gegenüber dem Bestandsbezug vor Ort kontrolliert. Eine Messung des Entwässerungsgefälles ist nicht Bestandteil dieser Mengentabelle.

3 Nachtragsmengen

Die Parteien bestätigen 14 m Leitung, 4 m³ gesonderten Leitungsgraben, einen Abtransport und 16 Anschlussstunden für N01.1 bis N01.4. Zur Gerätebereitschaft N01.5 werden keine Mengen gemeinsam bestätigt. Herr Albrecht hält seinen Ansatz von zwei Tagen aufrecht. Frau Hartwig verweist auf die offenen Einsatznachweise.

Herr Albrecht und Frau Hartwig zeichnen die Mengentabelle. Der Bauherr erhält eine Kopie. Die Aufmaßunterzeichnung ersetzt weder die Abnahme noch die Entscheidung über die streitige Gerätebereitschaft. Die im Bautagebuch dokumentierten Arbeitsunterbrechungen bleiben unverändert Bestandteil der Bauakte.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Objektüberwachung; Torsten Albrecht, Leinebau

Anlagen: keine

36_2024-03-01_Schlussrechnung.pdf

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 01.03.2024 · Bezug BH-21-04

Schlussrechnung LB-240301

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die vom 21.08.2023 bis 29.02.2024 ausgeführten Leistungen des Loses 1 berechnen wir die nachstehenden Beträge. Rechnungsnummer LB-240301, Projekt BH-21-04, Auftrag vom 18.04.2023. Leistungsempfänger ist der Bürgerhaus Leinewinkel e.V., Lindengasse 18, 37574 Einbeck. Die endgültige Fertigmeldung erfolgt nach Abschluss der noch ausstehenden Einstellarbeiten an den Türen.

1 Abgerechnete Leistungen

Position	Menge	EP netto EUR	Betrag EUR
2.1 Baustelleneinrichtung	1 psch	9.000,00	9.000,00
2.2 Selektiver Rückbau	216 m²	41,00	8.856,00
2.3 Fundamentaushub	66 m³	92,00	6.072,00
2.4 Streifenfundamente	25,2 m³	330,00	8.316,00
2.5 Bodenplatte Anbau	80 m²	152,00	12.160,00
2.6 Außenmauerwerk Anbau	98 m²	135,00	13.230,00
2.7 Abdichtung Bestandssockel	42 m²	205,00	8.610,00
2.8 Innenputz Bestand	150 m²	52,00	7.800,00
2.9 Dach Anbau	80 m²	268,00	21.440,00
2.10 Außentüren	3 St	2.590,00	7.770,00
2.11 Zugangsrampe	21,45 m²	260,00	5.577,00
2.12 Entwässerungsrinne	9,4 m	172,00	1.616,80
Grundauftrag nach Aufmaß			110.447,80
N01.1 bis N01.4	gemäß Auftrag		3.706,00
N01.5 Gerätebereitschaft	2 Tage	620,00	1.240,00
Summe netto			115.393,80
Umsatzsteuer 19 Prozent			21.924,82
Gesamt brutto			137.318,62

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

2 Bereits vereinnahmte Abschläge

Zahlung	Netto EUR	Umsatzsteuer EUR	Brutto EUR
12.10.2023 zu LB-231002	30.000,00	5.700,00	35.700,00
18.12.2023 zu LB-231201	40.000,00	7.600,00	47.600,00
Summe vereinnahmt	70.000,00	13.300,00	83.300,00
Noch verlangt	45.393,80	8.624,82	54.018,62

Die Rechnung geht am 04.03.2024 beim Verein ein; wir bitten um Zahlung binnen 21 Kalendertagen nach Zugang. Die Gerätebereitschaft wird trotz des Vorbehalts im Auftrag beansprucht. Wir verweisen auf die Behinderungsanzeige und den Bauablauf. Eine abschließende Einigung hierzu liegt nicht vor. Die übrigen Positionen beruhen auf AM-07.

Zahlungsempfänger ist Leinebau Hochbau GmbH. Die Zahlung erfolgt auf das im Vertrag hinterlegte Geschäftskonto. Steuernummer 35/200/48160. Geschäftsführer Henning Seidel, Am Werkhof 6, 37574 Einbeck. Für Rückfragen steht Torsten Albrecht zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henning Seidel, Geschäftsführer

Anlagen: 35_2024-02-16_Gemeinsames_Aufmaß.pdf; 33_2023-09-12_Nachtragsangebot.pdf

38_2024-03-18_Abnahme.pdf

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
Einbeck, 18.03.2024 · Bezug BH-21-04

Abnahmeprotokoll Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18.03.2024 wurde das Los 1 zwischen 10:00 und 12:10 Uhr gemeinsam begangen. Teilgenommen haben Maren Döring und Uwe Feldmann für den Bauherrn, Lena Hartwig für die Objektüberwachung sowie Torsten Albrecht für Leinebau. Gegenstand ist allein der Bauvertrag vom 18.04.2023 einschließlich des bestätigten Nachtrags N01.1 bis N01.4.

1 Erklärung des Bauherrn

Der Bauherr nimmt die Leistungen des Loses 1 mit den nachstehenden ausdrücklich vorbehaltenen Mängeln ab. Die Architektin empfiehlt die Abnahme unter Dokumentation dieser Restpunkte. Die Erklärung umfasst keine Leistungen anderer Unternehmer und keine Abnahme der Architektenleistungen. Hinsichtlich der streitigen Gerätebereitschaft wird keine Vergütungsentscheidung getroffen.

2 Festgestellte Punkte

Kennung	Feststellung	Vereinbarung
M-01	Rinnenrost am nördlichen Zugang klappert bei Überfahrt; Befestigung fehlt am letzten Element.	Leinebau befestigt bis 28.03.2024.
M-02	Tür T-03 schließt bei geringem Öffnungswinkel nicht vollständig selbsttätig.	Leinebau stellt Schließer bis 28.03.2024 ein.
B-01	Nordwand des Saals wirkt nach Neuverputz trocken; alter Sockelbereich bleibt aufgrund Vorgeschichte beobachtungsbedürftig.	Hauswart dokumentiert Veränderungen. Keine Aussage über verdeckte Schichten.

Die Rechte wegen M-01 und M-02 werden vorbehalten. Am Begehungstag war es trocken; eine Beregnungsprüfung am Höhenanschluss fand nicht statt. Die Begehung bestätigt daher nicht die Funktion sämtlicher Anschlüsse bei Starkregen. Frau Hartwig hat keine sichtbare Putzablösung festgestellt. Herr Albrecht erklärt, dass keine Horizontalsperre hergestellt wurde, wie bereits im Angebot abgegrenzt.

3 Unterlagen und Termine

Leinebau übergibt die Produktnachweise zu Türen und Dach sowie den eingetragenen Leitungsverlauf. Das Aufmaß AM-07 ist bereits übergeben. Die Arbeiten waren am 15.03.2024 zur Abnahme gemeldet; die Abnahme wurde auf Wunsch des Vorstands am 18.03.2024 durchgeführt. Eine Vertragsstrafe ist nicht vereinbart.

Für Los 1 wird als vertraglicher Ausgangspunkt der fünfjährigen Mängelfrist die heutige Abnahme notiert. Die Fristen der anderen Gewerke und die gesonderte Abnahme der Architektenleistungen sind hiervon unabhängig. Die Zahlungsprüfung vom 11.03.2024 bleibt bestehen. Die Unterschriften bestätigen die vorstehenden Erklärungen und die gemeinsame Aufnahme, nicht den Verzicht auf vorbehaltene Rechte.

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Döring und Uwe Feldmann, Bauherr; Torsten Albrecht, Leinebau; Lena Hartwig, Protokoll

Anlagen: 35_2024-02-16_Gemeinsames_Aufmaß.pdf

43_2026-09-17_Objektbegehung.pdf

Objektbegehung am 17.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 17.09.2026 haben Lena Hartwig, Maren Döring, Ralf Winter und Torsten Albrecht die gemeldeten Erscheinungen von 09:00 bis 11:20 Uhr gemeinsam besichtigt. Die Einladung war am 09.09.2026 telefonisch abgestimmt worden. Es war trocken, die Außentemperatur betrug etwa 17 Grad. Die Feststellungen beschränken sich auf die zugänglichen Bauteile.

1 Befunde an der Nordwand

Im Saal zeigt der nördliche Sockelbereich links vom Fenster eine unregelmäßige Verfärbung mit abblättrender Beschichtung. Die sichtbare Ausdehnung beträgt entlang der Wand etwa 2,40 m und in der Höhe maximal 0,35 m. Das Foto vom 07.09.2026 ist diesem Ort zugeordnet. An der Wandfläche oberhalb 0,60 m waren keine Ablösungen erkennbar. Es fand keine Materialprobe und keine Öffnung der Sockelabdichtung statt.

Relative kapazitive Anzeige am unteren Sockel: 86 bis 92 Geräteeinheiten, Vergleichsfläche bei 1,20 m Höhe: 34 bis 39. Die Werte sind keine Masseprozent und zwischen Geräten nicht vergleichbar. Der Befund zeigt einen örtlichen Unterschied, belegt aber nicht für sich allein eine bestimmte Wasserquelle. Herr Albrecht verweist auf die schon 2021 dokumentierte Feuchte und die nicht beauftragte Horizontalsperre.

2 Rampe und Rinne

Am letzten Rinnenelement vor T-03 wurde gegenüber dem angrenzenden Belag ein Höhenversatz von etwa 6 mm gemessen. Der Rost saß bei der Begehung fest. Ein vorsichtiger Eimertest mit 10 Litern Wasser zeigte einen langsamen Ablauf und eine Restpfütze am seitlichen Anschluss. Der unterirdische Anschluss wurde nicht geöffnet. Im Rinnenkasten lag wenig feines Sediment. Herr Winter erklärte, er habe vor dem Regen Laub entfernt, den Anschlussstutzen aber nicht gespült.

3 Fachliche Bewertung und offener Untersuchungsbedarf

Das Schadensbild der Nordwand ist mit Feuchteeinwirkung vereinbar. Als Ursachen kommen verbliebene Bestandsfeuchte, eine unzureichende Trennung am Sockelanschluss oder ein Wasserzutritt im Zusammenhang mit dem Höhenanschluss in Betracht. Der jetzige Sichtbefund erlaubt keine belastbare Zuordnung. Das frühere Fechtebild und die ausgeführte vertikale Abdichtung müssen bei einer Bauteilöffnung gemeinsam betrachtet werden.

Der Höhenversatz und die verlangsamte Entwässerung sind technisch aufklärungsbedürftig. Die Rinne gehört zu Los 1, die anschließende Grundstücksleitung zu den Außenanlagen. Für die Verantwortungsabgrenzung sind Sohlenlage, Anschlussgefälle und Durchgängigkeit zu prüfen. Eine Sanierungsvariante, ein Kostenbetrag oder eine Haftungsquote werden heute nicht festgelegt.

4 Erklärungen der Beteiligten

Leinebau erklärt seine Bereitschaft zur gemeinsamen Untersuchung, erkennt aber eine eigene Verursachung nicht an. Frau Döring verlangt eine getrennte Dokumentation der Befunde vor jeder Öffnung. Frau Hartwig hält die Beweissicherung der Höhen und des Anschlusses für erforderlich. Der Verein entscheidet über Umfang und Beauftragung nach Eingang eines Untersuchungsvorschlags. Bis dahin hält Herr Winter den Rinnenbereich sauber und meldet Veränderungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin; Maren Döring; Ralf Winter; Torsten Albrecht

Anlagen: 41_2026-09-08_Mängelmeldung.eml; 42_2026-09-07_Feuchte_Saalnordwand.png; 38_2024-03-18_Abnahme.pdf
