

08_Bautagebuch.txt

Porta Hallenbau GmbH | Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica

Bautagebuch HW-26, Bauleiter Timo Fricke. Auszug der Tagesblätter 09.03. bis 08.06.2026.

1 März

09.03., 07:00: F17 Süd fehlt; vier Fachkräfte, Norden Aushub. 10.03.: Aushub Nord beendet, Süd offen. 11.03.: drei Fachkräfte, Beginn Fundamente West nach Abruf F17B; Regen ab 13:00, Abdeckung. 12.03.: drei Fachkräfte, sechs Personenstunden Räumen, sonst kein Betonieren; Wasser auf Planum. 13.03.: drei Fachkräfte, Schalung Nord; Abschalttermin entfällt. 16.03.: sechs Fachkräfte; Südtrasse gesperrt, Schalung West. Kran 4,0 Betriebsstunden. 17.03.: Nordbewehrung, Materialumlagerung; Kran 3,5 Stunden. 18.03.: Fundamente West fertig. 19.03.: Bodenplatte Nord begonnen. 20.03.: F17C ab 11:05 freigegeben, Südtrasse weiter gesperrt. 23.03.: sechs Fachkräfte, Bodenplatte Nord, Kran 5,0 Stunden. 24.03.: Bodenplatte Mitte, Kran 4,5 Stunden. 25.03.: Bodenplatte letzter Teil Nord fertig. 26.03.: Wandbeginn Nord. 27.03.: Telefon Freischaltung Süd 09:20; Kolonne an Wänden. 30.03.: südliche Fundamentergänzung ausgeführt, Kran hierfür 2,0 Stunden. 31.03.: südlicher Plattenrand geschlossen, Bodenplatte damit vollständig.

2 April

14.04.: Wände einschließlich Süd geschlossen. 15.04.: Deckenschalung begonnen. 22.04.: Team auf acht Fachkräfte erhöht. 23.04.: acht Fachkräfte, zusätzliche Schicht dokumentiert. 24.04.: acht Fachkräfte. 27.04.: acht Fachkräfte. 28.04.: Deckenbetonage abgeschlossen. 29.04. bis 05.05.: Erhärtung, tägliche Kontrolle durch zwei Personen.

3 Mai und Juni

06.05.: Dachunterkonstruktion begonnen. 13.05.: Dachunterkonstruktion fertig. 15.05.: Abdichtung begonnen. 22.05.: Abdichtung geschlossen. 26.05.: Fassadenanker begonnen. 02.06.: Fassadenanker beendet. 03.06.: Räumen und Mängeldurchgang. 05.06.: Reststellen geschlossen. 08.06.: Übergabe um 10:00 Uhr, Nutzer erhält Schlüssel.

Die Einträge wurden tagesbezogen geführt und hier am 08.06. für den Auftraggeber ausgegeben. Die Wetterwerte stehen gesondert im Messprotokoll. Zusätzliche Schichtstunden werden im Personalexport geführt. Gez. Timo Fricke, Bauleiter. Gegenzeichnung des Auftraggebers für diesen Auszug liegt nicht vor.

05_Planfreigaben.eml

Von	"Dr. Rolf Stein" <planung@tragwerk-hunte.example>
An	Timo Fricke <projekt@porta-hallenbau.example>
Datum	Fri, 20 Mar 2026 11:18:00 +0100
Betreff	HW-26: F17 Revision C freigegeben

Sehr geehrter Herr Fricke,

F17 Revision C ist seit 11:05 Uhr im Projektraum freigegeben. Die Freigabe betrifft die südlichen Stützenfüße. Die mit Revision B am 10.03. um 16:20 Uhr freigegebenen westlichen und nördlichen Fundamente bleiben unverändert. Nach unserem Planversandbuch wurde Revision B von Ihnen am 11.03. um 06:48 Uhr abgerufen.

Die zusätzliche Ankerlage war nach der Kollisionsprüfung mit der Bestandsleitung erforderlich. Wir bestätigen nicht, dass seit 09.03. sämtliche Fundamentarbeiten stillstanden. Bitte setzen Sie die offenen Abschnitte nach den freigegebenen Maßen fort und melden Sie abweichende Bestandslagen vor dem Betonieren. Eine Kostenübernahme erklären wir als Tragwerksplanung nicht. Diese Nachricht bestätigt die Freigabezeiten; der zeichnerische Plan verbleibt im Projektraum. Es wird kein Plan als E-Mail-Anlage übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rolf Stein

Tragwerksplaner

14_Erwidernng_Verband.eml

Von	Ines Reuter <bau@wesertor-logistik.example>
An	Stefan Köster <projekt@porta-hallenbau.example>
Datum	Fri, 12 Jun 2026 14:35:00 +0200
Betreff	HW-26: Forderung BZ01 wird derzeit nicht freigegeben

Sehr geehrter Herr Köster,

wir können Ihre Forderung BZ01 auf Grundlage der bisherigen Unterlagen nicht zur Zahlung freigeben. Sie rechnen Plan- und Leitungstage nebeneinander ab, obwohl sich beide Anzeigen auf denselben Südabschnitt beziehen. Bitte erläutern Sie anhand des Vertragsablaufs, welche konkrete Tätigkeit wann nicht ausgeführt werden konnte und wie sie den Übergabetermin beeinflusst hat.

Die Personalübersicht zeigt vom 09. bis 13.03. eine kleinere Kolonne als vorgesehen. Zudem wurde bei Regen am 12.03. nicht betoniert. Die Gerätestunden im Norden widersprechen einem vollständigen Kranstillstand. Ihre 160 Zusatzstunden stimmen nicht mit den 144 Stunden aus der Lohnbuchhaltung überein. Das bedeutet nicht, dass wir sämtliche Mehrkosten ausschließen; eine Zuordnung fehlt uns jedoch. Bitte senden Sie eine nachvollziehbare Ergänzung bis 19.06.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Reuter

Verbandsleitung

21_Fricke_Geraeteunterlagen.eml

Von	Timo Fricke <projekt@porta-hallenbau.example>
An	Jana Brüggemann <personal@porta-hallenbau.example>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 10:26:00 +0200
Betreff	HW-26: Mietrechnung und Auszug der Hubzeiten

Sehr geehrte Frau Brüggemann,

hier sind die Mietrechnung KM-260331 und der Auszug aus Wendts Gerätekarten. Die sechs Zeilen betreffen nur die herausgesuchten Tage, nicht jeden Miettag im März. Am 16. und 17.03. haben wir den Kran tatsächlich für Schalung und Bewehrung im Norden gebraucht. Ich habe die Maschine damals nicht zur Abholung angemeldet, weil ich jederzeit mit dem Beginn im Süden gerechnet hatte.

Unsere Bezeichnung als Stillstand im ersten Kostenansatz war dafür zu pauschal. Gleichwohl blieb das Gerät länger gebunden, als ich bei Vertragsbeginn vorgesehen hatte. Ob eine Abholung mit späterer Wiederanlieferung günstiger gewesen wäre, habe ich während der Leitungsarbeiten nicht beim Vermieter kalkulieren lassen. Einen entsprechenden Preis habe ich auch jetzt nicht vorliegen.

Zu den Aprilstunden: Die 160 Stunden waren meine Einsatzprognose vom 20.04. An den beiden Randtagen 22. und 28.04. wurden jeweils acht Stunden weniger geleistet als zunächst eingeteilt. Die von Ihnen gebuchten 144 Zusatzstunden bestreite ich nicht. Herr Köster hat die Forderungsdatei nach meinem Kenntnisstand noch nicht geändert.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Fricke

Bauleiter Porta Hallenbau

03_Isttermine.csv

Vorgang	Leistung	Istbeginn	Istende	Erfassungsbeleg	Bearbeiter
V01	Einrichtung	2026-03-02	2026-03-02	Tagesabschluss 2026-03-02 / Fricke	Timo Fricke
V02	Aushub	2026-03-03	2026-03-10	Tagesabschluss 2026-03-10 / Fricke	Timo Fricke
V03	Fundamente	2026-03-11	2026-03-30	Tagesabschluss 2026-03-30 / Fricke	Timo Fricke
V04	Bodenplatte	2026-03-19	2026-03-31	Tagesabschluss 2026-03-31 / Fricke	Timo Fricke
V05	Wände	2026-03-26	2026-04-14	Tagesabschluss 2026-04-14 / Fricke	Timo Fricke
V06	Decke	2026-04-15	2026-04-28	Tagesabschluss 2026-04-28 / Fricke	Timo Fricke
V07	Erhärtung	2026-04-29	2026-05-05	Tagesabschluss 2026-05-05 / Fricke	Timo Fricke
V08	Dachunterkonstruktion	2026-05-06	2026-05-13	Tagesabschluss 2026-05-13 / Fricke	Timo Fricke
V09	Abdichtung	2026-05-15	2026-05-22	Tagesabschluss 2026-05-22 / Fricke	Timo Fricke
V10	Fassadenanker	2026-05-26	2026-06-02	Tagesabschluss 2026-06-02 / Fricke	Timo Fricke
V11	Räumen und Kontrolle	2026-06-03	2026-06-05	Tagesabschluss 2026-06-05 / Fricke	Timo Fricke
V12	Übergabe	2026-06-08	2026-06-08	Tagesabschluss 2026-06-08 / Fricke	Timo Fricke

09_Wettermessungen.csv

Datum	Temperatur_07U hr_C	Niederschlag_m m_24h	Windmaximum_k mh	Beobachtung	Messort
2026-03-09	4	0	18	trocken	Container Nord
2026-03-10	5	2	21	feucht	Container Nord
2026-03-11	3	18	32	Regen ab 13 Uhr	Container Nord
2026-03-12	2	26	39	Wasser auf Planum	Container Nord
2026-03-13	4	12	28	Schalung nass	Container Nord
2026-03-16	5	1	17	kein Wasserstau Nord	Container Nord
2026-03-20	6	0	20	trocken	Container Nord
2026-03-23	7	0	16	trocken	Container Nord
2026-03-27	8	2	19	leichter Regen	Container Nord
2026-03-30	9	0	14	trocken	Container Nord

10_Personalstunden.csv

Datum	Soll_Fachkraefte	Ist_Fachkraefte	Regelstunden_g esamt	Zusatzstunden_g esamt	Disposition
2026-03-09	6	4	32	0	zwei Personen auf Auftrag PW-18
2026-03-10	6	4	32	0	PW-18 nicht beendet
2026-03-11	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-12	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-13	6	3	24	0	eine Person krank; zwei PW-18
2026-03-16	6	6	48	0	Stammkolonne vollständig
2026-04-22	6	8	64	24	Beschleunigung
2026-04-23	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-24	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-27	6	8	64	32	Beschleunigung
2026-04-28	6	8	64	24	Beschleunigung


18_Geraetestunden_MK44.csv

Datum	Gerät	Betriebsstunden	Tätigkeit	Arbeitsbereich	Erfasst_durch
2026-03-09	MK-44	0	kein Hub vermerkt	Bereitstellung Nord	Wendt
2026-03-16	MK-44	4.0	Schalung umgesetzt	West	Wendt
2026-03-17	MK-44	3.5	Bewehrung und Material umgesetzt	Nord	Wendt
2026-03-23	MK-44	5.0	Schalung und Betonierhilfen	Bodenplatte Nord	Wendt
2026-03-24	MK-44	4.5	Plattentakt bedient	Bodenplatte Mitte	Wendt
2026-03-30	MK-44	2.0	Fundamentergän- zung	Süd	Wendt

16_Baufeldskizze.png

Gerätehalle Wesertor | Baufeld 16.03.2026

Lageskizze der Tragwerksplanung, ohne Maßstab

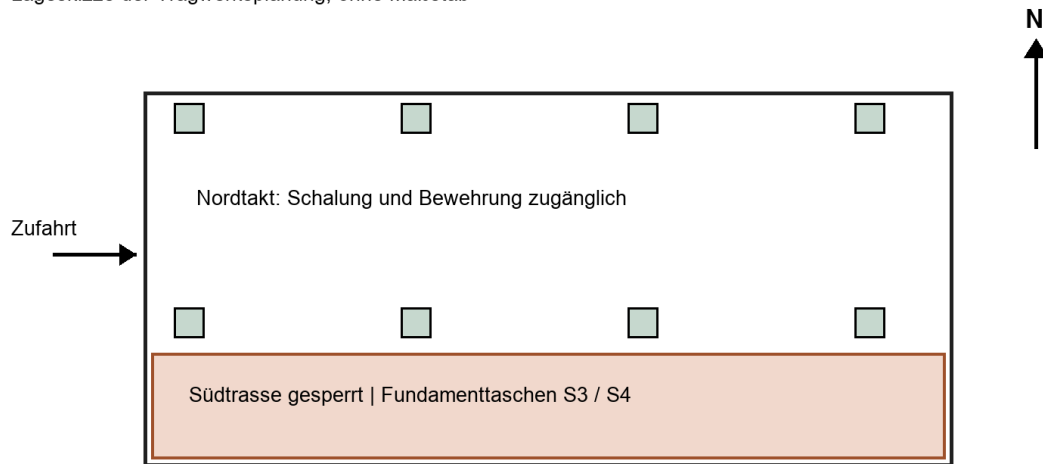

Freigabe Nord/West: F17B vom 10.03.2026

F17C Süd am Zeichnungsdatum noch nicht freigegeben.

Gez. Dr. Rolf Stein | Tragwerk Hunte | HW-26 / Skizze S06

Bilddatei: 16_Baufeldskizze.png

02_Vertragsablauf.xlsx

Vertragsablauf Gerätehalle

Porta Hallenbau / Stefan Köster | 2026-02-13

Vorgang	Leistung	Beginn	Ende	Kalendertage	Vorgänger
V01	Einrichtung	02.03.2026	02.03.2026	1.00	
V02	Aushub	03.03.2026	06.03.2026	4.00	V01
V03	Fundamente	09.03.2026	13.03.2026	5.00	V02
V04	Bodenplatte	16.03.2026	20.03.2026	5.00	V03
V05	Wände	23.03.2026	31.03.2026	9.00	V04
V06	Decke	01.04.2026	10.04.2026	10.00	V05
V07	Erhärtung	11.04.2026	17.04.2026	7.00	V06
V08	Dachunterkonstruktion	20.04.2026	24.04.2026	5.00	V07
V09	Abdichtung	27.04.2026	30.04.2026	4.00	V08
V10	Fassadenanker	04.05.2026	08.05.2026	5.00	V09
V11	Räumen und Kontrolle	11.05.2026	13.05.2026	3.00	V10
V12	Übergabe	15.05.2026	15.05.2026	1.00	V11

Datumsbänder zeigen Kalenderbelegung einschließlich Wochenenden und Erhärtung.

Montage an Arbeitstagen; Feiertage 03.04., 06.04., 01.05. und 14.05. sind arbeitsfrei.

V03/V04 abschnittsweise Nord vor Süd. Kolonne Rohbau: sechs Fachkräfte.

gez. Stefan Köster und Ines Reuter; abgestimmt am 13.02.2026.

13_Forderungsberechnung.xlsx

Berechnung BZ01 des Auftragnehmers

Porta Hallenbau / Stefan Köster | 2026-06-10

Kostenart	Bezug	Einheit	Anzahl	Satz netto EUR	Betrag netto EUR
Mobilkran	B01 und B02	Tag	20.00	420.00	8,400.00
Container	B01 und B02	Tag	20.00	90.00	1,800.00
Bauleitung und Polier	B01 und B02	Tag	20.00	560.00	11,200.00
Zaun und Einrichtung	B01 und B02	Tag	20.00	45.00	900.00
Zusatzschichten	April	h	160.00	60.00	9,600.00
Tageskosten					22,300.00
Geschäftskosten	8.0%				1,784.00
Forderung netto					33,684.00
Umsatzsteuer	19.0%				6,399.96
Forderung brutto					40,083.96

Ansätze der Forderung, keine Anerkennung durch die Auftraggeberin.

Tage: zehn wegen Planung zuzüglich zehn wegen Leitung laut Schreiben vom 10.06.

gez. Stefan Köster; Stundenansatz April gemäß erster Bauleitermeldung.

22_Bauablauf_Kranmiete_Tagesdisposition.xlsx

Vertragsablauf und gemeldete Isttermine

Neues Ablaufregister aus 02_Vertragsablauf.xlsx und 03_Isttermine.csv. Dauern als Kalenderbelegung, einschließlich Erhärtung; Vorgänger aus Vertragsablauf.

Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026

Positionen

12

Vorgang	Leistung	Sollbeginn	Sollende	Istbeginn	Istende	Soll Kalendertage	Ist Kalendertage	Vorgänger
V01	Einrichtung	02.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	02.03.2026	1,00	1,00	
V02	Aushub	03.03.2026	06.03.2026	03.03.2026	10.03.2026	4,00	8,00	V01
V03	Fundamente	09.03.2026	13.03.2026	11.03.2026	30.03.2026	5,00	20,00	V02
V04	Bodenplatte	16.03.2026	20.03.2026	19.03.2026	31.03.2026	5,00	13,00	V03
V05	Wände	23.03.2026	31.03.2026	27.03.2026	14.04.2026	9,00	19,00	V04
V06	Decke	01.04.2026	10.04.2026	15.04.2026	28.04.2026	10,00	14,00	V05
V07	Erhärtung	11.04.2026	17.04.2026	29.04.2026	05.05.2026	7,00	7,00	V06
V08	Dachunterkonstruktion	20.04.2026	24.04.2026	06.05.2026	13.05.2026	5,00	8,00	V07
V09	Abdichtung	27.04.2026	30.04.2026	15.05.2026	22.05.2026	4,00	8,00	V08
V10	Fassadenanker	04.05.2026	08.05.2026	26.05.2026	02.06.2026	5,00	8,00	V09
V11	Räumen und Kontrolle	11.05.2026	13.05.2026	03.06.2026	05.06.2026	3,00	3,00	V10
V12	Übergabe	15.05.2026	15.05.2026	08.06.2026	08.06.2026	1,00	1,00	V11

MK-44: Miettage und belegte Hubzeiten

17_Mietrechnung_Mobilkran.pdf: 22 Miettage im März. Hubzeiten nur aus den sechs Kartenzeilen in 18_Geraetestunden_MK44.csv; keine vollständige Betriebsstundenerfassung.

Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026

Positionen			Berechnete Tage		Miete netto EUR		Belegte Hubstunden	
22			22,00		9.240,00		19,00	

Miettag	Gerät	Mietbeleg	Berechnete Tage	Tagessatz netto EUR	Miete netto EUR	Belegte Hubstunden	Karteneintrag	Stundenbeleg
02.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
03.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
04.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
05.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
06.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
09.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	– kein Hub vermerkt		18_Geraetestunden_MK44.csv
10.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
11.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
12.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
13.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
16.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	4,00 Schalung umgesetzt		18_Geraetestunden_MK44.csv
17.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	3,50 Bewehrung und Material umgesetzt		18_Geraetestunden_MK44.csv
18.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
19.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
20.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
23.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	5,00 Schalung und Betonierhilfen		18_Geraetestunden_MK44.csv
24.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	4,50 Plattentakt bedient		18_Geraetestunden_MK44.csv
25.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
26.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
27.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			
30.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00	2,00 Fundamentergänzung		18_Geraetestunden_MK44.csv
31.03.2026	MK-44	KM-260331	1,00	420,00	420,00			

Personal, Wetter und Bautagesmeldungen

Neues Tagesregister: 10_Personalstunden.csv an elf Tagen, 09_Wettermessungen.csv an zehn Tagen. Tagesnotizen aus 08_Bautagebuch.txt, WB-1203 und Istablauf. Summen nur aus belegten Stunden.

Jana Brüggemann, Porta Hallenbau GmbH, Stand 15.06.2026

Positionen	Regelstunden		Zusatzstunden					
27	504,00		144,00					

Datum	Soll Fachkräfte	Ist Fachkräfte	Regelstunden	Zusatzstunden	Regen mm/24 h	Personalbeleg	Wetterbeleg	Tagesnotiz
02.03.2026								Einrichtung abgeschlossen
03.03.2026								Aushub begonnen
04.03.2026								Aushubphase laut Istablauf
05.03.2026								Aushubphase laut Istablauf
06.03.2026								Aushubphase laut Istablauf
09.03.2026	6,00	4,00	32,00	–	–	10_Personalstunden.csv	09_Wettermessungen.csv	F17 Süd fehlt; Norden Aushub
10.03.2026	6,00	4,00	32,00	–	2,00	10_Personalstunden.csv	09_Wettermessungen.csv	Aushub Nord fertig; F17B 16:20
11.03.2026	6,00	3,00	24,00	–	18,00	10_Personalstunden.csv	09_Wettermessungen.csv	F17B 06:48 abgerufen; Westbeginn
12.03.2026	6,00	3,00	24,00	–	26,00	09_Wettermessungen.csv	09_Wettermessungen.csv	Betonabruf 07:40 abgesagt
13.03.2026	6,00	3,00	24,00	–	12,00	10_Personalstunden.csv	09_Wettermessungen.csv	Schalung Nord; Abschaltung entfällt
16.03.2026	6,00	6,00	48,00	–	1,00	10_Personalstunden.csv	09_Wettermessungen.csv	Süd gesperrt; Schalung West
17.03.2026								Nordbewehrung und Umlagerung
18.03.2026								Fundamente West fertig
19.03.2026								Bodenplatte Nord begonnen
20.03.2026					–		09_Wettermessungen.csv	F17C 11:05; Süd bleibt gesperrt
23.03.2026					–		09_Wettermessungen.csv	Bodenplatte Nord
24.03.2026								Bodenplatte Mitte
25.03.2026								Letzter Plattenteil Nord fertig
26.03.2026								Wandbeginn Nord
27.03.2026					2,00		09_Wettermessungen.csv	Anruf Freischaltung 09:20
30.03.2026					–		09_Wettermessungen.csv	Fundamentergänzung Süd
31.03.2026								Südlicher Plattenrand geschlossen
22.04.2026	6,00	8,00	64,00	24,00		10_Personalstunden.csv		Deckenschichten, acht Fachkräfte
23.04.2026	6,00	8,00	64,00	32,00		10_Personalstunden.csv		Zusätzliche Schicht
24.04.2026	6,00	8,00	64,00	32,00		10_Personalstunden.csv		Deckenschichten fortgesetzt
27.04.2026	6,00	8,00	64,00	32,00		10_Personalstunden.csv		Deckenschichten fortgesetzt
28.04.2026	6,00	8,00	64,00	24,00		10_Personalstunden.csv		Deckenbetonage abgeschlossen

01_Bauvertrag_Termine.docx

Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

09.02.2026 | Zeichen: HW-26 / Los Rohbau

Bauvertrag Gerätehalle Wesertor

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Bauleistung

Porta Hallenbau übernimmt den Rohbau und die Dachunterkonstruktion der Gerätehalle am Standort Wesertor zum Einheitspreisvolumen von 684.000 EUR netto. Leistungsbeginn ist der 02.03.2026, die Übergabe der geschlossenen Rohbauhülle ist für 15.05.2026 vereinbart. Der Ablaufplan vom 13.02. wird nach gemeinsamer Abstimmung als Vertragsanlage geführt. Arbeitswoche ist Montag bis Freitag; Sonn- und Feiertagsarbeiten sind nicht vorausgesetzt.

2 Mitwirkungen

Die freigegebene Fundamentplanung soll bis 06.03. und die Leitungsfreigabe für die Südtrasse bis 13.03. vorliegen. Die Freigabe von Nordtrasse und westlichen Fundamenten ist davon getrennt möglich. Der Auftragnehmer organisiert seine Kolonnen und zeigt konkret behinderte Leistungen mit Beginn, Ort und möglicher Ausweicarbeit an. Im Vertrag wird VOB/B vereinbart; ein pauschaler Tagesentschädigungssatz wurde nicht festgelegt.

3 Dokumentation

Baubesprechungen finden montags statt. Tagesberichte nennen Personal, Geräte und tatsächlich bearbeitete Achsen. Geänderte Termine werden nicht allein durch Eintrag im Bericht Vertragsfristen. Die Bauherrin erteilt technische Freigaben über die Projektleitung; eine Anerkennung zusätzlicher Vergütung bedarf der gesonderten Erklärung der Verbandsleitung.

gez. Ines Reuter, Verbandsleitung
gez. Stefan Köster, Geschäftsführer

04_Behinderungsanzeige_Plan.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

09.03.2026 | Zeichen: HW-26 / Anzeige B01

Behinderungsanzeige Fundamentplanung

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Fehlende Freigabe

Heute um 07:00 Uhr lag die für 06.03. angekündigte Fundamentplanung noch nicht vollständig vor. Das Detail F-17 der südlichen Stützenfüße ist offen. Ohne Bewehrungsführung und Ankermaße können wir dort die Fundamentbewehrung nicht verlegen. Die Aushubarbeiten im Norden werden zunächst fortgesetzt.

2 Betroffene Ressourcen

Für diese Woche waren sechs Fachkräfte und der Mobilkran vorgesehen. Tatsächlich sind heute vier Fachkräfte anwesend. Wir ordnen drei Personen dem nördlichen Aushub und eine Person der Materialvorbereitung zu. Das südliche Fundamentband war im Vertragsablauf ab heute vorgesehen. Eine belastbare Dauer der Beeinträchtigung können wir ohne Freigabetermin noch nicht nennen.

3 Aufforderung

Bitte teilen Sie bis morgen 12:00 Uhr mit, wann F-17 freigegeben wird und ob ein abschnittsweises Vorgehen zugelassen ist. Wir behalten uns Kosten- und Terminfolgen vor. Diese Anzeige nennt den gegenwärtigen Zustand; eine konkrete Verlängerungsberechnung wird damit noch nicht vorgelegt. Den Umfang möglicher Ausweicarbeiten halten wir in den Tagesberichten fest.

gez. Timo Fricke, Bauleiter

06_Behinderungsanzeige_Leitung.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

16.03.2026 | Zeichen: HW-26 / Anzeige B02

Behinderungsanzeige Südtrasse

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Leitungsbereich

Die vom Netzbetreiber angekündigte Freischaltung der Leitung im südlichen Arbeitsstreifen ist heute um 07:30 Uhr nicht erfolgt. Der Leitungsbereich ist durch eine rot markierte Absperrung gesichert. Unsere Kolonne darf in diesem Streifen weder ausheben noch Anker setzen. Betroffen sind die südöstlichen Fundamenttaschen S3 und S4 sowie der anschließende Plattenrand.

2 Arbeitsablauf

Für dieselben südlichen Stützenfüße steht außerdem F17 Revision C noch aus. Im Norden wird die Schalung geschlossen; hier kann weitergearbeitet werden. Wir haben den Kran für diese Umsetzungen genutzt. Die Bodenplatte kann in der geplanten zusammenhängenden Taktfolge nicht hergestellt werden. Welcher Zeitanteil auf die fehlende Zeichnung und welcher auf die Leitung entfällt, wurde vor Ort nicht festgelegt.

3 Erforderliche Mitteilung

Bitte nennen Sie einen verbindlichen Freischalttermin. Wir melden den Wegfall der Behinderung, sobald Netzbetreiber und Projektleitung die Arbeitsfläche freigeben. Eine veränderte Ausführung der Fundamente in Leitungsnähe erfolgt nicht ohne technische Freigabe. Wir verlangen Ersatz der hieraus entstehenden zusätzlichen Kosten und behalten die Bezifferung vor.

gez. Timo Fricke, Bauleiter

12_Bauzeitforderung.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

10.06.2026 | Zeichen: HW-26 / Forderung BZ01

Forderung wegen verlängerter Bauzeit

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Unsere Zeitberechnung

Wir fordern wegen der verspäteten Fundamentplanung und der verspäteten Leitungsfreigabe zusätzliche Vergütung. Für den fehlenden Plan setzen wir die zehn Arbeitstage vom 09. bis 20.03. an. Für die gesperrte Südtrasse setzen wir weitere zehn Arbeitstage vom 16. bis 27.03. an. Wir gelangen damit zu zwanzig vergütungspflichtigen Tagen. Die Übergabe erfolgte tatsächlich erst am 08.06. statt am 15.05.2026.

2 Kostenforderung

Unsere beigefügte Berechnung ergibt 33.684,00 EUR netto, zuzüglich 6.399,96 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 40.083,96 EUR. Darin enthalten sind verlängerte Tageskosten, zusätzliche Personalstunden und acht Prozent allgemeine Geschäftskosten auf die Tageskosten. Wir verlangen Zahlung binnen 21 Tagen. Die April-Schichten betrachten wir als notwendige Beschleunigung zur Begrenzung weiteren Verzugs.

3 Begründung unserer Forderung

Wir halten die Bauherrin für die fehlende Planung und die nicht freigegebene Leitung verantwortlich. Unsere Anzeigen vom 09. und 16.03. liegen vor. Aus unserer Sicht gehen die späteren Verschiebungen auf diese Ereignisse zurück. Dass im Norden gearbeitet wurde, beseitigt nach unserer Auffassung die Belastung durch vorgehaltene Ressourcen nicht. Eine rechtliche Anerkennung der Forderung durch den Verband behaupten wir nicht; über Grundlage und Umfang besteht noch keine Einigung.

gez. Stefan Köster, Geschäftsführer

15_Besprechung_Beschleunigung.docx

Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

20.04.2026 | Zeichen: HW-26 / Besprechung 12

Besprechung zu den Deckenschichten

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Stand

Die Besprechung fand um 09:00 Uhr am Container statt. Die Deckenarbeiten hatten am 15.04. begonnen. Herr Fricke erklärte, dass mit der bisherigen Besetzung eine Fertigstellung der Decke vor Ende April unsicher sei. Frau Reuter bat um Vorschläge zur Begrenzung der weiteren Verschiebung, ohne einen neuen Übergabetermin verbindlich zu vereinbaren.

2 Zusätzliche Schichten

Herr Fricke schlug zwei zusätzliche Fachkräfte und verlängerte Schichten vom 22. bis 28.04. vor. Er rechnete zunächst mit 160 zusätzlichen Personenstunden. Frau Reuter erklärte, sie werde die Auswirkungen mit der Verbandsleitung besprechen. Eine Vergütungszusage gab sie nicht ab. Herr Fricke sagte, die Firma werde die Einteilung wegen der Betonbestellung bereits am selben Tag veranlassen.

3 Nachweise

Die tatsächlich geleisteten Zusatzstunden sollen aus der Zeiterfassung kommen. Der Auftragnehmer wird angeben, welche Regelstunden ohnehin zur Vertragserfüllung angefallen wären. Ein gesonderter Beschleunigungspreis wurde in der Besprechung nicht verhandelt. Die Ursache einzelner Verschiebungen blieb zwischen den Beteiligten streitig.

gez. Ines Reuter, Protokoll
Zur Kenntnis: Timo Fricke

19_Betonabruf_12_Maerz.docx

Weserbeton Lieferwerk GmbH
Mischplatz 4, 32423 Minden
disposition@weserbeton.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

12.03.2026 | Zeichen: Disposition WB-1203 / Kunde Porta Hallenbau

Telefonvermerk zur Betonbestellung Westfundamente

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Reservierte Lieferung

Für heute, 12.03., waren ab 11:00 Uhr zwei Fahrmischer mit zusammen 14,00 m³ für das westliche Fundamentband vorgemerkt. Die Mengenreservierung nahm Herr Wendt gestern um 10:20 Uhr telefonisch vor. Eine Freigabe der südlichen Fundamente war nach seiner Angabe nicht Voraussetzung dieser Westlieferung. Wir hatten die Rezeptur disponiert, aber bis heute 07:40 Uhr noch keinen Beton für diesen Auftrag gemischt.

2 Absage am Morgen

Herr Wendt rief heute um 07:40 Uhr an und sagte die Lieferung ab. Er nannte Wasser auf dem Planum nach dem nächtlichen Regen und eine noch nicht trockene Arbeitsfläche als Grund. Über fehlende Planunterlagen für den Westen sprach er in diesem Telefonat nicht. Ob zusätzlich Personal fehlte, kann ich aus unserem Dispositionsgespräch nicht sagen. Ich war nicht auf der Baustelle und habe den Bodenzustand nicht selbst gesehen.

3 Neuer Abruf

Die 14,00 m³ wurden nicht als Ausfalllieferung fakturiert. Wir vermerkten einen neuen Abruf für den 18.03., vorbehaltlich Bestätigung am Vortag. Für den 13.03. konnte ich keinen gleich frühen Lieferplatz anbieten; frei war nur ein Nachmittagsfenster ab 14:30 Uhr. Herr Wendt wollte diesen Ersatztermin nicht fest zusagen und zunächst die Baustelle trocknen lassen. Dieser Vermerk gibt die Telefonate wieder, nicht die spätere Fertigstellung des gesamten Fundamentabschnitts.

gez. Elke Hesse, Disponentin

20_Kolonnenfreigabe_PW18.docx

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Jana Brüggemann, Personaldisposition; Timo Fricke, Bauleitung

13.03.2026 | Zeichen: Disposition PW-18 / Übergang HW-26

Freigabe der beiden Fachkräfte aus Auftrag PW18

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Abschluss der Restarbeiten

Unsere beiden Fachkräfte Erik Lange und Cem Yilmaz haben die Randabschalung des Auftrags PW-18 heute um 14:15 Uhr beendet. Die ursprünglich für 06.03. erwartete Fertigstellung war nicht erreicht worden, weil Anschlussbleche erst am 09.03. angeliefert wurden. Ich habe beide Mitarbeiter vom 09. bis 13.03. auf PW-18 eingesetzt. Sie standen in dieser Woche nicht auf Abruf für Wesertor bereit.

2 Absprachen mit der Disposition

Am 10.03. teilte ich Frau Brüggemann mit, dass ich bis Freitag mit den beiden weiterarbeiten muss. Herr Fricke fragte am 11.03. nach einer früheren Abgabe wenigstens einer Person. Ich konnte ihm für den 12.03. keine verbindliche Zusage machen. Von der fehlenden Planung im Süden der Gerätehalle wusste ich nur aus diesem Telefonat. Meine Entscheidung, die Restarbeiten bei PW-18 zu Ende zu führen, war bereits am Montag getroffen worden.

3 Übergang nach Wesertor

Ab Montag, 16.03., 07:00 Uhr, gebe ich beide Fachkräfte für HW-26 frei. Werkzeug und persönliche Ausrüstung werden am Montag direkt dorthin gebracht. Die bei HW-26 zusätzlich gemeldete Erkrankung einer dritten Person habe ich nicht disponiert. Meine Freigabe umfasst nur Lange und Yilmaz. Ein anderer Auftrag ist für die beiden in der folgenden Woche nicht eingeplant; die Stunden auf PW-18 bleiben dessen Kostenstelle zugeordnet.

gez. Holger Bunte, Polier Auftrag PW-18

07_Netzbetreiber_Freigabe.pdf

Wesertrasse Netzdienste GmbH
Leitungsring 11, 32423 Minden
betrieb@wesertrasse.example

An: Logistikverband Wesertor
Deichbogen 28, 32423 Minden
bau@wesertor-logistik.example

27.03.2026 | Zeichen: WT-2617 / Südtrasse Gerätehalle

Freigabe des südlichen Arbeitsstreifens

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Umschaltung

Die Leitung im südlichen Baufeld wurde am 26.03.2026 um 15:40 Uhr außer Betrieb genommen. Die Endkontrolle erfolgte am 27.03. zwischen 08:00 und 09:00 Uhr. Ab 27.03., 09:15 Uhr, kann der markierte Arbeitsstreifen nach Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung wieder bearbeitet werden. Die seit 16.03. geltende Zutrittsbeschränkung wird aufgehoben.

2 Verzögerungsgrund

Der ursprünglich für 13.03. geplante Termin konnte nicht gehalten werden, weil ein zugesagter Abschaltpunkt im Nachbarbetrieb nicht verfügbar war. Die technische Klärung wurde am 24.03. abgeschlossen. Die Absperrung betraf ausschließlich die Südtrasse, nicht die nördliche Zufahrt oder das westliche Fundamentband.

3 Übergabe

Herr Fricke wurde telefonisch um 09:20 Uhr informiert. Er erklärte, die Geräte würden zunächst für die laufenden Wandarbeiten benötigt; der südliche Bereich solle am folgenden Arbeitstag wieder besetzt werden. Mit diesem Schreiben wird keine Bewertung der Bauzeitforderung oder der vertraglichen Verantwortlichkeit vorgenommen.

gez. Janne Ahlers, Betriebsverantwortliche

11_Geraete_und_Gemeinkosten.pdf

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Geschäftsführung Porta Hallenbau

05.05.2026 | Zeichen: HW-26 / Kostenblatt K05

Kostenbelege Gerätehalle März bis April

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Geräte

Für den Mobilkran liegt Mietrechnung KM-260331 über 22 berechnete Arbeitstage im März zu 420,00 EUR netto vor. Wochenenden sind nicht berechnet. Die Rechnungssumme beträgt 9.240,00 EUR netto. Die Rechnung unterscheidet nicht zwischen produktivem Einsatz und Stillstand. Nach den Gerätestundenkarten gab es am 16., 17., 23. und 24.03. produktive Hubarbeiten.

2 Tagesansätze

Die Containerkosten werden aus dem Projektmietvertrag mit 90,00 EUR netto pro berechnetem Arbeitstag angesetzt. Baustelleneinrichtung und Zaun sind mit 45,00 EUR je Arbeitstag intern verteilt. Für Bauleitung und Polier setzt die Kostenstelle gemeinsam 560,00 EUR je Tag an. Diese Personen betreuten während der fraglichen Wochen auch die fortgesetzten Arbeiten im Norden; getrennte Stunden nach Störungsursache sind nicht erfasst.

3 Zusatzschichten

Die Lohnbuchhaltung weist für 22. bis 28.04. insgesamt 144 zusätzliche Personenstunden aus. Der interne Vollkostensatz beträgt 60,00 EUR je Stunde einschließlich Zuschlägen. Herr Fricke hatte zunächst 160 Stunden angekündigt. Eine Rechnung eines externen Beschleunigungsunternehmens besteht nicht. Die Geschäftsführung möchte außerdem acht Prozent allgemeine Geschäftskosten auf die verlangten verlängerten Tageskosten ansetzen; eine projektbezogene Mehrkostenaufstellung hierzu liegt nicht vor.

gez. Jana Brüggemann, kaufmännische Projektbetreuung

17_Mietrechnung_Mobilkran.pdf

Kranmobil Wiehen GmbH
Hubweg 16, 32427 Minden
abrechnung@kranmobil-wiehen.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

31.03.2026 | Zeichen: Rechnung KM-260331 / Mietgerät MK-44

Mietrechnung Mobilkran März

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Abgerechneter Zeitraum

Wir berechnen für das Mietgerät MK-44 am Hochwasserlager Wesertor den Zeitraum 02.03. bis 31.03.2026. Gemäß Ihrer Bestellung vom 18.02. beträgt die Miete 420,00 EUR netto je Montag bis Freitag. Für die 22 so berechneten Tage ergeben sich 9.240,00 EUR netto, zuzüglich 1.755,60 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 10.995,60 EUR. Samstage und Sonntage werden nicht berechnet. Die Bedienung durch Ihre Beschäftigten ist nicht Bestandteil unserer Rechnung.

2 Mietberechnung

Die Tagesmiete fällt für die Bereitstellung des Geräts auf Ihrer Baustelle an und ist nicht an eine bestimmte Zahl von Hubstunden geknüpft. Die Anzeige des Betriebsstundenzählers wurde zur technischen Betreuung aufgenommen. Sie führt nicht zu einer stundenweisen Abrechnung. Unterbrechungen der Baustellenarbeit wurden uns nicht als Abmeldung der Miete mitgeteilt. Eine Gutschrift für einzelne Märztag ist auf diesem Beleg nicht enthalten.

3 Bezahlung und Rückgabe

Bitte zahlen Sie den Bruttobetrag bis 14.04. unter Angabe KM-260331 auf das hinterlegte Geschäftskonto. Eine Abholung zum 31.03. war nicht bestellt; die Rechnung schließt nur den Monatsabschnitt ab. Für einen Abtransport benötigen wir zwei Arbeitstage Vorlauf und eine befahrbare Zufahrt. Eine erneute Anlieferung wäre gesondert zu disponieren. Aus der Fortsetzung der Miete folgt keine Aussage über den Einsatz des Geräts an jedem einzelnen Tag.

gez. Rieke Vogelsang, Abrechnung
