

02_Diktat_Kroll.txt

David Kroll | Massivbau Dammert | Baustelle Schilfrain, Soest

Sprachnotiz am 16.09.2026, 07:48 bis 07:52 Uhr. Textübertragung 08:02 Uhr.

Ich komme gerade von der Ostplatte. Heute ist Mittwoch. Es ist nicht die ganze Baustelle zu, aber über der Technikrinne geht es noch nicht. Das war Montag schon so. Wir waren um sieben da, um zehn nach sieben stand ich an der Rinne. Rohrsteg hatte zwei Bündel drin, aber die Formstücke fehlten und die Befestigungen waren nicht fertig. Ich habe mit Malz gesprochen, Simmen kam kurz nach acht. Sie hat nicht gesagt, wir dürften zudecken.

Ich hatte am Montag fünf Leute einschließlich mir. Aydin und Seifert konnten die Matten daneben anfangen. Schulz und Weber haben im Westen weitergemacht. Nach Mittag ging Schulz nach Osten. Also bitte nicht schreiben, fünf Leute standen zwei Tage herum. Was in welcher Stunde war, steht in der Liste, ich habe sie gestern noch korrigiert. Die Pausen sind extra.

Dann noch der Plan. Montag sagte Simmen, die Öffnungen müssten anders liegen. Den neuen Plan habe ich Dienstag um zehn nach fünf bekommen, nein, zehn Uhr fünf morgens. Index vier. Zwei Öffnungen 120 Millimeter weiter nach Norden, Detail sechs anders. Dafür brauche ich noch die Bestätigung von der Statik, ob unser geschnittener Stahl passt. Das ist nicht dasselbe wie die offene Rinne. Beides hält jetzt die Fertigstellung des Ostfelds auf.

Gestern Nachmittag war Rohrsteg fertig mit Einsetzen, aber Simmen wollte noch eine Halterung mehr. Sie kommt heute halb zehn. Ich weiß also nicht, wann wir wirklich freikommen. Beton heute um sieben habe ich gestern um 15:25 abgesagt. Wilke hat Freitag zehn Uhr angeboten, aber nur vorläufig. Eine Rechnung für die Absage habe ich nicht. Die Pumpe muss ich noch separat anrufen.

Die Westschalung kam gestern 12:45. Damit können zwei Leute arbeiten, vielleicht nachher drei, das muss Aydin sehen. Es fehlt nicht an allem Material. Den Rohbautermin Ende Oktober kann ich jetzt nicht seriös neu berechnen. Erst muss ich wissen, wann der Osten betoniert wird. Bitte im Brief klar sagen, was konkret betroffen ist, und nichts von vier Wochen Verzögerung erfinden. Den Brief muss ich noch ansehen. Frau Reuter hat von mir dazu bislang nur den üblichen Jour-fixe-Kalender, kein Schreiben mit diesen Einzelheiten.

12_Telefonnotizen.txt

Baustelle SR-26 | Notizbuch David Kroll | Stand 16.09.2026, 08:25 Uhr

14.09. 07:18, Gespräch mit Eike Malz/Rohrsteg an der Rinne: zwei Formstücke fehlen. Malz erwartet Nachricht aus Lager, nennt keine Uhrzeit.

14.09. 08:05, Petra Simmen vor Ort: Rinne offen, keine Überdeckung. Hinweis auf Ausweichflächen West. Kein Gespräch mit Amelie Reuter.

14.09. 11:18, Simmen telefonisch: neuer Öffnungsplan in Arbeit, Durchführungen Achse 5. Kein Plananhang zum Telefonat.

14.09. 16:10, Simmen telefonisch: Westfeld für die vorgesehenen Schalungsarbeiten technisch freigegeben. Ostfeld ausdrücklich ausgenommen.

15.09. 14:30, Simmen vor Ort: zusätzliche Halterung in der Rinne erforderlich. Malz hört mit. Keine schriftliche Abschlussbestätigung.

15.09. 15:10, Wilke/Betonwerk: heutige Disposition braucht Entscheidung. Kroll will Rückmeldung zur Rinne abwarten.

15.09. 15:25, Kroll an Wilke: Termin 16.09., 07:00 abgesagt. Noch keine Kosten genannt.

16.09. 07:35, Wilke: 18.09., 10:00 möglich, Rückmeldung bis 12:00. Bestätigung als 07_Beton_Disposition.pdf angekündigt.

16.09. 08:25: Keine E-Mail oder förmliche Anzeige von Kroll an bau@werkraum-schilfrain.example im Ausgang. Entwurf wird angefordert. Dieses Notizbuch bleibt intern.

01_Kroll_Buero.eml

Von	David Kroll <d.kroll@massivbau-dammert.example>
An	Lea Friese <l.friese@massivbau-dammert.example>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 08:32:00 +0200
Betreff	Schilfrain: Diktat und Unterlagen für das Schreiben

Guten Morgen Frau Friese,

ich habe auf dem Weg zum Container die Fakten ins Telefon gesprochen. Die Textübertragung liegt als Datei 02 bei; bitte machen Sie daraus einen Entwurf der förmlichen Behinderungsanzeige an unsere Auftraggeberin. Ich kontrolliere Daten, Ursachen und den tatsächlichen Arbeitsablauf vor dem Versand. Bitte setzen Sie nicht einfach alle Anwesenheitsstunden als Stillstand an. Im Westen arbeiten wir weiter.

Der Vertrag und beide Ablaufstände liegen ebenfalls im Ordner. Das Gespräch mit Frau Simmen ist noch kein von mir versandtes Schreiben. Insbesondere weiß ich nicht, ob Frau Reuter die einzelnen Auswirkungen bereits kennt. Ich möchte einen nachvollziehbaren Text darüber, welche Arbeiten seit wann betroffen sind, was wir trotzdem tun und welche Rückmeldungen wir brauchen. Eine abschließende Forderung über Tage oder Geld kann ich heute nicht freigeben.

Für die Kontaktadresse verwenden Sie bitte die im Vertrag benannte Auftraggeberadresse und nehmen Frau Simmen in Kopie. Senden Sie selbst noch nichts ab. Nach dem Termin um 09:30 Uhr könnte eine Ergänzung erforderlich sein. Der Betonlieferant hält Freitag nur bis heute Mittag vor.

Freundliche Grüße
David Kroll

Anlagen:
02_Diktat_Kroll.txt
04_Ablauf_01.docx
11_Ablauf_02.docx

08_Simmen_Plan.eml

Von	Petra Simmen <p.simmen@kontur-bauleitung.example>
An	David Kroll <d.kroll@massivbau-dammert.example>
Datum	Tue, 15 Sep 2026 10:05:00 +0200
Betreff	SR-26: Öffnungsplan S-17 Index 04

Sehr geehrter Herr Kroll,

der Öffnungsplan S-17/04 steht seit 09:55 Uhr im Projektraum. Gegenüber Index 03 sind die beiden Durchführungen bei Achse 5 um jeweils 120 mm nach Norden versetzt. Der Abstand zwischen den Durchführungen bleibt 800 mm. Die ergänzende Bewehrung ist im Detail 6 geändert. Bitte prüfen Sie mit der Tragwerksplanung, ob die bereits zugeschnittenen Stäbe unverändert genutzt werden können; ich erteile hierzu keine statische Freigabe.

Rohrsteg meldet für heute Vormittag die fehlenden Formstücke. Ich komme um 14:30 Uhr zur Technikrinne. Eine Freigabe zur Überdeckung kann ich vor Prüfung des ausgeführten Zustands nicht bestätigen. Ihr Hinweis gestern um 08:05 Uhr ist in meinem Tagesvermerk aufgenommen. Eine von Ihnen an die Auftraggeberin gerichtete förmliche Anzeige ist damit nicht dokumentiert.

Bitte geben Sie den freien Westbereich nicht ungenutzt auf. Die Freigabe des Westfelds für die vorgesehenen Schalungsarbeiten ist Ihnen bereits am 14.09. um 16:10 Uhr mitgeteilt worden. Welche Mannschaftsstärke dort sinnvoll eingesetzt werden kann, stimmen Sie mit Ihrem Polier ab. Zusätzliche Vergütung oder eine Änderung des Vertragstermins sage ich nicht zu.

Mit freundlichen Grüßen
Petra Simmen

17_Rauter_Pumpenfenster.eml

Von	Silke Rauter <s.rauter@hebefluss.example>
An	David Kroll <d.kroll@massivbau-dammert.example>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 11:18:00 +0200
Betreff	Schilfrain / HF-26-614 / Vormerkung bis 11:45 Uhr

Sehr geehrter Herr Kroll,

wie gerade besprochen bleibt es bei unserer Rückmeldegrenze von 11:45 Uhr. Ich schicke das Dispositionsblatt von 10:20 Uhr nochmals mit. Sie haben uns im Telefonat um 11:10 Uhr noch keinen festen Einsatzauftrag für Freitag erteilt. Die von Ihnen beim Betonwerk angefragte spätere Anlieferung um 11:00 Uhr ist nach Ihrer Mitteilung ebenfalls noch nicht bestätigt.

Zum heutigen Termin habe ich den Fahrer erreicht. Er bestätigt, dass er die Baustelle Schilfrain nicht angefahren hat. Eine Anwesenheitsbestätigung von Ihnen kann es dafür nicht geben. Unsere kaufmännische Kollegin sieht sich lediglich die kurzfristige Umbesetzung der Frühschicht an. Ich habe Ihnen weder eine Rechnung angekündigt noch gesagt, dass der Vorgang endgültig kostenfrei ist.

Für Freitag fehlen mir weiterhin die endgültige Buchung und eine abgestimmte Aufstellstelle. Bitte verstehen Sie die Geräteklasse nicht als Zusage, von jedem beliebigen Punkt im Hof bis an Ihre Ostplatte zu gelangen. Ich kenne die inzwischen abgestellten Schalungselemente dort nicht. Solange Ihre Fläche noch nicht freigegeben ist, ist unsere Vormerkung auch keine Bestätigung der Betonierbereitschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Rauter

Pumpendienst Hebefluss GmbH

Anlagen:

14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf

09_Stundenliste.csv

Datum	Person	Anwesenheit_h	Pause_h	Ost_freier_Abschnitt_h	West_Arbeiten_h	Koordination_Warten_h	Erfasst_von
2026-09-14	David Kroll	9,0	0,5	0,0	0,0	8,5	David Kroll
2026-09-14	Mehmet Aydin	9,0	0,5	7,0	0,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Ronja Seifert	9,0	0,5	7,0	0,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Benno Schulz	9,0	0,5	3,0	4,0	1,5	David Kroll
2026-09-14	Janis Weber	9,0	0,5	0,0	7,0	1,5	David Kroll
2026-09-15	David Kroll	9,0	0,5	0,0	0,0	8,5	David Kroll
2026-09-15	Mehmet Aydin	9,0	0,5	5,0	0,0	3,5	David Kroll
2026-09-15	Ronja Seifert	9,0	0,5	5,0	0,0	3,5	David Kroll
2026-09-15	Benno Schulz	9,0	0,5	0,0	6,0	2,5	David Kroll
2026-09-15	Janis Weber	9,0	0,5	0,0	6,0	2,5	David Kroll

16_Disposition_Ereignisse.csv

Zeitpunkt: 2026-09-15T15:25:00+02:00

Vorgang: Beton 16.09. abgesagt

Kontakt: Henning Wilke

Status: keine Produktion; Pumpe separat

Menge_oder_Zeit: 42,00

Einheit: m³ bisher angemeldet

Erfasst_von: David Kroll

Zeitpunkt: 2026-09-16T07:35:00+02:00

Vorgang: Beton 18.09. angeboten

Kontakt: Henning Wilke

Status: Vorhalt bis 12:00 Uhr; ungebucht

Menge_oder_Zeit: 10:00

Einheit: frühester Lieferbeginn

Erfasst_von: David Kroll

Zeitpunkt: 2026-09-16T08:46:00+02:00

Vorgang: Pumpeneinsatz 16.09. abgesagt

Kontakt: Silke Rauter

Status: erstmals direkt mit Pumpendienst gesprochen

Menge_oder_Zeit: 07:00

Einheit: ursprünglicher Einsatzbeginn

Erfasst_von: David Kroll

Zeitpunkt: 2026-09-16T10:20:00+02:00

Vorgang: Pumpenblatt HF-26-614 eingegangen

Kontakt: Silke Rauter

Status: Freitag nur vorgemerkt bis 11:45 Uhr

Menge_oder_Zeit: 10:30

Einheit: früheste Ankunft Freitag

Erfasst_von: Lea Friese

Zeitpunkt: 2026-09-16T10:58:00+02:00

Vorgang: Rückruf zum Betonfenster

Kontakt: Henning Wilke

Status: spätere erste Lieferung noch nicht bestätigt

Menge_oder_Zeit: 11:00

Einheit: angefragter Beginn Freitag

Erfasst_von: David Kroll

Zeitpunkt: 2026-09-16T11:10:00+02:00

Vorgang: Pumpendienst zurückgerufen

Kontakt: Silke Rauter

Status: keine feste Bestellung abgegeben

Menge_oder_Zeit: 11:45

Einheit: Rückmeldegrenze bleibt


Erfasst_von: David Kroll

10_Arbeitsfelder.png

SR-26 | Arbeitsfelder Bodenplatte | Index 04

15.09.2026 | David Kroll

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

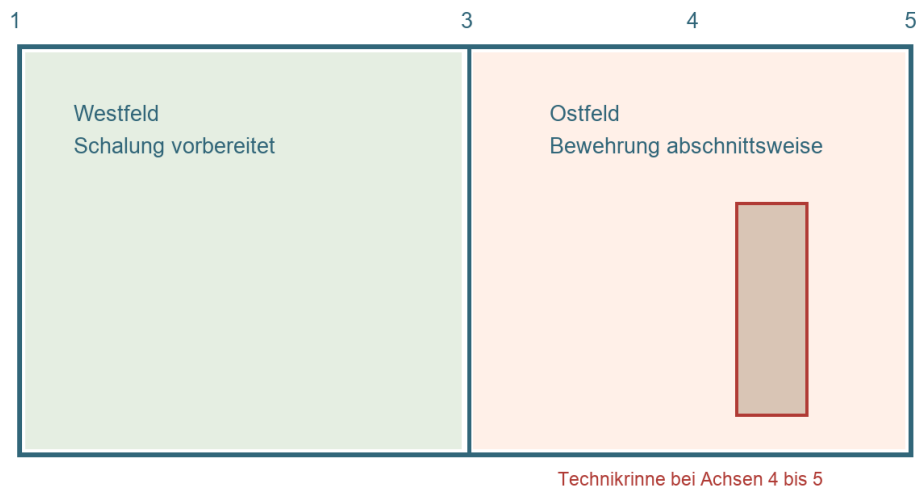

Westfeld Achsen 1 bis 3 | Ostfeld Achsen 3 bis 5

Schematische Lageübersicht. Rinne im Ostfeld; kein Schal- oder Bewehrungsplan.

Bilddatei: 10_Arbeitsfelder.png

18_Stunden_Ablauf_Disposition.xlsx

1 Stundenregister SR-26

14./15.09. nach 09_Stundenliste.csv. Fortschreibung 16.09. nur 07:00 bis 11:15 nach 15_Polierbuch_Vormittag.docx; kein vollständiger Arbeitstag.

David Kroll, Stand 16.09.2026

Positionen	Anwesenheit min	Pause min	Ost frei min	West min	Koordination / Warten min	Nettoanwesenheit h
15	6.675,00	300,00	1.985,00	1.950,00	2.470,00	106,25

Datum	Person	Anwesenheit min	Pause min	Ost frei min	West min	Koordination / Warten min	Nettoanwesenheit h	Quelle / Register
14.09.2026	David Kroll	540,00	30,00	–	–	510,00	8,50	09_Stundenliste.csv
14.09.2026	Mehmet Aydin	540,00	30,00	420,00	–	90,00	8,50	09_Stundenliste.csv
14.09.2026	Ronja Seifert	540,00	30,00	420,00	–	90,00	8,50	09_Stundenliste.csv
14.09.2026	Benno Schulz	540,00	30,00	180,00	240,00	90,00	8,50	09_Stundenliste.csv
14.09.2026	Janis Weber	540,00	30,00	–	420,00	90,00	8,50	09_Stundenliste.csv
15.09.2026	David Kroll	540,00	30,00	–	–	510,00	8,50	09_Stundenliste.csv
15.09.2026	Mehmet Aydin	540,00	30,00	330,00	–	210,00	8,50	09_Stundenliste.csv
15.09.2026	Ronja Seifert	540,00	30,00	300,00	–	210,00	8,50	09_Stundenliste.csv
15.09.2026	Benno Schulz	540,00	30,00	–	360,00	150,00	8,50	09_Stundenliste.csv
15.09.2026	Janis Weber	540,00	30,00	–	360,00	150,00	8,50	09_Stundenliste.csv
16.09.2026	David Kroll	255,00	–	–	–	255,00	4,25	Stundenregister SR-26
16.09.2026	Mehmet Aydin	255,00	–	140,00	–	115,00	4,25	Stundenregister SR-26
16.09.2026	Ronja Seifert	255,00	–	195,00	60,00	–	4,25	Stundenregister SR-26
16.09.2026	Benno Schulz	255,00	–	–	255,00	–	4,25	Stundenregister SR-26
16.09.2026	Janis Weber	255,00	–	–	255,00	–	4,25	Stundenregister SR-26

2 Tagesjournal Bodenplatte und Wände

Zeitpunkte aus Bautagebuch, Telefonnotizen und Montageunterlagen. Einzelereignisse sind keine abrechenbaren Stillstandsintervalle.

David Kroll, Stand 16.09.2026

Positionen

35

Datum	Zeit	Person	Bereich	Ereignis	Menge	Einheit	Quelle
14.09.2026	07:00	David Kroll	Baustelle	Arbeitsbeginn der Kolonne	5,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	07:10	David Kroll	Rinne Ost	Offener Rinnenabschnitt festgestellt	9,00	m ungefähr	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	07:18	Eike Malz	Rinne Ost	Fehlende Formstücke angesprochen	2,00	Stück	12_Telefonnotizen.txt
14.09.2026	08:05	Petra Simmen	Rinne Ost	Keine Überdeckung freigegeben			12_Telefonnotizen.txt
14.09.2026	08:30	Aydin / Seifert	Ost frei	Abstandhalter und erste Matten gestellt	2,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	11:18	Petra Simmen	Durchführungen	Geänderten Öffnungsplan angekündigt	2,00	Öffnungen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	12:00	Kolonne	Baustelle	Beginn der Mittagspause	5,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	12:30	Kolonne	Baustelle	Ende der Mittagspause	5,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	13:00	Benno Schulz	Ost frei	Wechsel aus dem Westbereich	1,00	Person	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	16:00	David Kroll	Baustelle	Ende der Anwesenheit	5,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
14.09.2026	16:10	Petra Simmen	Westfeld	Technische Freigabe für Schalungsarbeiten			12_Telefonnotizen.txt
15.09.2026	07:00	David Kroll	Baustelle	Arbeitsbeginn mit gleicher Kolonne	5,00	Personen	05_Bautagebuch.pdf
15.09.2026	09:40	Eike Malz	Rinne Ost	Formstücke angeliefert	2,00	Stück	05_Bautagebuch.pdf
15.09.2026	09:55	Petra Simmen	Projektraum	Plan S-17/04 bereitgestellt			08_Simmen_Plan.eml
15.09.2026	10:05	David Kroll	Planablage	Plan S-17/04 empfangen	120,00	mm Versatz	08_Simmen_Plan.eml

Datum	Zeit	Person	Bereich	Ereignis	Menge	Einheit	Quelle
15.09.2026	12:20	Eike Malz	Rinne Ost	Einsetzen der Formstücke abgeschlossen			05_Bautagebuch.pdf
15.09.2026	12:35	Uwe Strack	Lager West	Lieferfahrzeug SG-18 angekommen			06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	12:45	Schulz / Weber	Lager West	Entladung begonnen	2,00	Personen	06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	13:25	Benno Schulz	Lager West	Entladung beendet, Übernahme bestätigt			06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	14:30	Petra Simmen	Rinne Ost	Zusätzliche Halterung verlangt			05_Bautagebuch.pdf
15.09.2026	15:10	Henning Wilke	Betondisposition	Entscheidung über morgigen Termin erfragt			12_Telefonnotizen.txt
15.09.2026	15:25	David Kroll	Betondisposition	Liefertermin 16.09. abgesagt	42,00	m ³ angemeldet	07_Beton_Disposition.pdf
15.09.2026	16:00	David Kroll	Rinne Ost	Vollständige Freigabe lag nicht vor			05_Bautagebuch.pdf
16.09.2026	07:00	Mehmet Aydin	Baustelle	Arbeitsbeginn mit gleicher Mannschaft	5,00	Personen	15_Polierbuch_Vormittag.docx
16.09.2026	07:48	David Kroll	Baustelle	Beginn der Sprachnotiz			02_Diktat_Kroll.txt
16.09.2026	07:52	David Kroll	Baustelle	Ende der Sprachnotiz			02_Diktat_Kroll.txt
16.09.2026	08:02	David Kroll	Büroablage	Textübertragung der Sprachnotiz			02_Diktat_Kroll.txt
16.09.2026	08:40	Malz / Bock	Rinne Ost	Montage zusätzlicher Halterung begonnen	2,00	Personen	13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	09:18	Eike Malz	Rinne Ost	Zusätzliche Halterung montiert			13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	09:32	Petra Simmen	Rinne Ost	Kontrolltermin vor Ort begonnen			13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	09:55	Eike Malz	Rinne Ost	Seitliche Abdeckung abnehmen lassen	3,40	m	13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	10:02	Petra Simmen	Rinne Ost	Termin ohne vollständige Freigabe beendet			13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	10:15	Nele Bock	Rinne Ost	Muffenkennzeichnung ins Montagebuch übertragen			13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	10:15	Ronja Seifert	Westfeld	Wechsel zu Schulz und Weber	1,00	Person	15_Polierbuch_Vormittag.docx
16.09.2026	11:15	Mehmet Aydin	Westfeld	Erste Elemente standen, noch nicht fertig	3,00	Elemente	15_Polierbuch_Vormittag.docx

3 Material- und Dispositionsregister

Liefermengen, Vormerkungen und Rückmeldefenster getrennt nach Vorgang. Freitagfenster noch nicht gebucht; Uhrzeiten gelten für den benannten Einsatz.

David Kroll, Stand 16.09.2026

Positionen

15

Belegdatum	Partner	Gegenstand	Vorgang	Menge	Einheit	Von / Zeitpunkt	Bis	Quelle
15.09.2026	Schalgerät Linden	Rahmen 2,70 × 0,90 m	Geliefert, Entladung	18,00	Stück	12:45	13:25	06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	Schalgerät Linden	Rahmen 2,70 × 0,60 m	Geliefert, Entladung	8,00	Stück	12:45	13:25	06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	Schalgerät Linden	Richtstützen	Geliefert, Entladung	12,00	Stück	12:45	13:25	06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	Schalgerät Linden	Verbindungskisten	Verschlossen übergeben	2,00	Stück	12:45	13:25	06_Lieferbeleg.pdf
15.09.2026	Benno Schulz	Elementrückseiten	Bei Übernahme verschmutzt	2,00	Stück			06_Lieferbeleg.pdf
10.09.2026	Betonwerk Körnig	Beton Ostfeld	Anmeldung für 16.09.	42,00	m³	07:00		07_Beton_Disposition.pdf
15.09.2026	Betonwerk Körnig	Beton Ostfeld	Termin 16.09. abgesagt	42,00	m³	15:25		07_Beton_Disposition.pdf
16.09.2026	Betonwerk Körnig	Beton Ostfeld	Mögliches Fenster 18.09.	42,00	m³	10:00	14:00	07_Beton_Disposition.pdf
16.09.2026	Pumpendienst Hebefluss	Pumpe 24-m-Klasse	Früheste Ankunft 18.09.	1,00	Gerät	10:15		14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf
16.09.2026	Pumpendienst Hebefluss	Aufstellen und Einrichten	Ansatz nach Ankunft 18.09.	30,00	min	10:30	11:00	14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf
16.09.2026	Pumpendienst Hebefluss	Freitagsvormerkung	Rückmeldegrenze heute			11:45		17_Rauter_Pumpenfenster.eml
16.09.2026	Betonwerk Körnig	Freitagsvormerkung	Rückmeldegrenze heute			12:00		07_Beton_Disposition.pdf
16.09.2026	Rohrsteg	Zusätzliche Traverse	Aus Lager mitgebracht	1,00	Stück	08:40	09:18	13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	Rohrsteg	Schellen	Aus Lager mitgebracht	2,00	Stück	08:40	09:18	13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf
16.09.2026	Rohrsteg	Befestigungsmittel	Aus Lager mitgebracht	4,00	Stück	08:40	09:18	13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf

03_Vertrag_Rohbau.docx

Rohbauauftrag Werkstatt Schilfrain

Werkraum Schilfrain GmbH | Geschäftsführerin Amelie Reuter

An: Massivbau Dammert GmbH | Geschäftsführer Stefan Lück

24.08.2026 | SR-26 / RB-01 / Vertragsausfertigung

1 Leistung und Vertragsunterlagen

Die Werkraum Schilfrain GmbH, Schilfrain 19, 59494 Soest, beauftragt die Massivbau Dammert GmbH, Feldbogen 6, 59494 Soest, mit dem Rohbau des eingeschossigen Werkstattgebäudes. Vertragsgrundlagen sind dieser Auftrag, das Angebot MD-26108 vom 18.08.2026, das LV RB-07 und die VOB/B Ausgabe 2016. Diese Unterlagen sind beiden Parteien bei Unterzeichnung ausgehändigt worden. Der Auftrag umfasst Fundamente, Bodenplatte, Stahlbetonwände und die im LV beschriebenen Öffnungen; die technische Fachplanung wird durch die Auftraggeberin gestellt.

Die Auftragssumme auf Grundlage der ausgeschriebenen Mengen beträgt 286.400,00 EUR netto zuzüglich 54.416,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 340.816,00 EUR brutto. Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Mengen und vereinbarten Einheitspreisen. Über Nachträge wird nur aufgrund einer gesonderten nachvollziehbaren Beschreibung entschieden. Dieser Vertrag vereinbart keine pauschale Vergütung für ungeklärte spätere Störungen.

2 Mitwirkung und Freigaben

Die Auftraggeberin stellt die abgestimmten Schal- und Bewehrungspläne rechtzeitig vor den betreffenden Arbeiten bereit. Im Bereich der Technikrinne unter der Bodenplatte verlegt ihr gesonderter Auftragnehmer Rohrstege Haustechnik die Leitungen. Die Rohrlage und der Abschluss seiner Arbeiten sind vor dem darüberliegenden Bewehrungseinbau gemeinsam zu prüfen. Eine Überdeckung ohne die erforderliche technische Kontrolle ist nicht vorgesehen.

Für den Schriftverkehr über Ausführung und Termine ist die Auftraggeberin unter bau@werkraum-schilfrain.example erreichbar. Eine Kopie geht an die Objektüberwachung. Fachplanerin oder Objektüberwachung dürfen technische Abläufe koordinieren; rechtsgeschäftliche Vereinbarungen über Vergütungsänderungen oder geänderte Vertragstermine trifft Amelie Reuter. Die Vertragsparteien benennen damit Ansprechpartner, ohne die Wirksamkeit einzelner künftiger Erklärungen vorwegzunehmen.

3 Termine

Arbeitsbeginn ist der 31.08.2026. Der Rohbau soll bis 30.10.2026 fertiggestellt werden. Der von den Parteien bestätigte Detailablauf RB-T-01 vom 25.08. liegt der Koordination zugrunde; seine einzelnen Zwischenansätze sind keine gesondert vereinbarten Vertragsfristen. Die Auftraggeberin und der Auftragnehmer werden erkennbare Abweichungen zeitnah besprechen und die betroffenen Vorgänge dokumentieren.

Amelie Reuter und Stefan Lück | Vertragsbestätigung am 24.08.2026

04_Ablauf_01.docx

Arbeitsfolge Bodenplatte und Wände

David Kroll | Bauleitung Massivbau Dammert

An: Amelie Reuter und Objektüberwachung Petra Simmen

25.08.2026 | RB-T-01 / bestätigt zur Koordination am 27.08.2026

1 Geplanter Ablauf

Die Bodenplatte wird in zwei Feldern hergestellt. Feld West liegt zwischen den Achsen 1 bis 3, Feld Ost zwischen 3 bis 5. Beide Felder sind durch eine geplante Arbeitsfuge getrennt. Das Westfeld ist unabhängig zugänglich. Die Technikrinne quert ausschließlich das Ostfeld zwischen Achsen 4 und 5. Der Kolonnenansatz beträgt fünf Beschäftigte mit acht Anwesenheitsstunden je regulärem Arbeitstag, einschließlich einer halben Stunde Pause.

Die nachstehende Folge geht von fertig verlegten Leitungen in der Technikrinne bis zum 11.09. um 12:00 Uhr und einer anschließenden Kontrolle aus. Die Bewehrung kann im Bereich der Rinne erst danach geschlossen werden. Im übrigen Ostfeld kann sie abschnittsweise vorbereitet werden; eine vollständige Betonage setzt den Abschluss sämtlicher Vorarbeiten im Feld voraus.

Vorgang	Geplanter Zeitraum	Abhängigkeit
Westfeld Bewehrung	07.09. bis 09.09.	Sauberkeitsschicht vorhanden
Westfeld Betonage	10.09., 07:00 Uhr	Kontrolle am 09.09.
Ostfeld Bewehrung	14.09. bis 15.09.	Technikrinne fertig und kontrolliert
Ostfeld Betonage	16.09., 07:00 Uhr	Bewehrung und Öffnungsdetails freigegeben
Wandschalung West	17.09. bis 18.09.	technische Freigabe des Westfelds
Wandschalung Ost	21.09. bis 23.09.	Ostplatte ausreichend für Folgearbeiten

2 Arbeitsmittel und Ausweichfläche

Die Wandschalung für das Westfeld kommt am 15.09. mittags. Zuvor können an der Westseite Randabschlüsse nachbearbeitet und Schalungsträger sortiert werden. Diese Tätigkeiten bieten nicht für die gesamte Kolonne zwei volle Tage Arbeit. Für das Ostfeld sind Bewehrungsstahl und Abstandhalter ab 11.09. auf der Baustelle verfügbar. Die Betonbestellung wird durch David Kroll abgestimmt.

3 Fortschreibung

Die Vorgänge werden bei Änderungen einzeln fortgeschrieben. Ein verschobener Betontermin wird nicht ohne Prüfung als gleich lange Verschiebung des Rohbauendes übernommen. Die Westarbeiten und Liefermöglichkeiten sind dafür gesondert anzusehen. Die Terminansätze dienen der Ausführungscoordination, nicht einer bereits erklärten Bewertung möglicher Ansprüche.

David Kroll | d.kroll@massivbau-dammert.example

11_Ablauf_02.docx

Wochenplanung ab 16 September

David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

An: Polier Mehmet Aydin und Disposition

16.09.2026, 08:20 Uhr | RB-T-02 / vorläufiger Kolonnenplan

1 Stand am Mittwochmorgen

Die Technikrinne im Ostfeld ist noch nicht zur Überdeckung freigegeben. Frau Simmen hat für heute 09:30 Uhr einen weiteren Termin angekündigt. Auch die Rückfrage zum Bewehrungsdetail an den geänderten Durchführungen ist noch offen. Der Betontermin von heute 07:00 Uhr ist abgesagt. Eine neue Lieferung für Freitag ab 10:00 Uhr kann bis heute 12:00 Uhr angemeldet werden; Pumpe und Freigaben sind noch nicht bestätigt.

2 Kolonneneinsatz

Aydin und Seifert halten zunächst die vorbereiteten Bewehrungsbereiche im Ostfeld frei und prüfen die für das Änderungsdetail bereits gelieferten Stäbe gegen die neue Liste, ohne Stäbe eigenständig umzubiegen. Schulz und Weber beginnen nach der bereits vorliegenden technischen Freigabe des Westfelds mit dem Sortieren und Vorbereiten der Wandschalung. Kroll nimmt am Termin zur Technikrinne teil und stimmt die Liefermöglichkeiten ab. Die Baustelle ist deshalb nicht insgesamt ohne Arbeit.

Für Donnerstag ist das Stellen der ersten Westwände vorgesehen. Ob gleichzeitig die Ostbewehrung abgeschlossen werden kann, hängt von den noch offenen Rückmeldungen ab. Eine vollständige Verlagerung aller fünf Beschäftigten in die Westwände ist wegen des begrenzten Arbeitsraums heute nicht sinnvoll. Der konkrete Einsatz wird im Tagebuch und in der Stundenliste fortgeschrieben, nicht pauschal als Stillstand eingetragen.

3 Annahmen und Termine

Wenn Rinne und Detail heute freigegeben werden, könnte die Ostbewehrung nach derzeitiger Einschätzung am Donnerstag fertig werden. Das ist eine Arbeitsannahme und keine zugesagte Fertigmeldung. Der mögliche Betontermin am Freitag würde weitere Abstimmung über die anschließenden Wände erfordern. Auswirkungen auf den vertraglichen Rohbautermin 30.10. werden damit noch nicht beziffert. Die vorausgehende Planung RB-T-01 bleibt als Vergleichsstand erhalten.

Diese Wochenplanung geht nur an die Kolonne und die Disposition. Sie ist keine an die Auftraggeberin gerichtete förmliche Erklärung. Bitte tatsächliche Beginn- und Endzeiten weiterhin erfassen und bei einer Freigabe deren Zeitpunkt und Gegenstand notieren.

David Kroll | Stand 16.09.2026, 08:20 Uhr

15_Polierbuch_Vormittag.docx

Polierbuch Mittwochvormittag

Mehmet Aydin | Massivbau Dammert GmbH

An: David Kroll | Baustellenablage Schilfrain

16.09.2026, 11:25 Uhr | SR-26 / MA-16 / Eintrag bis 11:15 Uhr

1 Frühe Arbeiten

Wir waren um 07:00 Uhr mit derselben Mannschaft wie gestern da. Ronja und ich haben zuerst die bereits ausgelegten Matten im freien Ostabschnitt angesehen und die Stabkennungen mit der Liste verglichen. Von 07:15 bis 08:30 Uhr ergänzten wir Abstandhalter außerhalb der Rinne. Über der Rinne blieb offen. An den verschobenen Durchführungen haben wir keine Stäbe umgebogen. Ich will nachher noch wissen, welche gekennzeichneten Teile wir wieder einsetzen können; auf eigene Faust schneiden wir dort nichts weg.

Benno und Janis nahmen im Westen die Verbindungskisten auseinander und sortierten Zubehör zu den gestern gelieferten Elementen. Zwei Rückseiten waren stark verschmutzt. Das Reinigen und Zuordnen dauerte bis 08:40 Uhr. Danach legten sie die ersten Elemente an der westlichen Wandachse bereit. Die technische Freigabe für diesen Bereich lag seit Montag vor; heute fehlte dort nicht die Freigabe, sondern zunächst die vorbereitete Schalung.

2 Während des Rinnentermins

Von 08:30 bis 09:20 Uhr sortierten Ronja und ich die schon geschnittenen Stäbe an der östlichen Lagerstelle nach Kennung. Damit war nicht entschieden, dass alles zum neuen Detail passt. Ab 09:20 Uhr begleitete ich Kroll an die Rinne, Ronja räumte den freien Oststreifen auf. Ich sah die zusätzliche Halterung und hörte Frau Simmen nach der verdeckten Kennzeichnung fragen. Eine Freigabe zum Schließen habe ich nicht gehört.

Um 10:15 Uhr ging Ronja zu Benno und Janis in den Westen. Zu dritt konnten sie die ersten drei Elemente nacheinander stellen und sichern. Mehr Leute hätten an dieser kurzen Wandstrecke im Weg gestanden. Um 11:15 Uhr standen drei Elemente; der Abschnitt war noch nicht fertig ausgerichtet und geschlossen. Ich blieb im Osten für die Abstimmung der Teile und den Zugang von Rohrsteg. Kroll telefonierte zwischendurch mit Lieferanten und war nicht die ganze Zeit bei mir.

3 Stand zur Eintragung

Mittagspause hat bis 11:15 Uhr noch nicht stattgefunden. Die heutige Stundenliste ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Eintrag soll keine volle Tagesstundenzahl abgeleitet werden. Den neuen Betontermin kenne ich nur als Möglichkeit. Mir liegt bis jetzt weder eine abgeschlossene Kontrolle der Rinne noch eine Antwort auf unsere Frage zu den vorbereiteten Stäben vor.

Mehmet Aydin | m.aydin@massivbau-dammert.example

05_Bautagebuch.pdf

Bautagebuch Bodenplatte

David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

An: Baustellenablage SR-26

15.09.2026, 17:20 Uhr | BT-12 / Einträge 14. und 15.09.2026

1 Montag 14 September

Arbeitsbeginn 07:00 Uhr. Anwesend: David Kroll, Mehmet Aydin, Ronja Seifert, Benno Schulz und Janis Weber. Gegen 07:10 Uhr war die Technikrinne zwischen Achsen 4 und 5 auf etwa 9 m Länge noch offen. Es lagen zwei Leitungsbündel ohne abschließende Befestigung in der Rinne. Herr Malz von Rohrstege war vor Ort und sagte, zwei Formstücke fehlten. Einen schriftlichen Fertigtermin nannte er nicht. Petra Simmen kam um 08:05 Uhr.

Bis 08:30 Uhr wurden Lage und freier Arbeitsraum angesehen. Es gab keine Freigabe zum Schließen der Bewehrung über der Rinne. Ab 08:30 Uhr stellten Aydin und Seifert im freien Ostabschnitt Abstandhalter und erste Matten. Schulz und Weber arbeiteten an Randabschalungen im Westen. Kroll koordinierte Lieferung und Planrückfrage. Ab 13:00 Uhr half Schulz im freien Ostabschnitt; Weber räumte weiter im Westen auf. Die Kolonne war bis 16:00 Uhr anwesend, Pause 12:00 bis 12:30 Uhr.

Um 11:18 Uhr erhielt ich von Petra Simmen die Ankündigung eines geänderten Öffnungsplans. Das betraf zwei Durchführungen nahe Achse 5. Der Plan war um 16:00 Uhr noch nicht in unserem Projektraum. Im freien Abschnitt war Bewehrung möglich, im Bereich der Durchführungen nicht abschließend. Das Tagebuch ordnet die heute eingesetzten Stunden Tätigkeiten zu; daraus ergibt sich nicht automatisch eine vergütungsfähige Stillstandszeit.

2 Dienstag 15 September

Beginn 07:00 Uhr mit derselben Kolonne. Die Formstücke wurden laut Rohrstege um 09:40 Uhr angeliefert. Der Einbau dauerte bis etwa 12:20 Uhr. Frau Simmen führte um 14:30 Uhr eine Sichtkontrolle durch und bat um eine Ergänzung der Halterung. Eine vollständige Freigabe zur Überdeckung lag um 16:00 Uhr nicht vor. Die Wandschalung West kam um 12:45 Uhr; Schulz und Weber entluden und sortierten sie.

Um 10:05 Uhr erreichte uns der Öffnungsplan S-17/04. Ein öffnungsnahes Bewehrungsdetail wurde darin gegenüber S-17/03 verändert. Kroll bat die Tragwerksplanung um Bestätigung, wie mit den bereits vorbereiteten Stäben zu verfahren sei. Um 15:10 Uhr sagte die Disposition des Betonwerks, der alte Termin 16.09., 07:00 Uhr könne nicht beliebig bis zum Vorabend offen gehalten werden. Kroll stornierte ihn um 15:25 Uhr telefonisch. Eine Stornorechnung lag zum Ende des Tages nicht vor.

David Kroll | fortgeschrieben 15.09.2026, 17:20 Uhr

06_Lieferbeleg.pdf

Lieferbeleg Wandschalung West

Schalgerät Linden GmbH | Disposition Frauke Dorn
An: Massivbau Dammert GmbH | Baustelle Schilfrain 19
15.09.2026, 12:45 Uhr | Lieferschein SG-26194

1 Lieferung

Die nachstehenden Teile wurden am 15.09.2026 mit Fahrzeug SG-18 an die Baustelle Schilfrain 19 in Soest geliefert. Fahrer war Uwe Strack. Ankunft 12:35 Uhr, Beginn Entladung 12:45 Uhr, Ende 13:25 Uhr. Benno Schulz und Janis Weber nahmen die Teile an. Einsetzen und Ausrichten der Schalung sind nicht Leistungen dieser Lieferung.

Teil	Menge	Zuordnung
Rahmenelement 2,70 × 0,90 m	18 Stück	Wände Westfeld
Rahmenelement 2,70 × 0,60 m	8 Stück	Wände Westfeld
Richtstütze	12 Stück	Wände Westfeld
Verbindungskiste	2 Stück	Zubehör; verschlossen übergeben

2 Zustand und Übernahme

Schulz vermerkte bei der Übernahme zwei verschmutzte Elementrückseiten. Ein Schaden an der Schalhaut wurde beim Entladen nicht festgestellt. Eine vollständige Prüfung sämtlicher Zubehörteile fand während der Entladung nicht statt. Die Teile wurden auf Lagerfläche West abgelegt; der Zugang zur Technikrinne blieb frei. Die Lieferung war für den 15.09. zwischen 12:00 und 14:00 Uhr angekündigt und lag innerhalb dieses Fensters.

3 Mietbeginn

Die vereinbarte Mietzeit beginnt am 15.09.2026. Ein anderer Mietbeginn oder eine kostenfreie Verlängerung ist auf diesem Lieferschein nicht vereinbart. Die Disposition erhielt keine Mitteilung über eine Stilllegung der gesamten Baustelle. Eine Rückholung wurde nicht angefragt. Frau Dorn kann über eine spätere Verlängerung erst nach Mitteilung des tatsächlich benötigten Enddatums entscheiden.

Frauke Dorn | f.dorn@schalgeraet-linden.example. Übernahme durch Benno Schulz am 15.09.2026, 13:25 Uhr in der Lieferablage bestätigt.

07_Beton_Disposition.pdf

Disposition Bodenplatte Ost

Henning Wilke | Betonwerk Körnig GmbH

An: David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

16.09.2026, 08:05 Uhr | BK-26-883 / Telefonbestätigung

1 Bestellung und Absage

Sehr geehrter Herr Kroll, wir bestätigen den Verlauf unserer Disposition für die Bodenplatte Ost in Soest. Sie hatten am 10.09.2026 eine Lieferung von 42,00 m³ Beton für den 16.09. ab 07:00 Uhr angemeldet. Pumpe und Lieferfolge sollten wir gemeinsam mit Ihnen am Vortag endgültig abstimmen. Am 15.09. um 15:25 Uhr haben Sie den Termin telefonisch abgesagt, weil die Fläche nach Ihrer Mitteilung nicht betonierbereit sei.

Die Absage ist bei uns vor Beladung eingegangen. Es wurde für diese Baustelle kein Beton produziert oder abgefahren. Die von einem anderen Unternehmen gestellte Pumpe haben wir nicht in Ihrem Namen storniert. Etwaige Kosten dieses Unternehmens können wir deshalb weder bestätigen noch beziffern. Über eigene Dispositionskosten haben wir noch keine Rechnung gestellt.

2 Neue Liefermöglichkeit

Unser nächstes derzeit frei planbares Zeitfenster ist Freitag, 18.09.2026, ab 10:00 Uhr. Wir halten es bis heute 12:00 Uhr unverbindlich vor. Für eine feste Bestellung benötigen wir bis dahin Ihre Bestätigung der Betonierbereitschaft, der Menge und des Pumpentermins. Die Menge von 42,00 m³ ist aus der alten Anmeldung übernommen; eine aktualisierte Mengenprüfung haben wir nicht vorgenommen.

Eine Lieferung am Donnerstagmorgen können wir zurzeit nicht zusagen. Falls ein anderer Auftrag ausfällt, melden wir uns, möchten Ihre Bauablaufplanung aber nicht auf diese ungewisse Möglichkeit stützen. Die vorgesehene Lieferdauer am Freitag beträgt bei ungestörter Abnahme etwa vier Stunden. Zufahrt und Standfläche der Pumpe müssen frei sein.

3 Reichweite dieser Bestätigung

Wir kennen weder die Ursache der fehlenden Betonierbereitschaft noch die vertraglichen Termine zwischen Ihnen und Ihrem Auftraggeber. Dieses Schreiben hält ausschließlich Bestell- und Lieferinformationen fest. Eine Übernahme von Kosten oder eine Anerkennung einer Bauzeitverlängerung ist damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Wilke | h.wilke@beton-koernig.example

13_Montageblatt_Rohrsteg.pdf

Montageblatt Technikrinne

Eike Malz | Rohrsteg Haustechnik GmbH

An: Petra Simmen | Objektüberwachung Kontur

16.09.2026, 10:35 Uhr | RS-26-308 / Tagesblatt 16

1 Nacharbeit am Morgen

Ich habe heute mit Monteurin Nele Bock um 08:40 Uhr an der zusätzlichen Halterung in der Technikrinne begonnen. Die von Ihnen gestern um 14:30 Uhr angesprochene Stelle liegt im östlichen Drittel des rund 9 m langen Rinnenabschnitts. Die bereits gestern eingesetzten Formstücke wurden nicht wieder ausgebaut. Für die Ergänzung brachten wir eine Traverse, zwei Schellen und vier Befestigungsmittel aus unserem Lager mit. Die Montage der zusätzlichen Halterung war um 09:18 Uhr abgeschlossen.

Frau Simmen traf um 09:32 Uhr ein; Herr Kroll kam hinzu. Beide sahen die neue Halterung. Die Leitung lag dort bei äußerer Kontrolle nicht mehr lose auf dem Untergrund. Eine Belastungsprobe des gesamten Leitungsbündels wurde nicht ausgeführt. Die Befestigungsmittel waren nach dem Einbau zugänglich und wurden nicht mit Beton überdeckt.

2 Kontrollöffnung und Überdeckung

An einem Anschluss im östlichen Abschnitt konnten wir die Kennzeichnung der eingesetzten Muffe vom Rand aus nicht vollständig lesen. Frau Simmen wollte den Anschluss vor der Überdeckung noch einmal geöffnet sehen. Um 09:55 Uhr ließ ich deshalb die seitliche Abdeckung auf den östlichen 3,40 m abnehmen. Die westlichen 5,60 m blieben eingebaut, wurden aber ebenfalls nicht zur Überdeckung freigegeben. Der Termin endete für Frau Simmen um 10:02 Uhr ohne vollständige Freigabe der Rinne.

Um 10:15 Uhr erreichten wir die Kennzeichnung von unten. Sie lautet auf die von uns bestellte Ausführung. Nele Bock übertrug die Zeichen in unser Montagebuch. Ein erneuter gemeinsamer Kontrolltermin hat bis zur Niederschrift um 10:35 Uhr nicht stattgefunden. Die abgenommene seitliche Abdeckung liegt gesichert neben der Rinne. Wir haben Herrn Kroll nicht gesagt, er dürfe jetzt die Bewehrung darüber schließen.

3 Abgrenzung unseres Einsatzes

Dieses Blatt berichtet unsere Montage und die beobachteten Zeiten. Die geänderten Öffnungen nach Plan S-17/04 und deren Bewehrungsdetail gehören nicht zu unserer Planung. Ob dort bereits zugeschnittene Stäbe weiterverwendet werden können, habe ich nicht entschieden. Der Arbeitsbereich blieb für unsere Monteurin zugänglich; andere Tätigkeiten im Westfeld konnte ich nur vom Weg zum Container aus sehen.

Eike Malz | e.malz@rohrsteg.example

14_Pumpen_Dispositionsblatt.pdf

Pumpendisposition Schilfrain

Silke Rauter | Pumpendienst Hebefluss GmbH

An: David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

16.09.2026, 10:20 Uhr | HF-26-614 / Dispositionsbestätigung

1 Bisheriger Termin

Sehr geehrter Herr Kroll, für heute war bei uns eine Autobetonpumpe der 24-m-Klasse zu Ihrem Einsatz um 07:00 Uhr vorgemerkt. Die Anmeldung erfolgte am 11.09. durch Ihr Büro. Die letzte Abstimmung von Lieferfolge und Standplatz fehlte gestern Abend. Wir hatten deshalb noch keine endgültige Ausfahrtfreigabe erteilt. Das Betonwerk Körnig hat uns keine Stornierung in Ihrem Namen übermittelt.

Um 08:46 Uhr riefen Sie heute an und teilten erstmals unmittelbar unserer Disposition mit, dass der Einsatz entfallen solle. Die Pumpe war nicht zu Ihrer Baustelle gefahren. Unser Fahrer war ab 06:00 Uhr für die Frühschicht eingeteilt und wurde um 06:35 Uhr nach interner Umplanung einem anderen Einsatz zugewiesen. Eine Wartezeit auf der Baustelle Schilfrain ist in seinem Tagesblatt nicht vermerkt. Ob wir Ihnen für die kurzfristige Änderung einen Dispositionsbetrag berechnen, ist noch in unserer kaufmännischen Bearbeitung; dieses Blatt ist keine Rechnung.

2 Freitag 18 September

Für Freitag können wir dieselbe Gerätekategorie derzeit frühestens ab 10:30 Uhr an Ihrer Baustelle vorsehen. Das von Ihnen genannte Betonfenster beginnt um 10:00 Uhr. Beide Angaben sind also noch nicht deckungsgleich. Unser Ansatz enthält anschließend etwa 30 Minuten zum Aufstellen und betriebsbereiten Einrichten bei frei zugänglicher, geeigneter Standfläche. Eine Betonannahme bereits um 10:00 Uhr sagen wir mit dieser Vormerkung nicht zu.

Die Angaben zur Auslegerreichweite ersetzen keine Prüfung der tatsächlichen Aufstellstelle. Sie nannten uns heute wieder den Hof an der Westseite; die Abstände zum Ostfeld und die Abstützflächen haben wir noch nicht gemeinsam angesehen. Die Betonmenge von 42,00 m³ stammt aus Ihrer alten Anmeldung und wurde von uns nicht neu aufgemessen.

3 Rückmeldung

Wir halten das Freitagfenster bis heute 11:45 Uhr ohne verbindliche Buchung offen. Sie wollten nach dem Termin an der Rinne zurückrufen. Eine Auftragserteilung für Freitag haben wir bis 10:20 Uhr nicht erhalten. Ein anderer Termin oder eine Vergütungsregelung für ausgefallene Einsätze ist in diesem Schreiben nicht vereinbart. Unsere Dispositionsakte enthält bislang keinen von Ihnen anerkannten Kostenbetrag.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Rauter | s.rauter@hebefluss.example
