

11_Planlauf_Notizen.txt

Planungsbüro Raumkante | BW-26 | Posteingang Nora Küster

Stand 18.09.2026, 08:20 Uhr

02.09., 10:00: BB-01 an Reinhold, Seeger. Zu diesem Zeitpunkt PVC und T12 ohne festgelegte Spezialanforderung im Kostenansatz. Datei nicht löschen, Sitzungsbezug.

09.09., 17:10: Nutzervermerk NB-04 bestätigt. Linoleum, Sockel 10 cm, Wand 125 mm, Q3, Musterfeld. Herr Seeger war bei Besprechung dabei.

10.09., 11:25: BS-09 von Elke Mertens eingegangen. Türblatt BW-T-12/02 wurde angekündigt, ist im Ordner noch nicht als eigene Zeichnung abgelegt. In BB-02 darauf verwiesen.

10.09., 15:30: TW-06 von Cem Arslan eingegangen. Freies Revisionsmaß und örtliche Markierung. Deckenspiegel noch offen.

11.09., 09:15: BW-M-02 erstellt. Gleiche Raumgeometrie, anderer Umgang mit Verschnitt gegenüber Übertragungszeile M-01.

11.09., 14:20: BB-02 abgelegt und an Reinhold geschickt. Nutzerstand bestätigt; kein technisches Freigabeblatt für LV.

14.09., 16:42: Seeger meldet LV Revision 03. Nicht versandt. Drei Seiten.

17.09., 09:05: Nora bittet um Abgleich mit Fundstellen. Termin am 18.09. um 14:00 vorgesehen.

18.09., 08:20: Bis jetzt keine zusätzliche Türzeichnung und kein Deckenspiegel erhalten. Keine telefonische Freigabe von Mertens oder Arslan dokumentiert.

01_Kuester_LV_Abgleich.eml

Von	Nora Küster <n.kuester@raumkante.example>
An	Ralf Seeger <r.seeger@raumkante.example>
Datum	Thu, 17 Sep 2026 09:05:00 +0200
Betreff	Bachwinkel: Vor dem Versand noch BB gegen LV lesen

Guten Morgen Herr Seeger,

bitte gleichen Sie die Baubeschreibung mit dem Ausbau-LV ab, bevor wir die Unterlagen an die drei angefragten Firmen senden. Im Ordner liegen BB-01 und BB-02; die ältere Datei soll für die Entstehungsgeschichte erhalten bleiben. Ich brauche eine Liste der Widersprüche und fehlenden Leistungen mit genauen Fundstellen in den jeweiligen Fassungen. Eine bloße Zusammenfassung hilft mir bei der Freigabe nicht.

Bitte ändern Sie die LV-Datei zunächst nicht. Ich möchte die betroffenen Textstellen nebeneinander sehen und mit Ole Reinhold sowie den Fachplanern besprechen. Eine jüngere E-Mail ist nicht automatisch eine neue vollständige Leistungsbeschreibung. Bei Maßen und Mengen bitte angeben, ob eine andere Mengendefinition oder wirklich eine abweichende Geometrie vorliegt.

Die Anfrage soll ursprünglich am 21.09. hinausgehen. Ich habe noch keine Versandfreigabe erteilt. Herr Arslan hat insbesondere um den Deckenspiegel gebeten; seine Nachricht befindet sich ebenfalls in der Ablage. Bitte nehmen Sie offene Nachweise als offen auf, ohne eine technische Freigabe zu formulieren.

Freundliche Grüße

Nora Küster

Anlagen:

03_Baubeschreibung_02.docx

04_LV_Ausbau_03.docx

10_Seeger_Dateiversand.eml

Von	Ralf Seeger <r.seeger@raumkante.example>
An	Nora Küster <n.kuester@raumkante.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 16:42:00 +0200
Betreff	BW-LV-AU Revision 03 in der Ablage

Hallo Frau Küster,

die Revision 03 des Ausbau-LV liegt jetzt im Projektordner. Ich habe die Trennung zum Treppenhaus und den Deckenanstrich ergänzt. Die neuen Nutzerwünsche vom Mittwoch habe ich beim heutigen Durchlauf noch nicht vollständig in jede Position übernommen. Der Dateiname soll daher nicht als Bestätigung einer abschließenden Prüfung verstanden werden.

Die 14,88 m² in der Wandposition sind eine Ansicht. Für Spachtel und Anstrich habe ich 29,76 m², also beide Seiten, eingesetzt. Bei den Bodenflächen steht noch meine Übertragungszeile aus BW-M-01 mit zehn Prozent Verschnitt. Das Raumbblatt von Freitag habe ich erhalten, die Mengenspalte aber noch nicht umgestellt.

Den alten Türtext habe ich stehen gelassen, bis wir den neuen Fachbeitrag gemeinsam durchsehen. Der Deckenspiegel ist noch nicht in meinem Posteingang. Es gibt keinen Versand an Firmen und keine ausgedruckte Angebotsfassung. Bitte verwenden Sie für die Besprechung diese Revision und nicht meinen lokalen Zwischenstand vom 12.09.

Viele Grüße

Ralf Seeger

Planungsbüro Raumkante

17_Roemer_Musterlieferung.eml

Von	Maja Römer <m.roemer@bahnenraum.example>
An	Ralf Seeger <r.seeger@raumkante.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 09:35:00 +0200
Betreff	Bachwinkel: Musterabschnitte und Lieferauskunft BR-26-512

Sehr geehrter Herr Seeger,

die drei Musterabschnitte gehen heute mit unserem Fahrer an Ihr Büro, nicht an die Baustelle. Meine Lieferauskunft vom 21.09. ist beigelegt. Die graugrüne Probe stammt aus Los 26-38, das derzeit nur für eine Teilmenge verfügbar ist. Die zwei anderen Muster sind Schiefergrau und gedecktes Rot; für diese liegen nach heutiger Lagerauskunft größere zusammenhängende Abschnitte vor. Eine verbindliche Verfügbarkeit im November kann ich ohne Reservierung nicht zusagen.

Sie hatten am Telefon auch nach einem 8-cm-Sockel gefragt. Meine beigelegte Auskunft bezieht sich auf die danach per E-Mail genannten 100 mm. Ich habe keine Bestellung für die eine oder andere Höhe aufgenommen. Auf den Mustern steht deshalb nur die Material- und Farbbezeichnung; sie enthalten keine Entscheidung über die Sockelausführung.

Für zwei Ersatzfliesen konnte unser Lager bislang keine passenden Restbestände finden. Die mitgeschickte hellere Probe sollte Herr Reinhold nicht für die bereits bestätigte Bestandsfarbe halten. Zu Untergrundklebern kann ich anhand einer Beschreibung der dunklen Schicht keine belastbare Aussage machen. Wir haben die Materialproben des ausgebauten Bodens nicht erhalten und keine Analyse vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen
Maja Römer
Belaghandel Bahnenraum GmbH

Anlagen:
15_Lieferauskunft_Boden.docx

09_Mengenuebertragung.csv

Stand	Quelle	Bauteil	Ansatz	Menge	Einheit	Ersteller
02.09.2026	BW-M-01 Übertragungszeile	Boden elastisch	$96,00 * 1,10$	105,60	m ²	Ralf Seeger
11.09.2026	BW-M-02 Abschnitt 1	Boden elastisch	$43,20 + 28,80 + 24,00$	96,00	m ²	Nora Küster
11.09.2026	BW-M-02 Abschnitt 2	Trennwand eine Ansicht	$4,80 * 3,10$	14,88	m ²	Nora Küster
11.09.2026	BW-M-02 Abschnitt 2	Trennwand zwei Seiten	$14,88 * 2$	29,76	m ²	Nora Küster
11.09.2026	BW-M-02 Abschnitt 2	Sockel	$77,20 - 10,00$	67,20	m	Nora Küster
14.09.2026	BW-LV-AU 03 Pos. 06.010	Flurdecke	$12,00 * 2,00$	24,00	m ²	Ralf Seeger

14_Sockelstrecken.csv

Raum: 0.11

Wandpaar: beide Längswände

Bruttolänge_m: 18,00

Abzug_m: 1,80

Sockellänge_m: 16,20

Abzugsgrund: zwei Durchgänge zu je 0,90 m

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger

Raum: 0.11

Wandpaar: beide Stirnwände

Bruttolänge_m: 9,60

Abzug_m: 1,20

Sockellänge_m: 8,40

Abzugsgrund: fester bodenbündiger Schranksockel

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger

Raum: 0.12

Wandpaar: beide Längswände

Bruttolänge_m: 12,00

Abzug_m: 1,00

Sockellänge_m: 11,00

Abzugsgrund: Planungsansatz Tür T12; keine Bestandsablesung

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger

Raum: 0.12

Wandpaar: beide Stirnwände

Bruttolänge_m: 9,60

Abzug_m: 1,00

Sockellänge_m: 8,60

Abzugsgrund: fester bodenbündiger Einbauschränk

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger

Raum: 0.10

Wandpaar: beide Längswände

Bruttolänge_m: 24,00

Abzug_m: 3,00

Sockellänge_m: 21,00

Abzugsgrund: drei geplante Türanschlüsse zusammen

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger

Raum: 0.10

Wandpaar: beide Stirnwände

Bruttolänge_m: 4,00

Abzug_m: 2,00

Sockellänge_m: 2,00

Abzugsgrund: Eingang und Hofanschluss zusammen

Stand: BW-M-02; Einzelstrecken übertragen 18.09.2026

Ersteller: Ralf Seeger


12_Raumschema.png

BW-A-21/02 | Raumschema Erdgeschoss

08.09.2026 | Nora Küster

Illustration / Skizze, keine Baustellenfotografie. Nicht maßstäblich.

Raumzuordnung, keine maßstäbliche Wandgeometrie

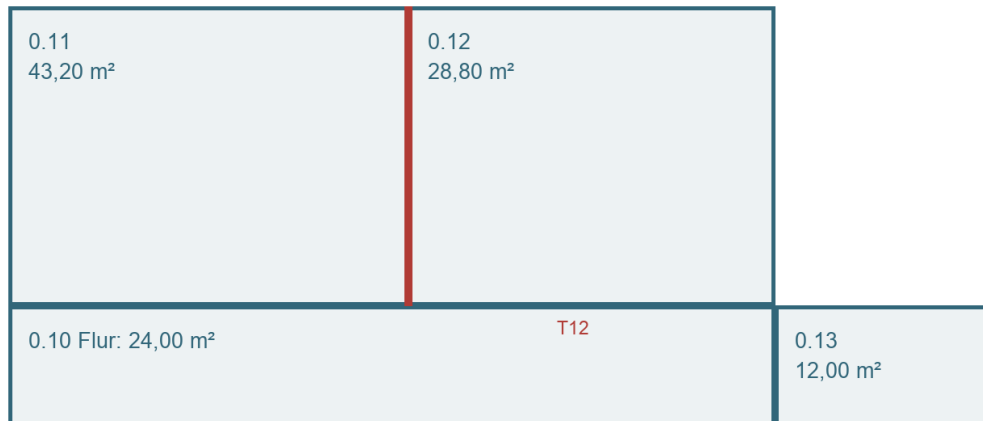

0.11: 43,20 m² | 0.12: 28,80 m² | 0.10: 24,00 m²

Schematische Zuordnung, nicht maßstäblich. Verbindliche Innenmaße im Raumblatt BW-M-02.

Bilddatei: 12_Raumschema.png

18_Raumaufmass_Leistungsstaende.xlsx

1 Maße und Flächen Bachwinkel

Raumgeometrie nach 05_Aufmassraeume.pdf. Bestandsaufnahmen und Planungsmaße tragen eigene Stände.

Ralf Seeger, Stand 22.09.2026

Positionen

24

Raum	Bauteil	Merkmal	Wert	Einheit	Stand	Quelle	Bezug
0.11	Boden	Länge	9,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Lichtes Innenmaß
0.11	Boden	Breite	4,80	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Lichtes Innenmaß
0.11	Boden	Fläche	43,20	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Ohne Verschnitt
0.12	Boden	Länge	6,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Lichtes Innenmaß
0.12	Boden	Breite	4,80	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Lichtes Innenmaß
0.12	Boden	Fläche	28,80	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Ohne Verschnitt
0.10	Boden	Länge	12,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Flur ohne tiefe Nischen
0.10	Boden	Breite	2,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Lichtes Innenmaß
0.10	Boden	Fläche	24,00	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Ohne Verschnitt
0.13	Boden	Länge	4,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Teeraum, Bestandsfliesen
0.13	Boden	Breite	3,00	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Teeraum, Bestandsfliesen
0.13	Boden	Fläche	12,00	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Nicht im elastischen Belag
0.11 / 0.12	Trennwand	Freie Länge	4,80	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Ohne Öffnung
0.11 / 0.12	Trennwand	Höhe	3,10	m	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Bis tragende Decke

Raum	Bauteil	Merkmal	Wert	Einheit	Stand	Quelle	Bezug
0.11 / 0.12	Trennwand	Eine Ansichtsfläche	14,88	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Geometrische Ansicht
0.11 / 0.12	Trennwand	Beide Seiten	29,76	m²	11.09.2026	05_Aufmassraeume.pdf	Zwei Beschichtungsflächen
0.12	T12 Bestand	Freier Durchgang	0,98	m	21.09.2026	16_Tueroeffnung_T12.pdf	Türblatt etwa 90 Grad offen
0.12	T12 Bestand	Maueröffnung unten	1,01	m	21.09.2026	16_Tueroeffnung_T12.pdf	Zargenränder örtlich freigelegt
0.12	T12 Bestand	Maueröffnung oben	1,00	m	21.09.2026	16_Tueroeffnung_T12.pdf	Putzreste belassen
0.12	T12 Bestand	Mauerwerksdicke	115,00	mm	21.09.2026	16_Tueroeffnung_T12.pdf	Ohne Putz
0.13	Entnommene Fliese	Länge	197,00	mm	18.09.2026	13_Oeffnungsbericht_Boden.pdf	An Küchenzeile
0.13	Entnommene Fliese	Breite	197,00	mm	18.09.2026	13_Oeffnungsbericht_Boden.pdf	Nennformat 20 × 20 cm
0.13	Entnommene Fliese	Dicke	7,00	mm	18.09.2026	13_Oeffnungsbericht_Boden.pdf	Ungefähr
0.10	Flurdecke Planung	Abhängung	350,00	mm	11.09.2026	03_Baubeschreibung_02.docx	Unter Bestandsdecke

2 Einzelwandregister BW-26

Einzelstreckenaufteilung vom 22.09.2026 zu 14_Sockelstrecken.csv. Wandnummern gelten nur in diesem Register; Tür T12 bleibt Planungsansatz.

Ralf Seeger, Stand 22.09.2026

Positionen	Brutto m	Abzug m	Sockel m
12	77,20	10,00	66,20

Raum	Wand	Stand	Register / Beleg	Brutto m	Abzug m	Sockel m	Abzugsgrund
0.11	Längswand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	9,00	0,90	8,10	Durchgang 0,90 m
0.11	Längswand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	9,00	0,90	8,10	Durchgang 0,90 m
0.11	Stirnwand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	4,80	1,20	3,60	Fester Schranksockel
0.11	Stirnwand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	4,80	–	4,80	Durchgehender Sockel
0.12	Längswand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	6,00	1,00	5,00	T12 geplant, lichte Breite 1,00 m
0.12	Längswand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	6,00	–	5,00	Durchgehender Sockel
0.12	Stirnwand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	4,80	1,00	3,80	Bodenbündiger Einbauschränk
0.12	Stirnwand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	4,80	–	4,80	Durchgehender Sockel
0.10	Längswand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	12,00	2,00	10,00	Zwei geplante Türanschlüsse
0.10	Längswand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	12,00	1,00	11,00	Ein geplanter Türanschluss
0.10	Stirnwand 1	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	2,00	1,00	1,00	Eingangsanschluss
0.10	Stirnwand 2	22.09.2026	Einzelwandregister BW-26	2,00	1,00	1,00	Hofanschluss

3 Leistungsregister der Bearbeitungsstände

Einzelwerte je Originalfassung. BB-02 ist Nutzerstand, LV Revision 03 noch nicht versandt; Lieferauskünfte sind keine Bestellung.

Ralf Seeger, Stand 22.09.2026

Positionen

26

Datum	Fassung	Stelle	Gegenstand	Menge / Wert	Einheit	Beschreibung	Quelle
02.09.2026	BB-01	Abschnitt 1	Wanddicke	100,00	mm	Beplankung noch abzustimmen	02_Baubeschreibung_01.pdf
02.09.2026	BB-01	Abschnitt 2	Belagsfläche	96,00	m²	PVC zunächst bevorzugt	02_Baubeschreibung_01.pdf
02.09.2026	BB-01	Abschnitt 3	Tür T12	0,90	m lichte Breite	Ohne besondere Feuerwiderstandsanforderung	02_Baubeschreibung_01.pdf
14.09.2026	LV Revision 03	01.010	Baustelleneinrichtung	1,00	pauschal	Staubdichte, abschließbare Trennung	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	02.010	Metallständerwand	14,88	m²	100 mm, beidseitig einlagig	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	02.020	Spachteln	29,76	m²	Qualitätsstufe Q2	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	03.010	Bodenbelag	105,60	m²	PVC, Menge einschließlich 10 Prozent Verschnitt	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	03.020	Sockel	67,20	m	Aus Belagsmaterial, 8 cm hoch	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	04.010	Anstrich neue Wand	29,76	m²	Zweifach matt	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	04.020	Anstrich Bestandswand	141,50	m²	Reinigen und örtlich ausbessern	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	04.030	Anstrich Gruppendecken	72,00	m²	Bestehende Decken bleiben	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	05.010	Tür T12	1,00	Stück	0,90 × 2,10 m, ohne Türschließer	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	06.010	Flurdecke	24,00	m²	Zugang nach Ausbau von Leuchten	04_LV_Ausbau_03.docx
14.09.2026	LV Revision 03	07.010	Abschlussreinigung	1,00	pauschal	Eigene Arbeitsbereiche	04_LV_Ausbau_03.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 1	Wanddicke	125,00	mm	Beidseitig zweilagige Beplankung	03_Baubeschreibung_02.docx

Datum	Fassung	Stelle	Gegenstand	Menge / Wert	Einheit	Beschreibung	Quelle
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 1	Musterfeld	2,00	m²	Raum 0.11, Oberfläche Q3	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 2	Belagsfläche	96,00	m²	Linoleum, Einbaumenge ohne Verschnitt	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 2	Sockelhöhe	10,00	cm	Gesonderte Leistung	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 2	Lose Fliesen	2,00	Stück	Ersatz bei passendem Material	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 3	Tür T12	1,00	m lichte Breite	Eigenschaften nach BS-09	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 4	Revisionsöffnungen	2,00	Stück	Je 600 × 600 mm freie Öffnung	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 4	Flurdecke	24,00	m²	Abhängung 35 cm	03_Baubeschreibung_02.docx
11.09.2026	BB-02	Abschnitt 4	Gruppendecken	72,00	m²	Nur Anstrich	03_Baubeschreibung_02.docx
21.09.2026	BR-26-512	Abschnitt 1	Lieferbreite Linoleum	2,00	m	Endgültige Schnittliste fehlt	15_Lieferauskunft_Boden.docx
21.09.2026	BR-26-512	Abschnitt 2	Sockelstreifen	100,00	mm Höhe	Kein angeformtes Hohlkehlprofil	15_Lieferauskunft_Boden.docx
22.09.2026	Musterpost	Liefernachricht	Musterabschnitte	3,00	Stück	Graugrün, Schiefergrau, gedecktes Rot	17_Roemer_Musterlieferung.eml

03_Baubeschreibung_02.docx

Baubeschreibung Lernatelier Bachwinkel

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

An: Bachwinkel Lernen GmbH | Ole Reinhold

11.09.2026 | BW-26 / BB-02 / abgestimmter Nutzerstand

1 Geltungsbereich und Wandaufbau

Diese Fassung ersetzt BB-01 vom 02.09.2026 für die weitere Vorbereitung der Ausschreibung. Grundriss und Nutzungsgrenzen bleiben unverändert: Gruppenräume 0.11 und 0.12, Flur 0.10 sowie Teeraum 0.13 im Erdgeschoss Bachwinkel 22, Detmold. Die Bauherrin hat am 09.09. die Materialauswahl bestätigt. Die Vergabe ist privat; ein Auftrag an ein Ausbauunternehmen besteht noch nicht. Die Freigabe der LV-Fassung erfolgt gesondert.

Die Trennwand zwischen den Gruppenräumen erhält eine Fertigtiefe von 125 mm, mit beidseitig zweilagiger Beplankung und Mineralwolleeinlage. Die freie Wandlänge beträgt 4,80 m, die Höhe 3,10 m. In der Wand liegt keine Türöffnung. Für die Wandfläche wird nur eine Ansichtsfläche zur Mengenangabe angesetzt; beide Wandseiten gehören zur beschriebenen Leistung. Die Montage endet an der tragenden Decke und nicht an der späteren Unterdecke.

Die sichtbaren Oberflächen der neuen Wand sind für den geplanten matten Anstrich und das seitlich einfallende Licht vollflächig zu spachteln. Vereinbart ist für die Ausschreibungsbeschreibung die Qualitätsstufe Q3. Ein Musterfeld von 2 m² wird vor Ausführung der Gesamtfläche im Raum 0.11 angelegt. Das Musterfeld ersetzt nicht die Beschreibung der geschuldeten Oberfläche. Auf Bestandsputz ist nach Reinigung und örtlichen Ausbesserungen ein Anstrich vorgesehen; ein vollflächiger Neuputz ist dort nicht enthalten.

2 Bodenbeläge

In 0.11, 0.12 und 0.10 wird Linoleum in Bahnen ausgeschrieben. PVC ist nach der Nutzerbesprechung nicht mehr vorgesehen. Die geometrische Bodenfläche beträgt nach BW-M-02 insgesamt 96,00 m². Die Mengen im Leistungsverzeichnis sollen als Einbaumengen ohne Verschnittzuschlag stehen; der Verschnitt ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Die Sockel werden als gesonderte Leistung mit 10 cm Höhe beschrieben. Die Bemusterung erfolgt anhand dreier gedeckter Farbtöne; ein bestimmtes Fabrikat wurde nicht festgelegt.

Der Teeraum 0.13 gehört nicht zu diesen 96,00 m². Seine 12,00 m² Fliesen bleiben erhalten. Nur zwei lose Fliesen im Bereich der früheren Küchenzeile werden ausgetauscht, soweit gleichformatiges Material beschafft werden kann. Der Untergrund für Linoleum ist vor Einbau zu prüfen; erforderliche weitergehende Maßnahmen sind vor Ausführung mit der Planung abzustimmen.

Nora Küster | BB-02, Seite 1

3 Türen

Für Tür T12 gilt der Fachbeitrag BS-09 vom 10.09.2026. Die Tür erhält die dort projektspezifisch benannten Eigenschaften für die Abtrennung des Gruppenraums zum Flur. Die lichte Durchgangsbreite beträgt 1,00 m; das Rohbaumaß und die Bandseite ergeben sich aus Türblatt BW-T-12/02. Eine automatische Offenhaltung ist nicht vorgesehen. Der Hersteller muss die Eignung des gelieferten Gesamtsystems einschließlich Zarge und Schließmittel nachweisen. Diese Baubeschreibung trifft keine eigenständige brandschutztechnische Bemessung.

Der Flur bleibt während der Bauzeit gesperrt. Staubschutz und eine abschließbare Trennung zum weiterhin genutzten Treppenhaus sind Bestandteil des Ausbaauftrags. Schlüssel werden ausschließlich von Ole Reinhold ausgegeben. Der Bestandsausgang zum Hof wird weder versetzt noch im Querschnitt verkleinert. Sein Zustand ist vor Beginn gemeinsam zu dokumentieren.

4 Unterdecken und Wartungszugang

Im Flur 0.10 wird die Unterdecke auf 24,00 m² erneuert. Die Abhanghöhe beträgt 35 cm unter Bestandsdecke. Über der Decke liegen Absperreinrichtungen und zwei Anschlusskästen. Nach dem Fachbeitrag TW-06 vom 10.09.2026 sind zwei demontierbare Revisionsöffnungen mit freier Öffnung von jeweils 600 × 600 mm vorzusehen. Die genaue Lage wird vor Montage anhand der tatsächlich eingebauten Anlagen festgelegt. Ein bloßer Zugang durch Ausbau von Leuchten genügt für diese beiden Stellen nicht.

In den Gruppenräumen bleiben die vorhandenen Decken bestehen und werden gestrichen. Die Gesamtfläche dieser beiden Decken beträgt 72,00 m². Akustikelemente an den Wänden gehören zu einem späteren Möblierungsauftrag und sind nicht im Ausbau-LV enthalten. Die angebotene Ausführung darf deshalb keine Wandabsorber stillschweigend einpreisen.

5 Stand und Beteiligte

Die Auftraggeberin hat Material und Raumnutzung bestätigt, nicht sämtliche technischen Einzelheiten der Fachbeiträge. Brandschutzplanerin Elke Mertens prüft die Türkonfiguration; TGA-Planer Cem Arslan prüft die Zugänglichkeit oberhalb der Flurdecke. Herr Reinhold entscheidet über Farben erst nach Bemusterung. Der Ausbau soll vom 02.11. bis 27.11.2026 erfolgen. Ein Vertragstermin ist daraus noch nicht entstanden.

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante | n.kuester@raumkante.example

04_LV_Ausbau_03.docx

Leistungsverzeichnis Ausbau Bachwinkel

Ralf Seeger | Planungsbüro Raumkante

An: Interne Vergabeablage BW-26

14.09.2026 | BW-LV-AU / Revision 03 / noch nicht versandt

1 Vorbemerkungen

Die Leistungen betreffen den Innenausbau des Erdgeschosses Bachwinkel 22, Detmold. Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Mengen zu den angebotenen Einheitspreisen. Die nachstehenden Mengen dienen der Angebotskalkulation. Preise sind vom Bieter einzutragen; dieses Dokument enthält keine Planerpreise. Die Baustelle kann nach Terminabstimmung besichtigt werden. Ausbauleistungen im Obergeschoss sind nicht enthalten.

Grundlage des Mengengerüsts ist BW-A-21/02. Beim Fortschreiben der Texte wurden die Raumbezeichnungen aus BB-01 übernommen. Die Einarbeitung der am 11.09. eingegangenen Fach- und Nutzerunterlagen ist im internen Laufzettel noch nicht als abgeschlossen vermerkt. Ralf Seeger hat die Revision 03 am 14.09. um 16:30 Uhr in die Ablage gestellt.

1.1 Baustelleneinrichtung

Position 01.010 umfasst das Einrichten und Räumen der Ausbauarbeitsplätze einschließlich einer staubdichten und abschließbaren Trennung zum Treppenhaus. Vorhandene Flächen außerhalb des Arbeitsbereichs sind vor Beschädigung zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind bis zum Abschluss der stauberzeugenden Arbeiten vorzuhalten und anschließend rückstandsfrei zurückzubauen. Menge: 1 pauschal.

1.2 Metallständerwand

Position 02.010 umfasst die Trennwand zwischen 0.11 und 0.12 als nichttragende Metallständerwand mit 100 mm Fertigtiefe, beidseitig einlagiger Beplankung und Mineralwolleeinlage. Die Wand ist an angrenzende Bauteile anzuschließen und bis zur tragenden Decke zu führen. Öffnungen sind nicht vorgesehen. Menge: 14,88 m².

Position 02.020 umfasst das Verspachteln der sichtbaren Plattenflächen der Position 02.010 in Qualitätsstufe Q2 einschließlich der Befestigungspunkte. Ein vollflächiger Feinspachtelauftrag ist nicht Bestandteil dieser Position. Das anschließende Anstrichsystem ist in Position 04.010 erfasst. Menge: 29,76 m².

Position	Menge	Einheit
01.010	1	pauschal
02.010	14,88	m ²
02.020	29,76	m ²

2 Bodenarbeiten

Position 03.010 umfasst Lieferung und Verlegung eines PVC-Belags in Bahnen in den Gruppenräumen 0.11 und 0.12 sowie im Flur 0.10. Der Belag wird vollflächig verklebt; Fugen sind entsprechend dem gewählten System zu schließen. Der Farbton wird aus der Standardkollektion des angebotenen Herstellers gewählt. Die Position umfasst einen Verschnittansatz von 10 Prozent in der ausgeschriebenen Menge. Menge: 105,60 m².

Position 03.020 umfasst Sockelstreifen aus dem Material der Position 03.010, 8 cm hoch, einschließlich Innen- und Außenecken. Abgerechnet wird die ausgeführte Länge. Öffnungen werden abgezogen. Menge: 67,20 m. Die Erneuerung der Fliesen in Raum 0.13 ist nicht enthalten. Zum Austausch einzelner loser Fliesen ist in dieser Revision keine Position angelegt.

3 Malerarbeiten

Position 04.010 umfasst den zweifachen matten Anstrich der neuen Wandflächen mit einer für den Untergrund geeigneten Beschichtung. Kleinere Schleifarbeiten an den verspachtelten Fugen und die erforderliche Grundierung sind eingeschlossen. Die Beschichtung ist gleichmäßig ohne erkennbare Ansätze auszuführen. Menge: 29,76 m². Eine besondere Musterfläche ist in dieser Position nicht genannt.

Position 04.020 umfasst Reinigen, örtliches Ausbessern und zweimaliges Streichen der Bestandswandflächen. Die Mengenzusammenstellung führt hierfür 141,50 m². Das Entfernen größerer loser Putzbereiche wird vor Ausführung mit der Bauleitung abgestimmt und ist nicht Bestandteil dieser Position. Position 04.030 umfasst den Anstrich der bestehenden Decken in 0.11 und 0.12 mit insgesamt 72,00 m².

Ralf Seeger | Mengenstand aus BW-M-01; Übernahme in Revision 03 am 14.09.2026

4 Türen und Unterdecken

Position 05.010 umfasst Tür T12 als glattes Holztürelement ohne besondere Feuerwiderstands- oder Rauchschutzanforderung. Die lichte Durchgangsbreite beträgt 0,90 m, die Höhe 2,10 m. Beschläge, Zarge, Drückergarnitur und Montage sind enthalten. Ein Türschließer ist nicht vorgesehen. Die Oberfläche wird werkseitig weiß beschichtet. Menge: 1 Stück. Die endgültige Bandseite wird vor Bestellung aus dem Ausführungsplan übernommen.

Position 06.010 umfasst die abgehängte geschlossene Gipsplattendecke im Flur 0.10, Abhängung 35 cm unter Bestandsdecke, einschließlich Unterkonstruktion, Randanschlüssen und Verspachtelung. Menge: 24,00 m². Öffnungen für die in der Elektroplanung benannten Leuchten sind einzuschneiden; gesonderte Revisionsklappen sind nicht vorgesehen. Bei Bedarf erfolgt der Zugang oberhalb der Decke nach Ausbau der Leuchten.

5 Abschlussarbeiten und Abgrenzung

Position 07.010 umfasst die Reinigung der eigenen Arbeitsbereiche und das Entfernen der von den Ausbauarbeiten verursachten Verschmutzungen an angrenzenden geschützten Flächen. Der vorhandene Hofausgang bleibt erhalten und ist bei Transporten zu schützen. Menge: 1 pauschal. Die laufende Gebäudereinigung und das Reinigen der unberührten Räume im Obergeschoss gehören nicht zum Leistungsumfang.

Lose Möblierung, Wandabsorber und die Teeküchenmöbel werden durch die Auftraggeberin gesondert beschafft. Elektroanschlüsse und Trinkwasserleitungen werden nicht mit diesem LV vergeben. Der Ausbauunternehmer muss den Zugang zu den betroffenen Anschlussstellen mit der Bauleitung koordinieren. Die Montageplanung für Revisionsstellen ist vor Schließen der Decke vorzulegen, soweit solche Stellen mit den Fachplanern vereinbart werden.

Zusammengestellt von Ralf Seeger. Revision 03 umfasst drei Seiten. Angebotsversand und technische Freigabe sind im Verteiler noch nicht bestätigt.

07_TGA_Revisionsstellen.docx

Wartungszugang oberhalb der Flurdecke

Cem Arslan | TGA Büro Leitwerk

An: Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

10.09.2026, 15:30 Uhr | TW-06 / BW-26

1 Einbauten im Flur

Sehr geehrte Frau Küster, oberhalb der Flurdecke 0.10 liegen zwei Absperreinrichtungen der Heizungsleitungen und zwei Anschlusskästen. Die Absperreinrichtungen befinden sich im westlichen Drittel, die Kästen am Übergang zu Raum 0.12. Die Angaben beruhen auf unserer Öffnung vom 08.09.2026. Ein durchgehender Zugang vom Nachbarraum ist wegen der vorhandenen Unterzüge nicht möglich. Die Konstruktion der neuen Decke muss den späteren Wartungszugang berücksichtigen.

Wir benötigen zwei demontierbare Revisionsöffnungen mit freiem Durchgang von jeweils 600×600 mm. Die Angabe meint das freie Öffnungsmaß, nicht das Außenmaß des Klappenrahmens. Die Öffnungen dürfen durch die Unterkonstruktion oder hinter der Klappe liegende Leitungen nicht wieder verengt werden. Die Lage ist vor Montage vor Ort zu markieren. Eine Verschiebung um wenige Zentimeter kann nötig sein; eine Verringerung des freien Maßes ist damit nicht freigegeben.

2 Abgrenzung zur Elektroplanung

Die vorgesehenen Einbauleuchten haben wesentlich kleinere Ausschnitte. Über diese Ausschnitte sind die Absperreinrichtungen nicht sicher zu bedienen. Der Zugang darf deshalb nicht allein vom Ausbau einer Leuchte abhängig gemacht werden. Die zwei Revisionsöffnungen sind im Ausbau-LV eigenständig zu erfassen oder vollständig in einer klar bezeichneten Deckenposition zu beschreiben. Die Elektroplanung enthält dafür keine Lieferung.

Die Revision TW-05 vom 03.09. ging noch von zugänglichen Bestandsdeckenfeldern aus. Nach der Entscheidung für eine geschlossene Gipsplattendecke ist diese Annahme entfallen. Die Leitungsführung selbst wird dadurch nicht verändert. Der Vorschlag betrifft die Wartbarkeit; technische Anforderungen an ein gegebenenfalls klassifiziertes Deckensystem sind mit der zuständigen Fachplanung abzugleichen.

3 Termin

Vor dem Schließen der Decke möchte ich die erreichbaren Bauteile mit dem Trockenbauer ansehen. Für die Planfreigabe benötige ich einen Deckenspiegel mit den beiden Öffnungen und den Leuchten. Einen solchen Plan habe ich bislang nicht erhalten. Bitte rechnen Sie die Öffnungen nicht als zusätzliche neue Boden- oder Deckenfläche; die $24,00 \text{ m}^2$ Flurgrundfläche ändern sich durch sie nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Cem Arslan | c.arslan@leitwerk.example

08_Nutzerbesprechung.docx

Materialbesprechung vom 9 September

Ole Reinhold | Bachwinkel Lernen GmbH

An: Nora Küster und Ralf Seeger | Planungsbüro Raumkante

09.09.2026, 17:10 Uhr | BW-26 / NB-04

1 Teilnehmer und Raumprogramm

Die Besprechung fand von 15:00 bis 16:20 Uhr im Büro der Bachwinkel Lernen GmbH statt. Teilgenommen haben Ole Reinhold, Nora Küster und Ralf Seeger. Die zwölf Arbeitsplätze in 0.11 und acht Plätze in 0.12 bleiben unverändert. Das Lager im Obergeschoss ist nicht Bestandteil des Umbaufauftrags. Herr Reinhold bestätigt, dass im Teeraum keine Kochgeräte mit eigener Abluft geplant sind.

2 Materialentscheidungen

Nach Ansicht der drei vorgelegten Belagsmuster entscheidet sich Herr Reinhold für Linoleum in Bahnen in den beiden Gruppenräumen und im Flur. Die Entscheidung ersetzt den bisherigen Kostenansatz PVC. Ein bestimmtes Fabrikat wird nicht vorgeschrieben. Der Sockel soll 10 cm hoch sein, weil die Reinigung mit größeren Geräten erfolgen soll. Der genaue Farbton wird nach den Angeboten anhand der verfügbaren Kollektion gewählt. Die Planung darf hierfür drei Farbtöne vorschlagen.

Die neue Wand zwischen den Gruppenräumen soll wegen der mitgebrachten Fachplanung mit 125 mm Fertigtiefe und beidseitig zweilagiger Beplankung weiterbearbeitet werden. Für die sichtbare Oberfläche wird Q3 vorgesehen. Herr Seeger weist darauf hin, dass im LV-Arbeitsstand noch die frühere Wandbeschreibung steht. Frau Küster nimmt die Änderungen in BB-02 auf. Der heutige Vermerk enthält keine Freigabe des Leistungsverzeichnisses.

3 Erhalt und Bemusterung

Die Fliesen im Teeraum bleiben erhalten. Zwei lose Fliesen unmittelbar vor der alten Küchenzeile sollen nach Möglichkeit ersetzt werden. Wenn kein passendes Format zu beschaffen ist, entscheidet Herr Reinhold nach Vorlage einer Alternative; ein vollständiger neuer Fliesenboden wird heute nicht bestellt. Die bestehenden Gruppendecken werden nur gestrichen. Die Wandabsorber werden später zusammen mit den Möbeln beschafft.

Für den Anstrich der neuen Wand vereinbaren die Teilnehmer ein Musterfeld von 2 m² in Raum 0.11. Dabei sollen Farbe und sichtbare Oberflächenwirkung unter dem tatsächlichen Licht beurteilt werden. Der Mustertermin wird mit der ausführenden Firma festgelegt. Die technischen Anforderungen bleiben in der Beschreibung zu benennen; der Vermerk ersetzt diese nicht.

Ole Reinhold | Bestätigt per E-Mail am 09.09.2026 um 17:10 Uhr

15_Lieferauskunft_Boden.docx

Lieferauskunft zu Linoleum und Sockeln

Maja Römer | Belaghandel Bahnenraum GmbH

An: Ralf Seeger | Planungsbüro Raumkante

21.09.2026, 11:10 Uhr | BR-26-512 / unverbindliche Auskunft

1 Angefragte Ausführung

Sehr geehrter Herr Seeger, Sie haben uns am Freitag nach Material für 96,00 m² Einbaufläche in drei Räumen gefragt. Für die von Ihnen benannte Linoleumausführung führen wir Rollenware mit 2,00 m Breite. Die Menge des zu bestellenden Materials ergibt sich erst aus der Bahnaufteilung und den nutzbaren Abschnittslängen. Die Einbaufläche ist daher nicht ohne Weiteres die Liefermenge. Ihre Zahl 105,60 m² habe ich als früheren pauschalen Verschnittansatz verstanden, nicht als von uns berechneten Materialbedarf.

Für drei derzeit verfügbare gedeckte Farbtöne können wir Musterabschnitte bereitstellen. Beim graugrünen Ton stammen die momentan lagernden Abschnitte aus zwei Fertigungslosen. Eine zusammenhängende Lieferung aus nur einem Los wäre nach heutiger Auskunft frühestens in der Kalenderwoche 43 verfügbar. Ein bestimmtes Los haben wir für Bachwinkel noch nicht reserviert. Die Räume mit gleichem Belag müssen nicht zwangsläufig aus unterschiedlich gefärbten Losen beliefert werden; dafür brauchen wir die endgültige Auswahl und Schnittliste.

2 Sockel

Sockelstreifen aus derselben Rollenware können mit 100 mm Höhe geschnitten werden. Eine werkseitig angeformte Hohlkehle ist damit noch nicht geliefert. Für diese Variante wären ein anderes Detail und zusätzliche Formteile erforderlich. In Ihrer Anfrage vom 18.09. stand nur „Sockel aus demselben Material“. Ich habe deshalb weder Hohlkehlprofile noch vorgefertigte Außenwinkel in eine Mengenannahme aufgenommen. Ein örtlich aus Streifen hergestellter Sockel hat einen anderen Lieferumfang als ein fertiges Formteil.

Die im Gespräch genannten 67,20 m sind die abgeleitete Einbaulänge. Für Bestellung und Zuschnitt müssen die Einzelstrecken betrachtet werden. Wir verkaufen die Streifen nicht automatisch als genau 67,20 m ohne Schnittverluste. Eine Vermischung von Materialbestellung und späterem Aufmaß würde Ihnen zwei unterschiedliche Mengen liefern.

3 Fliesen und Verfügbarkeit

Die von Herrn Heuer gemessene Bestandsfliese mit 197 × 197 mm und ungefähr 7 mm Dicke können wir aus unserem aktuellen Lager nicht seriengleich zuordnen. Zwei optisch ähnliche Muster in anderen Dicken wären verfügbar. Sie sind keine bestätigten Ersatzstücke. Es liegt weder eine Materialbestellung noch ein Angebotspreis für den gesamten Ausbau vor. Diese Auskunft ersetzt keine Entscheidung des Nutzers über Farbe oder sichtbare Abweichungen.

Mit freundlichen Grüßen

Maja Römer | m.roemer@bahnenraum.example

02_Baubeschreibung_01.pdf

Baubeschreibung Lernatelier Bachwinkel

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

An: Bachwinkel Lernen GmbH | Ole Reinhold

02.09.2026 | BW-26 / BB-01 / Fassung zur Nutzerbesprechung

1 Gebäude und Nutzung

Das Erdgeschoss des Hauses Bachwinkel 22 in 32756 Detmold wird zu einem Lernatelier mit zwei Gruppenräumen umgebaut. Auftraggeberin ist die Bachwinkel Lernen GmbH. Raum 0.11 erhält zwölf Arbeitsplätze, Raum 0.12 acht Plätze. Der dazwischenliegende Flur 0.10 verbindet Eingang und Hofausgang. Der Teerraum 0.13 dient ausschließlich der Zubereitung von Getränken; eine Kochküche ist nicht vorgesehen. Das Obergeschoss bleibt unberührt.

Diese Fassung beschreibt den Besprechungsstand vom 01.09.2026. Die Ausbaumaße richten sich nach Plan BW-A-21/02. Die Trennwand zwischen den Gruppenräumen wird als Metallständerwand ausgeführt. Für die Kalkulation ist eine Fertigtiefe von 100 mm angesetzt. Die Art und Stärke der Beplankung wird mit der Fachplanung noch abgestimmt. Die zum Flur gerichteten Oberflächen werden vollflächig gestrichen. Am Bestandsmauerwerk bleiben die vorhandenen Putzflächen erhalten, soweit sie tragfähig sind.

2 Oberflächen

In den Gruppenräumen und im Flur ist ein elastischer Belag vorgesehen. Der Auftraggeber bevorzugt zunächst PVC in Bahnen. Die endgültige Materialentscheidung soll am 09.09. getroffen werden. Für die Kostenschätzung werden 96 m² Belagsfläche verwendet. Sockel sollen aus demselben Material hochgezogen werden. Im Teerraum bleiben die vorhandenen Bodenfliesen bestehen, sofern die Prüfung nach Demontage der Küchenzeile keine losen Fliesen ergibt.

An der neuen Trennwand sollen die Stoßstellen der Platten verspachtelt werden. Die Oberflächenqualität ist mit dem späteren Anstrich abzustimmen. In Raum 0.11 wird das Licht überwiegend entlang der Wand geführt. Das Lichtkonzept liegt noch nicht vor. Ein Musterfeld soll vor dem vollflächigen Anstrich von Frau Küster und Herrn Reinhold angesehen werden.

3 Türen und Decken

Tür T12 zwischen Flur und Gruppenraum 0.12 wird erneuert. Für den vorläufigen Kostenansatz wird eine Tür ohne besondere Feuerwiderstandsanforderung mit einer lichten Durchgangsbreite von 0,90 m angesetzt. Die Tür zum Hof bleibt bestehen. Ob T12 besondere Eigenschaften benötigt, ist im Brandschutzbeitrag zu klären. Die Unterdecke im Flur wird auf einer Fläche von 24 m² erneuert. Revisionsöffnungen sind in dieser frühen Fassung noch nicht gezählt.

Nora Küster | Versandstand vom 02.09.2026. Diese Fassung ist nicht als Ausführungsfreigabe bezeichnet.

05_Aufmassraeume.pdf

Raummaße Erdgeschoss Bachwinkel

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

An: Ralf Seeger | Ausschreibung

11.09.2026, 09:15 Uhr | BW-M-02 / zu BW-A-21/02

1 Flächen und Abzüge

Die Maße wurden am 08.09. von Nora Küster und Ole Reinhold im geräumten Erdgeschoss aufgenommen. Es handelt sich um lichte Innenmaße. Der Flur ist rechteckig; Nischen über 10 cm Tiefe gibt es in den erfassten Räumen nicht. Bodenflächen werden ohne Verschnitt angegeben. Die Summe der Räume mit neuem elastischem Belag beträgt 96,00 m². Der 12,00 m² große Teeraum bleibt davon getrennt.

Raum	Länge × Breite	Bodenfläche
0.11 Gruppenraum	9,00 × 4,80 m	43,20 m ²
0.12 Gruppenraum	6,00 × 4,80 m	28,80 m ²
0.10 Flur	12,00 × 2,00 m	24,00 m ²
0.13 Teeraum	4,00 × 3,00 m	12,00 m ²

2 Wand und Sockel

Die neue Trennwand ist 4,80 m lang und 3,10 m hoch. Daraus ergeben sich 14,88 m² für eine Wandansicht und 29,76 m² für beide zu beschichtenden Seiten. Die Wand enthält keine Öffnung. Diese geometrischen Werte entscheiden nicht über Wanddicke oder Beplankung.

Der Umfang der drei Belagsräume beträgt zusammen 77,20 m. Öffnungen und nicht zu belegende feste Anschlussbereiche ergeben zusammen 10,00 m Abzug. Für den Sockel verbleiben deshalb 67,20 m. Die Höhe ist eine Material- und Leistungsfestlegung, keine Größe aus diesem Aufmaß. Das Raumblatt BW-M-01 vom 02.09. führte bereits dieselben Innenmaße, enthielt aber in seiner Übertragungszeile 105,60 m² einschließlich zehn Prozent Verschnitt.

3 Sichtbare Grenzen

Die Raumhöhe wurde an drei zugänglichen Punkten geprüft. Unter abgehängten Teilen im Flur wurde die Bestandsdecke nicht geöffnet. Aus der Skizze BW-A-21/02 dürfen keine exakten Lagen verdeckter Leitungen abgenommen werden. Revisionsstellen werden vor Montage mit der Fachplanung örtlich festgelegt.

Nora Küster | geprüft gegen die örtlichen Maßnotizen am 11.09.2026

06_Fachbeitrag_Brandschutz.pdf

Tür T12 im Lernatelier

Elke Mertens | Ingenieurbüro Brandlinie

An: Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

10.09.2026 | BS-09 / BW-26 / Türabstimmung

1 Gegenstand der Abstimmung

Sehr geehrte Frau Küster, für die Trennung des Gruppenraums 0.12 vom Flur 0.10 haben wir die Türkonfiguration im Projekt Bachwinkel heute mit Herrn Reinhold besprochen. Die folgende Festlegung bezieht sich ausschließlich auf Tür T12 in der vorliegenden Umbauplanung. Sie ist keine allgemeine Aussage über Türen in Lernräumen. Die Bestandswand neben der Öffnung bleibt in unserer weiteren Detailprüfung zu berücksichtigen.

2 Vorgabe für die weitere Planung

Für die Ausschreibung ist T12 als feuerhemmendes, rauchdichtes und selbstschließendes Element einschließlich abgestimmter Zarge und Schließmittel zu beschreiben. Die lichte Durchgangsbreite soll nach der Nutzerabstimmung 1,00 m betragen. Eine bloße Türblattbezeichnung reicht für die Bestellung nicht aus; das angebotene System und seine Eignung für die vorhandene Einbausituation sind vor Bestellung zu prüfen. Die konkrete Nachweisführung und Einbaudetails müssen wir anhand des ausgewählten Systems freigeben.

Im vorläufigen Kostenblatt wurde noch ein Element ohne besondere Anforderungen und mit 0,90 m Breite geführt. Dieser Ansatz entspricht nicht dem heutigen Fachbeitrag. Ich habe keine automatische Offenhaltung vorgesehen. Der Nutzer wünscht eine im Alltag leicht zu bedienende Tür; die hierfür geeigneten Beschläge stimmen wir anhand des angebotenen Systems ab. Ein dauerhaftes Offenstellen durch einen Keil ist keine von uns geplante Betriebsweise.

3 Weitere Bearbeitung

Bitte legen Sie mir vor dem Versand das Türblatt und den zugehörigen LV-Text gemeinsam vor. Ich muss dann insbesondere Einbauwand, Anschlüsse und die Zusammenstellung des Systems nachvollziehen können. Der beigelegte Plan BW-A-21/02 zeigt die Lage, ersetzt aber keinen Systemnachweis. Die Abmessung der Rohbauöffnung ist noch anhand des gewählten Elements festzulegen.

Diese Nachricht erweitert nicht den Auftrag auf das Obergeschoss. Für andere Bestandstüren enthält sie keine Aussage. Die in BB-01 angekündigte spätere Abstimmung ist mit diesem Fachbeitrag für T12 konkretisiert; die weitere technische Prüfung bleibt erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Mertens | e.mertens@brandlinie.example

13_Oeffnungsbericht_Boden.pdf

Örtliche Öffnung des Bodenaufbaus

Joris Heuer | Bodenwerk Heuer GmbH

An: Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

18.09.2026, 16:40 Uhr | BH-2619 / Aufnahme Bachwinkel

1 Anlass und Zugang

Ich habe heute von 14:35 bis 15:50 Uhr mit Nora Küster und Ole Reinhold drei kleine Öffnungen im vorhandenen Bodenbelag angesehen. Herr Reinhold hatte die Öffnungen vorher gestattet. Untersucht wurden eine Stelle an der Außenwand von 0.11, eine Stelle neben der Zugangstür von 0.12 und eine Stelle am Flurende vor 0.13. Wir haben keine zusammenhängende Raumfläche abgeräumt. Das Gebäude wurde währenddessen nicht als Lernatelier genutzt.

In 0.11 ließ sich eine ungefähr 20×20 cm große Belagfläche abheben. Unter dem oberen Belag blieb eine dunkle Klebstoffschicht auf einer harten Spachtellage zurück. Mit dem Handspachtel ließ sich die Spachtellage am Rand örtlich ablösen. Wir haben die Schichten weder analysiert noch die gesamte Haftung gemessen. Der Farbe nach kann ich keinen bestimmten Klebstoff oder Inhaltsstoff benennen. Schleifarbeiten fanden nicht statt.

2 Weitere Stellen

In 0.12 war unter dem vorhandenen Belag eine glatte, helle Spachtelschicht zu sehen. Sie blieb bei unserer kleinen Öffnung fest. Im Flur stießen wir am Rand der Öffnung auf einen Riss, dessen Fortsetzung unter dem übrigen Belag nicht sichtbar war. Die Stelle liegt etwa 1,10 m vor der Tür zum Teeraum. Die Abdeckung wurde anschließend wieder geschlossen und mit Klebeband gegen Hochstehen gesichert. Eine neue Bodenfläche wurde nicht hergestellt.

Die beiden bereits bekannten losen Fliesen in 0.13 liegen unmittelbar vor der ehemaligen Küchenzeile. An einer herausgenommenen Fliese maß ich 197×197 mm bei etwa 7 mm Dicke; das Verlegefeld ist auf ein Nennformat von 20×20 cm angelegt. Eine seriengleiche Ersatzfliese konnte Herr Reinhold nicht vorlegen. Eine noch vorhandene Reservefliese aus dem Keller ist sichtbar heller und rund 1 mm dicker. Sie wurde nicht eingebaut.

3 Festgehaltener Umfang

Die Öffnungen belegen nur den Zustand an den genannten Punkten. Ich habe weder Restfeuchte noch Ebenheit oder eine mögliche Schadstoffbelastung bestimmt. Mein heutiger Einsatz ist keine Kalkulation der vollständigen Untergrundvorbereitung für $96,00 \text{ m}^2$. Frau Küster nahm die abgehobenen Stücke in beschrifteten Beuteln mit. Für eine Entscheidung über einen flächigen Abtrag fehlen uns weitere Erkenntnisse; vor Ort wurde kein Schleif- oder Abbruchauftrag erteilt.

Joris Heuer | j.heuer@bodenwerk-heuer.example

16_Tueroeffnung_T12.pdf

Aufnahme der vorhandenen Türöffnung T12

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

An: Elke Mertens | Ingenieurbüro Brandlinie

21.09.2026, 15:45 Uhr | BW-T-A1 / örtliche Aufnahme

1 Bestand am 21 September

Ole Reinhold und ich haben heute um 14:10 Uhr die Türöffnung vom Flur 0.10 zu Raum 0.12 angesehen. Die alte Zarge war noch eingebaut. Ihre Abdeckungen wurden an zwei kurzen Stellen gelöst und wieder befestigt. Die freie Breite wurde bei ungefähr rechtwinklig geöffnetem Türblatt zwischen dessen vorspringender Kante und der gegenüberliegenden Zarge aufgenommen. Gemessen wurde der Bestand, nicht eine bestellte neue Türkonstruktion.

Messstelle	Ablesung	Grenze der Aufnahme
Freier Durchgang im Bestand	0,89 m	bei etwa 90° geöffnetem Blatt
Sichtbares Mauerwerk unten	1,01 m	nur örtlich freigelegte Zargenränder
Sichtbares Mauerwerk oben	1,00 m	Putzreste im Anschluss belassen
Wanddicke neben Zarge	115 mm	ohne die beidseitigen Putzschichten

2 Anschlüsse

Die Bestandswand neben T12 ist Mauerwerk und nicht die neue 125-mm-Trennwand zwischen den Gruppenräumen. Beide Bauteile dürfen in der weiteren Planung nicht verwechselt werden. Links neben der Zarge verläuft ein alter Kabelkanal bis zur Decke. Ob Leitungen im verdeckten Anschlussbereich liegen, wurde nicht geöffnet. Über der Öffnung ist ein Sturz sichtbar; seine Bewehrung und Auflager wurden heute nicht untersucht.

3 Unterlagenstand

Die in BB-02 genannte lichte Breite von 1,00 m bezeichnet die geplante neue Tür, nicht das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme. Ein abschließend bemaßtes Türblatt BW-T-12/02 liegt weiterhin nicht in unserer gemeinsamen Ablage. Ich habe aus den örtlichen Ablesungen kein erforderliches Rohbaumaß für ein noch nicht ausgewähltes Türsystem festgelegt. Auch eine Verbreiterung der Öffnung wurde heute nicht ausgeführt oder beauftragt.

Herr Reinhold hatte den Türdurchgang bisher als „ungefähr einen Meter“ bezeichnet. Er war bei der Messung anwesend und bestätigte, dass diese ältere Angabe keine lichte Durchgangsmessung war. Die Tür schlug in Raum 0.12 auf. Beschlag und Blatt blieben nach unserem Termin unverändert in Betrieb.

Nora Küster | n.kuester@raumkante.example
