

10_Portalquittung.txt

Projektpost Bauverfahren Celle

Transaktion CE-20260902-091842

Empfänger: Bauaufsicht Celle

Absender: Rieke Cordes, Cordes Bauatelier

Bauherrschaft: Stadt Celle, Gebäudebetrieb Uhlenried

Zeitpunkt: 02.09.2026 09:18:42 +02:00

Vorgang: Antrag übermittelt

Dateisatz

1 Antrag_CE-WU26.pdf, 184 kB

2 G-01_B_Lageplan.pdf, 612 kB

3 G-02_B_Bauzeichnung.pdf, 940 kB

4 BB-01_Baubeschreibung.pdf, 221 kB

5 FL-01_Flaechen.pdf, 97 kB

6 BS-01_Kammann.pdf, 176 kB

7 TW-01_Hohenfeld.pdf, 164 kB

Technische Übertragung abgeschlossen. Die fachliche und rechtliche Prüfung steht aus.

Empfangsreferenz: CE-BA-2026-184

Automatisch erzeugter Eingangsbeleg. Keine Unterschrift.

12_Vermessung.eml

Von	"Peer Hohenfeld", Vermessung <p.hohenfeld@vermessung-hohenfeld.example>
An	"Rieke Cordes", Architektin <r.cordes@cordes-bauatelier.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	CE-WU26 Nordgrenze und Bezugspunkte G-01/B

Sehr geehrte Frau Cordes,

anbei die Erläuterung zu unserem bereits übergebenen Lagebezug V-26-118. Die nördliche Grenze liegt im Projektkoordinatensystem bei $y = 48,00$ m. Die in G-01/B dargestellte Nordkante der Halle liegt bei $y = 45,30$ m. Daraus ergibt sich senkrecht zur Grenze ein Abstand von $2,70$ m. Die Grenzpunkte wurden am 17.08.2026 aufgenommen; eine Verschiebung der Grenze ist nicht Gegenstand unserer Unterlage.

Die Grundstücksecken liegen bei $(0,00/0,00)$, $(60,00/0,00)$, $(60,00/48,00)$ und $(0,00/48,00)$. Die Fläche beträgt $2.880,00$ m². Die Geländepunkte Nordwest $41,96$ m und Nordost $42,02$ m beziehen sich auf dasselbe Projekthöhensystem wie der Hallenfertigfußboden $42,10$ m. Die alte Skizze mit $3,00$ m war keine Vermessungszeichnung.

Eine Verschiebung der Nordwand auf $y = 45,00$ m würde den geometrischen Abstand auf $3,00$ m vergrößern. Ob dies die bauordnungsrechtlich erforderliche Tiefe erfüllt, haben wir nicht geprüft. Bitte verwenden Sie unsere Maße nicht als rechtliche Abstandsbescheinigung. Die Südwandlage $y = 30,30$ m bliebe bei der von Ihnen diskutierten Verkürzung unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

Peer Hohenfeld, Vermessung

Vermessungsbüro Hohenfeld

Am Kieselgarten 3 · 29223 Celle

p.hohenfeld@vermessung-hohenfeld.example

Anlagen: keine

13_Nachbarantwort.eml

Von	"Saskia Lüders", Geschäftsführerin <s.lueders@lueders-garten.example>
An	"Fiona Seidel", Projektleitung <f.seidel@werkhof-uhlenried.example>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	CE-WU26 Werkhof Nordwand und Lieferzufahrt

Sehr geehrte Frau Seidel,

wir haben Ihre Skizze vom 11.09.2026 mit der 24 m langen Nordwand gesehen. Gegen den Werkhofbetrieb tagsüber haben wir grundsätzlich nichts einzuwenden. Wichtig ist uns, dass Regenwasser auf Ihrem Grundstück bleibt und unsere Lieferzufahrt nicht als Rangierfläche verwendet wird. Die in der Besprechung gezeigte Wand hatte keine Öffnungen.

Die Aussage unseres Lagerleiters, der Bau sei für uns in Ordnung, bezog sich auf die Nutzung und nicht auf eine bestimmte Unterschreitung eines Grenzabstands. Wir möchten vor einer förmlichen Erklärung den endgültigen Lageplan und die Wandansicht erhalten. Eine Eintragung im Baulastenverzeichnis oder eine Übernahme von Abstandsflächen haben wir nicht zugesagt.

Bitte richten Sie weitere Unterlagen an mich. Das Grundstück wird von unserer Gesellschaft gehalten; unser Pächter im hinteren Hofteil ist nicht befugt, für uns Grundstückserklärungen abzugeben. Für ein Gespräch stehen wir am 28.09.2026 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Saskia Lüders, Geschäftsführerin
Lüders Gartenbedarf GmbH
Uhlenrieder Weg 28 · 29225 Celle
s.lueders@lueders-garten.example
Anlagen: keine

15_Entwaesserung.eml

Von	"Ole Beeken", Entwässerungsplanung <planung@beeken-wasser.example>
An	"Rieke Cordes", Architektin <r.cordes@cordes-bauatelier.example>
Datum	Mon, 21 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	CE-WU26 Rückhaltung bei verkürzter Halle

Sehr geehrte Frau Cordes,

unser Entwässerungsansatz EW-02 vom 19.08.2026 enthält 456,00 m² Dachfläche aus Halle und Sozialtrakt sowie 864,00 m² befestigte Hofffläche. Die acht Pkw-Stellplätze mit zusammen 100,00 m² sind in den 864,00 m² nicht enthalten. Die Fahrradfläche von 18,00 m² ist unbefestigt mit wasserdurchlässigem Belag angesetzt und nicht in der angeschlossenen Fläche enthalten.

Bei einer Hallentiefe von 14,70 m reduziert sich die Hallendachfläche um 7,20 m². Die angeschlossene Dachfläche wäre dann 448,80 m². Der Rückhalteraum wird dadurch nicht automatisch um denselben Prozentsatz kleiner; Zuflussansatz, Drosselung und Regenereignis sind gemeinsam neu zu rechnen. Eine neue Berechnung liegt noch nicht vor.

Die Nordrinne kann nach Süden versetzt werden, sofern die konstruktive Dachausbildung dies zulässt. Wir benötigen dafür den ausgewählten Schnitt und den abgestimmten Dachplan. Eine Ableitung über das Grundstück Lüders ist in keiner Variante vorgesehen. Bitte kennzeichnen Sie im Lageplan Hof, Stellplätze und Fahrradfläche getrennt.

Mit freundlichen Grüßen
Ole Beeken, Entwässerungsplanung
Ingenieurbüro Beeken
Am Südanger 7 · 29227 Celle
planung@beeken-wasser.example
Anlagen: keine

16_Bauherrenstand.eml

Von	"Fiona Seidel", Projektleitung <f.seidel@werkhof-uhlenried.example>
An	"Rieke Cordes", Architektin <r.cordes@cordes-bauatelier.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 14:25:00 +0200
Betreff	CE-WU26 Entscheidung zur Nordwand noch offen

Sehr geehrte Frau Cordes,

die Variante mit 14,70 m Hallentiefe ist nach Rücksprache mit dem Werkhofleiter betrieblich nutzbar. Wir haben sie aber noch nicht für die Einreichung ausgewählt. Die Variantenentscheidung soll am 25.09.2026 zwischen mir und der Betriebsleitung fallen. Bitte halten Sie bis dahin die bisherige Fassung und die verkürzte Variante getrennt.

Der Kämmerer fragt, ob das Verfahren wegen der kommunalen Bauherrschaft als behördliche Zustimmung laufen könne. Eine schriftliche Auskunft dazu liegt uns nicht vor. Die vorhandene Portalquittung wurde intern bereits als Zustimmung bezeichnet; ich habe diese Formulierung nicht bestätigt.

Die Nachreichungsfrist 30.09.2026 ist bekannt. Eine Verlängerung haben wir bislang weder beantragt noch erhalten. Ein Abweichungsantrag ist weiterhin nicht freigegeben. Für den heutigen Stand bitte keine Erklärung an den Nachbarn und keine neue Portalübermittlung veranlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Fiona Seidel, Projektleitung

Stadt Celle · Gebäudebetrieb Uhlenried

Uhlenrieder Weg 26 · 29225 Celle

f.seidel@werkhof-uhlenried.example

Anlagen: keine


17_Planindex.csv

Projekt	Plan	Revision	Datum	Inhalt	Verwendung	Versand	Verfasser
CE-WU26	G-01	A	2026-05-20	Entwurf Lage 3,00 m Annahme	Entwurf bestätigt	2026-05-26 Bauherr	Rieke Cordes
CE-WU26	G-02	A	2026-05-20	Entwurf Halle 24 x 15 m	Entwurf bestätigt	2026-05-26 Fachplaner	Rieke Cordes
CE-WU26	G-01	B	2026-08-27	Vermessene Lage Nord 2,70 m	eingereicht	2026-09-02 Portal	Rieke Cordes
CE-WU26	G-02	B	2026-08-27	Schnitt mit Geländehöhen	eingereicht	2026-09-02 Portal	Rieke Cordes
CE-WU26	G-03	0	2026-09-18	Nordwand 0,30 m eingerückt	zur Entscheidung	2026-09-18 Bauherr	Rieke Cordes
CE-WU26	BS-01	0	2026-08-25	Brandschutz auf G-02/A	Fachbeitrag	2026-09-02 Portal	Nele Kammann
CE-WU26	EW-02	0	2026-08-19	Dach 456 m², Hof 864 m²	Fachplanung	2026-08-20 Objektplanung	Ole Beeken

14_Nordvariante_G03.png

Werkhof Uhlenried · Nordvariante G-03 · 18.09.2026

CE-WU26 · Cordes Bauatelier · zur Entscheidung · keine Einreichung

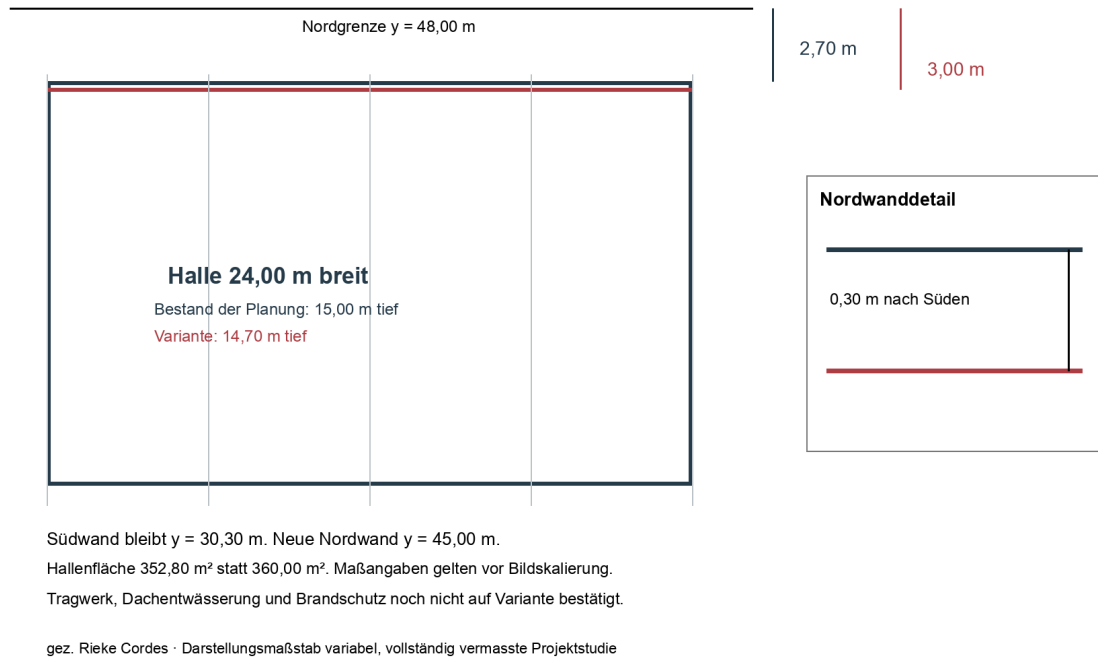

Bilddatei: 14_Nordvariante_G03.png

06_Flaechen.xlsx

Werkhof Uhlenried Flächen

FL-01 · Rieke Cordes · 27.08.2026 / Variante ergänzt 18.09.2026

Bauteil / Fläche	Anzahl	Länge m	Breite m	Fläche m²	Plan- und Quellenbezug
Halle beantragt	1,00	24,00	15,00	360,00	G-02/B Außenkontur
Sozialtrakt	1,00	12,00	8,00	96,00	G-02/B Außenkontur
Hof und Zufahrt	1,00	48,00	18,00	864,00	G-01/B, ohne Pkw und Fahrräder
Pkw-Stellplätze	8,00	5,00	2,50	100,00	G-01/B, acht Stellplätze
Fahrradfläche	1,00	6,00	3,00	18,00	G-01/B, wasserdurchlässig
Grundstück m²				2880,00	V-26-118, 60,00 x 48,00 m
Belegte Flächen m²				1.438,00	
Restfläche m²				1.442,00	

Variante G-03	Anzahl	Länge m	Tiefe m	Fläche m²	Bezug
Halle verkürzt	1,00	24,00	14,70	352,80	G-03, nur zur Entscheidung
Differenz Hallenfläche				-7,20	
Dachfläche Variante				448,80	
Dachfläche Antrag				456,00	

Nordabstand Antrag m 2,70 Vermessung, keine Zulässigkeitsprüfung

Eingaben blau auf hellem Feld. Rechenwerte sind geometrische Flächen, keine Genehmigungsbescheinigung.

Hof, Pkw-Stellplätze und Fahrradfläche sind getrennte Ansätze. Entwässerung verwendet eigene Anschlussflächen.

gez. Rieke Cordes · Cordes Bauatelier · CE-WU26

02_Entwurfsentscheidung.docx

Stadt Celle · Gebäudebetrieb Uhlenried

Uhlenrieder Weg 26 · 29225 Celle
f.seidel@werkhof-uhlenried.example

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle

Celle, 26.05.2026 · Bezug CE-WU26

Entwurfsentscheidung und Betriebsdaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach der Nutzerbesprechung vom 19.05.2026 bestätigen wir die Variante Osthof als Grundlage des Bauantrags. Der Rat hat für das Gesamtvorhaben 1.475.600,00 EUR brutto auf Basis der Kostenberechnung von 1.240.000,00 EUR netto bereitgestellt. Eine zusätzliche Flächenerweiterung ist darin nicht enthalten.

1 Betrieb und Flächen

Am Standort arbeiten zwölf Beschäftigte in zwei zeitlich überlappenden Teams. Der Regelbetrieb findet montags bis freitags zwischen 06:30 und 17:30 Uhr statt. In der Halle werden vier kleine Pflegefahrzeuge, zwei Anhänger und handgeführte Geräte eingestellt. Kraftstoff wird nicht in Vorratstanks gelagert. Für Kleingebinde ist der im Brandschutzbeitrag gesondert beschriebene Schrank vorgesehen.

Die Außenkontur der Halle beträgt 24,00 m mal 15,00 m. Der Sozialtrakt mit Umkleiden, Büro und Aufenthaltsraum hat 12,00 m mal 8,00 m Außenmaß. Der Hof muss eine durchgehend nutzbare Rangiertiefe von 10,00 m vor den Toren behalten. Besucher melden sich am Büro an; ein regelmäßiger Publikumsbetrieb ist nicht vorgesehen.

2 Lage und Planfreigabe

Wir geben den Entwurf G-01/A und G-02/A vom 20.05.2026 für die weitere Antragsbearbeitung frei. Der nördliche Grenzabstand ist nach dem aktuellen Vermessungsstand einzutragen. Die in der Vorbesprechung verwendeten 3,00 m waren eine Entwurfsannahme und sind nicht als vermessen bestätigt.

Eine Verkleinerung der Halle nach Norden ist aus betrieblicher Sicht möglich, wenn mindestens 14,60 m äußere Tiefe erhalten bleiben. Ob dies rechtlich und konstruktiv sinnvoll ist, ist noch nicht entschieden. Eine Abweichung von Grenzabstandsanforderungen ist nicht durch diesen Beschluss freigegeben. Bitte legen Sie eine solche Entscheidung gesondert vor.

3 Weiterer Ablauf

Die Fachplaner sollen ihre Beiträge auf diesen Entwurfsstand beziehen. Der Termin 15.03.2027 bleibt Ziel für den Baustart; eine Vorwegnahme der behördlichen Entscheidung ist damit nicht verbunden. Für verbindliche Änderungen bleibt Fiona Seidel zuständig. Die Niederschrift gibt die am 26.05.2026 von Fiona Seidel bestätigte Entscheidung wieder.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Fiona Seidel, Projektleitung

Anlagen: G-01/A Lageplan; G-02/A Grundriss und Schnitt

05_Baubeschreibung.docx

Cordes Bauatelier

Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
r.cordes@cordes-bauatelier.example

Stadt Celle · Bauaufsicht
Verwaltungshof 8 · 29221 Celle

Celle, 27.08.2026 · Bezug CE-WU26

Baubeschreibung zum Antrag CE-WU26

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für die Stadt Celle wird der Neubau des Werkhofs Uhlenried auf dem Grundstück Flur 7, Flurstück 118/6 beantragt. Die Beschreibung bezieht sich auf die Bauzeichnungen G-02/B und den Lageplan G-01/B vom 27.08.2026. Die bestehende offene Lagerfläche wird für Fahrzeughalle, Sozialtrakt und befestigten Hof neu geordnet.

1 Gebäude und Nutzung

Die eingeschossige Halle hat 360,00 m² äußere Grundfläche. Vier nach Süden gerichtete Tore mit jeweils 3,50 m lichter Breite erschließen die Fahrzeugstände. Die nördliche Wand enthält keine Fenster und keine Türen. Der Sozialtrakt ist mit 96,00 m² äußerer Grundfläche angesetzt. Zwischen Halle und Sozialtrakt ist der im Brandschutzbeitrag bezeichnete Abschluss vorgesehen.

Der Hallenboden liegt auf 42,10 m im verwendeten Projekthöhensystem. Die Traufe Nord liegt 4,80 m über Hallenfertigfußboden, der First 6,20 m. Das Gelände an der Nordseite liegt nach Vermessungsangabe zwischen 41,96 m und 42,02 m. Die genaue Zuordnung der Geländepunkte zum Schnitt ist im Blatt G-02/B dargestellt.

2 Konstruktion und Technik

Die Halle erhält eine Stahlrahmenkonstruktion mit gedämmten Dach- und Wandpaneelen. Die Tragwerksplanung Hohenfeld vom 24.08.2026 beschreibt die Vorbemessung; die endgültige prüffähige Statik ist nicht Bestandteil dieser Beschreibung. Der Sozialtrakt wird in Mauerwerksbauweise errichtet. Die Gebäudeentwässerung wird in die von Beeken geplante Rückhaltung geführt.

Das auf dem Dach anfallende Wasser wird gesammelt; eine Ableitung auf das Nachbargrundstück ist nicht vorgesehen. Die Außengeräte der Wärmeversorgung stehen an der Ostseite des Sozialtrakts. Die Betriebszeiten und Zahl der Beschäftigten entsprechen der Entwurfsentscheidung vom 26.05.2026. Eine Ladestation für externe Fahrzeuge oder öffentliche Werkstattnutzung ist nicht beantragt.

3 Grundstück und Erschließung

Das Grundstück hat nach vorgelegter Vermessungsunterlage 2.880,00 m². Die Zufahrt erfolgt ausschließlich vom Uhlenrieder Weg im Süden. Acht Pkw-Stellplätze und zwölf Fahrradplätze sind im Lageplan dargestellt. Der Abstand der nördlichen Hallenaußenwand zur Grundstücksgrenze ist in G-01/B mit 2,70 m angegeben; im älteren Entwurf waren 3,00 m angesetzt.

Die befestigte Hof- und Zufahrtsfläche beträgt im Rechenblatt 864,00 m². Die unbefestigte Fläche ergibt sich aus der Grundstücksfläche nach Abzug der dort einzeln aufgeführten Flächen. Dieser Flächennachweis ist keine abschließende Prüfung sämtlicher planungs- und bauordnungsrechtlicher Kennwerte.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rieke Cordes, Architektin

Anlagen: keine

01_Planervertrag.pdf

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 12.02.2026 · Bezug CE-WU26

Planervertrag Werkhof Uhlenried

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen den am 12.02.2026 abgestimmten Auftrag für den Neubau einer Fahrzeug- und Gerätehalle mit Sozialtrakt auf dem Grundstück Uhlenrieder Weg 26, Gemarkung Uhlenried, Flur 7, Flurstück 118/6. Die Projektkennung lautet CE-WU26. Die Halle dient dem kommunalen Grünpflegebetrieb; eine öffentliche Annahmestelle für Abfälle ist nicht Gegenstand des Vorhabens.

1 Leistungsgegenstand und Stufen

Beauftragt werden die Grundleistungen der Gebäudeplanung in den Leistungsphasen 1 bis 4. Der Abruf der Genehmigungsplanung ist mit Unterzeichnung erklärt. Die Leistungsphasen 5 bis 9 sind nicht beauftragt; ein späterer Abruf bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Die Entwurfsplanung soll eine Halle mit 24,00 m mal 15,00 m Außenmaß und einen südöstlich anschließenden Sozialtrakt mit 12,00 m mal 8,00 m Außenmaß zugrunde legen.

Cordes Bauatelier koordiniert die Beiträge von Hohenfeld Tragwerk, Kammann Brandschutzplanung und Ingenieurbüro Beeken. Diese Büros sind durch die Stadt gesondert beauftragt. Die Objektplanung übernimmt nicht die fachliche Erstellung ihrer statischen, brandschutztechnischen oder entwässerungstechnischen Nachweise. Ein amtlicher Lageplan wird separat beauftragt.

2 Genehmigungsplanung und besondere Leistungen

Der Auftrag umfasst die Zusammenstellung und Erarbeitung der Bauvorlagen, die im vereinbarten Verfahren erforderliche Abstimmung, die autorisierte Einreichung und die Ergänzung beziehungsweise Anpassung des Antragsstands. Die Unterstützung bei nachbarlichen Erklärungen ist zunächst auf eine gemeinsame Ortsbesprechung begrenzt. Weitergehende Beschaffung von Zustimmungserklärungen, besondere technische Nachweise für eine Zustimmung im Einzelfall und Rechtsbehelfsverfahren sind nicht beauftragt.

Die Stadt entscheidet über Änderungen von Nutzung, Baukörper und Kostenrahmen. Eine notwendige Korrektur eigener Planungsfehler wird durch diese Regelung nicht zu einer zusätzlich vergüteten Leistung. Für nachträglich geänderte Planungsziele sind Inhalt und Vergütung vor Durchführung abzustimmen, soweit die sofortige Bearbeitung nicht zur Abwendung eines konkreten Nachteils erforderlich ist.

3 Vergütung und Termine

Für die beauftragte Stufe wird ein Pauschalhonorar von 68.000,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart. Die Baukostenberechnung vom 20.05.2026 ist mit 1.240.000,00 EUR netto als Planungsrahmen bestätigt; sie ist kein garantierter Endpreis. Der intern angestrebte Baubeginn ist der 15.03.2027. Eine Genehmigung bis zu einem bestimmten Datum wird nicht zugesagt.

4 Vertretung und Dokumentation

Rieke Cordes darf den Bauantrag in der am 26.05.2026 von Fiona Seidel bestätigten Entwurfsfassung übermitteln und die technische Korrespondenz führen. Änderungen des Antragsgegenstands, Anträge auf Abweichung sowie rechtsverbindliche Nachbarerklärungen bedürfen einer vorherigen Freigabe durch Fiona Seidel. Kostenanerkennnisse, Rechtsmittelverzicht und Beauftragung weiterer Unternehmen sind nicht umfasst.

Planrevisionen sind mit Datum, Inhalt und tatsächlichem Übermittlungsnachweis zu dokumentieren. Die Stadt erhält nach jeder Einreichung das Anlagenverzeichnis und den Eingangsbeleg. Eine landesrechtliche Bauleiterfunktion und technische Prüfaufgaben werden mit diesem Vertrag nicht übertragen. Beide Parteien bestätigen die Vereinbarung in Textform am 12.02.2026: Fiona Seidel für die Stadt und Rieke Cordes für Cordes Bauatelier.

Stadt Celle · Gebäudebetrieb Uhlenried

Uhlenrieder Weg 26 · 29225 Celle
f.seidel@werkhof-uhlenried.example

Mit freundlichen Grüßen

gez. Fiona Seidel, Projektleitung


Anlagen: keine

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_Lageplan_G01B.pdf

Werkhof Uhlenried Lageplan

CE-WU26 · G-01/B · 27.08.2026 · Schematisch vermasster Lagebezug

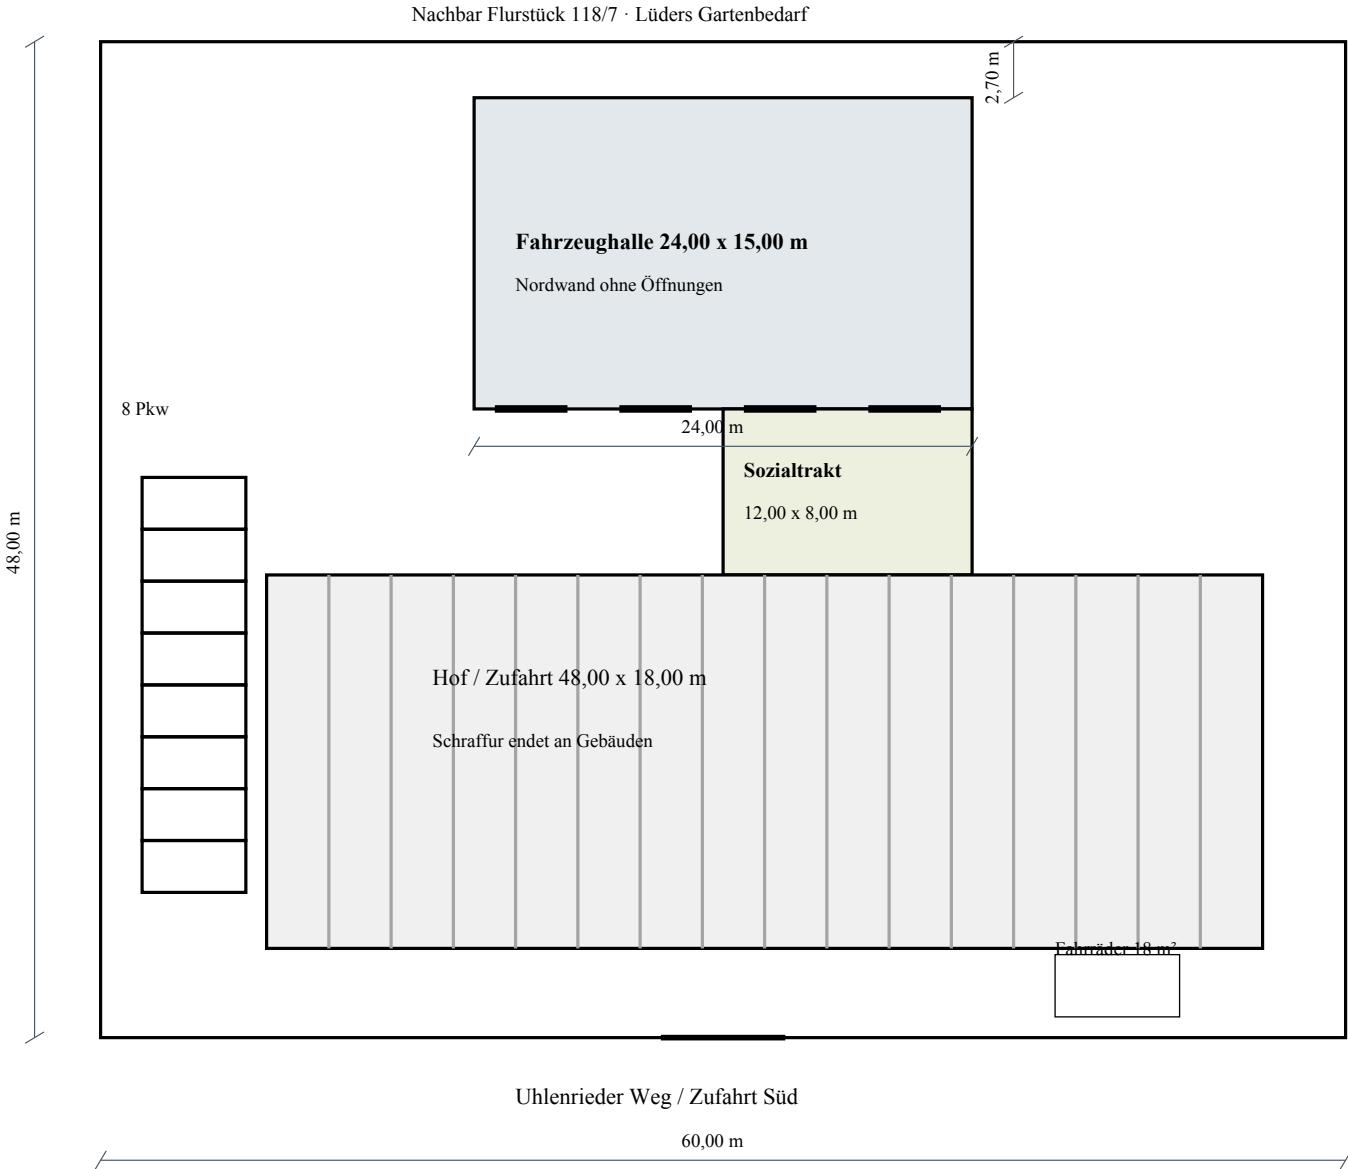

N




- Grundstück 60,00 x 48,00 m = 2.880,00 m²
- Flur 7, Flurstück 118/6
- Hallensüdwand y = 30,30 m
- Hallennordwand y = 45,30 m
- Nordgrenze y = 48,00 m
- Hofansatz ohne Pkw-Stellplätze
- Höhenbezug: FFB Halle 42,10 m
- Vermessung V-26-118, 17.08.2026
- Stand: zur Einreichung
- gez. Rieke Cordes


04_Bauzeichnung_G02B.pdf

Werkhof Grundriss und Nord-Süd-Schnitt

CE-WU26 · G-02/B · 27.08.2026 · Grundriss schematisch vermasst

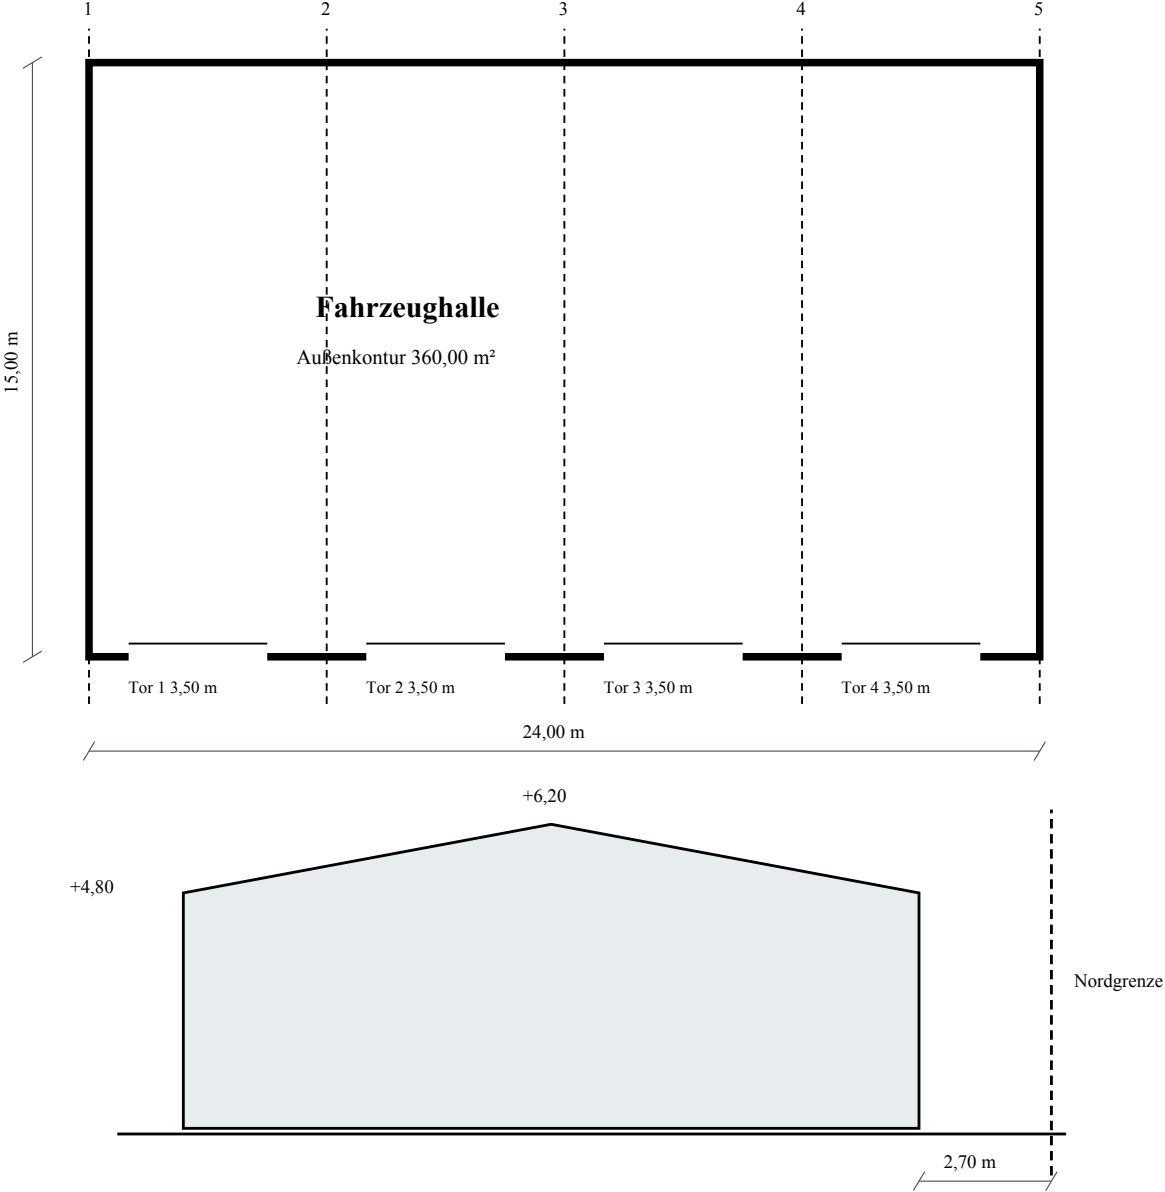

Sozialtrakt 12,00 x 8,00 m

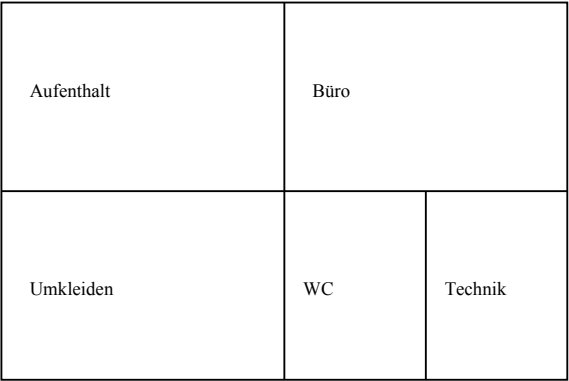

Schnitt: Süd links / Nord rechts

- FFB Halle = 42,10 m
- Gelände Nordwest = 41,96 m
- Gelände Nordost = 42,02 m
- Traufe relativ FFB = 4,80 m
- Brandschutzbeitrag noch auf Stand A
- gez. Rieke Cordes

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_Tragwerksbeitrag.pdf

Hohenfeld Tragwerk

An der Feldmühle 6 · 29227 Celle
j.wendt@hohenfeld-tragwerk.example

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 24.08.2026 · Bezug CE-WU26

Vorbemessung der Hallenkonstruktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Beitrag bezieht sich auf G-02/A vom 20.05.2026 und die am 18.08.2026 übersandten Profilskizzen. Die Halle ist als fünf Rahmenachsen mit 6,00 m Achsabstand vorgesehen. Die äußere Tiefe beträgt 15,00 m. Die Lastannahmen aus Photovoltaik und Dachaufbau sind in der beigefügten Projektberechnung erfasst; diese Berechnung wird gesondert zur Prüfung vorgelegt.

1 Planungsstand

Für den Bauantrag können die angegebenen Trauf- und Firsthöhen verwendet werden. Die vorliegende Stellungnahme ist keine Bescheinigung einer abgeschlossenen bautechnischen Prüfung. Fundamentabmessungen und Verbindungsmittel werden erst nach Abschluss der Baugrundabstimmung endgültig festgelegt. Bohrungen oder Änderungen an Rahmenquerschnitten dürfen aus diesem Schreiben nicht abgeleitet werden.

2 Mögliche Verringerung der Hallentiefe

Eine Verringerung der äußeren Hallentiefe von 15,00 m auf 14,70 m ist konstruktiv grundsätzlich in der Rahmengeometrie darstellbar. Damit ist weder die neue Statik gerechnet noch eine Änderung freigegeben. Die Traufhöhe soll nach bisheriger Abstimmung unverändert bleiben. Eine Veränderung der nördlichen Stützenlage betrifft die Fundamentplanung und die Dachentwässerung.

Bitte geben Sie uns den endgültigen Lage- und Schnittstand mit Bezug auf die vermessene Grenze. Wir benötigen die Entscheidung spätestens am 05.10.2026, wenn die Fachunterlagen für den nächsten Antragslauf rechtzeitig vorliegen sollen. Der Termin ist unser interner Bearbeitungsvorlauf und keine behördliche Frist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jorit Wendt, Tragwerksplanung

Anlagen: keine

08_Brandschutzbeitrag.pdf

Kammann Brandschutzplanung

Birkenstieg 19 · 29313 Hambühren
n.kammann@kammann-brand.example

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 25.08.2026 · Bezug CE-WU26

Brandschutzbeitrag zum Werkhofantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stellungnahme betrifft den von Ihnen übersandten Hallenentwurf G-02/A und die Betriebsdaten vom 26.05.2026. Sie enthält die für die weitere Antragskoordination abgestimmten Angaben. Eine Genehmigung oder abschließende Bestätigung der gesamten Bauvorlage wird hiermit nicht erklärt.

1 Nutzungsannahmen

Wir legen zwölf Beschäftigte, vier Pflegefahrzeuge und zwei Anhänger zugrunde. Die Halle wird nicht für Veranstaltungen genutzt. Kraftstoffe werden nur in betriebsüblichen Kleingebinden in einem dafür gesondert nachzuweisenden Schrank vorgehalten. Eine offene Lagerung an der Nordwand ist nicht Bestandteil unseres Ansatzes. Der Sozialtrakt besitzt einen eigenen Ausgang nach Süden.

2 Nordwand und Grundstücksbezug

Die Nordwand ist im vorliegenden Entwurf öffnungslos. Im uns vorliegenden Lageplan ist ein Abstand von 3,00 m zur nördlichen Grenze dargestellt. Eine Verringerung dieses Abstands war nicht Gegenstand unserer Bearbeitung. Für einen abweichenden Grenzabstand benötigen wir den vermessenen Lageplan, die tatsächliche Wandhöhe und die vorgesehene Wand-/Dachausbildung.

Eine bloße Zustimmung des Nachbarn würde die brandschutztechnische Beurteilung nicht ersetzen. Ob eine besondere Anforderung oder eine zusätzliche Maßnahme erforderlich wird, kann erst anhand des aktualisierten Satzes bewertet werden. Wir bestätigen deshalb derzeit keine Kompensationsmaßnahme für 2,70 m Abstand.

3 Rettungswege und weitere Bearbeitung

Die im Grundriss dargestellten Ausgänge nach Süden und Osten sind freizuhalten. Die Flächen vor den Ausgängen dürfen nicht als feste Lagerplätze genutzt werden. Die genaue Türqualität am Übergang zum Sozialtrakt wird mit dem abschließenden Nachweis abgestimmt. Bitte übersenden Sie die endgültige Revision einschließlich Schnitt, damit keine unterschiedlichen Geometrien im Antragsverfahren verbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nele Kammann, Brandschutzplanung

Anlagen: keine

09_Bauantrag.pdf

Cordes Bauatelier

Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
r.cordes@cordes-bauatelier.example

Stadt Celle · Bauaufsicht
Verwaltungshof 8 · 29221 Celle
Celle, 02.09.2026 · Bezug CE-WU26

Bauantrag Neubau Werkhof Uhlenried

Sehr geehrte Damen und Herren,

Namens und in Vollmacht der Stadt Celle beantragen wir die Baugenehmigung für den Neubau der Fahrzeug- und Gerätehalle mit Sozialtrakt auf dem Grundstück Uhlenrieder Weg 26, Gemarkung Uhlenried, Flur 7, Flurstück 118/6. Die Bauherrschaft wurde über die Übermittlung am heutigen Tag unterrichtet. Das Projekt wird unter CE-WU26 geführt.

1 Antragsgegenstand

Beantragt sind eine eingeschossige Halle mit 24,00 m mal 15,00 m Außenmaß, ein Sozialtrakt mit 12,00 m mal 8,00 m Außenmaß sowie die in G-01/B dargestellte Erschließung. Maßgeblich sind die beigefügten Bauzeichnungen vom 27.08.2026. Eine öffentliche Abfallannahme, zusätzliche Lagerhalle oder Tankanlage ist nicht Gegenstand dieses Antrags.

2 Bauvorlagen

Kennung	Unterlage	Stand
G-01/B	Lageplan mit Grenzabstand Nord	27.08.2026
G-02/B	Grundriss, Schnitt und Höhen	27.08.2026
BB-01	Baubeschreibung	27.08.2026
FL-01	Flächenberechnung	27.08.2026
BS-01	Brandschutzbeitrag Kammann	25.08.2026
TW-01	Tragwerksbeitrag Hohenfeld	24.08.2026

Der nördliche Grenzabstand ist im aktualisierten Lageplan mit 2,70 m dargestellt. Eine gesonderte Erklärung der Bauherrschaft zu einem Abweichungsantrag liegt uns noch nicht vor. Wir bitten um Mitteilung, welche ergänzenden Unterlagen für die Bearbeitung dieses Punkts benötigt werden. Der Antrag soll nicht als Erklärung einer nachbarlichen Zustimmung verstanden werden.

3 Bevollmächtigung und Korrespondenz

Ansprechpartnerin der Bauherrschaft ist Fiona Seidel. Die technische Korrespondenz bitten wir über Rieke Cordes zu führen. Die Vollmacht ergibt sich aus dem Planervertrag vom 12.02.2026 in Verbindung mit der Entwurfsentscheidung vom 26.05.2026. Eine Erweiterung des Antragsgegenstands bleibt einer gesonderten Erklärung vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rieke Cordes, Architektin

Anlagen: G-01/B; G-02/B; BB-01; FL-01; BS-01; TW-01

11_Nachforderung.pdf

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 09.09.2026 · Bezug CE-WU26

Nachforderung zum Bauantrag CE-BA-2026-184

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der am 02.09.2026 eingegangene Antrag zum Werkhof Uhlenried wird unter dem Aktenzeichen CE-BA-2026-184 geführt. Bei der Vorprüfung wurden die nachstehenden Unstimmigkeiten festgestellt. Bitte reichen Sie die bezeichneten Unterlagen bis zum 30.09.2026 nach und ordnen Sie die Antwort den folgenden Ziffern zu.

1 Nördliche Grundstücksgrenze

Im Lageplan G-01/B ist ein Abstand der Hallenaußenwand zur Nordgrenze von 2,70 m eingetragen. Der Brandschutzbeitrag geht dagegen von 3,00 m aus. Bitte legen Sie einen auf den Vermessungsstand bezogenen Schnitt mit Wandhöhe und Geländeangaben sowie eine nachvollziehbare Abstandsberechnung vor. Falls eine Abweichung beantragt werden soll, ist der Antrag konkret zu begründen und von der hierzu befugten Person zu veranlassen.

2 Flächennachweis

Die Baubeschreibung nennt 864,00 m² Hof- und Zufahrtsfläche. Die schraffierte Fläche im Lageplan ist nicht eindeutig von den Stellplätzen abgegrenzt. Bitte erläutern Sie, ob die Stellplätze in diesem Ansatz enthalten sind, und reichen Sie eine übereinstimmende Flächenaufstellung nach. Die Grundstücksfläche von 2.880,00 m² ist durch den vorgelegten Vermessungsbezug zu belegen.

3 Fachbeiträge

Die Beiträge zu Tragwerk und Brandschutz beziehen sich auf G-02/A. Bitte legen Sie die Bestätigung vor, welche Angaben auf den eingereichten Stand G-02/B übertragen werden können. Eine technische Bestätigung für einen gegenüber dem Fachbeitrag geänderten Grenzabstand liegt bislang nicht vor.

4 Weiteres Verfahren

Die Eingangsquittung vom 02.09.2026 bestätigt den Eingang des dort genannten Dateisatzes, nicht dessen inhaltliche Vollständigkeit oder Genehmigungsfähigkeit. Über den Bauantrag ist noch nicht entschieden. Eine etwa benötigte Verlängerung der oben genannten Nachreichungsfrist ist mit konkreter Begründung vor Fristablauf anzufragen; eine Verlängerung ist derzeit nicht gewährt.

Bitte teilen Sie bei Ihrer Antwort mit, ob die bisherige Geometrie beibehalten oder ein geänderter Plansatz vorgelegt wird. Dieses Schreiben enthält keine Zustimmung zu einer Ausführung mit 2,70 m Grenzabstand und keine Erlaubnis zum Baubeginn.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mareike Drenker, im Auftrag

Anlagen: keine
