

16_2026-06-12_Planversand.txt

Heller und Seifert Architektur
Lindenbreite 17, 31655 Stadthagen
hs@heller-seifert.example

An Theda Mertin
12.06.2026, 16:25 Uhr
AS-26-03 / Versandjournal Entwurfsunterlagen

Sehr geehrte Frau Mertin,

wir halten für Ihre Projektablage den folgenden Versandstand fest. Die Einträge dokumentieren die Übermittlung, nicht eine technische oder rechtsgeschäftliche Freigabe.

01.06.2026, 15:10: E-03-EG, E-03-OG und E-03-S an Mertin, Rötte und Rabe; Zweck Entwurfskoordination.

02.06.2026, 11:40: Objektbeschreibung E-03 an Mertin; Zweck Lesestand.

03.06.2026, 09:15: L-04 von Rötte empfangen; Zweck Schachtkoordination.

03.06.2026, 16:00: T-02 Notiz von Rabe empfangen; keine Durchdringung bestätigt.

04.06.2026, 14:20: TGA-Kostenansatz empfangen.

05.06.2026, 12:05: Raumliste E-03 an Mertin und Felder.

08.06.2026, 17:10: Kostenberechnung an Mertin; K-07 noch offen.

09.06.2026, 17:00: Koordinationsprotokoll an alle Teilnehmenden.

10.06.2026, 13:30: Terminfortschreibung an Mertin.

11.06.2026, 10:32: Betreiberwunsch zu Eingriffen von Felder eingegangen.

12.06.2026, 16:25: keine neue geometrische Schachtfassung eingegangen.

Der Termin am 15.06. bleibt zur Abstimmung vorgesehen. Eine Revision E-04 ist bislang nicht erstellt. Die Unterlagen E-03 dürfen deshalb nicht mit einer später bestätigten Schachtlösung bezeichnet werden. Eine Einreichung bei der Bauaufsicht wurde durch unser Büro nicht veranlasst.

Mit freundlichen Grüßen
Janne Heller
Architektin
Anlagen: keine neuen Unterlagen

15_2026-06-11_Betreiberwunsch.eml

Von	"Dr.Enno Felder", Sprecher der Praxisgemeinschaft <verwaltung@praxis-muehlenanger.example>
An	"Theda Mertin", Projektleitung <projekt@muehlenanger.example>
Datum	Thu, 11 Jun 2026 10:32:00 +0200
Betreff	AS-26-03 / Zusätzlicher Wunsch für einen ambulanten Eingriffsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach einem Gespräch mit einer möglichen weiteren Partnerpraxis möchten wir prüfen lassen, ob im Obergeschoss künftig ambulante Eingriffe möglich wären. Wir haben dazu noch keine abgestimmte Betriebsbeschreibung. Die Partnerpraxis denkt an einen gesonderten Eingriffsraum und eine andere Materialversorgung als bisher.

Uns ist bekannt, dass der bestätigte Stand vom 10.04. keinen Operationsbereich enthält. Ich möchte diese Nutzung daher zunächst als Möglichkeit zur Diskussion stellen. Eine Zustimmung der Eigentümerin zu einem neuen Programm oder zu Mehrkosten liegt nicht vor.

Bitte den bisherigen Entwurf nicht schon als hierfür geeignet gegenüber der Partnerpraxis bezeichnen. Wir benötigen zunächst eine Aussage, welche Betreiber- und Fachangaben für die Prüfung erforderlich wären. Die Anzahl der bislang bestätigten allgemeinen Behandlungsräume möchten wir vor einer Entscheidung nicht reduzieren.

Für den Termin am 15.06. kann ich ab 15:00 Uhr telefonisch hinzukommen. Eine verbindliche Zusage der Partnerpraxis gibt es noch nicht. Diese Nachricht ist kein Auftrag an die Fachbüros und keine Freigabe einer technischen Lösung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Enno Felder, Sprecher der Praxisgemeinschaft
Praxisgemeinschaft Mühlenanger
Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen
verwaltung@praxis-muehlenanger.example


10_2026-06-05_Raumliste.csv

Stand	Plan	Zone	Nutzung	Rasterfläche m²	Hinweis
05.06.2026	E-03-EG	EG-01	Behandlung 1	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-02	Behandlung 2	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-03	Diagnostik	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-04	Warten Nord	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-05	Behandlung 3	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-06	Anmeldung und Warten	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-07	Nebenräume	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-08	Treppe und Aufzug	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-09	Sanitär	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-10	Technik	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-EG	EG-11	Flur und Verteilung	60	30 mal 2 m Raster
05.06.2026	E-03-OG	OG-01	Sprechzimmer 4	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-02	Sprechzimmer 5	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-03	Therapie	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-04	Personal	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-05	Besprechung	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF

Stand	Plan	Zone	Nutzung	Rasterfläche m²	Hinweis
05.06.2026	E-03-OG	OG-06	Therapie Nebebereich	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-07	Material	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-08	Treppe und Aufzug	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-09	Sanitär	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-10	Verwaltung	48	6 mal 8 m Außenraster; keine NRF
05.06.2026	E-03-OG	OG-11	Flur und Verteilung	60	30 mal 2 m Raster
05.06.2026	E-03	Gesamt	Zwei Ebenen	1080	Wand- und Verteilanteile enthalten
05.06.2026	L-04	K-07	Schacht	3.6	Bereits in Rasterzone enthalten
05.06.2026	AS-26-03	Bearbeitung	Janne Heller		An Mühlenanger Immobilien KG

Ärztehaus Am Mühlenanger

L 04 Schacht und Unterzug über Erdgeschoss

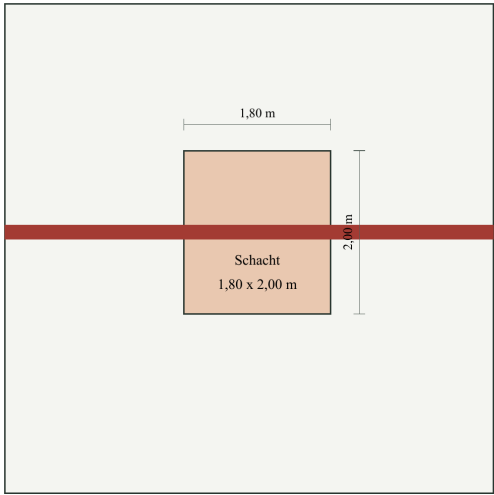

K-07 / Decke über EG

Unterzugslinie T-02:

y = 11,20 m im Gesamtplan

Schachtlage im Gesamtplan:

x = 12,20 bis 14,00 m

y = 10,20 bis 12,20 m

Lage nicht bestätigt

Bezug: E-03 / T-02

gez. Malte Rötte

Rot: Unterzug aus T-02. Orange: Schachtbedarf aus L-04. Keine Durchdringung freigegeben.

AS-26-03 · L-04 · 03.06.2026 · Koordinationsausschnitt 1:50 bei A4

gez. Malte Rötte, Fachplaner

Bilddatei: 07_2026-06-03_TGA_Schacht.png

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

11_2026-06-08_Kostenberechnung.xlsx

Ärztehaus Kostenberechnung

Heller und Seifert · an Mühlenanger Immobilien · 08.06.2026 · AS-26-03

Projektbestandteil	Menge	Einheit	Ansatz netto EUR	Netto EUR	Quelle	Stand
Erdarbeiten	540	m²	95,00	51.300,00	E-03 / Grundfläche	Ansatz Juni
Gründung und Bodenplatte	540	m²	260,00	140.400,00	E-03 / T-02	Ohne Bodenverbesserung
Tragwerk und Decken	1080	m² BGF	290,00	313.200,00	T-02 / 03.06.	Schachtänderung offen
Fassade geschlossen	720	m²	310,00	223.200,00	E-03 / Ansicht	Fenster separat
Dachaufbau	540	m²	210,00	113.400,00	E-03 / Schnitt	Flachdach
Fenster und Außentüren	180	m²	590,00	106.200,00	E-03 / Ansicht	Planeransatz
Innenausbau	1080	m² BGF	420,00	453.600,00	E-03 / Raumstand	Allgemeine Praxisnutzung
Technische Anlagen	1	psch	690.000,00	690.000,00	TGA 04.06.	Ohne Aufzug
Aufzug	1	St	48.000,00	48.000,00	TGA 04.06.	Zwei Haltestellen
Außenanlagen	1250	m²	110,00	137.500,00	Vorplanung 01.04.	Unverändert
Lose Ausstattung	1	psch	150.000,00	150.000,00	Betreiber 10.04.	Keine OP-Ausstattung
Planung und Nebenkosten	1	psch	380.000,00	380.000,00	Abruf / Ansatz	Steuerpflichtige Ansätze
Gesamt netto				2.806.800,00		
Umsatzsteuer	19%			533.292,00		
Kosten brutto				3.340.092,00		
Reserve brutto				200.000,00		
Mit Reserve brutto				3.540.092,00		
Kostenschätzung netto				2.780.000,00	01.04.2026	
Veränderung netto				26.800,00		
Finanzrahmen brutto				3.800.000,00		
Abstand mit Reserve				259.908,00		

Planbezug E-03. Schachtgeometrie K-07 ungeklärt; TGA-Ansatz ohne Änderung am Tragwerk.

Grundstück und öffentlich-rechtliche Gebühren außerhalb dieser Berechnung; Gebühren noch offen.

Interne Projektkostengliederung. Keine Kostenerfassung für später vorgeschlagene OP-Nutzung.

gez. Janne Heller · Mengen aus Zeichnungen 03 bis 05 und Raumlite 10; Fachansätze 08 und 09.

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

14_2026-06-10_Terminfortschreibung.xlsx

Ärztehaus Terminfortschreibung

Heller und Seifert · 10.06.2026 · Kalenderdauer, Ende exklusiv · AS-26-03

Vorgang	Beginn	Kalendertage	Ende	Vorgänger	Verantwortung	Grundlage
Fachkoordination K-07	15.06.2026	7	22.06.2026	Start	Planung / Fachbüros	Antworten ab 15.06. erwartet
Bauherrenentscheidung	22.06.2026	3	25.06.2026	Fachkoordination	Mühlenanger KG	Sitzungsfenster vorbehaltlich
Genehmigungsunterlagen	25.06.2026	28	23.07.2026	Entscheidung	Objekt- und Fachplanung	Folgeabruf erforderlich
Behördenverfahren	23.07.2026	70	01.10.2026	Einreichung	Annahme Büro	Keine zugesicherte Dauer
Weitere Planung	01.10.2026	42	12.11.2026	Behördenstand	Objekt- und Fachplanung	Vereinfachte Abfolge
Vergabe	12.11.2026	35	17.12.2026	Weitere Planung	Bauherr / Planung	Kein Vergabetermin zugesagt
Bauausführung	17.12.2026	280	23.09.2027	Vergabe	Noch nicht beauftragt	Rahmenannahme
Inbetriebnahme	23.09.2027	14	07.10.2027	Bauausführung	Bauherr / Betreiber	Mit Nachweisen und Übergabe
Ziel Betriebsbeginn			01.10.2027			
Tage nach Zieltermin			6			

Stand 01.04.: Entscheidung 12.06. vorgesehen. Neuer Beginn der offenen Fachkoordination 15.06.
Keine Fristzusage der Behörde; kein Abruf späterer Phasen und keine Beauftragung der Ausführung.

gez. Janne Heller · an Theda Mertin · Grundlage: Koordinationsprotokoll 09.06.2026.

02_2026-04-10_Vorplanungsentscheidung.docx

Mühlenanger Immobilien KG

Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen
projekt@muehlenanger.example

Architektur Heller und Seifert
Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen

Stadthagen, 10.04.2026 · AS-26-03

Bestätigung der Vorplanungsbasis

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Besprechung vom 10.04.2026 haben Theda Mertin, Dr. Enno Felder und Janne Heller den Vorplanungsstand VP-02 vom 01.04.2026 als Grundlage der Entwurfsplanung bestätigt. Der Baukörper bleibt zweigeschossig mit 30,00 mal 18,00 m Außenmaß. Die südliche Seite nimmt den Haupteingang auf.

1. Nutzungen

Im Erdgeschoss sind allgemeinmedizinische Sprech- und Behandlungsräume, ein diagnostischer Bereich ohne festgelegte strahlende Geräte, Anmeldung und Wartebereiche vorgesehen. Im Obergeschoss sollen weitere Sprechzimmer, Therapie- und Personalräume liegen. Es ist kein ambulanter Operationsbereich beschlossen. Eine besondere Reinraum- oder Sterilgutversorgung ist nicht Teil der bestätigten Basis.

Ein gemeinsamer Aufzug verbindet die beiden Ebenen. Die Betreiber legen Wert auf kurze Wege zwischen Anmeldung, Diagnostik und Behandlungsräumen. Die endgültige Zuordnung einzelner Nebenräume wird mit den Fachbeiträgen abgestimmt. Eine Verringerung der bestätigten Behandlungsraumzahl bedarf der Zustimmung der Eigentümerin nach Rücksprache mit der Praxisgemeinschaft.

2. Kosten und Ausstattung

Die Kostenschätzung vom 01.04.2026 beträgt 2.780.000 EUR netto vor Umsatzsteuer und Reserve. Darin sind 150.000 EUR netto für lose Ausstattung enthalten. Medizinische Sondergeräte sind nicht als allgemeine Gebäudeausstattung erfasst. Das vereinbarte Gesamtbudget von 3.800.000 EUR brutto wird nicht erhöht.

Die Fachplanung soll die zentralen Technikflächen und vertikalen Verteilungen im Entwurf konkretisieren. Die Vorplanung zeigt hierzu noch schematische Bereiche. Die Bestätigung des Vorplanungsstands ist keine Zustimmung zu beliebigen späteren Schachtgrößen oder zur Änderung tragender Bauteile.

3. Weiterer Ablauf

Die Fachbeiträge sollen bis Ende Mai vorliegen. Die Entscheidung über den abgestimmten Entwurf war für den 12.06.2026 vorgesehen. Ein Folgeabruf für Genehmigungsplanung oder Ausführungsplanung wurde in dieser Besprechung nicht erklärt. Das Protokoll wurde den Teilnehmenden am 10.04.2026 übersandt und von Frau Mertin am selben Tag bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Theda Mertin, Projektleitung

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

06_2026-06-02_Objektbeschreibung.docx

Architektur Heller und Seifert

Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen
hs@heller-seifert.example

Mühlenanger Immobilien KG
Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen

Stadthagen, 02.06.2026 · AS-26-03

Objektbeschreibung zum Entwurfsstand E 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Entwurfsstand E-03 vom 01.06.2026 entwickelt die bestätigte Vorplanung für das Ärztehaus Am Mühlenanger weiter. Das Gebäude hat zwei oberirdische Geschosse mit jeweils 540 m² Bruttogrundfläche. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Zeichnungen E-03-EG, E-03-OG und E-03-S vom 01.06.2026.

1. Nutzung und Erschließung

Der Haupteingang liegt an der Südseite. Anmeldung und Wartebereich sind im Erdgeschoss nahe dem Eingang angeordnet. Ein zentraler Flur erschließt die nördlichen Behandlungs- und Diagnostikzonen. Treppe und Aufzug bilden einen gemeinsamen Kern. Das Obergeschoss enthält zusätzliche Sprechzimmer, Therapie-, Besprechungs- und Personalbereiche.

Die Raumzonen werden in einer gesonderten Raumlite zusammengestellt. Die Rasterflächen der Zeichnung enthalten Wand- und Verteilanteile; sie ersetzen keine abschließende Nutzflächenberechnung. Die Zahl und Zuordnung der Behandlungsräume entsprechen dem bestätigten Betreiberstand vom 10.04.2026. Ein Operationsbereich ist nicht vorgesehen.

2. Konstruktion und Hülle

Vorgesehen ist ein regelmäßiges Tragwerksraster mit Stahlbetondecken und tragenden Linien nach dem Konzept T-02. Die Fassade erhält gedämmte geschlossene Flächen und Fensterbänder entsprechend den Ansichten. Das Dach ist als flach geneigter, gedämmter Dachaufbau vorgesehen. Im Kostenansatz werden 540 m² Dachfläche und 720 m² geschlossene Fassadenfläche geführt.

Die Geschosshöhe beträgt im Entwurf 3,60 m; die Oberkante der Attika liegt bei 7,80 m über dem Bezugspunkt des Erdgeschosses. Die zeichnerische Darstellung ist ein Entwurfsstand und enthält keine ausführungsreifen Anschlussdetails. Baugrund- und Gründungsangaben sind durch die hierfür beauftragten Fachleute zu bestätigen.

3. Technische Konzeption

Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro werden durch Technikplanung Rötte bearbeitet. Der Entwurf hält einen zentralen Technikbereich und einen vertikalen Schacht vor. Die eingezeichnete Schachtgeometrie ist ein vorläufiger Ansatz; die schriftliche Fachbestätigung steht aus. Der Schacht ist noch nicht abschließend in das Tragwerkskonzept integriert.

Die technischen Anlagen und der Aufzug werden als gesonderte Ansätze in der Kostenberechnung geführt. Die Eignung für besondere medizinische Nutzungen wird durch diese Objektbeschreibung nicht bestätigt. Änderungen an der Nutzung müssen mit Betreiber, Bauherr und Fachplanung abgestimmt werden.

4. Unterlagenstand

Eine abschließende Genehmigungsentscheidung liegt nicht vor. Die Kostenberechnung wird nach Eingang der Fachansätze fortgeschrieben. Die vorliegende Beschreibung enthält keine Freigabe zur Ausführung. Offene Punkte aus der Fachkoordination werden unter der Kennung K-07 im Besprechungsstand weitergeführt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janne Heller, Architektin

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

Architektur Heller und Seifert

Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen
hs@heller-seifert.example

Mühlenanger Immobilien KG
Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen

Stadthagen, 09.06.2026 · AS-26-03

Protokoll der Entwurfskoordination vom 9 Juni

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 09.06.2026 haben Theda Mertin, Janne Heller, Malte Rötte und Svea Rabe von 14:00 bis 15:10 Uhr den Stand E-03, T-02 und L-04 besprochen. Dr. Felder war nicht anwesend. Die Sitzung fand im Büro Heller und Seifert statt.

1. Schacht K-07

Der geometrische Konflikt aus der Tragwerksnotiz wurde anhand des Ausschnitts L-04 nachvollzogen. Frau Rabe bestätigte keine Durchdringung der Unterzugslinie. Herr Rötte erläuterte, dass der angesetzte Querschnitt derzeit nicht ohne weitere Prüfung verkleinert werden kann. Eine Aufteilung in zwei Schächte wurde angesprochen, aber nicht beschlossen.

Frau Mertin bat um Darstellung der betroffenen Räume, falls eine Verlegung nach Süden erforderlich wird. Sie erklärte keine Zustimmung zum Verlust eines Behandlungsraums. Eine Änderung des Tragwerks blieb als weitere Möglichkeit offen. Es wurde weder eine technische Freigabe noch eine zusätzliche Bauleistung beauftragt.

2. Kostenstand

Die Kostenberechnung vom 08.06. wurde als aktueller Bürostand übergeben. Sie enthält den TGA-Ansatz von 690.000 EUR netto und den Aufzug gesondert mit 48.000 EUR netto. Für eine aus K-07 folgende Änderung des Tragwerks liegt noch kein belastbarer Ansatz vor. Der Gesamtfinanzrahmen bleibt unverändert.

3. Termine und weiterer Austausch

Der ursprünglich für 12.06. vorgesehene abschließend abgestimmte Entwurf wird nicht als erreicht bestätigt. Die Beteiligten wollen am 15.06. die geometrischen Möglichkeiten besprechen. Frau Heller soll den Terminstand anhand dieser offenen Koordination fortführen. Eine Dauer für die anschließende Fachbearbeitung ist noch nicht zugesagt.

Frau Mertin wird die Raumfolgen mit der Praxisgemeinschaft besprechen. Das Protokoll wurde am 09.06. um 17:00 Uhr versandt. Rückmeldungen lagen bei Ablage noch nicht vor. Der Versand gilt nicht als stillschweigende Zustimmung zu einer der besprochenen Lösungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janne Heller, Architektin

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_2026-04-08_Entwurfsabruf.pdf

Mühlenanger Immobilien KG

Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen

projekt@muehlenanger.example

Architektur Heller und Seifert

Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen

Stadthagen, 08.04.2026 · AS-26-03

Abruf der Entwurfsplanung Ärztehaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir rufen auf Grundlage des Planungsvertrags vom 15.01.2026 die Entwurfsplanung für das Ärztehaus Am Mühlenanger 9 in Stadthagen ab. Die Vorplanung sieht einen zweigeschossigen Baukörper von 30,00 mal 18,00 m und 1.080 m² Bruttogrundfläche vor. Die schriftliche Bestätigung der Nutzungszuordnung folgt mit dem Protokoll vom 10.04.2026.

1. Beauftragtes Ergebnis

Zu erstellen sind der Gebäudeentwurf mit Grundrissen, Schnitten und Ansichten, die Objektbeschreibung, die Integration der gesondert beauftragten Fachbeiträge sowie die Kostenberechnung mit Vergleich zur Kostenschätzung vom 01.04.2026. Der Terminplan ist anhand des abgestimmten Entwurfsstands fortzuschreiben. Gespräche zur Genehmigungsfähigkeit sind mit Bezug auf die besprochenen Unterlagen zu dokumentieren.

Die Objektplanung koordiniert die Beiträge von Technikplanung Rötte und Ingenieurbüro Rabe Tragwerk. Die Fachbüros bleiben für ihre Berechnungen und fachlichen Bestätigungen verantwortlich. Ein Prüfauftrag an Prüfsachverständige wird durch diesen Abruf nicht ersetzt.

2. Vereinbarte Rahmenbedingungen

Der Finanzrahmen beträgt 3.800.000 EUR brutto einschließlich 200.000 EUR Reserve, beweglicher Ausstattung und Planung. Grundstückskosten sind ausgeschlossen. Die gesondert anfallenden öffentlich-rechtlichen Gebühren sind innerhalb des Finanzrahmens zu decken, aber noch nicht beziffert. Ziel ist ein Betriebsbeginn am 01.10.2027.

Die Vergütung für den abgerufenen Umfang beträgt nach unserer Pauschalvereinbarung 61.000 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Vertiefte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, eine neue Variantenoptimierung mit geändertem Betreiberprogramm und die Genehmigungsplanung sind nicht zusätzlich abgerufen.

3. Entscheidungen

Theda Mertin bündelt die Nutzerentscheidungen. Eine technische Abstimmungsnotiz eines Fachbüros ist keine Bauherrenentscheidung über zusätzliche Fläche oder Kosten. Die Unterlagen sollen am 12.06.2026 zur Entscheidung vorliegen. Falls bis dahin entscheidende Fachbeiträge fehlen, ist der konkret erreichte Stand mit den fehlenden Angaben vorzulegen. Bauleistungen dürfen nicht beauftragt werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Theda Mertin, Projektleitung


Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_2026-06-01_Entwurf_EG.pdf

Ärztehaus Am Mühlenanger

Entwurf EG / Raum- und Tragwerksbezug

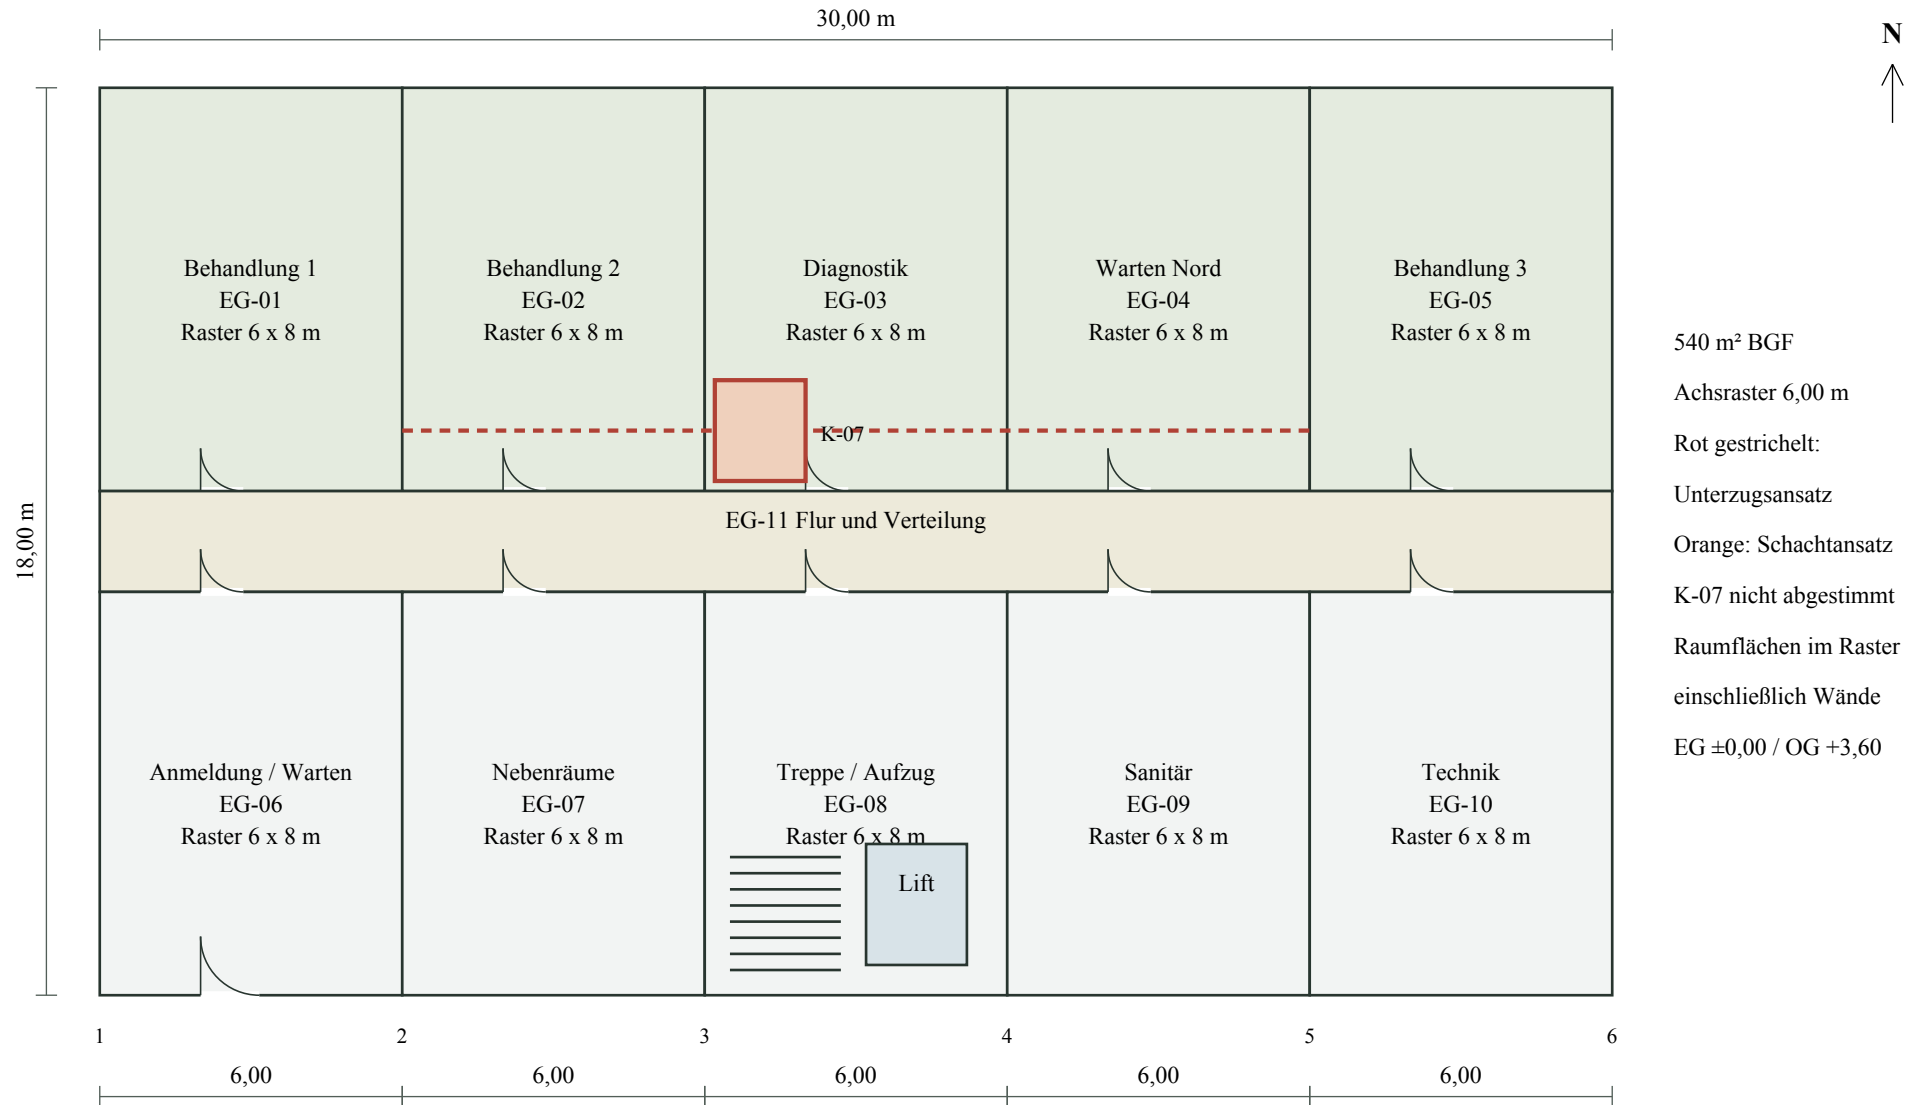


PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_2026-06-01_Entwurf_OG.pdf

Ärztehaus Am Mühlenanger

Entwurf OG / Raum- und Tragwerksbezug

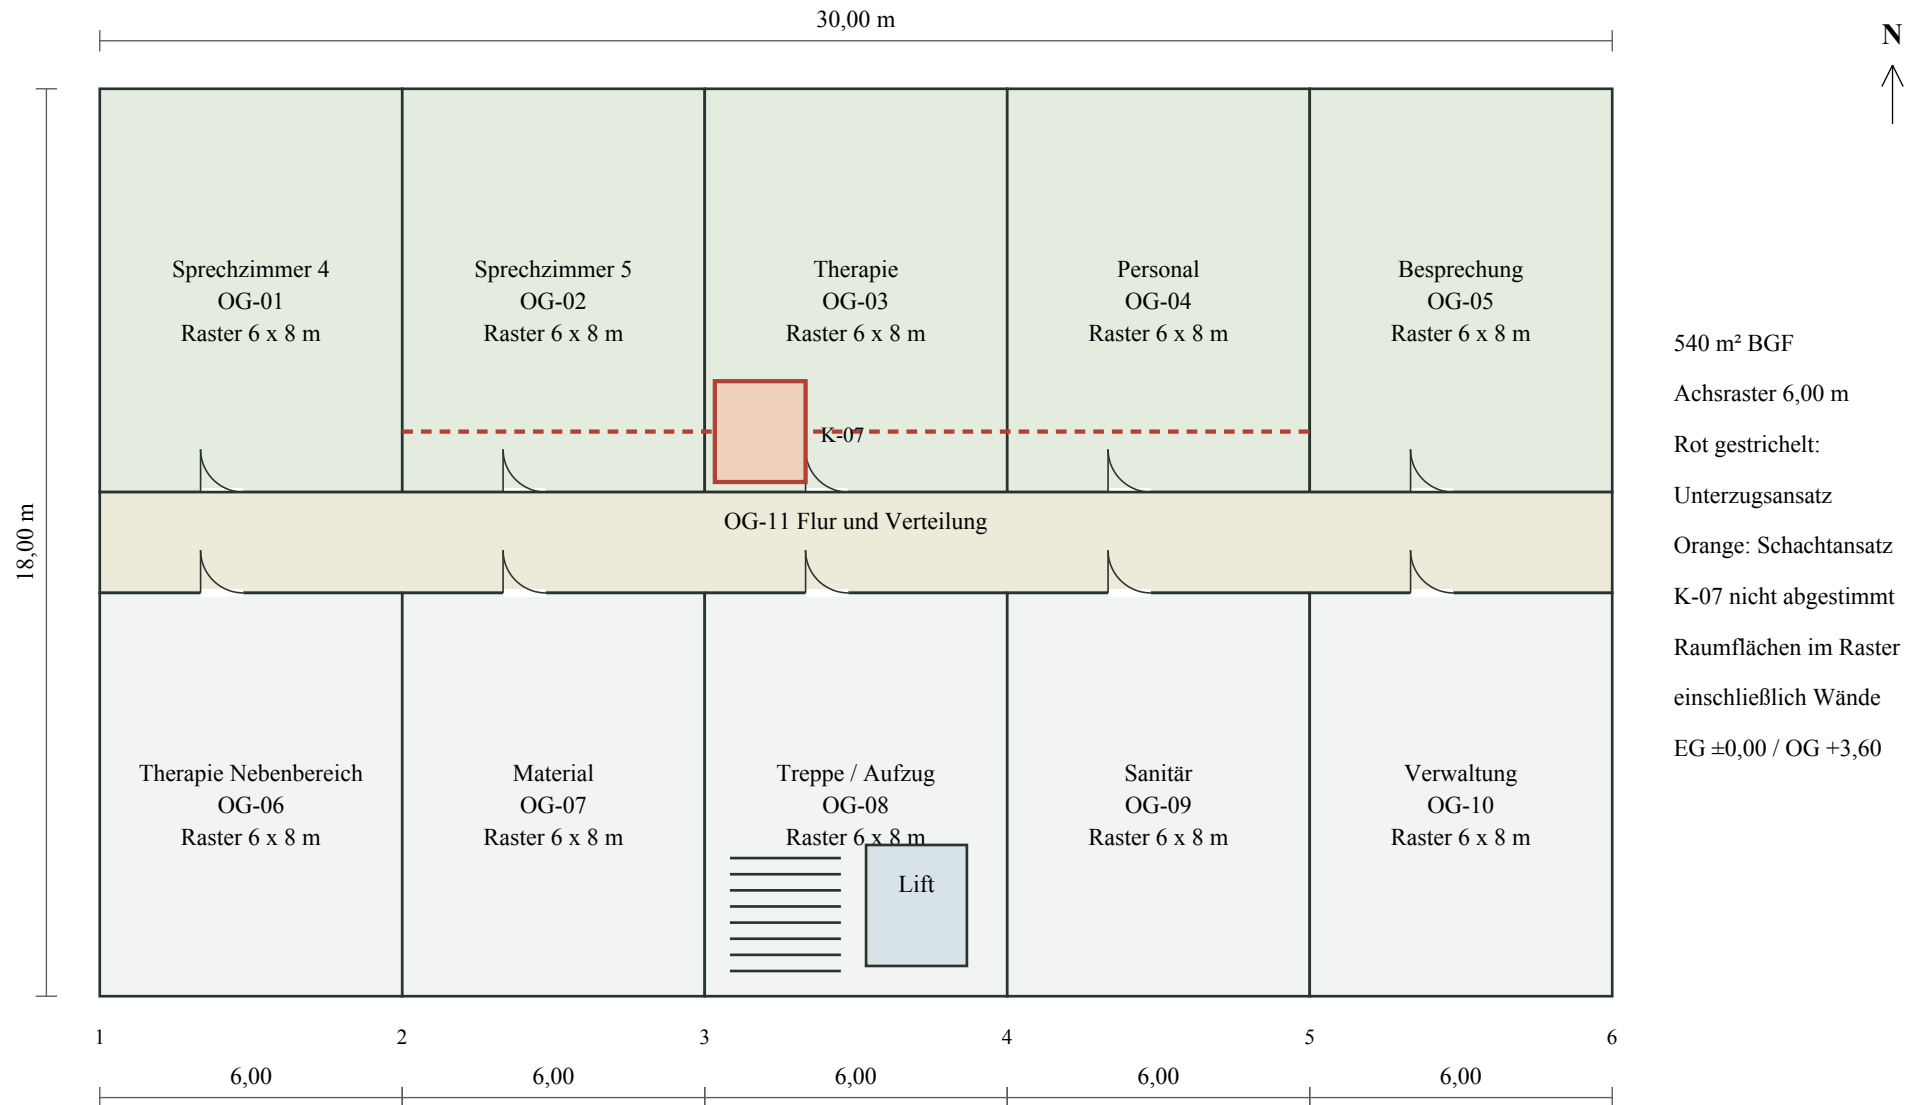


PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_2026-06-01_Schnitt_Ansicht.pdf

Ärztehaus Am Mühlenanger

Schnitt 1 und Südansicht

1. Schnitt durch Treppen- und Technikern

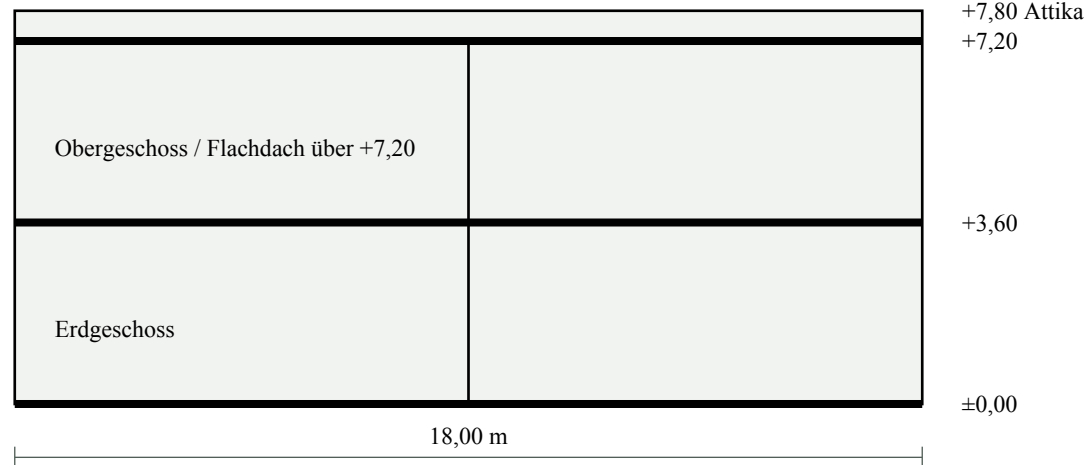

Technikansatz: keine Detailplanung

Dachfläche 540 m²

Geschosshöhen 3,60 m


Installationshöhen noch abzustimmen

2. Südansicht

Fassadenansätze gesamt:

720 m² geschlossen / 180 m² Öffnungen

Ansatz inkl. Rücksprünge, alle Ansichten

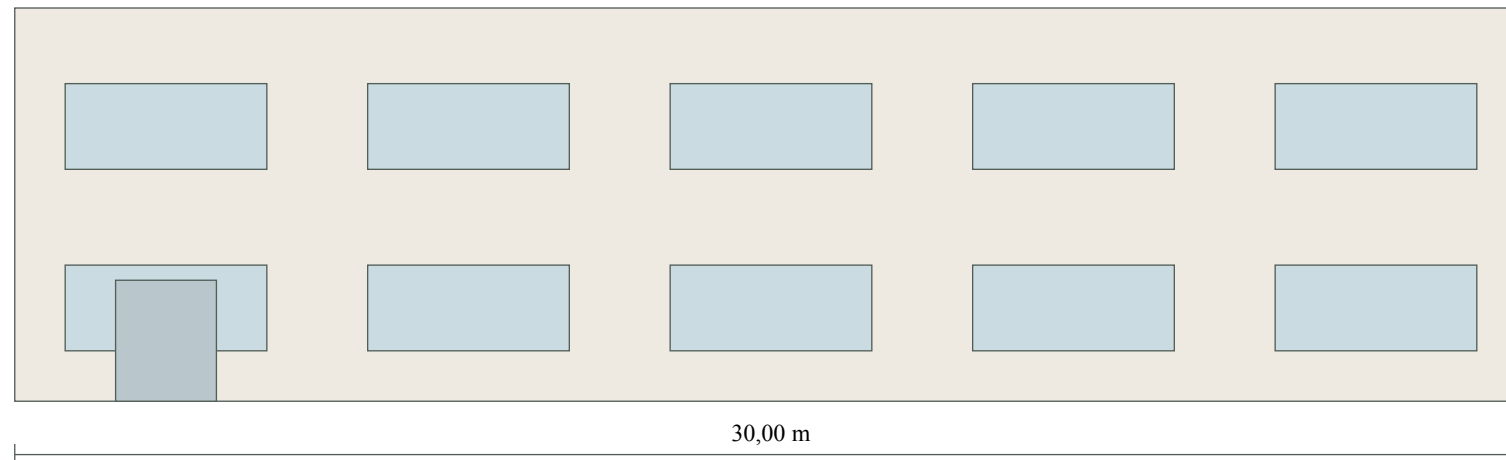

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_2026-06-03_Tragwerksnotiz.pdf

Tragwerksnotiz T 02 zum Schachtbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben den am 03.06.2026 erhaltenen TGA-Ausschnitt L-04 mit unserem Tragwerkskonzept T-02 verglichen. Beide Unterlagen beziehen sich auf die Decke über dem Erdgeschoss. Der in L-04 mit 1,80 mal 2,00 m dargestellte Schacht liegt zwischen den Gebäudeachsen 3 und 4 und schneidet in der dargestellten Lage die vorgesehene Unterzugslinie bei $y = 11,20$ m.

1. Gegenwärtiger Stand

Im Konzept T-02 verläuft diese tragende Linie von $x = 6,00$ bis $x = 24,00$ m. Die Schachtöffnung aus L-04 liegt von $x = 12,20$ bis $14,00$ m und von $y = 10,20$ bis $12,20$ m. Eine Öffnung in dieser Größe ist in unserer bisherigen Vorbemessung nicht berücksichtigt. Die Darstellung im Objektgrundriss E-03 ist deshalb nicht als von uns bestätigte Durchdringung zu verwenden.

Die Entwurfsgrundlage enthielt zuvor nur einen schematischen Technikbereich. Ob der Schacht verschoben, aufgeteilt oder das Tragwerk geändert werden kann, erfordert eine gemeinsame Abstimmung. Eine Verlegung nach Süden kann den Flur oder den gemeinsamen Kern berühren; eine Änderung des Unterzugs hat andere Folgen. Wir geben mit diesem Schreiben keine dieser Lösungen frei.

2. Benötigte Angaben

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir den verbindlichen lichten Schachtquerschnitt, erforderliche Abstände und die zulässigen Leitungsumlenkungen aus der Technikplanung. Die Objektplanung soll die betroffenen Raum- und Verkehrsflächen kennzeichnen. Anschließend können wir die statisch zu untersuchende Geometrie festlegen.

Der bisherige Kostenansatz für Tragwerk und Decken enthält keine zusätzlich bemessene Abfangung für K-07. Eine Mehrkostenzahl können wir vor dieser Abstimmung nicht bestätigen. Der Termin für einen überarbeiteten Beitrag hängt vom Eingang der abgestimmten Geometrie ab. Unsere übrigen Konzeptangaben bleiben unverändert als Vorbemessungsstand bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Svea Rabe, Tragwerksplanerin

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_2026-06-04_TGA_Beitrag.pdf

Technikplanung Rötte

Am Südhang 5 · 31675 Bückeburg
planung@roette.example

Architektur Heller und Seifert
Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen
Stadthagen, 04.06.2026 · AS-26-03

Technischer Beitrag und Kostenansatz L 04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für den aktuellen Entwurf bestätigen wir den in unserem Ausschnitt L-04 dargestellten Platzbedarf des zentralen Installationsschachts von 1,80 mal 2,00 m als derzeitigen Koordinationsansatz. Darin sind die vorgesehenen vertikalen Leitungsführungen und ein zugänglicher Revisionsbereich berücksichtigt. Die Lage ist mit dem Tragwerk noch nicht abgestimmt.

1. Anlagenkonzept

Der Technikraum im südöstlichen Erdgeschossbereich bleibt vorgesehen. Die Verteilung erfolgt über den zentralen Schacht in das Obergeschoss. Eine Aufteilung in zwei kleinere Schächte könnte zusätzliche horizontale Verteilung erfordern. Wir haben diese Alternative noch nicht bemessen und nicht bepreist.

Die Ansätze beziehen sich auf die allgemeine Praxisnutzung aus dem Protokoll vom 10.04.2026. Sie enthalten keine Raumluftechnik für einen ambulanten Operationsbereich und keine besondere Sterilgutversorgung. Für solche Nutzungen wären gesonderte Betreiberangaben und Fachbeiträge erforderlich.

2. Kostenansatz netto

Anlagenbereich	Netto EUR
Heizung und Wärmeverteilung	185.000,00
Lüftung allgemeine Praxisbereiche	165.000,00
Sanitär	125.000,00
Elektro und Datentechnik	215.000,00
Technische Anlagen ohne Aufzug	690.000,00
Aufzug mit zwei Haltestellen	48.000,00

Preisstand ist Juni 2026. Die Ansätze enthalten die üblichen Montageleistungen der jeweiligen Anlagen, nicht die Honorare unserer Fachplanung und nicht eine Änderung des Gebäudetragwerks. Der Aufzug wird separat geführt und darf nicht nochmals in den 690.000 EUR addiert werden.

Für die Koordination schlagen wir einen gemeinsamen Termin am 15.06.2026 vor. Ein überarbeiteter Beitrag kann erst nach Festlegung der Geometrie zugesagt werden. Dieses Schreiben ist keine Ausführungsfreigabe und keine Bestätigung der kollisionsfreien Integration.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Malte Rötte, Fachplaner

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

12_2026-04-01_Kostenschaetzung.pdf

Architektur Heller und Seifert

Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen
hs@heller-seifert.example

Mühlenanger Immobilien KG
Am Mühlenanger 9 · 31655 Stadthagen
Stadthagen, 01.04.2026 · AS-26-03

Kostenschätzung zum Vorplanungsstand VP 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zum Vorplanungsstand VP-02 vom 01.04.2026 stellen wir den folgenden Kostenrahmen der Gebäude- und Projektbestandteile zusammen. Grundlage sind 1.080 m² Bruttogrundfläche, zwei Geschosse und die bisher beschriebene allgemeine Praxisnutzung. Die Zahlen sind Planungsansätze, keine eingeholten Bauangebote.

Projektbestandteil	Netto EUR
Baukonstruktion einschließlich Innenausbau	1.400.000,00
Technische Anlagen einschließlich Aufzug	720.000,00
Außenanlagen	130.000,00
Lose Ausstattung	150.000,00
Planung und steuerpflichtige Nebenkosten	380.000,00
Summe netto	2.780.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	528.200,00
Kosten brutto	3.308.200,00
Reserve brutto	200.000,00
Mit Reserve brutto	3.508.200,00

Grundstückskosten und öffentlich-rechtliche Gebühren sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. Das Grundstück steht bereits zur Verfügung; die Gebühren sind noch nicht beziffert und müssen innerhalb des Gesamtfinanzrahmens von 3.800.000 EUR berücksichtigt werden. Die Reserve ist kein erteilter Auftrag.

Die technischen Ansätze beruhen auf dem Flächen- und Nutzungsstand der Vorplanung. Schachtgrößen und tragende Linien sind noch nicht integriert. Besondere medizinische Geräte, ein Operationsbereich und eine zusätzliche Etage sind nicht Bestandteil dieser Schätzung.

Die spätere Kostenberechnung soll den konkretisierten Entwurf und die Fachbeiträge abbilden. Mengen- und Preisänderungen sind dann gegenüber diesem Stand zu erläutern. Die vorliegende Aufstellung trifft keine Aussage über die Fälligkeit von Planungshonoraren.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janne Heller, Architektin

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.
