

15_Telefonnotiz.txt

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
24.09.2026, 14:10 bis 14:22 Uhr | UR-21-West
Bearbeitung: Henrike Falk
Gespräch mit Rena Mert, Hausverwaltung

Frau Mert berichtet, dass am 24.08.2026 zwei Mitarbeiter der Lüftung Wartwerk GmbH einen Motor an L2 austauschten. Die Firma nutzte den Dachausstieg und stellte Werkzeug neben dem Anschluss ab. Mert war nicht durchgehend anwesend. Sie kann nicht sagen, ob die Abdichtung betreten, beschädigt oder geöffnet wurde. Der Montagebericht ist noch beim technischen Gebäudemanagement angefordert.

Nach dem Hausbuch trat am 28.08. ein schwacher Deckenrand auf. Mert hielt ihn zunächst für einen alten Fleck. Erst nach dem Regen vom 07.09. wurde der Rand deutlich größer. Eine Reinigung des nordwestlichen Ablaufs im Jahr 2026 ist nicht eingetragen. Für U-12 kann Mert keinen genauen ersten Tag nennen.

Das Gespräch enthielt keine technische Diagnose. Mert sagte zu, den sicheren Dachzugang mit dem Hausdienst zu klären. Falk hat keine Reparatur beauftragt und keine Aussage zur Verantwortlichkeit gegenüber einem Unternehmen abgegeben.

gez. Henrike Falk
Anlagen: keine

08_Maengelmeldung.eml

Von	"Henrike Falk", Projektleitung <rathausprojekt@uelzen-projekt.example>
An	Büro Raumkante <objektbetreuung@raumkante.example>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	UR-21-West Wasserflecken Sitzungssaal und Tür H2

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Mert hat nach dem Regen am 07.09. im Sitzungssaal zwei Wasserflecken gesehen. Der größere liegt unter der südöstlichen Dachhälfte nahe der Lüftung L2, der kleinere an der Westwand. Sie hat die Stellen im beigefügten Plan mit U-11 und U-12 markiert. Nach ihrer Erinnerung gab es im August einmal einen schwachen Rand; damals wurde keine Meldung geschrieben.

Die Hoftür H2 schleift weiterhin. Frau Mert findet keinen Nachweis, dass Heideprofil den Punkt aus der Abnahme 2021 je abgeschlossen hat. Die Tür wurde seitdem kaum benutzt. Im Saal finden nächste Woche Ausschusssitzungen statt; das Dach ist nur über die Hausverwaltung zugänglich.

Die beiden Sicherungseinbehalte stehen noch in unserer Kasse. Ilmenaudach hatte letzte Woche telefonisch nach Rückzahlung im Oktober gefragt. Ich habe keine Zusage gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Henrike Falk, Projektleitung

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen

Anlagen: 06_Dachplan_Befundorte.png

10_Unternehmerantwort.eml

Von	"Björn Eilers", Geschäftsführer <service@ilmenaudach.example>
An	"Stadt Uelzen", Projektstelle Rathaus West <rathausprojekt@uelzen-projekt.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	UR-21-West Besichtigung ohne Anerkennung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben Ihre Nachricht vom 10.09.2026 mit den beiden Befundstellen erhalten. Nach unserer Abnahme 2021 gab es bis heute keine Wasserbeanstandung. Bitte übersenden Sie Wartungsnachweise und Angaben zu den Arbeiten an Lüftung L2 im August.

Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht können wir am 14.10.2026 um 15:00 Uhr eine Sichtprüfung anbieten. Eine Reparaturzusage und ein Anerkenntnis einer Ursache sind damit nicht verbunden. Unser Monteur benötigt sicheren Zugang zur südöstlichen Dachfläche. Eine Verlängerung der vertraglichen Fristen erklären wir nicht.

Bitte bestätigen Sie außerdem, wann der Sicherungseinbehalt von 4.641,00 EUR ausgezahlt werden soll. Uns liegt bislang keine bezifferte Gegenforderung vor.

Mit freundlichen Grüßen

Björn Eilers, Geschäftsführer
Ilmenaudach Bau GmbH
Dachweg 46, 29525 Uelzen

Anlagen: keine

14_Terminabstimmung.eml

Von	"Henrike Falk", Projektleitung <rathausprojekt@uelzen-projekt.example>
An	Büro Raumkante <objektbetreuung@raumkante.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 10:35:00 +0200
Betreff	UR-21-West Gemeinsamer Termin im Oktober

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Saal ist vom 12. bis 16.10. durch Veranstaltungen belegt. Frau Mert und unser Hausdienst könnten den 18.10.2026 ab 09:00 Uhr ermöglichen. Dieser Tag wäre aus Sicht der Hausverwaltung für Dach und Metallbau gemeinsam praktisch.

Die Wiederherstellung des Geländerabschnitts ist für den 02.10. vorgesehen, aber noch nicht bestätigt. Ein Angebot für Bauteilöffnungen liegt nicht vor. Ilmenaudach bietet seinerseits nur den 14.10. an. Die ursprünglichen Abnahmen waren Dach am 15.10.2021 und Metallbau am 12.11.2021; die Schlüsselübergabe war am 10.01.2022.

Eine Fristvereinbarung oder Beauftragung zusätzlicher Überwachung habe ich bisher nicht unterschrieben. Herr Eilers hat der Terminverschiebung noch nicht zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Henrike Falk, Projektleitung

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West


Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen

Anlagen: keine

13_Sicherungskonto.csv

Datum	Vertrag	Buchung	Soll_EUR	Haben_EUR	Beleg	Text
2021-11-18	UR-21-D	Einbehalt	4641.00	0.00	SR-D-21104	5 Prozent von 92820 EUR
2021-12-16	UR-21-M	Einbehalt	2844.10	0.00	SR-M-21088	5 Prozent von 56882 EUR
2026-09-24	UR-21-D	Freigabe	0.00	0.00	Kassenstand	keine Auszahl ungsanordnun g
2026-09-24	UR-21-M	Freigabe	0.00	0.00	Kassenstand	keine Auszahl ungsanordnun g

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
R-12 D mit Befundmarkierung Hausverwaltung
UR-21-West | 2026-09-08 | Henrike Falk, Projektleitung

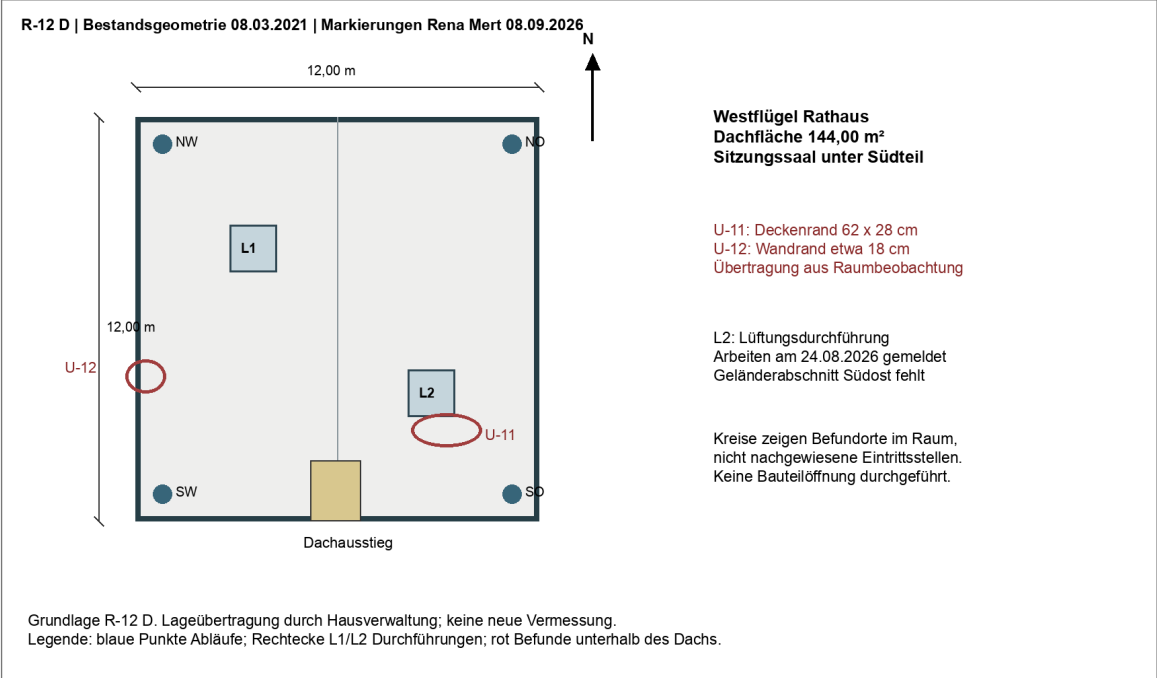

Maße haben Vorrang. Ausdruck nicht maßstäblich. Bezug und Revisionsstand im Planfeld.
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen | rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Bilddatei: 06_Dachplan_Befundorte.png

12_Sicherungen.xlsx

Rathaus Westflügel, Sicherungseinbehalte

Kasse | 24.09.2026 | Konto 8842, keine Bankverbindung

Bestand Einbehalte EUR 7.485,10

Vertrag / Kreditor	Abrechnung brutto	Satz	Einbehalt EUR	Freigaben EUR	Bestand EUR
UR-21-D / Ilmenaudach	92.820,00	5%	4.641,00	0,00	4.641,00
UR-21-M / Heideprofil	56.882,00	5%	2.844,10	0,00	2.844,10

Quelle: Sicherungskonto 8842, Buchungen 18.11. und 16.12.2021.
Beide Beträge sind Bareinbehalte aus Schlusszahlungen; keine Bürgschaft abgelöst.

Dach: Abnahme 15.10.2021. Metallbau: Abnahme 12.11.2021.
Jeweilige Vertragsvereinbarung: fünf Jahre ab Abnahme; Rückgabe nach Sicherungsabrede.

Es liegt am 24.09.2026 keine Auszahlungsanordnung vor.
Der Kassenbestand trifft keine Aussage zur Freigabefähigkeit oder Anspruchshöhe.

Erfasst: Rike Born, Stadtkasse. Originalbelege im Vertragsordner UR-21.

01_Planervertrag.docx

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Büro Raumkante
Zeichenhof 28, 29525 Uelzen

Uelzen, 09.11.2020 | UR-21-West

Planervertrag Rathaus Westflügel, Objektbetreuung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stadt Uelzen, vertreten durch die Projektstelle Rathaus West, beauftragt Büro Raumkante mit Gebäudeplanung und Objektüberwachung der Dach- und Fassadensanierung am Verwaltungsbogen 37. Die Gebäudeleistungsphasen 1 bis 9 werden vereinbart; die LPH 9 wird nach Abschluss der Ausführung ohne zusätzlichen Abruf ausgeführt. Die Fachplanung der Gebäudetechnik bleibt gesondert.

1. Betreuungsumfang

Raumkante bewertet die innerhalb der Anspruchsfristen festgestellten Mängel einschließlich erforderlicher Begehungen, längstens bis fünf Jahre seit der jeweiligen Abnahme der betroffenen Bauleistung. Es organisiert die Objektbegehung vor Ablauf der Fristen gegenüber den ausführenden Unternehmen und wirkt bei der Freigabe der vereinbarten Sicherheiten mit. Eine Einschränkung gesetzlicher Ansprüche der Stadt gegen andere Beteiligte wird mit dieser Leistungsbeschreibung nicht vereinbart.

2. Zusätzliche Aufgaben

Die fortlaufende Überwachung der Beseitigung erst nach Abnahme festgestellter Mängel wird nicht mit der Grundbetreuung beauftragt. Ein solcher Auftrag ist mit Umfang und Vergütung gesondert zu vereinbaren. Die Überwachung der Beseitigung bereits bei Bauabnahme festgestellter Mängel bleibt Bestandteil des vereinbarten Überwachungsauftrags. Regelmäßige Gebäudeverwaltung, Wartungsausführung und jährliche Rundgänge ohne konkreten Anlass sind nicht enthalten.

3. Honorar und Erklärungsbefugnis

Das Gesamthonorar beträgt 62.000,00 EUR netto zuzüglich Umsatzsteuer. Für den ausdrücklich beschriebenen Betreuungsumfang sind davon 2.400,00 EUR netto vereinbart. Dora Sell darf Befunde und Entscheidungsvorschläge ausarbeiten; Verzicht, Vergleich, Sicherheitenfreigabe und kostenpflichtige Zusatzbeauftragung werden ausschließlich durch die vertretungsberechtigte Stadtverwaltung erklärt. Fristkritische Sachverhalte sind unverzüglich Henrike Falk mitzuteilen.

Für die Stadt: gez. Henrike Falk aufgrund interner Abschlussvollmacht. Für Büro Raumkante: gez. Dora Sell. Beide Parteien bestätigen den vorstehenden Vertragsinhalt am 09.11.2020.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

05_Betriebsuebergabe.docx

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Büro Raumkante
Zeichenhof 28, 29525 Uelzen

Uelzen, 10.01.2022 | UR-21-West

Betriebsübergabe Westflügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Projektstelle übergab den Westflügel am 10.01.2022 an die Hausverwaltung, vertreten durch Rena Mert. Der Empfang umfasst die Räume W01 bis W08, den Sitzungssaal und den Zugang zum Dach. Sechs Dachzugangsschlüssel sowie die Papiermappen Dach und Metallbau wurden übernommen.

1. Vorhandene Unterlagen

Die Dachmappe enthält Abnahme vom 15.10.2021 mit Ergänzung vom 02.11.2021, Produktchargenliste und Bestandsplan R-12 D. Die Metallbaumappe enthält Abnahme vom 12.11.2021; ein Abschlussnachweis für Hoftür H2 fehlt. Die Hausverwaltung übernimmt den Wartungsordner und beauftragt künftig die regelmäßige Reinigung der Dachabläufe.

2. Erklärungen

Diese Niederschrift dokumentiert die organisatorische Betriebsübergabe. Bereits erklärte Gewerkeabnahmen bleiben unverändert. Eine neue gemeinsame Abnahme aller Bau- oder Architektenleistungen wird nicht erklärt. Die Projektstelle bleibt für Vertrags- und Sicherheitsfragen zuständig.

Rena Mert merkt an, dass H2 weiterhin schwer öffnet und derzeit wenig benutzt wird. Ein Termin mit Heideprofil wurde noch nicht festgelegt. Empfang: gez. Rena Mert. Übergabe: gez. Henrike Falk.
Kenntnisnahme: gez. Dora Sell.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

16_Angebot_Zusatzbetreuung.docx

Büro Raumkante

Zeichenhof 28, 29525 Uelzen
objektbetreuung@raumkante.example

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen

Uelzen, 25.09.2026 | UR-21-West

Angebot gesonderte Beseitigungsüberwachung U-11/U-12

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für den Fall einer beauftragten Mängelbeseitigung an den später gemeldeten Befundstellen U-11 und U-12 bieten wir folgende zusätzliche Leistung an. Unsere bereits vereinbarte fachliche Bewertung, die notwendige Begehung hierzu, die Vorfristbegehung und die Mitwirkung bei der Sicherheitenfreigabe bleiben unverändert Bestandteil des Ausgangsvertrags.

1. Zusätzlicher Leistungsumfang

Wir koordinieren zwei Kontrolltermine während einer fachlich festgelegten Beseitigungsmaßnahme und einen dokumentierten Abschlusstermin. Vor einer Verdeckung werden die im Beseitigungskonzept bezeichneten Anschlüsse mit der ausführenden Firma zugänglich gehalten. Die Kontrollen werden mit Ort, Datum, Beteiligten und tatsächlich sichtbaren Befunden dokumentiert. Die technische Spezialdiagnostik, Bauteilöffnungen und die Planung eines neuen Dachaufbaus sind nicht enthalten.

2. Vergütung und Voraussetzungen

Das zusätzliche Honorar beträgt pauschal 1.800,00 EUR netto zuzüglich 342,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 2.142,00 EUR. Voraussetzung sind sicherer Zugang und rechtzeitige Mitteilung der Ausführungstermine. Weitere Termine werden nur nach zusätzlicher Vereinbarung durchgeführt. Eine Befugnis zu Preisvereinbarungen, Abnahmeerklärungen, Verzicht oder Sicherheitenfreigabe wird nicht erteilt.

3. Angebotsstatus

Dieses Angebot ist bis 09.10.2026 bindend und noch nicht angenommen. Für den alten Abnahmepunkt M-04 der Hoftür wird mit diesem Angebot kein neuer Leistungsumfang berechnet. Über dessen bisherigen Bearbeitungsstand werden die Unterlagen des Ausgangsauftrags gesondert abgeglichen. Die Auftraggeberin erhält diesen vollständigen Text als Vertragsangebot; eine Annahmeerklärung liegt Büro Raumkante derzeit nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dora Sell, Architektin

Anlagen: keine

02_Dachvertrag.pdf

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Ilmenaudach Bau GmbH
Dachweg 46, 29525 Uelzen
Uelzen, 12.03.2021 | UR-21-West

Dachbauvertrag Westflügel UR-21-D

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stadt beauftragt Ilmenaudach Bau GmbH mit der Erneuerung des 144 m² großen Flachdachs auf dem Westflügel. Der Vertrag umfasst Abbruch des alten Aufbaus, Dampfsperre, Gefälledämmung, zweilagige Abdichtung, sämtliche Randanschlüsse sowie vier Abläufe. Preisgrundlage ist ein Pauschalpreis von 78.000,00 EUR netto zuzüglich 14.820,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 92.820,00 EUR.

1. Beschaffenheit und Unterlagen

Es gelten Plan R-12 Revision D vom 08.03.2021 und Anschlussdetail R-15 vom selben Tag. Randanschlüsse sind mit 150 mm Höhe über fertiger Dachoberfläche auszuführen. Die zwei vorhandenen Lüftungsdurchführungen werden in den Aufbau eingebunden. Spätere Montagen fremder Anlagen sind nicht Bestandteil des Auftrags. Die Abrechnung enthält eine Revisionszeichnung und eine dokumentierte Dichtheitsprüfung vor Abnahme.

2. Abnahme und Mängelansprüche

Es gelten die werkvertraglichen Regelungen des BGB. VOB/B wird nicht vereinbart. Die Parteien vereinbaren für die Bauwerksleistung fünf Jahre für Mängelansprüche ab Abnahme. Die Abnahme erfolgt förmlich in einem gemeinsamen Termin. Eine Schlüsselübergabe oder bloße Inbetriebnahme anderer Gewerke ersetzt diesen Termin nicht.

3. Sicherung

Die Stadt darf von der Schlusszahlung fünf Prozent der Bruttoabrechnung als Mängelsicherheit einbehalten. Bei unveränderter Abrechnung sind dies 4.641,00 EUR. Eine Ablösung durch gleichwertige Bürgschaft ist möglich, wurde bislang jedoch nicht erklärt. Nach Ablauf der vereinbarten Mängelfrist ist der nicht mehr zur Sicherung bestehender Ansprüche aus diesem Dachvertrag benötigte Betrag freizugeben. Für bekannte offene Ansprüche ist die benötigte Höhe nachvollziehbar zu bestimmen; eine vollständige Sperre ohne Bezug zum Dachvertrag ist nicht vereinbart.

gez. Henrike Falk für die Stadt; gez. Björn Eilers für Ilmenaudach Bau GmbH. Uelzen, 12.03.2021.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

03_Abnahme_Dach.pdf

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Ilmenaudach Bau GmbH
Dachweg 46, 29525 Uelzen
Uelzen, 15.10.2021 | UR-21-West

Förmliche Abnahme Dach Westflügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 15.10.2021 nahmen Henrike Falk, Dora Sell und Björn Eilers die Dacharbeiten am Westflügel gemeinsam in Augenschein. Frau Falk erklärte für die Stadt um 12:10 Uhr die Abnahme des Dachvertrags UR-21-D mit den nachstehenden Vorbehalten. Eine Erklärung zu anderen Gewerken oder zur Architektenleistung wird nicht abgegeben.

1. Feststellungen

A-01: Am Ablauf Nordost fehlt der Laubfangkorb. Eilers sagt Lieferung und Befestigung bis 29.10.2021 zu. Die Stadt behält ihre Rechte wegen dieses Mangels vor. A-02: Die Zuordnung der Produktchargen in der Dokumentationsmappe fehlt. Ergänzung bis 29.10.2021. Sichtbare Wasserflecken an der Saaldecke wurden beim Termin nicht festgestellt.

2. Abschlussvermerk vom 02.11.2021

Sell kontrollierte am 02.11.2021 den befestigten Laubfangkorb und nahm die nachgereichte Chargenliste entgegen. Beide im Abnahmeprotokoll genannten Punkte sind in diesem Umfang erledigt. Es fand keine erneute Abnahme des gesamten Dachs statt. Die Pauschalabrechnung blieb bei 92.820,00 EUR brutto; die Stadt führt einen Einbehalt von 4.641,00 EUR.

Für die jeweiligen Erklärungen: gez. Henrike Falk; gez. Dora Sell; gez. Björn Eilers. Der Abschlussvermerk ist eine Ergänzung derselben Abnahmeurkunde, unterzeichnet durch Dora Sell am 02.11.2021.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

04_Abnahme_Metallbau.pdf

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Heideprofil Metallbau GmbH
Profilring 33, 29549 Bad Bevensen
Uelzen, 12.11.2021 | UR-21-West

Abnahme Fenster und Außentüren UR-21-M

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 12.11.2021 fand die gemeinsame Abnahme der Fenster- und Außentürarbeiten mit Henrike Falk, Dora Sell und Maren Knoll statt. Frau Falk erklärte die Abnahme mit dem unten bezeichneten Vorbehalt. Der zugrunde liegende Vertrag vom 19.04.2021 umfasst Fenster und Türen zu 47.800,00 EUR netto, 9.082,00 EUR Umsatzsteuer und 56.882,00 EUR brutto. Für Mängelansprüche sind fünf Jahre ab Abnahme und ein Einbehalt von fünf Prozent brutto vereinbart.

1. Vorbehalt M-04

Der äußere Flügel der Hoftür H2 schleift beim Öffnen an der unteren Führung. Knoll sagt Justierung bis 26.11.2021 zu. Die Stadt behält ihre Rechte wegen dieses Mangels vor. Die übrigen bei der Begehung geöffneten Elemente funktionierten ohne Auffälligkeit. Ein Eingriff in die Dachabdichtung war nicht Gegenstand dieser Leistung.

2. Nachlauf

Auf diesem Original befindet sich kein Abschlussvermerk für M-04. Ein handschriftlicher Zusatz der Hausverwaltung vom 10.01.2022 lautet: ‚H2 öffnet schwer, Zugang meist über Haupteingang.‘ Die Schlusszahlung wurde unter Einbehalt von 2.844,10 EUR ausgeführt. Über eine Freigabe wurde bis zur Ablage dieser Ausfertigung nicht entschieden.

gez. Henrike Falk; gez. Dora Sell; gez. Maren Knoll. Den Zusatz vom 10.01.2022 zeichnete Hausverwalterin Rena Mert mit Namenskürzel RM.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

07_Wartung_2025.pdf

Dachpflege Suderland GmbH

Betriebsweg 44, 29556 Suderburg
disposition@suderland.example

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
Uelzen, 22.10.2025 | UR-21-West

Wartungsbericht WP-25122, Dach Westflügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Leon Tamm war am 22.10.2025 von 08:20 bis 10:10 Uhr mit einer zweiten Servicekraft auf dem Dach Westflügel. Zugang erfolgte über die feste Innentreppe. Es war trocken, die Dachoberfläche stellenweise feucht. Auftrag war Sichtkontrolle und Reinigung der vier Abläufe, nicht eine Bauteilöffnung oder Abdichtungsprüfung mit Wasserbelastung.

Stelle	Beobachtung	Arbeit
Ablauf NW	Laubauflage am Korb	gereinigt
Ablauf NO	Korb befestigt; kleine Zweige	gereinigt
Ablauf SW	frei	Sichtkontrolle
Ablauf SO	frei	Sichtkontrolle
Anschluss Lüftung L2	äußerlich ohne Ablösung	keine Öffnung

An den zugänglichen Oberflächen wurden keine offenen Nähte erkannt. Die Rückseite der Lüftung L2 war wegen eines abgestellten Gerüstteils nicht vollständig einsehbar. Es wurde kein Wasser in das Gebäude eingebracht. Eine Feuchtemessung im Sitzungssaal war nicht beauftragt.

Die Hausverwaltung erhielt den Bericht am 24.10.2025. Für 2026 ist noch kein Wartungstermin bestätigt. Auftragssumme dieses Termins: 420,00 EUR netto zuzüglich 79,80 EUR Umsatzsteuer. gez. Leon Tamm; Empfang bestätigt: gez. Rena Mert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Leon Tamm, Servicetechniker

Anlagen: keine

09_Befundblatt_Hausverwaltung.pdf

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Büro Raumkante
Zeichenhof 28, 29525 Uelzen
Uelzen, 09.09.2026 | UR-21-West

Hausverwaltung, Befundaufnahme W-Saal

Sehr geehrte Damen und Herren,

Rena Mert hielt am 09.09.2026 um 07:45 Uhr den sichtbaren Zustand im Sitzungssaal fest. U-11: unregelmäßiger brauner Rand an der Decke, etwa 62 cm mal 28 cm, gemessen mit Zollstock. U-12: kleiner dunkler Rand an der Westwand, etwa 18 cm breit. Es tropfte bei der Aufnahme nicht. Die Raumtemperaturanzeige zeigte 21 Grad Celsius.

1. Anzeigen und Lage

Ein ausgeliehenes Handgerät zeigte an U-11 den Wert 78 und am unauffälligen Vergleichspunkt den Wert 32. Das Gerät war auf ‚Baustoff‘ eingestellt; eine Kalibrierung oder Materialzuordnung wurde nicht dokumentiert. Die Anzeigen werden ohne Einheit wiedergegeben. Es wurde kein Material entnommen und keine Decke geöffnet.

2. Dachzugang

Mert sah vom Dachausstieg aus Laub am nordwestlichen Ablauf. Die südöstliche Fläche wurde nicht betreten, weil ein Geländerabschnitt nach Arbeiten an der Lüftung nicht wieder eingesetzt war. Die Firma für diese Arbeiten war nach dem Hausbuch am 24.08.2026 vor Ort. Ob an der Abdichtung gearbeitet wurde, ist im Hausbuch nicht vermerkt.

Die Maße bezeichnen sichtbare Ränder, nicht die räumliche Ausdehnung feuchten Materials. Die Planmarkierung vom Vortag wurde unverändert verwendet. gez. Rena Mert. Anlagen: keine.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine

11_Begehung_September.pdf

Büro Raumkante

Zeichenhof 28, 29525 Uelzen
objektbetreuung@raumkante.example

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West
Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
Uelzen, 21.09.2026 | UR-21-West

Begehungsniederschrift vom 21.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dora Sell und Rena Mert waren am 21.09.2026 von 09:00 bis 10:20 Uhr im Westflügel. Ilmenaudach und Heideprofil waren nicht anwesend. Der Sitzungssaal wurde besichtigt, das Dach nur vom Ausstieg aus. Der fehlende Geländerabschnitt erlaubte keine Begehung der südöstlichen Fläche im vorgesehenen Ablauf.

1. Sichtbarer Befund

U-11 zeigte einen trockenen braunen Rand in der angegebenen Lage unterhalb des Bereichs L2. U-12 war schwächer erkennbar. Es wurden keine Bauteile geöffnet und keine Materialfeuchten bestimmt. Die Zuordnung der Deckenstellen zu Dachanschlüssen beruht auf Plan R-12, nicht auf einer geöffneten Konstruktion. Ein Zusammenhang mit L2 ist möglich, aber durch diese Begehung nicht nachgewiesen.

2. Tür und Dokumente

H2 schleifte bei einem Öffnungsversuch an der unteren Führung. Die Stelle entspricht der Beschreibung M-04 aus dem Abnahmeprotokoll. Ein Nachweis früherer Justierung lag nicht vor. Wartungsbericht 2025 wurde gelesen; er enthält keine vollständige Prüfung der Rückseite L2. Für die Augustarbeiten fehlt der Montagebericht.

3. Terminnotiz

Falk wurde am 21.09. telefonisch über den unvollständigen Dachzugang informiert. Sie nannte den 18.10. als organisatorisch möglichen gemeinsamen Termin. Sell hielt fest, dass Dachabnahme und Metallbauabnahme an verschiedenen Tagen im Jahr 2021 erfolgt sind. Diese Niederschrift enthält keine Vereinbarung mit den Unternehmen über Fristen oder Ansprüche. gez. Dora Sell; Anwesenheit bestätigt: gez. Rena Mert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dora Sell, Architektin

Anlagen: keine
