

13_2026-03-20_Rahmentermine.txt

Büro Sander Gebäudeplanung
Quellenstieg 11, 31812 Bad Pyrmont
planung@sander-bau.example

An Wiesenbogen Bildung gGmbH
20.03.2026 / KP-26-02
Rahmentermine zur Variantenberatung

Sehr geehrte Frau Lammers,

die nachfolgenden Termine bilden den Arbeitsstand für die Beratung ab. Es handelt sich nicht um Zusagen von Behörden oder späteren Auftragnehmern. Die Bauzeit ist für beide Varianten bislang mit demselben Rahmen angesetzt.

27.03.2026: vorgesehene Beratung über die Varianten.
31.03.2026: erhoffte schriftliche Auswahlentscheidung.
13.04.2026: frühester Beginn Entwurfsplanung bei Folgeabruf.
15.05.2026: benötigter Baugrundbeitrag für weitere Gründungsannahmen.
29.05.2026: vorgesehener abgestimmter Entwurfsstand.
26.06.2026: angestrebte Zusammenstellung von Antragsunterlagen.
29.06.2026 bis 30.09.2026: zunächst angenommener Verfahrenszeitraum.
01.10.2026 bis 18.12.2026: weitere Planung und Vorbereitung der Vergabe.
11.01.2027 bis 26.02.2027: vorgesehene Vergabezeit.
15.03.2027: angestrebter Baubeginn.
29.10.2027: angenommene bauliche Fertigstellung.
November 2027: Ausstattung, Nachweise und betriebliche Vorbereitung.
01.12.2027: gewünschter Betriebsbeginn.

Die Betreiberin hat für eine mögliche Küchenlieferung noch keinen Auftrag ausgelöst. Ein zusätzlicher Klärungsbedarf für den Lieferzugang oder die obere Gruppe ist nicht mit einer eigenen Dauer eingerechnet. Wird die Variantenentscheidung verschoben, muss der Folgeablauf neu abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Levin Sander
Architekt
Anlagen: keine

Von	"Arne Oertel", Fachplanung <ao@oertel-tga.example>
An	"Levin Sander", Architekt <planung@sander-bau.example>
Datum	Mon, 16 Mar 2026 10:32:00 +0100
Betreff	KP-26-02 / Technikansätze zu V1 und V2

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für die beiden Vorplanungsgeometrien vom 12.03.2026 haben wir die Flächenansätze gesichtet. Für V1 setzen wir für die allgemeinen technischen Anlagen vorläufig 480 EUR netto je m² BGF an, für V2 520 EUR netto je m² BGF. Die Ansätze beziehen sich jeweils auf 864 m² und enthalten Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro als frühe Gesamtannahme.

Die unterschiedlichen Ansätze berücksichtigen bei V2 zusätzliche vertikale Verteilung und die zweite Ebene. Ein Aufzug ist darin nicht enthalten; hierfür verwenden wir einen gesonderten Ansatz von 45.000 EUR netto. Die Ausgabeküche ist in beiden allgemeinen Technikansätzen nicht enthalten. Bitte die Küchengeräte nicht zugleich in unserem Ansatz und in der Ausstattung addieren.

Für die Technikfläche sind in V1 und V2 zunächst jeweils 28 m² nutzbare Fläche vorgesehen. Die Aufstellung der Außeneinheit und eine gegebenenfalls erforderliche Schallbetrachtung sind noch offen. Die östliche Nachbargrenze sollte nicht ohne weitere Abstimmung als Aufstellort festgelegt werden.

Dies ist ein Vorplanungsbeitrag, keine Berechnung der Anlagenleistung. Die angenommene Nutzungszeit und 75 Mahlzeiten täglich stammen aus dem Betreiberprogramm. Bei Änderung der Gruppenzahl oder einer Produktionsküche müssen wir die Ansätze neu betrachten. Eine Geräteübernahme aus der alten Einrichtung haben wir nicht geprüft.

Mit freundlichen Grüßen

Arne Oertel, Fachplanung
Ingenieurbüro Oertel Haustechnik
Talwiese 4 · 31855 Aerzen
ao@oertel-tga.example

14_2026-03-23_Betreiberantwort.eml

Von	"Mira Töpel", Einrichtungsleitung <leitung@kinderhaus.example>
An	"Edda Lammers", Geschäftsführung <bau@wiesenbogen.example>
Datum	Mon, 23 Mar 2026 10:32:00 +0100
Betreff	KP-26-02 / Keine Küchenübernahme aus dem Altstandort

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Vermieter hat uns heute schriftlich mitgeteilt, dass sämtliche fest eingebauten Küchengeräte am bisherigen Standort verbleiben. Wir können daher weder Kühlung noch Spültechnik übernehmen. Meine telefonische Vermutung vom 18.03. hat sich nicht bestätigt.

Die Ausgabeküchenleistung brauchen wir in beiden Varianten. Das Angebot KR 260320 über 48.000 EUR netto beschreibt den von uns besprochenen Geräteumfang. Die Anschlüsse müssen nach der Angebotsbeschreibung zusätzlich in der Haustechnik abgestimmt werden. Eine Produktionsküche wünschen wir weiterhin nicht.

Bei V2 sehen wir außerdem die tägliche Bewegung der oberen Gruppe zum Garten noch nicht gelöst. Die dargestellte Treppe muss betrieblich mit zwei gleichzeitig anwesenden Betreuungspersonen nutzbar organisiert werden. Eine zusätzliche Personalstelle ist im laufenden Budget nicht eingeplant.

Bitte lassen Sie diese Angaben in die Beratung am 27.03. einfließen. Ich habe damit keine Variante ausgewählt und keine Bestellung bei Küchenbau Rieken ausgelöst.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Töpel, Einrichtungsleitung

Kinderhaus Wiesenbogen

Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

leitung@kinderhaus.example

16_2026-03-25_Nachbarschaft.eml

Von	Mara Lindhoff <ml@lindhoff.example>
An	"Edda Lammers", Geschäftsführung <bau@wiesenbogen.example>
Datum	Wed, 25 Mar 2026 10:32:00 +0100
Betreff	KP-26-02 / Anlieferung an der östlichen Grundstücksgrenze

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für die Vorstellung der beiden Skizzen am vergangenen Freitag. Mein Schlafzimmer liegt zur Grenze mit Ihrem Grundstück. Auf der eingeschossigen Skizze war die Anlieferung nahe dieser Grenze eingezeichnet. Ich möchte wissen, zu welchen Uhrzeiten dort Fahrzeuge fahren und ob Kühlaggregate laufen sollen.

Gegen eine Kita auf dem Grundstück habe ich mich in dem Gespräch nicht grundsätzlich ausgesprochen. Ich habe aber auch keiner konkreten Zufahrt oder Aufstellung technischer Geräte zugestimmt. Bitte halten Sie diese beiden Punkte auseinander.

Eine südliche Anlieferung erscheint mir weniger störend. Ob dies mit Ihrem Betrieb möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Bitte informieren Sie mich vor einer endgültigen Festlegung über den vorgesehenen Verlauf. Eine Vereinbarung über die Nutzung meines Grundstücks besteht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Mara Lindhoff

Mara Lindhoff

Wiesenbogen 8 · 31812 Bad Pyrmont


ml@lindhoff.example

11_2026-03-19_Mengenauszug.csv

Stand	Plan	Bezug	Menge	Einheit	Herkunft
19.03.2026	V1-01	Gebäudelänge	36	m	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V1-01	Gebäudebreite	24	m	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V1-01	Geschosse	1	St	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V1-01	BGF	864	m²	36 mal 24
19.03.2026	V1-01	Gruppen	3	St	Betreiberprogr mm
19.03.2026	V1-01	Plätze	75	St	Betreiberprogr mm
19.03.2026	V2-01	Gebäudelänge	24	m	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V2-01	Gebäudebreite	18	m	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V2-01	Geschosse	2	St	Zeichnung 12.03.
19.03.2026	V2-01	BGF	864	m²	24 mal 18 mal 2
19.03.2026	V2-01	Gruppen	3	St	Betreiberprogr mm
19.03.2026	V2-01	Plätze	75	St	Betreiberprogr mm
19.03.2026	Beide	Außenfläche bearbeitet	1500	m²	Ansatz Sander
19.03.2026	Beide	Grundstück	3224	m²	62 mal 52 schematisch
19.03.2026	Beide	Mahlzeiten täglich	75	St	Betreiberprogr mm
19.03.2026	Beide	Bearbeitung	Levin Sander		An Wiesenbogen Bildung gGmbH

Kita Wiesenbogen

Grundstück und räumliche Randbedingungen

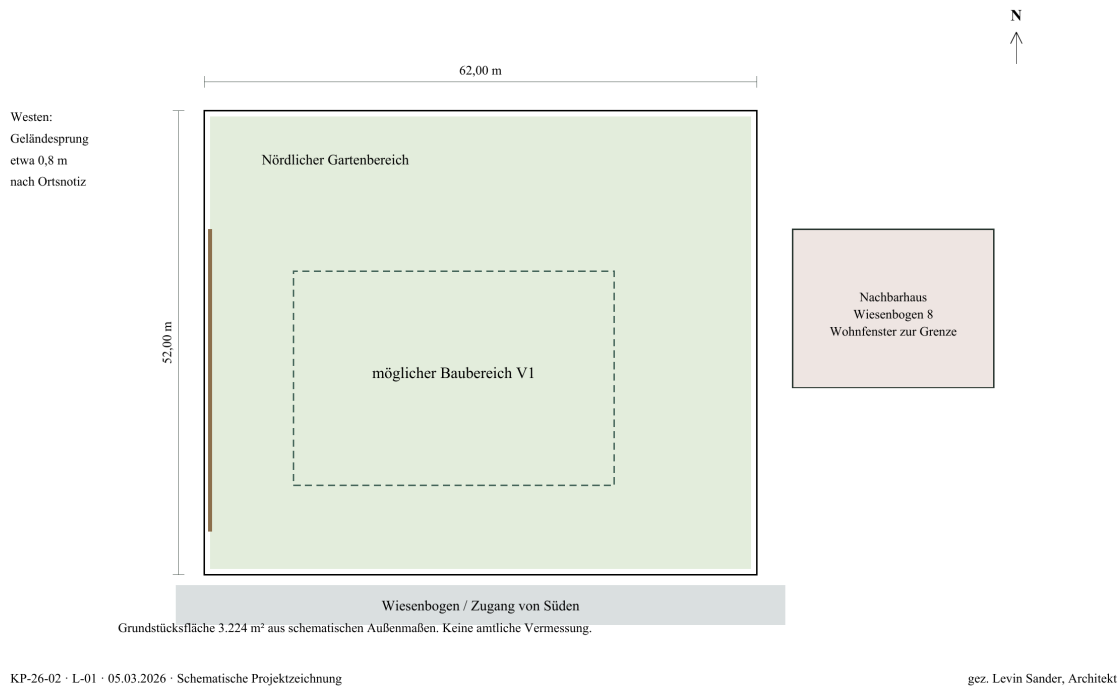

Bilddatei: 03_2026-03-05_Grundstuecksskizze.png

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

10_2026-03-19_Kostenschaetzung.xlsx

Kita Wiesenbogen Kostenschätzung

Büro Sander · an Wiesenbogen Bildung · 19.03.2026 · KP-26-02

Projektbestandteil	Menge	Einheit	V1 Ansatz EUR	V1 netto EUR	V2 Ansatz EUR	V2 netto EUR
Baukonstruktion	864	m² BGF	1.650,00	1.425.600,00	1.580,00	1.365.120,00
Technik ohne Küche	864	m² BGF	480,00	414.720,00	520,00	449.280,00
Aufzug	1	psch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Ausgabeküche	1	psch	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Außenanlagen	1500	m²	95,00	142.500,00	95,00	142.500,00
Lose Ausstattung	1	psch	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Planung und Nebenkosten	1	psch	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Herrichten und Anschlüsse	1	psch	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Summe netto				2.493.820,00		2.464.900,00
Umsatzsteuer	19%			473.825,80		468.331,00
Kosten brutto				2.967.645,80		2.933.231,00
Reserve brutto				200.000,00		200.000,00
Mit Reserve brutto				3.167.645,80		3.133.231,00
Finanzrahmen brutto				3.200.000,00		3.200.000,00
Abstand zum Rahmen				32.354,20		66.769,00

V1 eingeschossig, V2 zweigeschossig. Je 864 m² BGF, 75 Plätze. Grundstück vorhanden, nicht enthalten.

Preisstand März 2026. Bau- und Technikansätze: Sander / Oertel 16.03.; keine Unternehmerpreise.

V2 Küche: Ansatz 0 nach Telefonnotiz 18.03., Betreiberbestand angenommen. Schriftliche Antwort fehlt.

Nebenkosten sind ein Planungsansatz einschließlich Honoraren und steuerpflichtiger Untersuchungen.

Gebühren: außerhalb dieser Summe noch ohne Ansatz. Reserve nicht als erteilter Auftrag zu verstehen.

gez. Levin Sander · Planbezug V1-01 / V2-01 vom 12.03.2026 · interne Kostengliederung.

02_2026-03-04_Betreiberprogramm.docx

Kinderhaus Wiesenbogen

Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont
leitung@kinderhaus.example

Büro Sander Gebäudeplanung
Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont
Bad Pyrmont, 04.03.2026 · KP-26-02

Betriebsangaben für drei Kindergartengruppen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für die Vorplanung bestätige ich nach unserer Besprechung mit Frau Lammers drei Gruppen mit jeweils 25 Kindern ab drei Jahren. Die Öffnungszeit soll montags bis freitags von 07:00 bis 16:30 Uhr sein. Wir rechnen mit 75 ausgegebenen Mittagessen und einer zeitversetzten Nutzung des gemeinsamen Mehrzweckraums.

1. Räumliche Angaben

Nutzung	Anzahl	Gewünschte nutzbare Fläche
Gruppenraum	3	je 60 m ²
Gruppennebenraum	3	je 20 m ²
Mehrzweckraum	1	60 m ²
Ausgabeküche mit Lager	1	40 m ²
Leitung und Besprechung	2	zusammen 32 m ²
Personalraum	1	24 m ²
Sanitär und Pflege	3 Bereiche	zusammen 54 m ²
Material und Reinigung	mehrere	zusammen 30 m ²

Die Angaben sind betriebliche Wünsche aus unserer jetzigen Einrichtung. Verkehrs-, Konstruktions- und Technikflächen sind darin nicht enthalten. Die Tabelle ist keine Flächenvorgabe einer Behörde und keine technische Normprüfung.

2. Wege und Außenraum

Jede Gruppe soll einen gut auffindbaren Weg zum Außenspielbereich erhalten. Bei der zweigeschossigen Variante möchten wir wissen, wie Kinder und Personal den Wechsel zwischen Obergeschoss und Garten organisieren können. Ein Aufzug ersetzt in unserem Betrieb nicht die Aufsicht auf den Wegen. Die Essensanlieferung soll möglichst nicht durch die Garderobe laufen.

Für Fahrräder und Kinderwagen benötigen wir einen überdachten Bereich nahe dem Eingang. Eltern sollen das Gelände zu Fuß von Süden erreichen. Auf dem östlichen Nachbargrundstück liegen Wohnräume; ein Anlieferpunkt unmittelbar an dieser Grenze ist deshalb für uns nicht die erste Wahl.

3. Ausstattung

Wir prüfen noch, ob die Küchengeräte aus der bisherigen Einrichtung übernommen werden dürfen. Sie gehören nicht unserer Betriebsgesellschaft, sondern dem bisherigen Vermieter. Eine Zusage liegt nicht vor. Die geplante Küche soll angelieferte Speisen annehmen, warmhalten und ausgeben; eigenes Kochen ist nicht vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Mira Töpel, Einrichtungsleitung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

06_2026-03-13_Vorplanungserlaeuterung.docx

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont
planung@sander-bau.example

Wiesenbogen Bildung gGmbH
Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 13.03.2026 · KP-26-02

Erläuterung der Vorplanungsstände V1 und V2

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Pläne V1-01 und V2-01 vom 12.03.2026 zeigen zwei Gebäudeorganisationen für dasselbe dreigruppige Programm. Beide Varianten haben in der äußeren Flächenbetrachtung 864 m² Bruttogrundfläche. Die Raumzonen der Zeichnungen enthalten konstruktive und verteilende Anteile; sie sind nicht mit den gewünschten nutzbaren Raumflächen gleichzusetzen.

1. Eingeschossige Variante V1

V1 hat einen Baukörper von 36,00 mal 24,00 m. Die drei Gruppen liegen nebeneinander an der Nordseite. Der gemeinsame Flur trennt diese Zone von Mehrzweckraum, Verwaltung, Küche und Nebenbereichen im Süden. Die Gruppen können den nördlichen Garten ohne Geschosswechsel erreichen. Der Hauptzugang liegt südlich, die Küchenanlieferung ist zunächst an der Südostecke vorgesehen.

Die große Grundfläche beansprucht mehr zusammenhängende Grundstücksfläche. Die verbleibenden Außenräume liegen überwiegend nördlich und westlich. Der Anschluss an den westlichen Geländesprung ist noch mit der Außenplanung zu besprechen. Im Flächenansatz sind 1.500 m² bearbeitete Außenfläche vorgesehen, nicht die gesamte Grundstücksfläche.

2. Zweigeschossige Variante V2

V2 hat je Geschoss 24,00 mal 18,00 m. Zwei Gruppen liegen im Erdgeschoss und eine Gruppe im Obergeschoss. Der Aufzug und die Haupttreppe liegen an der Südseite. Ein zweiter Treppenbereich ist im Nordosten als räumlicher Ansatz dargestellt; dessen Ausbildung ist fachlich noch nicht abgestimmt. Das Obergeschoss enthält außerdem Personal- und Mehrzweckbereiche.

Die kleinere Gebäudegrundfläche lässt einen größeren zusammenhängenden Garten zu. Dafür entstehen Geschosswechsel im täglichen Betrieb. Die gemeinsame Küchenfläche liegt im Erdgeschoss. Ob Geräte aus dem Altstandort übernommen werden können, wird durch die Betreiberin geprüft; eine Bestätigung liegt noch nicht vor.

3. Weitere Beiträge

Die Fachbüros haben diese Geometrien erhalten. Technikbeitrag und Tragwerkskonzept stehen noch aus; eine Bemessung ist damit nicht verbunden. Das Vorgespräch zur Genehmigungsfähigkeit ist für den 18.03. vorgesehen. Eine förmliche Voranfrage wurde nicht gestellt. Die Kostenschätzung soll auf dem Preisstand März 2026 folgen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Levin Sander, Architekt

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

09_2026-03-18_Gespraechsvermerk.docx

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont
planung@sander-bau.example

Wiesenbogen Bildung gGmbH
Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 18.03.2026 · KP-26-02

Vermerk zum Vorgespräch über die Kita Planung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 18.03.2026 von 10:00 bis 10:35 Uhr führte Levin Sander ein telefonisches Vorgespräch mit der für das Grundstück angesprochenen Bauaufsicht. Frau Edda Lammers nahm ab 10:10 Uhr teil. Besprochen wurden die als V1-01 und V2-01 bezeichneten Vorplanungsstände vom 12.03.2026. Dieser Vermerk gibt die Notizen des Planungsbüros wieder.

Die Ansprechperson hielt eine Prüfung beider Baukörper grundsätzlich für möglich. Sie verwies auf die noch zu klärende Erschließung, den Geländeverlauf und die Abstimmung der besonderen Nutzung. Für eine belastbare Aussage sollten Lage, Höhen und Zufahrt in geeigneten Unterlagen dargestellt werden. Eine abschließende Aussage zur Zweigeschossigkeit wurde nicht getroffen.

Zum östlichen Lieferzugang wurde auf die angrenzende Wohnnutzung hingewiesen. Eine konkrete immissionsrechtliche Bewertung war nicht Gegenstand des Gesprächs. Das Büro sagte zu, zunächst mit der Betreiberin die Lieferzeiten und die Möglichkeit eines südlichen Zugangs zu besprechen.

Eine förmliche Bauvoranfrage wurde weder vorbereitet noch eingereicht. Es wurde kein Vorbescheid erteilt und keine Genehmigung zugesagt. Der Gesprächsstand soll der Variantenberatung dienen. Für ein förmliches Verfahren wären gesonderte Unterlagen und ein entsprechender Auftrag erforderlich.

Frau Lammers bat darum, beide Varianten bis zur Sitzung am 27.03. weiter gegenüberzustellen. Die mündliche Äußerung zum grundsätzlich möglichen Prüfweg soll nicht als Freigabe in einer Investitionsvorlage bezeichnet werden. Weitere Gesprächsunterlagen wurden nicht übergeben.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Levin Sander, Architekt

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

01_2026-03-02_Planungsabruf.pdf

Wiesenbogen Bildung gGmbH

Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

bau@wiesenbogen.example

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 02.03.2026 · KP-26-02

Abruf der Vorplanung für die Kita Wiesenbogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Grundlage unseres Rahmenvertrags vom 12.01.2026 rufen wir die Vorplanung für das Gebäude der Kita Wiesenbogen ab. Der Standort Wiesenbogen 6 in Bad Pyrmont bleibt gesetzt. Auftraggeberin ist die Wiesenbogen Bildung gGmbH; die Einrichtung wird durch unsere eigene Betriebsgesellschaft geführt.

1. Aufgabe und Ergebnisse

Zu untersuchen sind eine eingeschossige Lösung V1 und eine kompakte zweigeschossige Lösung V2 mit jeweils drei Gruppen und insgesamt 75 Plätzen für Kinder ab drei Jahren. Grundlage sind die abgestimmten Nutzerangaben vom 04.03.2026, soweit diese den hier genannten Umfang nicht erweitern. Vorzulegen sind gezeichnete Varianten, eine Erläuterung der funktionalen Unterschiede, Kostenschätzung und ein Terminplan mit wesentlichen Vorgängen.

Beide Varianten sollen dieselbe Ausgabeküchenleistung für täglich bis zu 75 Mahlzeiten ermöglichen. Ob vorhandene Ausstattung übernommen werden kann, klärt die Betreiberin. Ein Neubau einer Produktionsküche und eine vierte Gruppe sind nicht bestellt. Der Außenbereich ist mit seiner Schnittstelle zu den Zugängen zu berücksichtigen; eine vollständige Freianlagenplanung ist nicht Gegenstand dieses Gebäudeabrufs.

2. Vergütung und Grenzen

Für den beschriebenen Vorplanungsumfang sind 24.000 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer vereinbart. Die Beiträge von Tragwerks- und Technikplanung werden durch uns gesondert beauftragt und dem Büro zur Koordination bereitgestellt. Eine förmliche Bauvoranfrage, Fördermittelbeschaffung und Wirtschaftlichkeitsberechnung sind nicht abgerufen. Gespräche über die Genehmigungsfähigkeit sollen dokumentiert werden.

3. Finanzrahmen und Entscheidung

Der derzeitige Finanzrahmen beträgt 3.200.000 EUR brutto einschließlich 200.000 EUR Reserve, Ausstattung und Planung. Grundstückskosten sind nicht enthalten, weil das Grundstück bereits erworben ist. Der Ansatz für Gebühren ist noch festzulegen und darf nicht als zusätzlich gesicherte Finanzierung gelten. Die Variantenentscheidung soll nach Beratung am 27.03.2026 schriftlich erklärt werden.

Die Geschäftsführung entscheidet über die Weiterbearbeitung. Eine fachliche Zustimmung eines Beteiligten ersetzt diesen Beschluss nicht. Der Abruf berechtigt nicht zur Vergabe von Bauleistungen oder zur Einreichung eines förmlichen Antrags. Levin Sander hat den Abruf am 03.03.2026 per E-Mail bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen


gez. Edda Lammers, Geschäftsführung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

04_2026-03-12_V1_Erdgeschoss.pdf

Kita Wiesenbogen


V1 Erdgeschoss / drei Gruppen

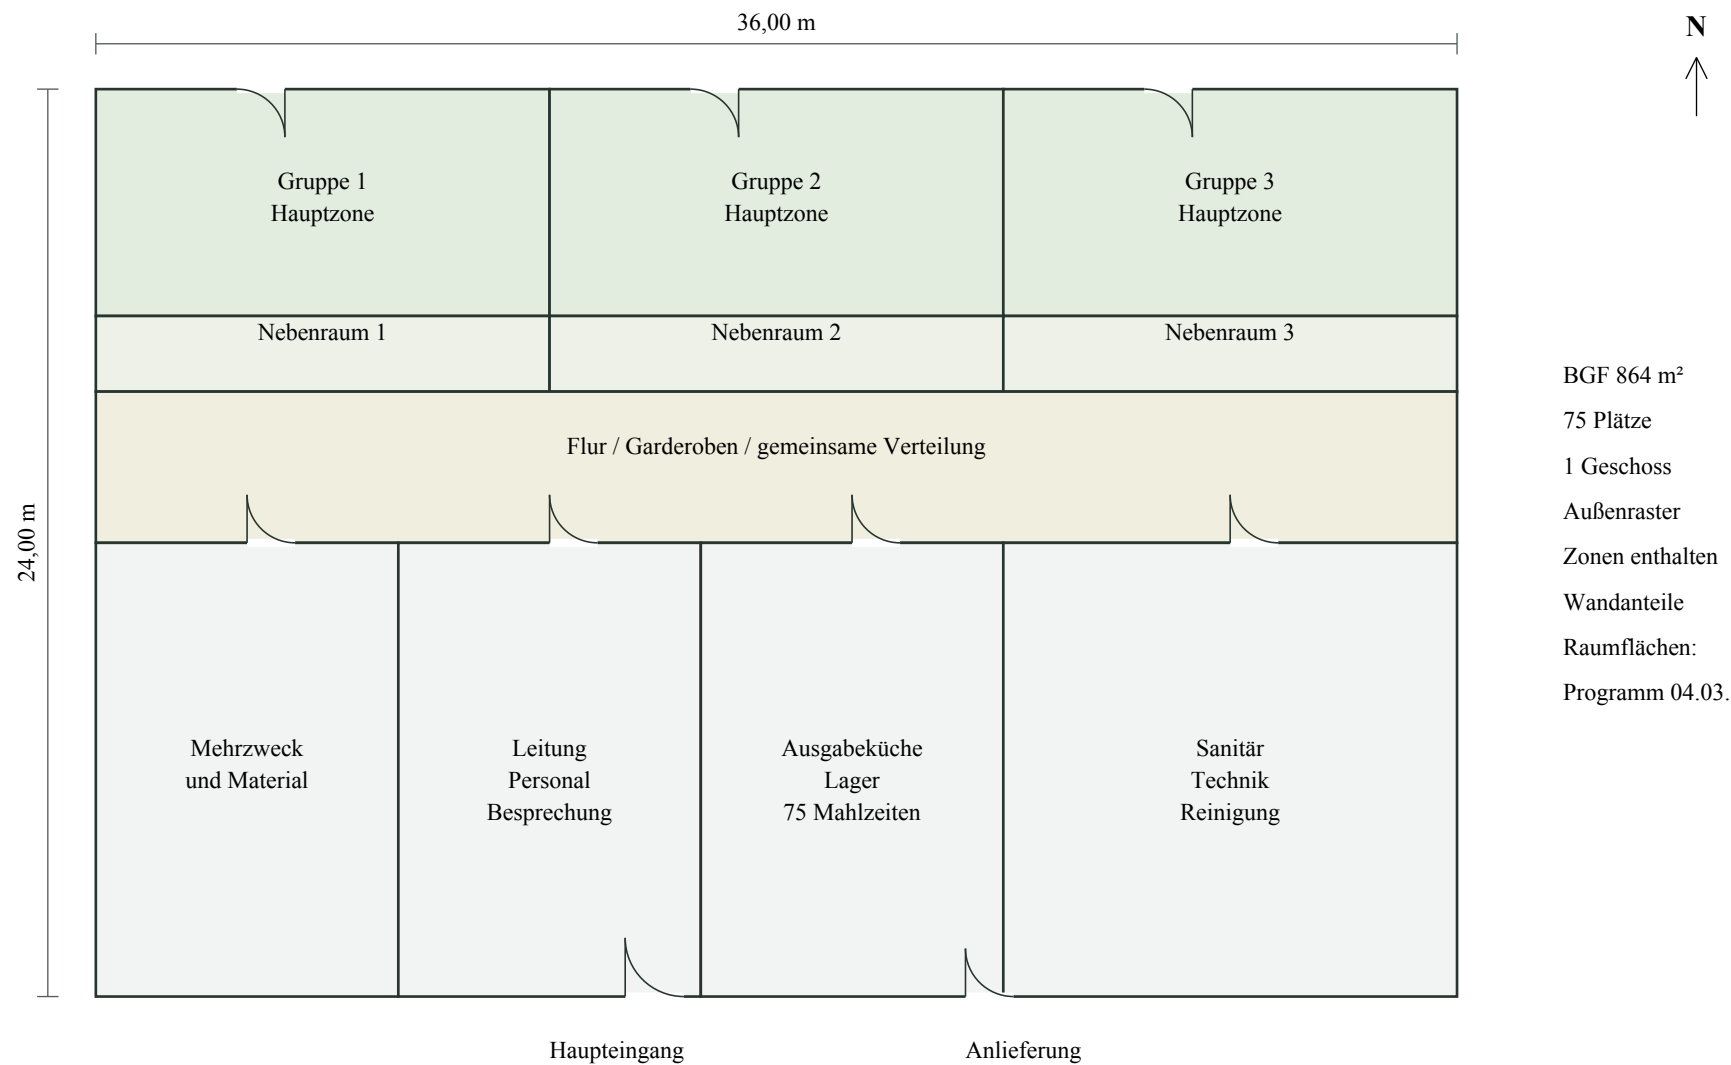

05_2026-03-12_V2_Erdgeschoss_Obergeschoss.pdf


Kita Wiesenbogen

V2 Erdgeschoss / zwei Gruppen

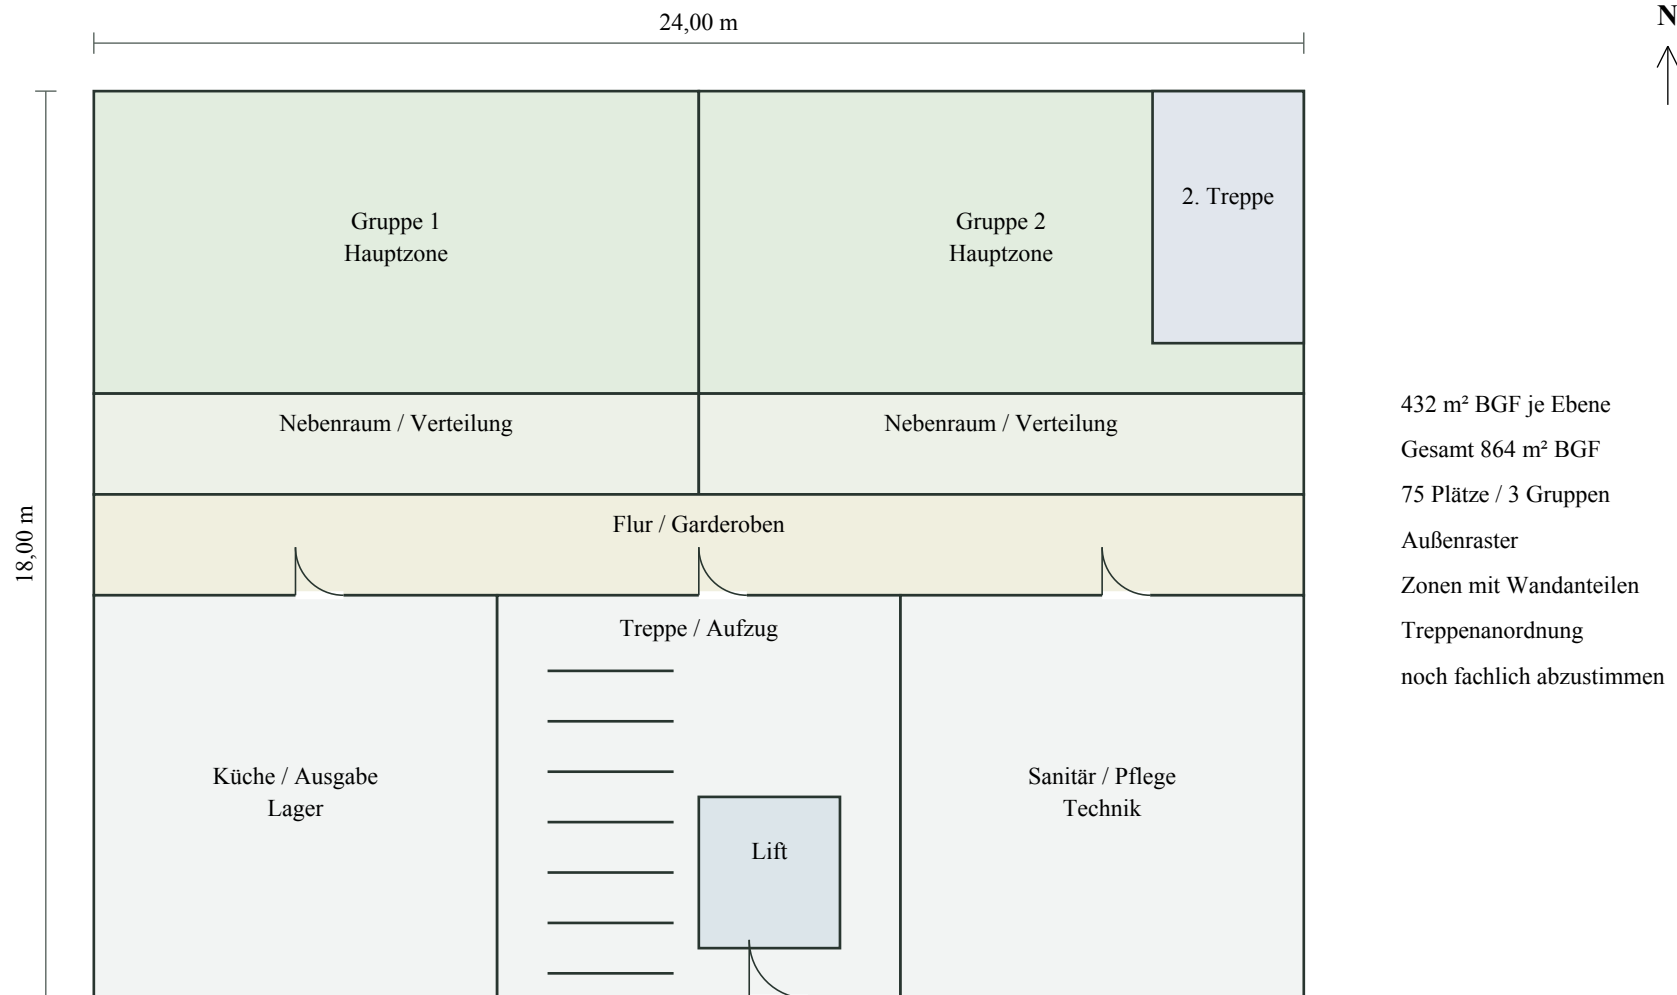

Kita Wiesenbogen

V2 Obergeschoss / eine Gruppe

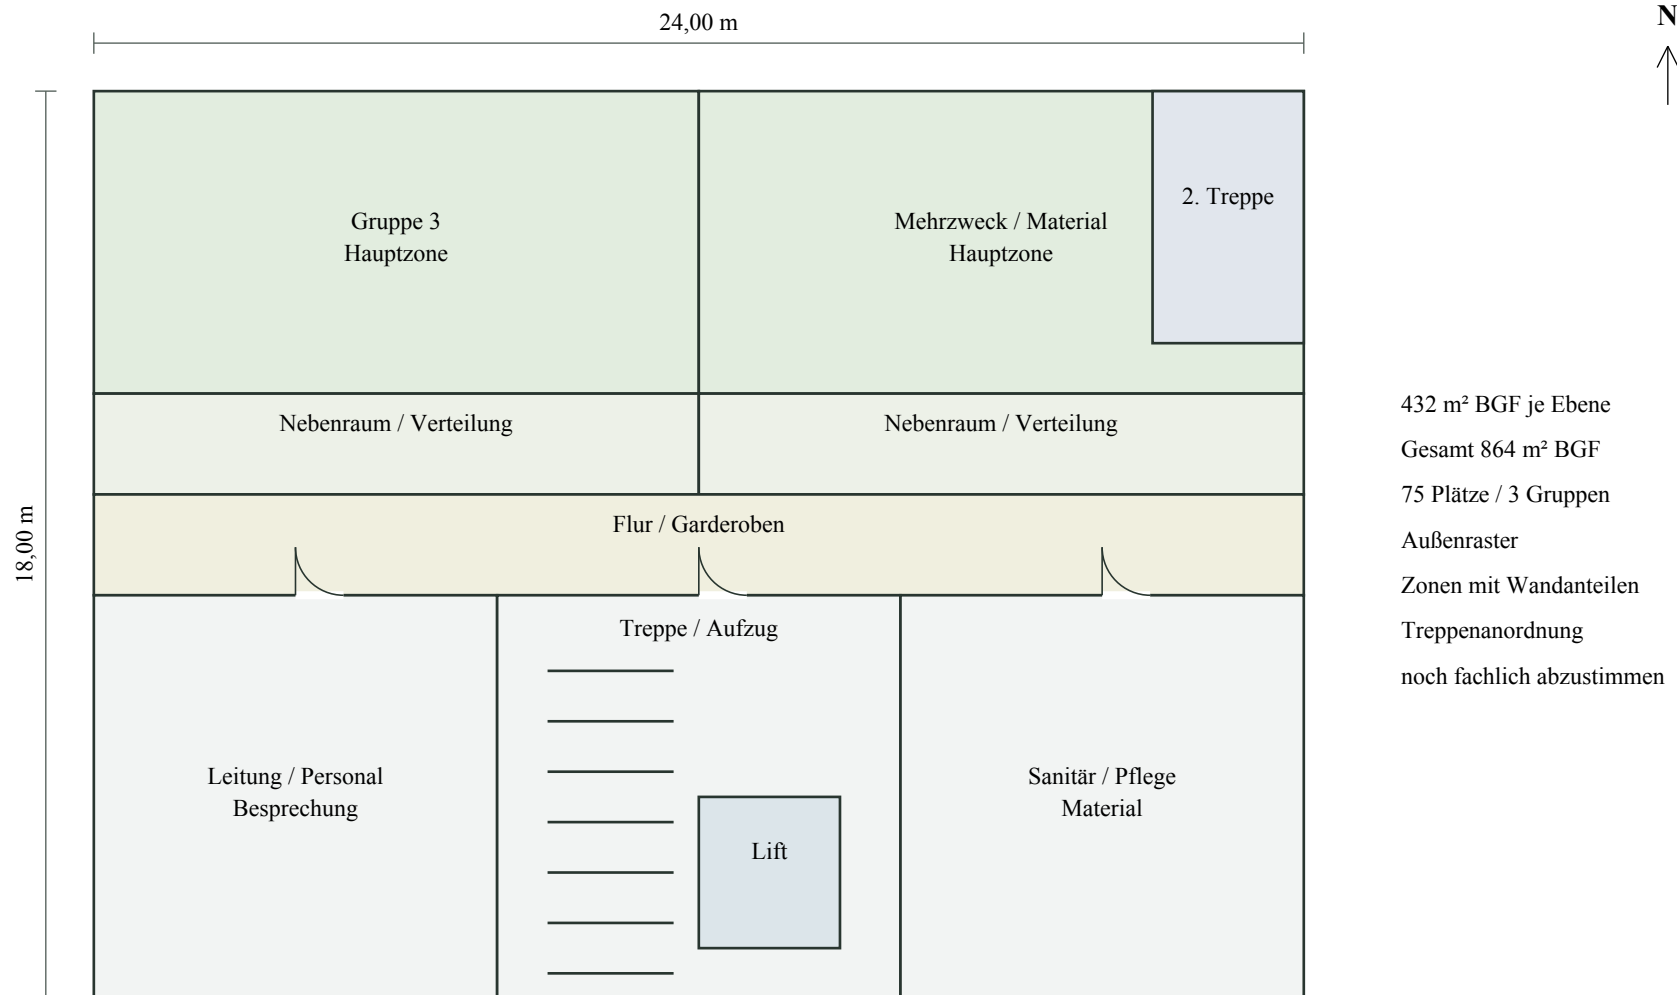

08_2026-03-17_Tragwerkskonzept.pdf

Sanderau Tragwerk

Holzacker 12 · 32676 Lügde
statik@sanderau.example

Büro Sander Gebäudeplanung
Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont
Bad Pyrmont, 17.03.2026 · KP-26-02

Tragwerkskonzept der Vorplanungsvarianten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben die Vorplanungszeichnungen V1-01 und V2-01 vom 12.03.2026 hinsichtlich eines möglichen Tragwerksrasters gesichtet. Die nachfolgenden Angaben sind ein Konzeptbeitrag für die Variantenuntersuchung, keine statische Berechnung und keine Freigabe von Bauteilen.

1. V1

Für den eingeschossigen Baukörper kann ein wiederkehrendes Raster von etwa 6,00 m vorgesehen werden. Die größere Spannweite des Mehrzweckbereichs ist gesondert zu bearbeiten. Der flache Dachaufbau wird zunächst mit einer Holzkonstruktion angenommen. Die in der Zeichnung dargestellten Raumtrennungen sind nicht sämtlich tragend.

2. V2

Für den zweigeschossigen Baukörper sind tragende Linien über beide Ebenen abzustimmen. Der Küchen- und Ausgabebereich im Erdgeschoss liegt unter dem Personal- und Besprechungsbereich. Die offenen Arbeitsbereiche und Raumtrennungen sind mit den tragenden Linien abzugleichen; eine zusätzliche Abfangung kann erforderlich werden. Im derzeitigen Baukostenkennwert ist ein üblicher Ansatz enthalten, jedoch keine detaillierte Mengenermittlung.

Die Schacht- und Treppenbereiche müssen in beiden Ebenen übereinanderliegen. Der zweite Treppenbereich im Nordosten ist räumlich vorgesehen, seine bauliche Ausbildung jedoch noch nicht abgestimmt. Die Darstellung ist kein Nachweis einer Rettungswegführung. Bitte vor einer Festlegung den Brandschutzbeitrag einbeziehen.

3. Baugrund

Uns liegt kein Baugrundbericht vor. Gründung und Umgang mit dem Geländesprung im Westen sind deshalb nur vorläufig berücksichtigt. Wir empfehlen, die für die Gründungsentscheidung erforderlichen Angaben rechtzeitig bereitzustellen. Eine Bodenverbesserung ist in diesem Schreiben weder bemessen noch bepreist. Beide Varianten sind unter demselben derzeitigen Erkenntnisstand zu vergleichen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Fenja Sanderau, Tragwerksplanung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

12_2026-03-20_Kuechenangebot.pdf

Küchenbau Rieken GmbH

Werkhof 3 · 31860 Emmerthal
angebot@rieken-kueche.example

Wiesenbogen Bildung gGmbH
Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont
Bad Pyrmont, 20.03.2026 · KP-26-02

Angebot KR 260320 Ausgabeküche

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Ihre Anfrage bieten wir die Ausstattung einer Ausgabeküche für angelieferte Speisen und bis zu 75 Mahlzeiten täglich an. Grundlage ist die im Betreiberprogramm vom 04.03.2026 genannte Betriebsweise. Eine Produktionsküche mit Kochlinie ist nicht enthalten.

Bestandteil	Netto EUR
Kühlung und Warenannahme	8.400,00
Warmhaltung und Ausgabe	11.600,00
Spültechnik	9.800,00
Edelstahlmöbel und Arbeitstische	10.200,00
Montage und Einweisung	8.000,00
Summe netto	48.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	9.120,00
Gesamt brutto	57.120,00

Bauseitige Elektro-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie raumlufttechnische Einrichtungen sind nicht Bestandteil dieses Geräteangebots. Ihre Fachplanung erhält nach Beauftragung die gerätebezogenen Anschlusswerte. Der Raum muss vor Montage fertiggestellt und zugänglich sein.

Die angebotene Geräteleistung ist für V1 und V2 gleich. Transportwege und Einbringung sind anhand der späteren Planung zu bestätigen. Die Lieferung erfolgt nach endgültiger technischer Abstimmung voraussichtlich innerhalb von 14 Wochen. Das Angebot gilt bis 30.04.2026.

Gebrauchtgeräte aus der bisherigen Einrichtung wurden von uns nicht besichtigt und sind nicht Gegenstand des Angebots. Eine Verrechnung oder Übernahme ist nicht vereinbart. Ein Auftrag liegt uns noch nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lutz Rieken, Vertrieb

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.

15_2026-03-24_Finanzausschuss.pdf

Wiesenbogen Bildung gGmbH

Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

bau@wiesenbogen.example

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 24.03.2026 · KP-26-02

Beratungsstand des Finanzausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Finanzausschuss hat am 24.03.2026 die Kostenschätzung vom 19.03. zur Kenntnis genommen. Der Gesamtfinanzrahmen von 3.200.000 EUR brutto bleibt unverändert. Darin sollen die vorgesehene Reserve und die noch zu bestimmenden Gebühren Platz finden. Eine zusätzliche Finanzierung wurde nicht beschlossen.

Die ursprünglich notierte Geräteübernahme bei V2 ist nach der Betreiberantwort vom 23.03. nicht möglich. Der Ausschuss hat das Küchenangebot noch nicht in einer neuen Kostentabelle vorliegen. Er bittet um Erläuterung, ob die vorhandenen Ansätze dieselbe Küchenleistung und dieselben Anschlussleistungen enthalten.

Für die Entscheidung sind uns neben den Investitionskosten die tägliche Betriebsorganisation und die verbleibende Gartenfläche wichtig. Es wurde keine Punktegewichtung beschlossen. Die Geschäftsführung möchte keine Variante allein anhand des bislang niedrigeren Tabellenbetrags auswählen.

Die Sitzung am 27.03. bleibt vorgesehen. Bis dahin wird kein Bauauftrag und kein förmlicher Antrag ausgelöst. Die Geschäftsführung hat beide Vorplanungsstände lediglich zur Beratung entgegengenommen; eine Freigabe zur Entwurfsplanung liegt noch nicht vor.

Teilgenommen haben Edda Lammers, Arvid Mollen und Daria Wessel. Der vorliegende Vermerk wurde am 24.03. um 17:20 Uhr durch Edda Lammers bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Edda Lammers, Geschäftsführung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.
