

Wohnhof Am Steinbogen in Hildesheim

Acht Mietwohnungen · Projekt SW-HI-26-08 · Projektunterlagen Oktober 2026 bis 5. Oktober 2033

Dokumentenregister mit 198 Originaldateien. Die Dateien sind nach ihrer stabilen Aktennummer angeordnet. Die Originale behalten ihre eigenen Datierungen.

Datei	Seiten
001_Projektauftrag_Wohnhof.pdf	1
002_Bedarfsprogramm_und_Planungsziele.docx	1
003_Architektenvertrag_mit_Stufenabruf.docx	3
004_Ortsbesichtigung_Grundlagen.pdf	1
005_Lageplan_LP01.pdf	2
006_Baugrund_und_Versickerungsbefund.pdf	1
007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx	1
008_Variantenfreigabe_und_Abruf.eml	1
009_Besprechung_Bauaufsicht_Entwurfsstand.pdf	1
010_Entwurfsbeschreibung_Stand_Maerz.docx	1
011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf	2
012_Grundriss_2OG_GP02.pdf	1
013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf	1
014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx	1
015_Fachplanerkoordination_Entwurf.docx	1
016_Energie_und_Entwaesserungskonzept.pdf	1
017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx	1
018_Bauantrag_Begleitschreiben.docx	1
019_Baubeschreibung.docx	1
020_Nachforderung_Bauaufsicht.pdf	1
021_Antwort_Nachforderung.docx	1
022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf	2
023_Abruf_LPH5_bis7.eml	1
024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf	1
025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx	1
026_Freigabe_Details_mit_Rueckfrage.eml	1
027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf	1
028_Flaechen_Abstaende_Aussenanlagen.pdf	1
029_Abschluss_Ausfuehrungsplanung.docx	1
030_Vergabeterminplan.docx	1
031_Leistungsverzeichnis_sieben_Lose.docx	5
032_Angebot_rohbau.pdf	1

Datei	Seiten
033_Vergleichsangebot_Rohbau.pdf	1
034_Angebot_huelle.pdf	1
035_Angebot_hls.pdf	1
036_Angebot_elektro.pdf	1
037_Angebot_ausbau.pdf	1
038_Angebot_aufzug.pdf	1
039_Angebot_aussen.pdf	1
040_Vergabevermerk.docx	1
041_Direktmandat_Vertragsgestaltung.eml	1
042_Bauvertrag_rohbau.docx	2
043_Bauvertrag_huelle.docx	2
044_Bauvertrag_hls.docx	2
045_Bauvertrag_elektro.docx	2
046_Bauvertrag_ausbau.docx	2
047_Bauvertrag_aufzug.docx	2
048_Bauvertrag_aussen.docx	2
049_Bauzeitenplan.csv	1
050_Bautagebuch.csv	4
051_Baubesprechung_Bodenbefund.docx	1
052_Behinderungsanzeige_Rohbau.eml	1
053_Nachtragsangebot_Filterpackung.pdf	1
054_Nachtragsauftrag_01.eml	1
055_Gemeinsames_Aufmass_Nachtrag.pdf	1
056_Gesamtinbetriebnahme_Technik.pdf	1
057_Maengelanzeige_vor_Abnahme.pdf	1
058_Nachbesserungsstand.eml	1
059_Foermliche_Abnahmen.docx	2
060_Uebergabe_Gebaeudeunterlagen.pdf	1
061_Auflagen_und_Schlussunterlagen.pdf	1
062_Betrieb_und_Wartungsplan.pdf	1
063_Feuchtemeldung_Wohnung05.eml	1
064_Objektbegehung_Feuchte.docx	1
065_Rueckmeldung_Fensteranschluss.eml	1
066_Vorfristbegehung_2033.pdf	1
067_Rueckgabe_Rohbausicherheit.docx	1
068_Abschluss_Objektbetreuung.pdf	1
069_Dokumentenregister.txt	4

Datei	Seiten
070_Kaufpreisfaelligkeit_Grundstueck.pdf	1
071_Grunderwerbsteuerbescheid.pdf	1
072_Notarkosten_Schlussberechnung.pdf	2
073_Grundbuch_Kostenrechnung.pdf	1
074_Maklerrechnung.pdf	1
075_Baugenehmigung_Kostenbescheid.pdf	1
076_Bauversicherung_Betragsrechnung.pdf	1
077_Bank_Finanzierungsentgelt.pdf	1
078_Bank_Zinsabrechnung_2027.pdf	1
079_Bank_Zinsabrechnung_2028.pdf	1
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4.pdf	1
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4_XRechnung.xml	4
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7.pdf	1
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7_XRechnung.xml	4
082_Architekt_Rechnung_LPH8.pdf	1
082_Architekt_Rechnung_LPH8_XRechnung.xml	3
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf	1
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9_XRechnung.xml	6
084_TGA_Planungsrechnung.pdf	1
084_TGA_Planungsrechnung_XRechnung.xml	4
085_TGA_Schlussrechnung.pdf	1
085_TGA_Schlussrechnung_XRechnung.xml	5
086_Tragwerk_Schlussrechnung.pdf	1
086_Tragwerk_Schlussrechnung_XRechnung.xml	4
087_Vermessung_Schlussrechnung.pdf	1
087_Vermessung_Schlussrechnung_XRechnung.xml	4
088_Baugrund_Rechnung.pdf	1
088_Baugrund_Rechnung_XRechnung.xml	3
089_Energie_Rechnung.pdf	1
089_Energie_Rechnung_XRechnung.xml	3
090_Brandschutz_Rechnung.pdf	1
090_Brandschutz_Rechnung_XRechnung.xml	3
091_Rohbau_Abschlag1.pdf	1
091_Rohbau_Abschlag1_XRechnung.xml	4
092_Rohbau_Abschlag2.pdf	1
092_Rohbau_Abschlag2_XRechnung.xml	4
093_Rohbau_Schlussrechnung.pdf	1

Datei	Seiten
093_Rohbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml	6
094_Gebaeudehuelle_Abschlag.pdf	1
094_Gebaeudehuelle_Abschlag_XRechnung.xml	3
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung.pdf	1
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung_XRechnung.xml	4
096_HLS_Abschlag.pdf	1
096_HLS_Abschlag_XRechnung.xml	4
097_HLS_Schlussrechnung.pdf	1
097_HLS_Schlussrechnung_XRechnung.xml	5
098_Elektro_Abschlag.pdf	1
098_Elektro_Abschlag_XRechnung.xml	3
099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf	1
099_Elektro_PV_Schlussrechnung_XRechnung.xml	5
100_Innenausbau_Abschlag.pdf	1
100_Innenausbau_Abschlag_XRechnung.xml	3
101_Innenausbau_Schlussrechnung.pdf	1
101_Innenausbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml	5
102_Aufzug_Schlussrechnung.pdf	1
102_Aufzug_Schlussrechnung_XRechnung.xml	4
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung.pdf	1
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung_XRechnung.xml	4
104_Hausanschluesse_Rechnung.pdf	1
104_Hausanschluesse_Rechnung_XRechnung.xml	4
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung.pdf	1
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung_XRechnung.xml	4
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf	1
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur_XRechnung.xml	3
107_Darlehensvereinbarung.docx	2
108_Eigenkapital_und_Vermietungsannahmen.docx	2
109_Projektkonto_2026.pdf	1
110_Projektkonto_2027.pdf	2
111_Projektkonto_2028.pdf	2
112_Projektkonto_2033.pdf	1
113_Rueckfrage_Elektrozahlung.eml	1
114_Elektro_Rueckzahlung.eml	1
115_Innenausbau_Belagsvereinbarung.eml	1
116_Projektabschluss_Zahlungsstand.eml	1

Datei	Seiten
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz.pdf	1
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz_XRechnung.xml	3
120_Kostenentwicklung.xlsx	4
121_Rechnungen_und_Zahlungen.xlsx	10
122_Finanzierung_und_Vermietung.xlsx	8
130_Mietvertrag_WE01.docx	2
131_Mietvertrag_WE02.docx	2
132_Mietvertrag_WE03.docx	2
133_Mietvertrag_WE04.docx	2
134_Mietvertrag_WE05.docx	2
135_Mietvertrag_WE06.docx	2
136_Mietvertrag_WE07.docx	2
137_Mietvertrag_WE08.docx	2
138_Uebergabe_WE01.pdf	1
139_Uebergabe_WE02.pdf	1
140_Uebergabe_WE03.pdf	1
141_Uebergabe_WE04.pdf	1
142_Uebergabe_WE05.pdf	1
143_Uebergabe_WE06.pdf	1
144_Uebergabe_WE07.pdf	1
145_Uebergabe_WE08.pdf	1
146_Maengelbuergschaft_Rohbau.pdf	1
147_Belagsvereinbarung_Wohnung07.docx	1
148_Fertigstellungsmitteilung.docx	1
149_Grundstueckskaufvertrag_UVZ_118_2026.pdf	4
150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf	1
151_Planstandportal_2027-09-24.png	1
152_Bauleiterchat_2028-02-02.png	1
153_Abnahme_Architektenleistungen.docx	1
154_Vorvertragliche_Auskunft_WE01.eml	1
155_Vorvertragliche_Auskunft_WE02.eml	1
156_Vorvertragliche_Auskunft_WE03.eml	1
157_Vorvertragliche_Auskunft_WE04.eml	1
158_Vorvertragliche_Auskunft_WE05.eml	1
159_Vorvertragliche_Auskunft_WE06.eml	1
160_Vorvertragliche_Auskunft_WE07.eml	1
161_Vorvertragliche_Auskunft_WE08.eml	1

Datei	Seiten
162_Energie_Ergebnisbericht.pdf	1
163_HLS_Einstellung_und_Pruefung.pdf	2
164_Lueftung_Messblatt.pdf	1
165_Elektro_Pruefbericht.pdf	3
166_PV_Ladepunkte_Inbetriebnahme.pdf	1
167_Aufzug_Pruefbescheinigung.pdf	1
168_Wartungsvereinbarung_Technik.pdf	1
169_Zaehlerregister_Bezug.csv	1
170_Grundschuldbestellung_UVZ_139_2026.pdf	3
171_Freistellung_48b_rohbau.pdf	1
172_Freistellung_48b_huelle.pdf	1
173_Freistellung_48b_hls.pdf	1
174_Freistellung_48b_elektro.pdf	1
175_Freistellung_48b_ausbau.pdf	1
176_Freistellung_48b_aufzug.pdf	1
177_Freistellung_48b_aussen.pdf	1
178_Freistellung_48b_versorger.pdf	1
179_Freistellung_Abfrage_und_Gueltingkeitsprotokoll.pdf	4

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 05.10.2026

Projektauftrag Wohnhof Am Steinbogen

Wir beauftragen Sie mit der Vorbereitung unseres Neubaus mit acht dauerhaft zu vermietenden Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Steinbogen Wohnen GmbH hält das 1.300 m² große Grundstück für dieses Vorhaben bereit. Eine Aufteilung und ein Verkauf von Eigentumswohnungen sind nicht vorgesehen. Die Planung beginnt am 5. Oktober 2026; die Übergabe zur Vermietung streben wir für September 2028 an.

1 Wirtschaftlicher Rahmen

Die Investitionsobergrenze beträgt 3.650.000,00 EUR brutto einschließlich Grundstück, Planung, Errichtung, Erwerbsnebenkosten und Finanzierung. Wir rechnen bei der langfristigen Wohnraumvermietung nicht mit einem Vorsteuerabzug. Die Kostendarstellung muss deshalb Bruttobeträge und Umsatzsteuer getrennt zeigen. Fördermittel und eine Bindung an öffentliche Vergabeverfahren sind bislang nicht Bestandteil der Finanzierung. Angebote werden gleichwohl vergleichbar und nachvollziehbar ausgewertet.

2 Nutzungsziel und Entscheidungsweg

Vorgesehen sind insgesamt 600 m² Wohnfläche: sechs Wohnungen in den unteren beiden Geschossen und zwei Wohnungen im obersten Geschoss. Wir wünschen einen Aufzug mit drei Halten, stufenlose Zugänge, einen gemeinschaftlichen Fahrradraum und einen kleinen Spielbereich. Die Wohnungen sollen alltagstauglich für unterschiedliche Altersgruppen nutzbar sein. Nachträgliche Mieterausbauten sollen auf ein Minimum beschränkt bleiben.

Die Geschäftsführung entscheidet über Varianten, Kostenrahmen, wesentliche Materialänderungen und Vergaben. Das Architekturbüro erhält keine Vollmacht, Bauverträge in unserem Namen abzuschließen, Forderungen anzuerkennen oder Abnahmen für uns zu erklären. Freigaben sind mit Planstand, Datum und Kostenfolge zu dokumentieren. Bis zur Unterzeichnung des Architektenvertrags dürfen nur die bereits besprochene Ortsaufnahme und die Klärung des Planungsbedarfs vorbereitet werden.

3 Erste Unterlagen

Bitte legen Sie bis Ende Oktober ein Bedarfsprogramm, einen Terminrahmen und eine Liste der benötigten Fachbeiträge vor. Die Grenzlage, Erschließung und Grundstücksentwässerung sind ausdrücklich zu klären. Eine verbindliche Aussage zur planungsrechtlichen Zulässigkeit liegt uns noch nicht vor. Den bisherigen Nachbarschaftseindruck verstehen wir nicht als Genehmigungszusage.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Bedarfsprogramm für acht Mietwohnungen

Das am 12. Oktober 2026 mit der Bauherrin abgestimmte Programm beschreibt die Anforderungen für den Variantenvergleich. Es ersetzt weder die Bauvorlagen noch die Fachnachweise. Maßgeblich sind ein wirtschaftlicher Betrieb, robuste Materialien und dauerhaft vermietbare Grundrisse.

1 Wohnungen und gemeinschaftliche Flächen

Im Erdgeschoss werden WE 01 mit 68 m², WE 02 mit 75 m² und WE 03 mit 82 m² vorgesehen. Im ersten Obergeschoss wiederholt sich die Größenfolge als WE 04 bis WE 06. Im zweiten Obergeschoss erhalten WE 07 und WE 08 jeweils 75 m². Die Sollsumme beträgt 600 m². Jede Wohnung benötigt einen eigenen Abstellbereich, einen Waschmaschinenplatz und eine nutzbare Küchenzone. Kellerflächen sind ausgeschlossen. Müll, Haustechnik und Fahrräder werden deshalb ebenerdig organisiert.

2 Erreichbarkeit und Barrierefreiheit

Alle acht Wohnungen sind barrierefrei zu planen. WE 01 erhält zusätzlich die für eine rollstuhlgerechte Nutzung notwendigen Bewegungsflächen und Ausstattungsvorbereitungen. Die Bauherrin bestellt den Aufzug unabhängig von einer höhenabhängigen gesetzlichen Aufzugspflicht. Vom gekennzeichneten Stellplatz bis WE 01 und zu den übrigen Wohnungen wird eine stufenlose Wegekette vorgesehen. Türdurchgänge, Bewegungsflächen und lichte Aufzugsmaße sind in der Ausführungsplanung nachzuweisen; die Angabe einer Wohnfläche allein belegt diese Anforderungen nicht.

3 Grundstück und Außenanlagen

Acht Pkw-Stellplätze einschließlich eines barrierefrei nutzbaren Platzes werden freiwillig eingeplant. Für Fahrräder sind 16 gesicherte Bewohnerplätze und vier Besucherplätze vorzusehen. Der Spielbereich erhält 30 m² zusammenhängende Fläche im südöstlichen Garten, abgegrenzt von der Zufahrt. Die Entwässerung darf weder zum Nachbargrundstück noch auf den öffentlichen Gehweg führen. Eine Versickerung ist erst nach Baugrundbewertung festzulegen.

4 Qualität und Betrieb

Wärmepumpe und Photovoltaik werden vorgesehen. Schallschutzstandort und Stromanschluss sind vor Ausschreibung zu prüfen. Zur Übergabe werden Wohnungszähler, Betreiberhandbuch und Wartungsübersicht verlangt.

5 Festgehaltene Zielkonflikte

Eine Vergrößerung der Wohnfläche über 600 m² setzt die erneute Abstimmung von Genehmigung, Kosten und Barrierefreiheit voraus. Größere Balkone werden zurückgestellt. Grundstück und Finanzierung bleiben Teil jeder Investitionsentscheidung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB
Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.10.2026 · SW-HI-26-08

Architektenvertrag Wohnhof Am Steinbogen

Die Steinbogen Wohnen GmbH als Auftraggeberin und das in dieser Urkunde bezeichnete Architekturbüro als Auftragnehmer schließen für den Neubau des Achtfamilienhauses am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim folgenden Vertrag. Beide Parteien handeln unternehmerisch. Der Vertrag wird durch Austausch dieser inhaltlich übereinstimmenden Erklärungen in Textform geschlossen.

1 Gegenstand und Planungsgrundlagen

Der Auftragnehmer übernimmt die Objektplanung Gebäude und Innenräume für acht Mietwohnungen mit insgesamt 600 m² geplanter Wohnfläche, ohne Keller, mit drei oberirdischen Geschossen und einem Aufzug. Der Vertragsumfang orientiert sich an den Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß Anlage 10 Nummer 10.1 HOAI, soweit diese für das bezeichnete Objekt tatsächlich erforderlich und nach Nummer 2 abgerufen sind. Das Bedarfsprogramm vom 12. Oktober 2026 sowie die nachfolgend schriftlich bestätigten Planungsentscheidungen bestimmen die vereinbarten Planungsziele.

Die anfängliche Investitionsobergrenze von 3.650.000,00 EUR brutto umfasst Grundstück, Planung, Errichtung, Erwerbsnebenkosten und Finanzierung. Der Auftragnehmer erfasst die ihm mitgeteilten Kostenanteile, kennzeichnet nicht von ihm fachlich ermittelte Ansätze und meldet absehbare Überschreitungen mit Handlungsoptionen unverzüglich. Er schuldet keine Finanzierungszusage, keinen Vermietungserfolg und keine Garantie für das Preisverhalten der Bauunternehmen.

2 Stufenweise Beauftragung

Mit Abschluss dieses Vertrags werden die Leistungsphasen 1 und 2 verbindlich abgerufen. Die Leistungsphasen 3 und 4 bilden die zweite Stufe; die Leistungsphasen 5 bis 7 bilden die dritte Stufe; die Leistungsphase 8 bildet die vierte und die Leistungsphase 9 die fünfte Stufe. Jeder weitere Abruf erfolgt durch eine Erklärung der Auftraggeberin in Textform. Ein Anspruch auf Abruf weiterer Stufen besteht nicht. Die Auftragnehmerin beginnt eine nicht abgerufene Stufe erst nach dem entsprechenden Abruf. Die Anrede Auftragnehmer in dieser Urkunde bezeichnet das Architekturbüro unabhängig von der jeweils handelnden Person.

Die Bearbeitungsfristen werden bei jedem Abruf anhand des dann bekannten Genehmigungs- und Vergabestands festgelegt. Bereits begonnene beauftragte Leistungen sind sachgerecht abzuschließen oder nach Weisung geordnet zu übergeben. Gesetzliche Kündigungsrechte und die hierfür geltenden Vergütungsfolgen bleiben unberührt.

3 Honorar und Abrechnung

Für sämtliche vollständig erbrachten und abgerufenen Vertragsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 wird ein Pauschalhonorar von 145.000,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer ergibt dies 172.550,00 EUR brutto. Das Pauschalhonorar umfasst übliche Nebenkosten, örtliche Besprechungen und die vereinbarte digitale Planübergabe. Eine gesonderte Nebenkostenpauschale fällt nicht an.

Zur Zuordnung auf die Abrufstufen und für nachvollziehbare Abschlagsrechnungen entfallen 2.900,00 EUR netto auf Leistungsphase 1, 10.150,00 EUR auf Leistungsphase 2, 21.750,00 EUR auf Leistungsphase 3, 4.350,00 EUR auf Leistungsphase 4, 36.250,00 EUR auf Leistungsphase 5, 14.500,00 EUR auf Leistungsphase 6, 5.800,00 EUR auf Leistungsphase 7, 46.400,00 EUR auf Leistungsphase 8 und 2.900,00 EUR auf Leistungsphase 9. Die Verteilung begründet keinen Zahlungsanspruch für nicht erbrachte oder nicht abgerufene Leistungen.

Abschläge dürfen entsprechend dem nachgewiesenen Wert vertragsgemäß erbrachter Leistungen verlangt werden. Jede Rechnung weist Leistungsstand, bereits berechnete Beträge, Umsatzsteuer und eingegangene Zahlungen aus. Eine Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang einer prüffähigen und berechtigten Rechnung wird vereinbart; gesetzlich zwingende Fälligkeitsvoraussetzungen bleiben zu beachten. Die Schlussrechnung setzt die gesetzlich erforderliche Abnahme und eine prüffähige Schlussrechnung voraus. Pauschalhonorar und Stufenteilbeträge ändern sich nicht allein durch eine Veränderung der anrechenbaren Kosten.

4 Fachplanung und zusätzliche Leistungen

Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Baugrunduntersuchung, Vermessung, gesonderte bauphysikalische Nachweise und fachrechtliche Anträge außerhalb der Objektplanung beauftragt die Auftraggeberin unmittelbar. Der Auftragnehmer benennt rechtzeitig den fachlichen Bedarf, koordiniert die vereinbarten Schnittstellen und berücksichtigt freigegebene Fachbeiträge. Die Fachplaner bleiben für ihre eigenen Leistungen verantwortlich.

Besondere Leistungen, zusätzliche Varianten nach abgeschlossener Entscheidung, Änderungen bereits freigegebener Planungsziele und wiederholte Leistungen sind vor ihrer Ausführung nach Gegenstand, zeitlicher Folge und Vergütung in Textform abzustimmen. Eine bloße Teilnahme an einer Besprechung oder der Eingang eines Änderungswunsches gilt nicht als gesonderte Beauftragung. Soweit gesetzliche Änderungs- und Vergütungsregelungen unmittelbar eingreifen, bleiben sie unberührt; die Beteiligten dokumentieren den Anlass und den Leistungsumfang unverzüglich.

5 Mitwirkung und Planfreigaben

Die Auftraggeberin stellt die verfügbaren Grundstücks- und Finanzierungsangaben vollständig zur Verfügung und trifft angeforderte Entscheidungen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist. Der Auftragnehmer benennt die benötigte Entscheidung, den zugehörigen Planstand und die absehbaren Termin- und Kostenfolgen einer Verzögerung. Freigaben der Auftraggeberin ersetzen weder die geschuldete fachliche Prüfung noch behördliche Entscheidungen.

Pläne werden mit eindeutiger Nummer, Revisionsstand und Ausgabedatum übergeben. Überholte Planstände werden in einer Änderungsliste gekennzeichnet. Baustellenfreigaben beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Bauteile und den freigegebenen Umfang; eine noch offene Fachplanung ist ausdrücklich auszuweisen.

6 Vergabe und rechtliche Beratung

Der Auftragnehmer bereitet technische Leistungsbeschreibungen vor, prüft Angebote fachlich und wirtschaftlich und wirkt am Zusammenstellen der Vertragsunterlagen mit. Er verwendet dabei die von der Auftraggeberin rechtlich freigegebenen Vertragsgrundlagen. Er erhält keine Vollmacht zum Abschluss oder zur Änderung von Bauverträgen und keine Vollmacht zur Erklärung der Abnahme, zum Vergleich oder zum Forderungsverzicht.

Eine eigenständige, auf die Interessen der Auftraggeberin zugeschnittene rechtliche Gestaltung streitiger oder risikoverteiler Vertragsklauseln ist nicht als Leistung des Architekturbüros vereinbart. Hierzu beauftragt die Auftraggeberin bei Bedarf unmittelbar eine hierfür befugte Rechtsberatung. Das Architekturbüro liefert die

technischen und wirtschaftlichen Tatsachen und stimmt die Unterlagen mit dieser Beratung ab. Eine technische Freigabe darf nicht als rechtliche Prüfung bezeichnet werden.

7 Abnahme und Dokumentation

Die Abnahme von Bauleistungen erklärt ausschließlich die Auftraggeberin oder eine hierzu im Einzelfall ausdrücklich bevollmächtigte Person. Der Auftragnehmer bereitet im beauftragten Umfang Abnahmen vor, stellt festgestellte Mängel zusammen und dokumentiert die Erledigung. Die Abnahme seiner eigenen Planungs- und Überwachungsleistungen wird von der Bauabnahme getrennt behandelt. Gesetzliche Ansprüche auf Teilabnahme bleiben unberührt.

Die Leistungsphase 9 umfasst die im beauftragten Leistungsbild geschuldete fachliche Bewertung innerhalb der dafür maßgeblichen Zeiträume, die erforderliche Objektbegehung vor Ablauf der einschlägigen Mängelanspruchsfristen und die Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheiten. Eine fortlaufende Überwachung späterer Mängelbeseitigungsarbeiten wird dadurch nicht stillschweigend zusätzlich beauftragt. Die Übergabe erfolgt mit Planverzeichnis, Revisionsunterlagen, Prüfprotokollen, Kontaktdaten der Firmen und einer Fristenübersicht.

8 Schlussbestimmungen

Für Haftung, Mängelrechte, Verjährung und Kündigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit dieser Vertrag keine wirksame speziellere Vereinbarung enthält. Eine pauschale Haftungsfreizeichnung wird nicht vereinbart. Die Auftraggeberin erhält nach Zahlung der geschuldeten Vergütung die zur vertragsgemäßen Errichtung, Nutzung, Unterhaltung und Änderung dieses konkreten Gebäudes erforderlichen Nutzungsrechte an den übergebenen Planungsunterlagen. Weitergehende urheberrechtliche Befugnisse verbleiben beim Berechtigten.

Die Parteien geben ihre Annahmeerklärungen am 19. Oktober 2026 in dieser gemeinsamen Vertragsfassung ab. Für die Steinbogen Wohnen GmbH: Maren Birk, Geschäftsführerin, erklärt die Annahme sämtlicher vorstehender Vereinbarungen. Für Konturfeld Architektur PartG mbB: Nora Feld, Architektin, erklärt die Annahme sämtlicher vorstehender Vereinbarungen. Die Namen schließen die jeweiligen Erklärungen in Textform ab.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 23.10.2026

Protokoll der ersten Ortsbesichtigung

Am 23. Oktober 2026 wurden Grundstück, Zufahrt und angrenzende Bebauung gemeinsam mit der Bauherrin besichtigt. Es handelte sich um eine Sichtaufnahme bei trockener Witterung. Verdeckte Leitungen, rechtliche Grenzverhältnisse und der Untergrund konnten dabei nicht festgestellt werden.

1 Grundstück und Umgebung

Die Arbeitsvermessung zeigt ein annähernd rechteckiges Grundstück von 32,50 m Breite und 40,00 m Tiefe. Die Straße liegt nördlich. Das Gelände fällt von Nordwest nach Südost um etwa 0,35 m ab. Im Garten stehen zwei kleinere Obstbäume. Im nördlichen Drittel befinden sich Reste einer befestigten Zufahrt; für deren Rückbau wurde noch keine Schadstoffuntersuchung durchgeführt.

Die benachbarten Gebäude wurden ohne Betreten fremder Grundstücke aufgenommen: westlich ein dreigeschossiges Wohnhaus mit etwa 10,20 m oberem Abschluss, östlich ein zweigeschossiges Wohnhaus mit ausgebautem Dach und etwa 9,60 m Firsthöhe, südlich zwei Wohngebäude mit zwei beziehungsweise drei sichtbaren Geschossen. Die Werte dienen zunächst dem Variantenvergleich und sind vor der Einreichung anhand vermessener Ansichten zu präzisieren. Eine abschließende Bestimmung der näheren Umgebung ist damit nicht verbunden.

2 Befunde und Klärungsbedarf

Am südlichen Zaun ist nach Auskunft der Bauherrin nach Starkregen Wasser stehen geblieben. Eine Mulde ist sichtbar, die Ursache jedoch offen. Ein Schachtdeckel im nördlichen Zufahrtsbereich trägt keine eindeutige Kennzeichnung. Die Bauherrin konnte kein aktuelles Leitungskataster vorlegen. Vor Erdarbeiten sind Leitungsauskünfte und eine örtliche Einweisung einzuholen.

3 Nächste Bearbeitung


Das Büro veranlasst nach Einzelauftrag die Arbeitsvermessung und empfiehlt zwei Baugrundaufschlüsse sowie einen Versickerungsversuch. Die Bauherrin stellt Erwerbsunterlagen und verfügbare Grundbuch-beziehungsweise Baulastenauskünfte gesondert bereit. Ein Beginn von Bauarbeiten wird aus diesem Protokoll nicht abgeleitet. Im Variantenvergleich werden der tiefe südöstliche Gartenbereich und die Lage der Entwässerung gesondert behandelt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Lageplan und Außenanlagen

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

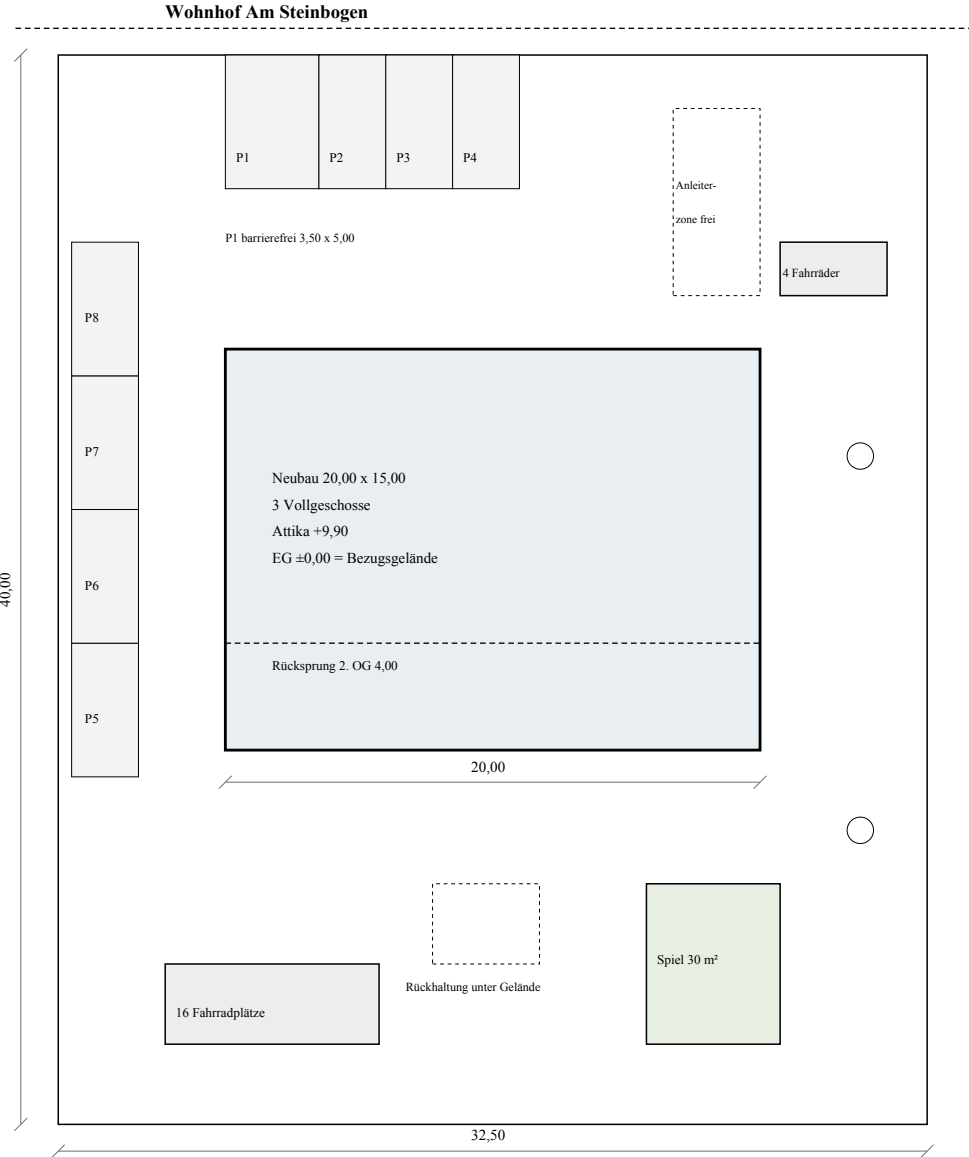

1 Grundstück und Bezug
1.300 m² | örtliches Koordinatensystem
Südwestecke x 0,00 / y 0,00
Norden in positiver y-Richtung


2 Abstände Hauptbaukörper
West 6,25 | Ost 6,25
Nord 11,00 | Süd 14,00
Gebäude x 6,25 bis 26,25
Gebäude y 14,00 bis 29,00
2. OG y 18,00 bis 29,00

3 Revision 1 vom 24.06.2027
Anleiterzone von Stellplätzen getrennt.
Stufenloser Zugang über Nordseite.
Pkw-Fahrgasse 6,00 m freihalten.

4 Planungsgrundlage
Projektbezogene Arbeitsvermessung.
Kein Auszug aus dem Liegenschaftskataster.
Grenzfeststellung und amtliche Bauvorlagen
werden durch diese Übersicht nicht ersetzt.

Umgebungsaufnahme und Baukörper

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

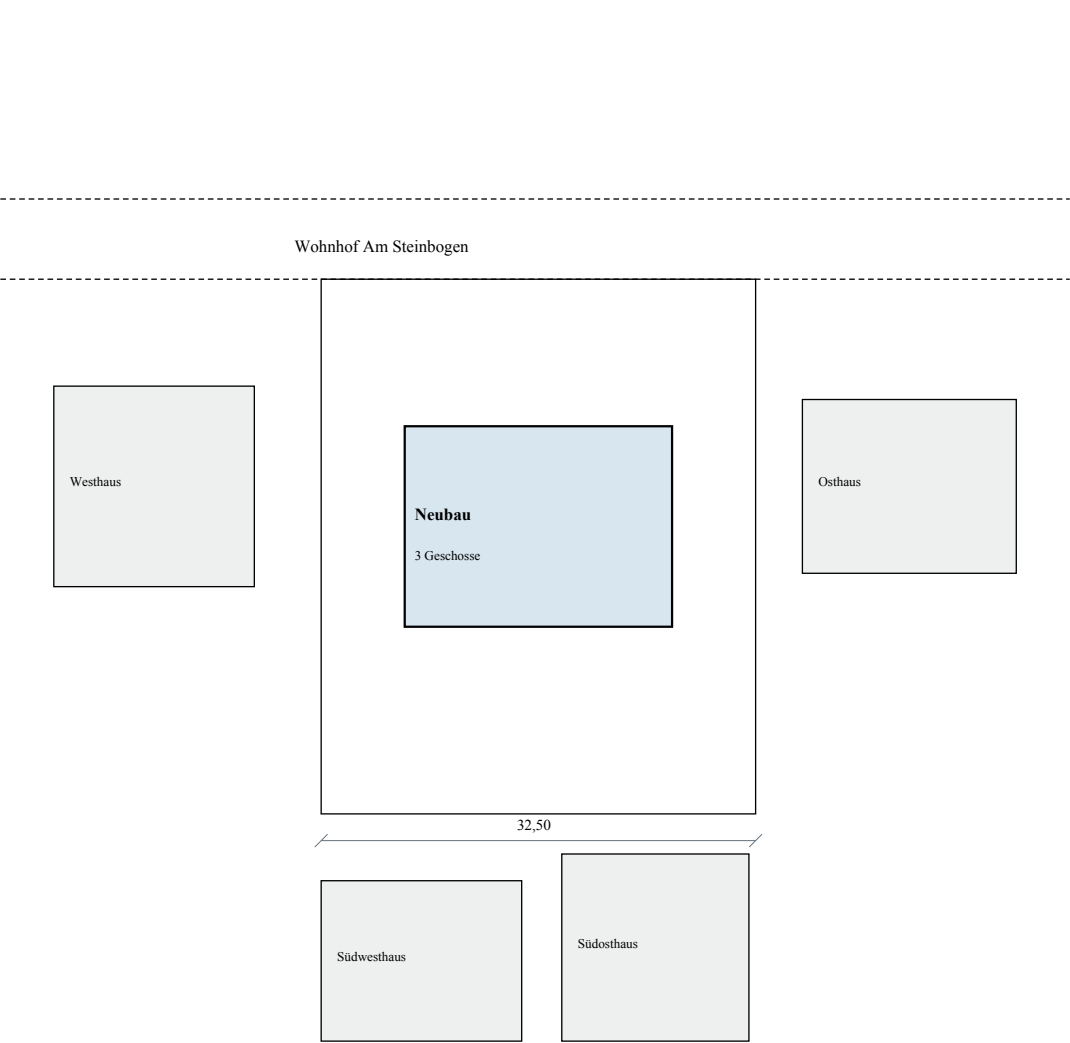

1 Umgebungsaufnahme

Westhaus: 3 Geschosse, oberer

Abschluss 10,20 m.

Osthaus: 2 Geschosse und Dach,

Firsthöhe 9,60 m.

Südwesthaus: 2 Geschosse,

Firsthöhe 8,20 m.

Südosthaus: 3 Geschosse,

oberer Abschluss 10,10 m.

2 Nutzungsbefund

Die aufgenommenen Häuser dienen

der Wohnnutzung. Keine gewerbliche

Nutzung war bei der Ortsaufnahme

an diesen Gebäuden erkennbar.

3 Abgrenzung

Darstellung der unmittelbaren Umgebung

nach Ortsaufnahme und Arbeitsmaßen.

Beurteilung der näheren Umgebung bleibt

Teil der Genehmigungsprüfung.

Kein amtlicher Katasterauszug.

Maßstab 1 zu 400; Maße und Höhenangaben sind gegenüber der Grafik maßgeblich.

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.11.2026

Baugrundbefund und Hinweise zur Gründung

Für den geplanten nicht unterkellerten Wohnungsneubau wurden am 9. November 2026 zwei Kleinbohrungen bis 6,00 m unter Gelände und ein Versickerungsversuch im südöstlichen Grundstücksbereich durchgeführt.

Die Aufschlusspunkte sind auf das örtliche Koordinatensystem des Lageplans LP01 bezogen: B 1 bei x 10,00 m und y 17,00 m, B 2 bei x 23,00 m und y 28,00 m. Die Beschreibung gilt nur für die erfassten Punkte.

1 Schichten und Wasser

B 1 zeigt bis 0,40 m humosen Oberboden, bis 1,10 m sandig-schluffige Auffüllung und darunter bis zur Endteufe steifen, lokal kiesigen Geschiebelehm. B 2 zeigt bis 0,35 m Oberboden, bis 0,90 m Auffüllung und darunter ebenfalls steifen Geschiebelehm. In B 2 trat nach zwei Stunden bei 2,40 m unter Gelände Wasser ein. Eine Grundwassermessstelle wurde nicht eingerichtet. Ein einzelner Bohrtag erlaubt keine Aussage zum höchsten zu erwartenden Wasserstand.

2 Gründung und Erdarbeiten

Eine flach gegründete Bodenplatte erscheint bei vollständigem Austausch ungeeigneter Auffüllungen grundsätzlich möglich. Die Tragwerksplanung hat Setzungsunterschiede, Randverdickungen und die tatsächlichen Lasten zu prüfen. Für die Vorbemessung kann bei einer ausreichend verdichteten Tragschicht ein Bettungsmodul von 15 MN/m^3 als Arbeitsansatz verwendet werden; die endgültige Festlegung erfolgt anhand der abgestimmten Gründungsgeometrie. Die Gründungssohle ist vor Einbau der Sauberkeitsschicht geotechnisch abzunehmen.

3 Niederschlagswasser

Der Versuch im südöstlichen Bereich ergab eine geringe Wasserdurchlässigkeit mit einem orientierenden Durchlässigkeitsbeiwert von $0,0000002 \text{ m/s}$. Eine ausschließlich auf Versickerung gestützte Grundstücksentwässerung wird auf dieser Grundlage nicht empfohlen. Die Fachplanung soll Rückhaltung und gedrosselte Ableitung mit dem Entwässerungsträger abstimmen. Ein unkontrollierter Überlauf auf Nachbargrundstücke ist zu vermeiden.

4 Abgrenzung und weiteres Vorgehen

Eine chemische Boden- oder Asphaltanalyse ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Vor Entsorgung sind repräsentative Deklarationsproben nach dem tatsächlichen Aushubkonzept zu bilden. Die Bauherrin soll für die Ausschreibung eine Mengenreserve für örtlich tiefer reichende Auffüllung vorsehen. Abweichungen bei der Freilegung, Wasserzutritte oder weiche Stellen sind vor Fortsetzung der Gründung anzuzeigen.

gez. Dr. Ute Venn, Geotechnikerin

Anlagen: keine

Variantenentscheidung für das Achtfamilienhaus

Für den nächsten Planungsschritt empfehlen wir Variante 2 mit einem zentralen Erschließungskern und einem im Süden zurückgesetzten obersten Geschoss. Die Empfehlung berücksichtigt das Bedarfsprogramm, den Baugrundbefund vom 16. November 2026 und die Investitionsobergrenze. Eine behördliche Zulässigkeitsentscheidung ist damit noch nicht verbunden.

1 Vergleichsgrundlage

Alle Varianten enthalten acht Wohnungen, den Aufzug mit drei Halten und die vorgesehenen Außenanlagen. Die Grundstückskosten und Finanzierungskosten werden im Vergleich unverändert behandelt. Die technische Ausrüstung wird einheitlich mit Wärmepumpe und Photovoltaik angesetzt. Ein Vergleich, der bei einer Variante den Aufzug oder die erforderlichen Bewegungsflächen wegließe, würde die Entscheidungsgrundlage verzerren.

2 Varianten

Variante 1 bildet drei Geschosse über der vollständigen Grundfläche von 20,00 m × 15,00 m ab. Die Brutto-Grundfläche beträgt 900 m². Die zusätzliche Fläche verbessert Abstellmöglichkeiten, führt aber zu einem größeren Baukörper als für das Wohnflächenprogramm erforderlich. Gegenüber der bevorzugten Variante entstehen 80 m² zusätzliche Brutto-Grundfläche. Die Einfügung der südlichen Fassadenflucht wäre vertieft abzustimmen.

Variante 2 ordnet Erdgeschoss und erstes Obergeschoss auf jeweils 20,00 m × 15,00 m an. Das zweite Obergeschoss misst 20,00 m × 11,00 m und ist an der Südseite um 4,00 m zurückgesetzt. Die Brutto-Grundfläche beträgt 820 m². Die Wohnungen des obersten Geschosses erhalten keine begehbare Dachterrasse auf der Rücksprungsfläche. Das vereinfacht Abdichtung, Nutzung und Flächenberechnung. Drei Vollgeschosse werden der weiteren Planung zugrunde gelegt.

Variante 3 verteilt die Wohnungen auf zwei Häuser mit vier Wohnungen. Sie erfordert zwei Treppenräume und eine zweite vertikale Erschließung oder verändert das Erreichbarkeitsprogramm. Zugleich werden Leitungswege und Fassadenanteile größer. Der Vorteil einer kleineren Einzelkubatur rechtfertigt für die Bauherrin derzeit nicht die zusätzlichen Erschließungsflächen.

3 Entscheidungsvoraussetzungen

Vor der Entwurfsfreigabe sind die äußere Höhe, die Abstandsflächen, die stufenlose Erreichbarkeit aller Wohnungen und die Entwässerung abzustimmen. Die Kosten werden in der zentralen Kostenfortschreibung geführt. Ein pauschaler Quadratmeterpreis aus einer anderen Gebäudeklasse wird nicht als Kostenberechnung übernommen. Die Entscheidung zugunsten von Variante 2 bleibt bis zur Rückmeldung der Bauaufsicht und der Finanzierung unter dem Vorbehalt, dass keine wesentlichen Hindernisse auftreten.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 09 Dec 2026 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Freigabe Variante 2 und Abruf der nächsten Stufe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir geben die Variante 2 aus Ihrem Vergleich vom 4. Dezember für die weitere Entwurfsbearbeitung frei. Acht Wohnungen und insgesamt 600 m² Wohnfläche bleiben die Grundlage. Die zurückgesetzte Dachfläche soll keine Mieterdachterrasse werden. Bitte verfolgen Sie den Aufzug und die rollstuhlgerechte WE 01 weiter; eine Einsparung dieser Eigenschaften ist nicht freigegeben.

Hiermit rufen wir die Leistungsphasen 3 und 4 nach Nummer 2 unseres Vertrags vom 19. Oktober 2026 ab. Bitte legen Sie uns vor der Einreichung den vollständigen Entwurfsstand und die fortgeschriebene Kostenberechnung vor. Die Investitionsobergrenze bleibt bei 3.650.000,00 EUR brutto. Auf eine möglicherweise günstige Ausschreibung dürfen Mehrkosten in der Planung nicht vorab gestützt werden.

Die Nachbarhöhen sind noch nicht abschließend geprüft. Bitte klären Sie auch, ob die Feuerwehr die nördliche Anleiterzone akzeptiert und ob die Fahrräder besser im Nebengebäude oder im Hauptgebäude untergebracht werden. Wir benötigen Ihre Rückmeldung hierzu bis zum Entwurfsgespräch im Februar.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 12.02.2027

Vermerk zur Abstimmung mit der Bauaufsicht

Am 12. Februar 2027 wurde der Entwurfsstand in einer telefonischen Vorbesprechung mit der Bauaufsicht erläutert. Dieser Vermerk gibt das Gespräch aus Sicht des Architekturbüros wieder. Eine Bauvoranfrage und ein Bauvorbescheid sind nicht Gegenstand des Gesprächs; eine Bindungswirkung wird nicht festgehalten.

1 Baukörper und Umgebung

Vorgestellt wurden acht Wohnungen, eine Gebäudegrundfläche von 20,00 m × 15,00 m, ein oberstes Geschoss von 20,00 m × 11,00 m und eine Attikahöhe von 9,90 m über dem Bezugsgelände. Das oberste Geschoss wird als drittes Vollgeschoss bezeichnet. Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt 6,20 m. Für die Einfügingsbeurteilung werden Ansichten der näheren Umgebung und eine nachvollziehbare Erschließungsdarstellung erwartet.

2 Unterlagenbedarf

Die Mitarbeiterin bat darum, den Lageplan mit den Abstandsdarstellungen, die Wohnungsliste und das Barrierefreiheitskonzept zusammen einzureichen. Die Einordnung des Verfahrens und der erforderlichen Bauvorlagen erfolgt durch die Bauaufsicht anhand des vollständigen Antrags. Die bloße Aufnahme eines Vorhabens in eine Vorbesprechung ist keine Bestätigung der Vollständigkeit oder Zulässigkeit.

3 Festgehaltene offene Punkte

Die Lage der Anleiterstellen und die nutzbare Breite der nördlichen Zugangszone sind noch mit der Brandschutzplanung abzugleichen. Die Entwässerung ist gesondert mit dem zuständigen Träger zu klären. Die Bauherrin hat noch keine Erschließungsbestätigung übergeben. Das Büro erstellt eine Nachweisliste und legt die endgültigen Einreichungsunterlagen der Bauherrin zur Freigabe vor.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Entwurfsbeschreibung und abgestimmter Planungsstand

Der Entwurf vom 19. März 2027 setzt Variante 2 um. Er enthält acht Wohnungen mit 600 m² Wohnfläche und einen gemeinsamen Erschließungskern mit Treppe und Aufzug. Die Freigabe dieses Entwurfs ist Grundlage für den Bauantrag; die Ausführung wird erst mit den späteren Detailplänen freigegeben.

1 Kubatur und Konstruktion

Erdgeschoss und erstes Obergeschoss haben eine äußere Grundfläche von jeweils 300 m². Das zweite Obergeschoss hat eine Grundfläche von 220 m² und ist an der Südseite zurückgesetzt. Die Summe der Brutto-Grundflächen beträgt damit 820 m². Die Geschossfußböden liegen bei ±0,00 m, +3,10 m und +6,20 m; die Attika endet bei +9,90 m. Ein Keller ist nicht vorgesehen. Die Bodenplatte wird auf einer ausgetauschten und verdichteten Tragschicht gegründet.

Vorgesehen sind tragende Mauerwerkswände und Stahlbetondecken. Der Treppenraum bildet den zentralen Erschließungsbereich. Die Fassaden erhalten einen robusten mineralischen Oberputz; Sockel und Türanschlüsse werden gegen Spritzwasser ausgebildet. Die zurückgesetzte Dachfläche über dem ersten Obergeschoss ist ausschließlich Wartungsfläche und wird nicht als Wohnfläche angesetzt.

2 Wohnungen und Erschließung

Die Wohnungen WE 01 bis WE 03 liegen im Erdgeschoss, WE 04 bis WE 06 im ersten Obergeschoss, WE 07 und WE 08 im zweiten Obergeschoss. Die Wohnflächenfolge lautet 68, 75, 82, 68, 75, 82, 75 und 75 m². Die Flächenaufstellung unterscheidet Wohnflächen von gemeinschaftlichen Flächen und Konstruktionsflächen. Der Aufzug bedient alle drei Ebenen. Alle acht Wohnungen werden barrierefrei vorgesehen; WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht ausgelegt.

3 Außenanlagen und Technik

Acht Pkw-Plätze einschließlich des gekennzeichneten barrierefreien Stellplatzes liegen an der Nordseite und entlang der westlichen Zufahrt. Der Fahrradbereich bietet 16 gesicherte Plätze; vier Besucherplätze liegen beim Hauseingang. Ein 30 m² großer Spielbereich liegt im südöstlichen Garten. Eine Wärmepumpe versorgt Heizung und Warmwasser; die Dachfläche nimmt eine Photovoltaikanlage auf. Die Standort- und Leistungsdetails werden mit der Fachplanung abgestimmt.

4 Freigabestand

Die Bauherrin bestätigt die Kubatur, Wohnungszahl, Wohnflächenziele und das Erschließungsprinzip. Offen bleiben die abschließende Tragwerksbemessung, der objektspezifische Energiebedarfsnachweis, die Dimensionierung der Rückhaltung und die detaillierte Schalldämmung der technischen Anlagen. Die endgültigen Genehmigungsunterlagen müssen diese Beiträge in der jeweils erforderlichen Form enthalten. Der freigegebene Entwurf berechtigt nicht zur Bestellung abweichender Bauteile.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

SW-HI-26-08 · Seite 1

Grundrisse Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Erdgeschoss
Fußboden ±0,00 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen
durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.

2 Flächen
Wohnfläche 225,00 m²
Brutto-Grundfläche 300,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.

3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Grundrisse Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Erstes Obergeschoss
Fußboden +3,10 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen
durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.


2 Flächen
Wohnfläche 225,00 m²
Brutto-Grundfläche 300,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.

3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Grundriss zweites Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

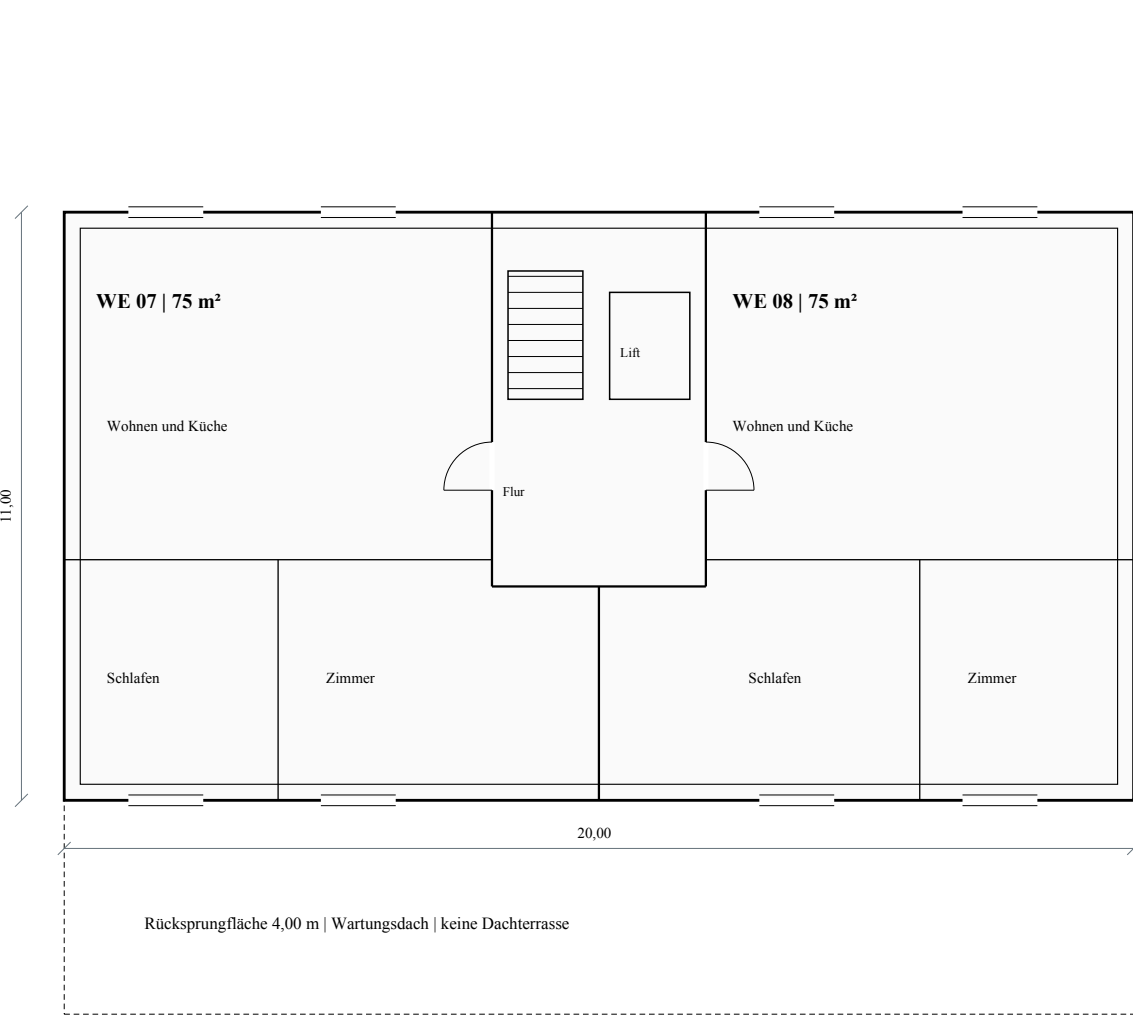

1 Zweites Obergeschoss
Fußboden +6,20 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.

2 Flächen
Wohnfläche 150,00 m²
Brutto-Grundfläche 220,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.


3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Gebäudeschnitt und Nordansicht

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung


1 Schnitt Süd nach Nord

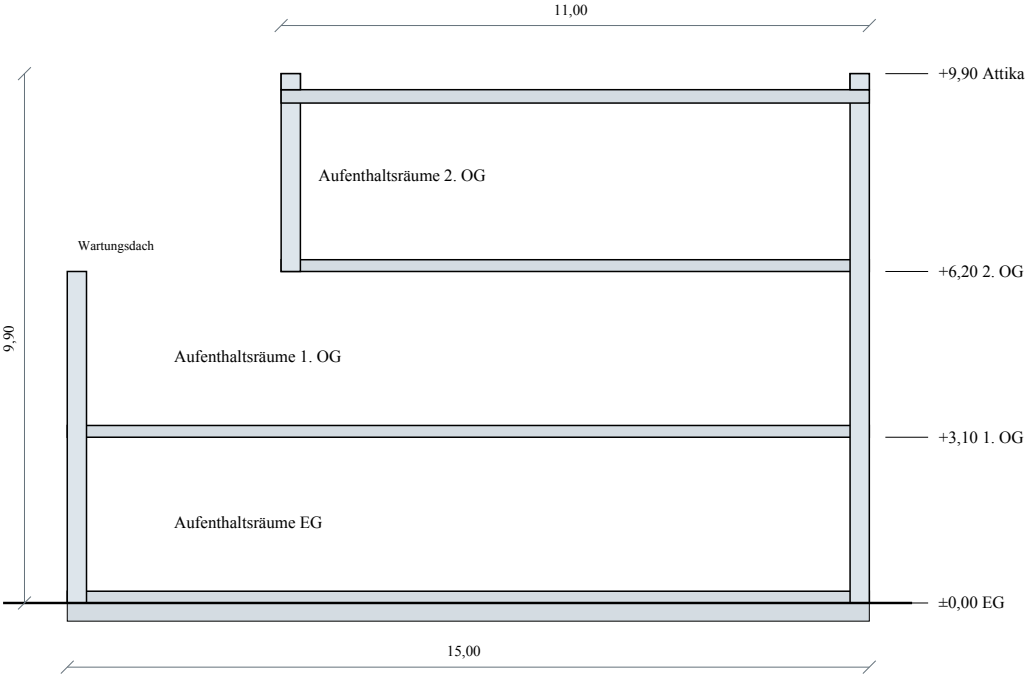

3 Bezug und Gebäudehöhe
Bezugsgelände ±0,00 an der Nordfassade.
Höchster Aufenthaltsraumfußboden +6,20.
Drei Vollgeschosse, kein Keller.
Schnittdarstellung 1 zu 100.

4 Planungsstand
Deckenstärke als Arbeitsansatz 22 cm.
Endgültige Statik gesondert.
Dachaufbau nach Wärmeschutzplanung.
Dachoberfläche oben +9,60 m.
Unterkannte Bodenplatte -0,34 m.
BRI 220 x 9,94 + 80 x 6,54
= 2.710,00 m³; ohne Attikaaufschlag.

2 Nordansicht 1 zu 160

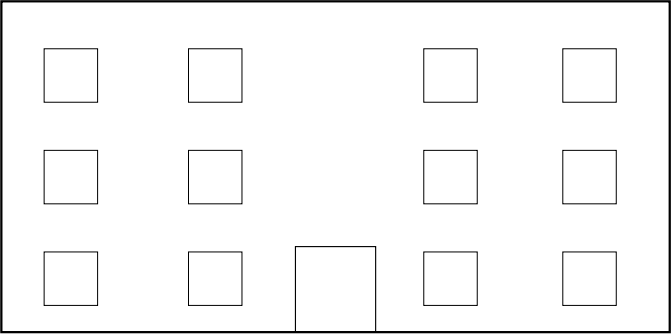

Wohnflächenberechnung für acht Wohnungen

Die nachfolgende Aufstellung erfasst die geplanten lichten Raumgrundflächen des Entwurfs. Balkon- und Terrassenflächen werden nicht angesetzt. Gemeinschaftliche Treppen-, Aufzugs-, Technik- und Fahrradflächen sind nicht Teil der Wohnflächen. Die Gesamtfläche von 600,00 m² ist ein Planungsstand und nach Ausführung anhand des tatsächlichen Bestands zu kontrollieren.

1 Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

WE 01 und WE 04 haben jeweils 68,00 m²: Wohnen und Küche 26,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 10,00 m², Bad 7,00 m², Flur 8,00 m² und Abstellraum 3,00 m². Die Grundflächen werden vollständig angesetzt. Bei WE 01 werden Bewegungsflächen und Türanfahrbereiche zusätzlich im Barrierefreiheitsdetail geprüft; ihre Lage darf bei der Möblierung nicht verstellt werden.

WE 02 und WE 05 haben jeweils 75,00 m²: Wohnen und Küche 29,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 12,00 m², Bad 7,00 m², Flur 10,00 m² und Abstellraum 3,00 m². WE 03 und WE 06 haben jeweils 82,00 m²: Wohnen und Küche 29,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 1 mit 11,00 m², Zimmer 2 mit 10,00 m², Bad 7,00 m², Flur 8,00 m² und Abstellraum 3,00 m².

2 Zweites Obergeschoss

WE 07 und WE 08 haben jeweils 75,00 m²: Wohnen und Küche 28,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 12,00 m², Bad 7,00 m², Flur 11,00 m² und Abstellraum 3,00 m². Die zurückgesetzte Dachfläche vor der Südfassade ist nicht zur Wohnnutzung bestimmt. Sie wird auch nicht anteilig als Terrasse in diese Berechnung aufgenommen.

3 Summen und Abgrenzung

Erdgeschoss 225,00 m², erstes Obergeschoss 225,00 m² und zweites Obergeschoss 150,00 m² ergeben zusammen 600,00 m². Die Brutto-Grundfläche von 820,00 m² ist eine andere Flächengröße und enthält unter anderem gemeinschaftliche Flächen und Bauteilquerschnitte. Ein Quotient aus Brutto-Grundfläche und Wohnfläche ersetzt keine Ermittlung der einzelnen Raumflächen.

Die Raumwerte werden als Planungsansätze mit zwei Dezimalstellen geführt und vor der Vermietung am ausgeführten Bestand überprüft. Die übersichtlichen A3-Grundrisse stellen das Erschließungs- und Raumordnungsprinzip dar; für Möbel-, Tür- und Installationsbestellungen sind die bemaßten Ausführungsdetails und späteren Aufmaße maßgeblich. Eine zugesicherte mietvertragliche Fläche wird mit dieser internen Berechnung noch nicht vereinbart.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Abstimmung von Tragwerk und technischer Ausrüstung

In der Besprechung vom 7. April 2027 wurden die Fachbeiträge mit dem Entwurf GP01 und GP02 abgeglichen. Teilgenommen haben Objektplanung, Tragwerksplanung und technische Ausrüstung. Die Bauherrin erhielt das Protokoll zur Entscheidung über die noch offenen Ausstattungsfragen.

1 Tragwerk

Die Tragwerksplanung bestätigt das Grundprinzip aus Mauerwerk und Stahlbetondecken. Für die vorläufigen Spannweiten werden 22 cm starke Decken berücksichtigt; endgültige Bewehrung und Durchstanznachweise folgen in der Ausführungsplanung. Die Randzone am südlichen Rücksprung des obersten Geschosses benötigt ein abgestimmtes Wärmebrückendetail. Der Aufzugsschacht erhält keine nachträglich ungeprüften Aussparungen.

2 Leitungsführung

Die TGA plant zwei durchgehende Installationszonen bei den innenliegenden Bädern. Die Fallleitungen werden nicht durch die tragende Treppenraumwand geführt. Im ersten Entwurf lag ein Lüftungsdurchbruch zu dicht am Deckenaufleger; die TGA verschiebt ihn um 25 cm nach Osten und legt bis zum 21. April eine abgestimmte Aussparungsliste vor. Die Objektplanung übernimmt erst den von der Tragwerksplanung bestätigten Stand.

3 Energie und Schall

Für die Wärmepumpe wird der nordöstliche Technikbereich geprüft. Die Bauherrin wünscht keine Außeneinheit unmittelbar neben den Schlafräumen der WE 02. Die Fachplanung bewertet deshalb die südöstliche Aufstellfläche einschließlich Leitungsweg und Schallausbreitung. Die Photovoltaikbelegung muss Wartungswege, Dachabläufe und die Befestigung an der Dachkonstruktion berücksichtigen.

4 Barrierefreiheit und Freigaben

Bei WE 01 bleibt im Bad eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m × 1,50 m vorgesehen. Der Waschmaschinenanschluss wandert in den Abstellbereich, damit die Fläche nicht durch ein Gerät eingeschränkt wird. Die Bauherrin bestätigt diese Anordnung. Türlisten mit lichten Durchgangsmaßen sind vor Ausschreibung zu erstellen. Das Protokoll enthält noch keine Freigabe der Ausführungsstatik oder der haustechnischen Anlagen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Konzept für Energieversorgung und Grundstücksentwässerung

Das Konzept koordiniert die Versorgung von acht Wohnungen mit 600 m² Wohnfläche. Energiebedarfsnachweis und Ausführungsberechnungen werden gesondert fortgeschrieben.

1 Wärmeerzeugung und Verteilung

Vorgesehen ist eine elektrisch betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe mit witterungsgeführter Niedertemperaturverteilung und wohnungsweiser Verbrauchserfassung. Die vorläufige Anlagenkonfiguration umfasst zwei Wärmepumpen mit jeweils 18 kW Nennleistung. Die raumweise Heizlast, die tatsächliche Leistung am Auslegungspunkt und der Warmwasserbedarf sind gesondert zu berechnen; die Summe der Nennleistungen ist kein Ersatz für diese Bemessung. Die Warmwasserbereitung wird gesondert bemessen. Die Außeneinheit wird südöstlich neben dem Technikzugang angeordnet; die Schallbewertung muss vor Gerätebestellung den konkreten Typ und den Nachtbetrieb erfassen.

2 Gebäudehülle und Dach

Für die weitere Berechnung werden Außenwand 0,18 W/(m²K), Dach 0,14 W/(m²K), Bodenplatte 0,20 W/(m²K) und Fenster 0,90 W/(m²K) als Planungsziele angesetzt. Diese Einzelwerte ersetzen keinen vollständigen energetischen Nachweis. Auf dem oberen Dach werden 80 Photovoltaikmodule mit je 450 Wp und jeweils 2,00 m² Modulfläche vorgesehen. Daraus ergeben sich 36 kWp und 160 m² Modulfläche bei insgesamt 300 m² Dachfläche über beide Dachniveaus. Die Anforderung an den solaren Dachflächenanteil und mögliche bautechnische Einschränkungen sind anhand der konkreten Dachgeometrie nachzuweisen. Wartungswege, Dachabläufe, Aufkantung und die konstruktive Lastaufnahme sind in der Belegung berücksichtigt und vor Montage mit der Werkplanung abzugleichen. Alle acht Pkw-Plätze erhalten Leitungsinfrastruktur und Vorverkabelung; zunächst werden zwei Ladepunkte hergestellt. Lastmanagement und Netzanschluss sind mit der Netzbetreiberin abzustimmen.

3 Niederschlagswasser

Wegen des schwach durchlässigen Bodens wird das Dachwasser über eine unterirdische Rückhaltung mit zunächst 12 m³ Nutzvolumen gesammelt. Als Arbeitsansatz für die Drosselung werden 1,0 l/s verwendet. Nutzvolumen und Abgabemenge sind vom Entwässerungsträger anhand des endgültigen Flächennachweises zu bestätigen. Ein Notüberlauf wird in den eigenen tiefer liegenden Gartenbereich geführt und darf weder Gebäudezugänge noch Nachbargrundstücke belasten.

4 Offene Nachweise

Vor Ausschreibung sind Heizlast, Warmwasser, Netzanschluss, Schall, Dachbelegung und Entwässerung abschließend zu berechnen. Die Ansätze sind keine zugesicherte Geräteleistung. Die Grundstücksentwässerung setzt die erforderliche Zustimmung des zuständigen Trägers voraus.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

Konzept für Rettungswege und barrierefreie Nutzung

Das Konzept gehört zum Bauantrag für acht Wohnungen. Die Ausführungsplanung konkretisiert Bauteilqualitäten, Anschlüsse und lichte Maße. Widersprüche zwischen Fachbeiträgen sind vor Bauteilfreigabe zu bereinigen.

1 Gebäude und Rettungswege

Das Gebäude hat drei oberirdische Vollgeschosse. Der Fußboden des höchstgelegenen Aufenthaltsraums liegt 6,20 m über dem festgelegten Bezugsgelände. Acht eigenständige Wohnungen mit jeweils weniger als 400 m² werden vorgesehen. Der Bauantrag ordnet das Vorhaben der Gebäudeklasse 3 zu. Der erste Rettungsweg führt aus jeder Wohnung über den notwendigen Treppenraum ins Freie.

Der zweite Rettungsweg wird für die oberen Wohnungen über anleiterbare Fensterflächen an der nördlichen beziehungsweise seitlichen Fassade vorgesehen. Die zugehörigen Anleiterstellen und der Zugang sind im Lageplan markiert und dauerhaft freizuhalten. Die konkrete Erreichbarkeit und die Anleiterbarkeit der Fenster sind im Zuge der Genehmigungsbearbeitung abzustimmen. Die Fensterabmessungen und Brüstungshöhen werden im Ausführungsplan dokumentiert. Ein Aufzug ersetzt keinen Rettungsweg.

2 Bauliche Maßnahmen

Tragende und aussteifende Bauteile sowie Decken werden in der für die Gebäudeklasse nachgewiesenen Qualität geplant. Trennbauteile zwischen Wohnungen, Treppenraumabschlüsse und Leitungsdurchführungen sind mit den jeweiligen Nachweisen abzustimmen. Ein allgemeiner Produktprospekt gilt nicht als Nachweis für einen bestimmten Einbau. Das Leitungs- und Abschottungskonzept wird vor Beginn der Rohinstallation in einer gemeinsamen Planrunde geprüft.

3 Barrierefreie Wohnungen

Alle acht Wohnungen werden barrierefrei gestaltet und über stufenlose Wege und den Aufzug erreicht. WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht ausgeführt. Dort werden insbesondere 1,50 m × 1,50 m Bewegungsflächen, nutzbare Türanfahrbereiche und die Vorbereitung von Haltegriffen berücksichtigt. Die maßgeblichen lichten Maße sind vor Bestellung der Türen und Sanitärobjekte zu prüfen. Möblierung darf die freien Bewegungsflächen nicht unterschreiten.

4 Außenraum und Betrieb

Der gekennzeichnete barrierefreie Pkw-Stellplatz wird nahe dem Hauseingang angeordnet und mit einem stufenlosen Zugang verbunden. 16 gesicherte Fahrradplätze und vier Besucherplätze werden ausgewiesen. Der Spielbereich liegt abseits der Zufahrt. Im späteren Betrieb müssen Rettungswege, Anleiterstellen und Bewegungsflächen frei bleiben; Abstellnutzungen des Treppenraums sind nicht in das Raumprogramm eingerechnet.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

SW-HI-26-08 · Seite 1

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht
Markt 3, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 10.05.2027 · SW-HI-26-08

Bauantrag für den Neubau eines Achtfamilienhauses

Sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen die Genehmigung für den Neubau eines Wohnhauses mit acht dauerhaft zu vermietenden Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die digitale Einreichung umfasst die Antragsdaten, die von den verantwortlichen Beteiligten bestätigten Bauvorlagen und dieses Begleitschreiben. Das Schreiben ersetzt nicht die erforderlichen digitalen Antragsfelder und Nachweise.

1 Vorhaben

Das nicht unterkellerte Gebäude erhält drei Vollgeschosse, eine Brutto-Grundfläche von 820 m² und eine Wohnfläche von 600 m². Erdgeschoss und erstes Obergeschoss messen außen jeweils 20,00 m × 15,00 m; das oberste Geschoss misst 20,00 m × 11,00 m. Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt 6,20 m, die Attikahöhe 9,90 m. Ein Aufzug erschließt alle Geschosse. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei vorgesehen; WE 01 wird rollstuhlgerecht geplant.

2 Planungsrecht und Erschließung

Wir legen der Einreichung eine Beurteilung der im Zusammenhang bebauten näheren Umgebung zugrunde und bitten um Prüfung der Einfügung nach Paragraph 34 BauGB. Die beigefügten Ansichten und die Grundstücksdarstellung erläutern Art und Maß der benachbarten Nutzung, Bauweise und überbaute Grundstücksflächen. Ein für das Vorhaben maßgeblicher qualifizierter Bebauungsplan wird in dieser Einreichung nicht geltend gemacht. Die Erschließungsunterlagen und die Grundstücksentwässerung sind Bestandteil der ergänzenden Nachweisführung.

3 Bauvorlagen

Beigefügt sind die Baubeschreibung, der Lageplan LP01, die Grundrisse GP01 und GP02, Schnitt und Ansichten SP01, die Wohnflächenberechnung und das Konzept für Rettungswege und Barrierefreiheit. Die Fachbeiträge zum Tragwerk und zur Energieversorgung werden nach Maßgabe der Verfahrensanforderungen vervollständigt. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie weitere Unterlagen oder eine Präzisierung der eingereichten Darstellungen benötigen.

Ansprechpartnerin für die Bauherrin ist die Geschäftsführung; technische Rückfragen richten Sie bitte zugleich an das beauftragte Architekturbüro. Rechtsgeschäftliche Erklärungen, eine Änderung des Antrags oder ein Rechtsbehelfsverzicht bedürfen einer Erklärung der Bauherrin. Wir bitten um Bestätigung des Eingangs unter Angabe des Aktenzeichens.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: 005_Lageplan_LP01.pdf; 011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf; 012_Grundriss_2OG_GP02.pdf;
013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf; 014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx;
017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx; 019_Baubeschreibung.docx

Baubeschreibung zum Wohnhausneubau

Zum Antrag vom 10. Mai 2027: Die Steinbogen Wohnen GmbH errichtet acht Wohnungen zur langfristigen Vermietung. Beherbergung und gewerbliche Nutzung sind nicht beantragt.

1 Grundstück und Gebäude

Das Grundstück hat eine Fläche von 1.300 m². Der Hauptbaukörper beansprucht 300 m² Grundfläche; das oberste Geschoss ist an der Südseite zurückgesetzt. Drei Vollgeschosse werden angegeben. Bei 6,20 m Höhe des obersten Aufenthaltsraumfußbodens und acht Nutzungseinheiten wird das Gebäude in Gebäudeklasse 3 eingeordnet. Die äußere Attika liegt bei 9,90 m. Die obere Dachoberfläche liegt bei 9,60 m, die Dachoberfläche der südlichen Rücksprungsfläche bei 6,20 m. Unterkante der konstruktiven Bodenplatte ist -0,34 m. Der hieraus geometrisch ermittelte Rauminhalt beträgt $220 \text{ m}^2 \times 9,94 \text{ m} + 80 \text{ m}^2 \times 6,54 \text{ m} = 2.710,00 \text{ m}^3$. Die Attika wird nicht pauschal als gesamte Dachhöhe angesetzt. Ein Keller wird nicht hergestellt.

2 Baukonstruktion

Die Gründung erfolgt nach Tragwerks- und Baugrundplanung als Stahlbetonbodenplatte auf geeigneter Tragschicht. Tragende Wände werden aus Mauerwerk, Decken und Treppe aus Stahlbeton hergestellt. Die Außenwand erhält eine gedämmte, verputzte Konstruktion. Das obere Dach und die südliche Rücksprungsfläche werden als abgedichtete Flachdächer ausgebildet. Die Rücksprungsfläche ist Wartungsfläche und keine Gemeinschafts- oder Mieterdachterrasse.

3 Nutzung und Erreichbarkeit

Die Wohnflächen betragen 225 m² im Erdgeschoss, 225 m² im ersten und 150 m² im zweiten Obergeschoss. Treppenraum und Aufzug mit drei Halten erschließen die acht barrierefreien Wohnungen; WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht. Trennbauteile und Anschlüsse folgen dem abgestimmten Schall- und Brandschutzkonzept.

4 Außenanlagen

Es werden acht Pkw-Stellplätze freiwillig hergestellt, davon einer gekennzeichnet und barrierefrei nutzbar. Die Planung enthält 16 gesicherte Fahrradplätze und vier Besucherplätze. Der 30 m² große Spielbereich im südöstlichen Garten wird von den Verkehrsflächen getrennt. Niederschlagswasser wird zurückgehalten und nach gesonderter Abstimmung gedrosselt abgeleitet. Die erforderlichen Zustimmungen zur Grundstücksentwässerung bleiben gesondert nachzuweisen.

5 Technische Anlagen

Wärmepumpe und Photovoltaik sind vorgesehen. Anlagenumfang, Schall- und Energienachweis erstellt die Fachplanung. Ein bestimmter Effizienzhausstandard und eine Förderung werden nicht zugesagt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht

Markt 3, 31134 Hildesheim

bauaufsicht@hildesheim-akte.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 02.06.2027

Nachforderung zum Bauantrag

Zum Bauantrag vom 10. Mai 2027 für das Wohnhaus mit acht Wohnungen wird das Aktenzeichen BA 2027 0618 geführt. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die nachstehend bezeichneten Ergänzungen. Dieses Schreiben enthält weder eine Baugenehmigung noch eine Freigabe vorzeitiger Arbeiten.

1 Lage und Rettungswege

Bitte ergänzen Sie im Lageplan die freizuhaltenden Anleiterstellen und den zugehörigen Zugang. Die bisherige Stellplatzanordnung lässt nicht erkennen, ob die Anleiterstelle an der Nordostecke bei belegten Pkw-Plätzen erreichbar bleibt. Legen Sie außerdem eine bemaßte Darstellung der Abstandsflächen und eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der Gebäudehöhen der näheren Umgebung vor.

2 Barrierefreie Nutzung

Das Konzept bezeichnet sämtliche acht Wohnungen als barrierefrei und WE 01 als rollstuhlgerecht. In den bisher vorgelegten Plänen fehlen jedoch die lichten Türmaße, die Bewegungsflächen im Bad der WE 01 und die nutzbaren Abmessungen des Aufzugs. Bitte reichen Sie diese Angaben einschließlich des stufenlosen Wegs vom gekennzeichneten Stellplatz zum Hauseingang nach. Die pauschale Bezeichnung einer Wohnung ersetzt die erforderliche Darstellung nicht.

3 Entwässerung und Dach

Bitte legen Sie die ergänzte Grundstücksentwässerungsplanung mit Rückhaltung, Drosselung und Notentwässerungsweg vor. Die Ableitung zum Nachbargrundstück ist auszuschließen. Ergänzen Sie ferner die Darstellung der Photovoltaikbelegung mit den für Wartung und Dachabläufe erforderlichen freien Bereichen.

4 Weiteres Verfahren

Wir bitten um gebündelte Einreichung bis zum 30. Juni 2027 unter Angabe des Aktenzeichens und eindeutiger Kennzeichnung geänderter Planstände. Die bisher eingereichten Unterlagen verbleiben in der Akte; ersetzen Sie diese durch vollständige revidierte Pläne. Sollte die Frist nicht eingehalten werden können, bitten wir um frühzeitige Mitteilung mit Begründung und einem belastbaren Nachreichungstermin.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht
Markt 3, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 24.06.2027 · SW-HI-26-08

Ergänzungen zum Bauantrag BA 2027 0618

Sehr geehrte Damen und Herren, namens der Bauherrin reichen wir zu Ihrem Schreiben vom 2. Juni 2027 die ergänzten Darstellungen ein. Der Gebäudekörper, die Anzahl der Wohnungen und die beantragte Nutzung bleiben unverändert. Die nachstehenden Änderungen sind im Planverzeichnis als Revision 1 gekennzeichnet.

1 Anleiterstellen und Abstandsdarstellung

Die nördliche Stellplatzreihe wurde um 0,80 m nach Westen versetzt. An der Nordostecke bleibt die markierte Anleiterzone frei; Poller oder Fahrradständer sind dort nicht vorgesehen. Der Zugang wird in einer durchgehend nutzbaren Breite von mindestens 1,25 m dargestellt. Die Gebäudeaußenkanten halten im gewählten Lageplan mindestens 6,25 m zu den seitlichen Grundstücksgrenzen und 11,00 m beziehungsweise 14,00 m zu Nord- und Südgrenze ein. Der südliche Rücksprung des obersten Geschosses vergrößert den Abstand dort zusätzlich.

2 Barrierefreiheit

Die Ergänzung zeigt bei WE 01 freie Bewegungsflächen von 1,50 m × 1,50 m im Bad sowie die erforderlichen Anfahrbereiche an den Türen. Für die Wohnungseingänge werden 0,90 m lichte Durchgangsbreite vorgesehen. Der Aufzug erhält eine nutzbare Kabine von 1,10 m × 1,40 m und eine lichte Türbreite von 0,90 m. Die Fläche vor dem Aufzug bleibt von Türschwenkbereichen und Abstellnutzung frei. Die übrigen Wohnungen werden anhand der ausgewiesenen lichten Maße barrierefrei geplant.

3 Entwässerung und Photovoltaik

Das Niederschlagswasser wird über eine Rückhaltung geführt. Im ergänzten Fachplan ist der Notentwässerungsweg auf dem eigenen Grundstück eingetragen. Die endgültige Drosselmenge wird mit dem Entwässerungsträger gesondert festgelegt. Die Photovoltaikbelegung wahrt Wartungsstreifen und die Zugänglichkeit der Dachabläufe; technische Einbauten wurden aus diesen Bereichen herausgenommen.

4 Verzeichnis und Verbindlichkeit

Die Revision betrifft Lageplan LP01, Barrierefreiheitsdetail BF01 und Dach- und Entwässerungsschema TE01. In den Grundrissen wird allein die Lage einzelner Türen und Einbauten präzisiert; Wohnflächen und Kubatur werden nicht geändert. Bitte führen Sie die bezeichneten Revisionen anstelle der entsprechenden Vorstände. Die Bauherrin bestätigt die Ergänzungen. Eine Freigabe zur Ausführung beantragen wir mit dieser Nachreichung nicht gesondert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: 005_Lageplan_LP01.pdf; 024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf;
027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.07.2027

Baugenehmigung für das Achtfamilienhaus

Aktenzeichen BA 2027 0618. Auf Ihren Antrag vom 10. Mai 2027 in der ergänzten Fassung vom 24. Juni 2027 wird der Neubau eines Wohnhauses mit acht Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim nach Maßgabe der zugehörigen genehmigten Bauvorlagen und der nachstehenden Nebenbestimmungen genehmigt. Die Entscheidung ergeht im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Die Genehmigung erfasst den dafür gesetzlich bestimmten Prüfungsumfang; außerhalb dieses Umfangs bleiben die Bauherrin und die verantwortlichen Beteiligten zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen verpflichtet.

1 Gegenstand

Genehmigt wird die Wohnnutzung in drei Vollgeschossen ohne Keller. Die Gebäudegrundfläche beträgt 300 m², die Grundfläche des obersten Geschosses 220 m². Der Fußboden des höchstgelegenen Aufenthaltsraums liegt bei 6,20 m, die Attika bei 9,90 m über dem festgelegten Bezugsgelände. Der Antrag bezeichnet das Gebäude als Gebäudeklasse 3. Die Entscheidung bezieht sich auf acht Wohnungen mit insgesamt 600 m² geplanter Wohnfläche; Änderungen an Nutzung, Kubatur oder wesentlichen Rettungswegen bedürfen vor ihrer Ausführung einer erneuten verfahrensrechtlichen Klärung.

2 Maßgebliche Unterlagen

Maßgeblich sind die Antragsbeschreibung vom 10. Mai 2027, die Baubeschreibung, Lageplan LP01 in Revision 1, Grundrisse GP01 und GP02, Schnitt und Ansichten SP01 sowie die Nachreichung vom 24. Juni 2027 mit Barrierefreiheitsdetail BF01 und Entwässerungsschema TE01. Spätere Ausführungspläne werden durch ihre Erstellung nicht automatisch Bestandteil dieser Genehmigung. Bei Abweichungen ist vor Ausführung mit der Bauaufsicht abzustimmen, ob geänderte Bauvorlagen oder ein gesonderter Antrag erforderlich sind.

3 Nebenbestimmungen

Die in den genehmigten Unterlagen bezeichneten Anleiterstellen und Zugänge sind frei von dauerhaften Einbauten und abgestellten Fahrzeugen zu halten. Die Ausführung der Grundstücksentwässerung setzt die erforderliche gesonderte Zustimmung des zuständigen Entwässerungsträgers voraus. Die Ableitung von Niederschlagswasser auf Nachbargrundstücke ist nicht zulässig. Vor Beginn der betroffenen Arbeiten sind die gesetzlich erforderlichen bautechnischen Nachweise und die für sie notwendigen Bestätigungen in der vorgeschriebenen Form vorzuhalten beziehungsweise einzureichen.

Sämtliche acht Wohnungen und die zugehörigen Wege sind entsprechend den eingereichten Darstellungen barrierefrei auszuführen; WE 01 ist zusätzlich rollstuhlgerecht herzustellen. Der gekennzeichnete Stellplatz und die im Antrag dargestellten Fahrradabstellanlagen sind spätestens zur Aufnahme der Nutzung nutzbar herzustellen. Der Spielbereich ist bis zur Nutzungsaufnahme entsprechend dem genehmigten Lageplan anzulegen.

4 Hinweise und Rechtsbehelf

Erforderliche Anzeigen zum Baubeginn und zur Nutzung sind fristgerecht in der vorgeschriebenen Form abzugeben. Diese Genehmigung ersetzt keine privatrechtlichen Zustimmungen und keine außerhalb ihres Regelungsumfangs erforderlichen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse. Über Gebühren wird gesondert entschieden. Mit Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen und die vor Baubeginn zu erfüllenden Anforderungen vorliegen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Hildesheim erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, zur Niederschrift oder in der gesetzlich zugelassenen elektronischen Form einzulegen. Eine einfache E-Mail genügt den Anforderungen an die elektronische Form nicht. Die Frist richtet sich nach der tatsächlichen Bekanntgabe; das Ausfertigungsdatum allein belegt diese nicht.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 21 Jul 2027 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Abruf der Ausführungsplanung und Vergabevorbereitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Uns liegt die Baugenehmigung vom 16. Juli 2027 seit dem 20. Juli vor. Wir rufen hiermit die Leistungsphasen 5 bis 7 nach unserem Architektenvertrag ab. Bitte bereiten Sie die Ausführungsplanung sowie die vergleichbaren Vergabeunterlagen für die sieben besprochenen Lose vor. Der Abruf umfasst keine eigenständige rechtliche Gestaltung der Bauvertragsklauseln; hierzu stimmen wir einen direkten Auftrag mit unserer Rechtsberatung ab.

Wir benötigen insbesondere die endgültige Türliste, die Details zu den schwellenlosen Anschlüssen und die koordinierte Durchbruchsplanung. Bei der Rücksprungfläche möchten wir am Wartungsdach festhalten. Eine spätere Dachterrasse wurde von uns nicht bestellt. Bitte nehmen Sie die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung in die Termin- und Freigabeliste auf.

Die vorgesehenen Vergaben sollen bis November 2027 entscheidungsreif sein. Ziel bleibt der Baubeginn im Dezember 2027 und die Übergabe im September 2028. Informieren Sie uns unmittelbar, falls notwendige Fachnachweise oder Lieferzeiten diese Folge gefährden. Eine Vorbestellung von Aufzug oder Fenstern ohne unsere ausdrückliche Vergabeentscheidung ist nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim


projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf

Barrierefreiheitsdetails Wohnung und Aufzug


Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

1 WE 01 Bad und Bewegungsfläche 1 zu 25

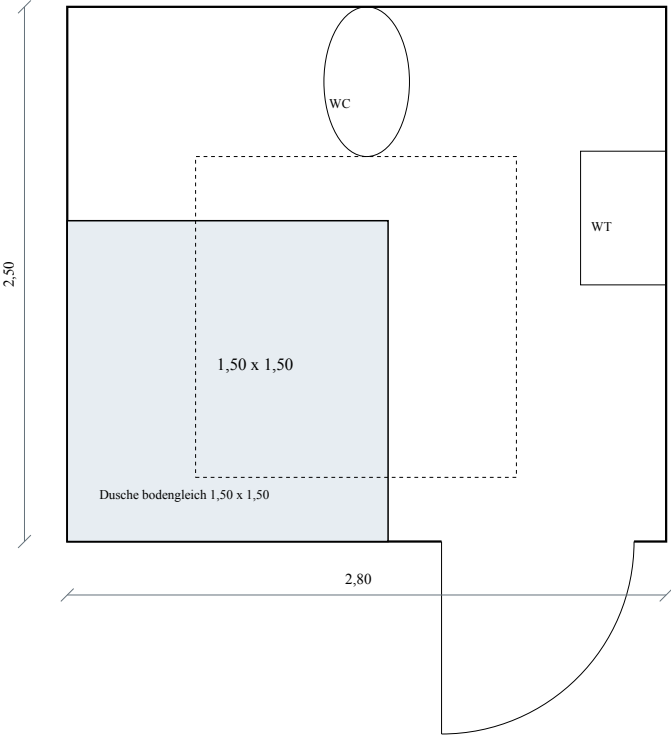

- 2 Festlegungen
- Freie Bewegungsfläche 1,50 x 1,50 m.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Tür nach außen öffnend im Ausführungsstand.
- WC seitlich jeweils mindestens 0,90 m frei.
- Waschmaschine im Abstellraum.
- Waschtisch unterfahrbar vorsehen.
- Rutschhemmung und Haltegriffbefestigung vor Bestellung produktbezogen abstimmen.

3 Aufzugskabine 1 zu 25

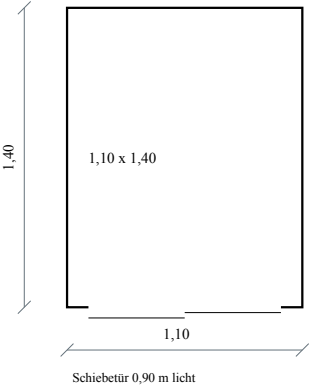

- Nutzbare Kabinenmaße dargestellt.
- Schachtmaße nach Herstellerplanung.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Drei Halte EG, 1. OG, 2. OG.
- Bewegungsfläche vor dem Aufzug frei von Türschwenkbereichen halten.

- 4 Prüfung vor Ausführung
- Bewegungsflächen und Bedienelemente im gesamten Zugangsweg abstimmen.
- Diese Detailzeichnung ersetzt keinen vollständigen Barrierefreiheitsnachweis.

Koordinierung der Ausführungsplanung

In der Planrunde vom 20. August 2027 wurden die Ausführungsdetails für Rohbau, Hülle und technische Ausrüstung zusammengeführt. Grundlage sind die Genehmigung vom 16. Juli 2027 und die abgerufene dritte Vertragsstufe. Die Ergebnisse dienen der Bereinigung der Leistungsverzeichnisse; eine Unternehmervariante ist damit noch nicht genehmigt.

1 Schwellenloser Zugang und Sockel

Die Außentür zum Hauseingang erhält eine schwellenlose Ausbildung mit unmittelbar vorgelagerter Entwässerungsrinne. Die Außenfläche fällt vom Gebäude weg; eine Aufkantung quer über den Zugang ist nicht zulässig. Abdichtung, Anschlussflansch und Entwässerung sind im Detail AP02 gemeinsam zu beschreiben. Die bisherige Standardposition der Fassadenfirma mit einer 4 cm hohen Türschwelle wird nicht in das Leistungsverzeichnis übernommen.

2 Sanitärschacht und Rohbau

Die TGA legt den revidierten Schacht im Bereich der Wohnungen WE 02 und WE 05 vor. Die Durchbrüche bleiben innerhalb der durch die Tragwerksplanung bestätigten Öffnungszone. Ein zusätzlicher Kernbohrungswunsch im Treppenraum ist zurückgestellt. Durchführungen in raumabschließenden Bauteilen sind nach dem abgestimmten Abschottungskonzept auszuführen und vor Verschluss zu dokumentieren.

3 Aufzug und Türen

Für den Aufzug werden drei Halte, 1,10 m × 1,40 m nutzbare Kabine und 0,90 m lichte Türbreite ausgeschrieben. Schachtmaße, Unterfahrt, Überfahrt und Befestigungskräfte sind aus den Herstellerangaben vor Rohbauabschluss abzugleichen. Das geforderte lichte Maß darf nicht mit dem Rohbaumaß verwechselt werden. Die Wohnungseingangstüren erhalten ebenfalls 0,90 m lichte Durchgangsbreite; Beschläge und Türschließer sind auf die vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten abzustimmen.

4 Noch offene Punkte

Der endgültige Wärmepumpentyp und die Schallberechnung liegen noch nicht vor. Die TGA liefert die Unterlagen bis zum 3. September. Für die Dachabdichtung fehlen die freigegebenen Anschlüsse der Photovoltaikunterkonstruktion. Die Objektplanung lässt die entsprechenden Positionen bis zum Eingang dieser Beiträge als nicht zur Bestellung freigegeben kennzeichnen. Die Bauherrin hat keiner Ausführung auf Grundlage eines bloßen Katalogdetails zugestimmt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 08 Sep 2027 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Freigabe der Details und Rückfrage zum Wartungsdach

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir geben die in Ihrer Planrunde vom 20. August erläuterten schwellenlosen Zugänge und die lichte Wohnungseingangsbreite von 0,90 m für die Ausschreibung frei. Die WE 01 bleibt rollstuhlgerichtet. Bitte berücksichtigen Sie bei der Bemusterung, dass sich die Türen ohne übermäßige Bedienkräfte nutzen lassen. Den Eingang wollen wir nicht nachträglich durch eine kleine Stufe vereinfachen.

In einer älteren Visualisierung ist auf der Rücksprungsfläche noch eine Sitzgruppe zu sehen. Diese Abbildung stammt aus der Variantenphase. Wir möchten ausdrücklich keine zur Wohnung gehörende Dachterrasse und keine entsprechende Angabe in einem Mietexposé. Bitte teilen Sie allen Planern und späteren Unternehmen den Stand Wartungsdach mit und entfernen Sie die Sitzgruppe aus den aktuellen Vertriebsbildern.

Bei der Wärmepumpe möchten wir die Gerätauswahl erst nach Eingang der Schallbewertung freigeben. Die am Telefon genannte Lieferalternative ist noch nicht bestellt. Bitte stellen Sie Kosten- und Terminfolge einer Änderung nachvollziehbar dar, bevor Sie sie in die Vergabeempfehlung aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx


Dachbelegung und Grundstücksentwässerung

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

- Revision 1 vom 24. Juni 2027
- Wartungswege und Abläufe bleiben zugänglich.
- Rücksprungdach gesondert angeschlossen; keine Dachterrasse.
- Notentwässerung auf eigenes Grundstück, nicht zum Nachbarn.


1 Dachaufsicht TE01

80 Module je 450 Wp | 36 kWp | 160 m² Modulfläche

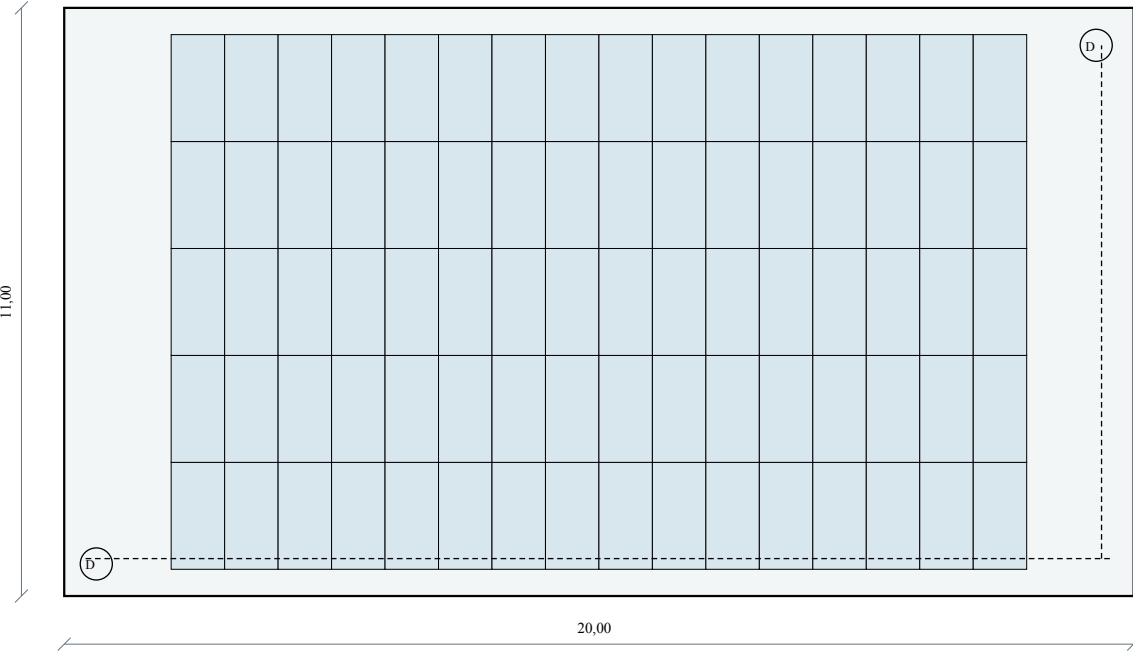

- Endgültige Bemessung und Zustimmung des Entwässerungsträgers erforderlich.
- Anlagenkonzept ist keine Einleiterlaubnis.

2 Entwässerungsschema

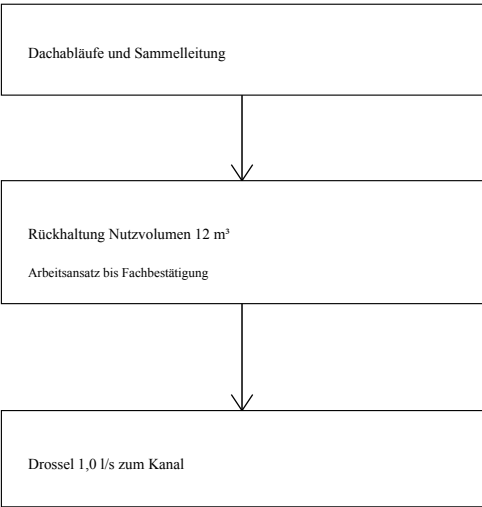

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 15.09.2027

Flächennachweis und Außenanlagenstand

Der Nachweis vom 15. September 2027 fasst die Flächenansätze für Ausschreibung und Bauablauf zusammen. Er bezieht sich auf ein 1.300 m² großes Grundstück mit 32,50 m × 40,00 m. Die Maße stammen aus der projektbezogenen Arbeitsvermessung und sind vor Absteckung mit der verantwortlichen Vermessung abzugleichen.

1 Baukörper und Abstände

Der Hauptbaukörper liegt von x 6,25 m bis x 26,25 m und von y 14,00 m bis y 29,00 m im örtlichen System. Norden liegt bei wachsendem y. Damit betragen die seitlichen Grenzabstände jeweils 6,25 m, der Abstand zur nördlichen Grenze 11,00 m und zur südlichen Grenze 14,00 m. Das zweite Obergeschoss nimmt den Bereich y 18,00 m bis y 29,00 m ein. Die Gebäudegrundfläche beträgt 300 m². Der rechnerische Mindestansatz von 0,5 × 9,90 m ergibt 4,95 m; in den gezeichneten Hauptfassadenbereichen liegen die tatsächlichen Abstände darüber. Sonderkonstellationen und Bauteile sind nach dem genehmigten Lageplan gesondert zu beurteilen.

2 Nutzungsflächen im Freien

Die acht Pkw-Stellplätze enthalten einen 3,50 m × 5,00 m großen gekennzeichneten Platz nahe dem Hauseingang. Die übrigen Plätze werden mit jeweils 2,50 m × 5,00 m geplant. Die gemeinsame Fahrgasse ist 6,00 m breit. Die erforderlichen Bewegungs- und Einfahrtsflächen dürfen nicht als zusätzliche Stellplätze vermietet werden. Die freizuhaltende Anleiterzone bleibt außerhalb der Stellplatzflächen.

Für 16 gesicherte Fahrräder wird eine eingehauste Abstellfläche mit geeigneten Anschließmöglichkeiten vorgesehen; vier weitere Plätze liegen am Eingang. Der 30 m² große Spielbereich liegt im südöstlichen Garten. Der übrige Garten bleibt begrünt. Die Rückhaltung wird unter einer zugänglichen Außenfläche angeordnet, so dass Kontrollöffnungen erreichbar bleiben.

3 Abstimmungsstand

Die Ausschreibung muss zwischen befestigten Flächen, Spielbereich, Vegetationsflächen und Entwässerungsanlagen unterscheiden. Die endgültigen Aufmaße werden für die Abrechnung vor Ort festgestellt. Eine Nachverdichtung der Stellplätze, ein Carport oder eine spätere Terrassennutzung ist nicht Bestandteil dieses Stands und darf nicht ohne Prüfung der Genehmigungslage umgesetzt werden.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Übergabe des koordinierten Ausführungsstands

Wir übergeben den koordinierten Stand für die Vorbereitung der Vergabe. Er umfasst das unveränderte Wohnungsprogramm, die abgestimmten Barrierefreiheitsmaßnahmen und die genehmigte Kubatur. Die weiter unten bezeichneten unternehmerbezogenen Unterlagen werden nach Vergabe geprüft; sie sind kein Anlass, fachlich noch offene Entscheidungen als bereits erledigt zu behandeln.

1 Abgestimmte Grundlagen

Die Planung bleibt bei drei Vollgeschossen, 820 m² Brutto-Grundfläche und 600 m² Wohnfläche. Der Rücksprung über dem ersten Obergeschoss wird als Wartungsdach ausgeführt. Alle acht Wohnungen sind barrierefrei vorgesehen; WE 01 ist rollstuhlgerecht. Der Aufzug erschließt drei Halte. Die Nachforderung der Bauaufsicht wurde am 24. Juni beantwortet, die Genehmigung am 16. Juli erteilt. Die Nebenbestimmungen werden im Bauablauf fortgeführt.

2 Schnittstellen der Vergabe

Die sieben Lose umfassen Rohbau, Dach und Fassade und Fenster, Heizung und Lüftung und Sanitär, Elektro und Photovoltaik, Innenausbau, Aufzug sowie Außenanlagen. An den Losgrenzen sind insbesondere Abdichtungsanschlüsse, Durchbrüche, Brandschutzabschottungen, Stromversorgung des Aufzugs und der Wärmepumpe sowie die Erdarbeiten für die Rückhaltung ausdrücklich zuzuordnen. Eine Leistung darf nicht allein wegen einer Schnittstelle in beiden Leistungsverzeichnissen unbemerkt abgerechnet werden.

3 Werkplanung und Freigaben

Die Aufzugsfirma liefert nach Vergabe die produktspezifische Werkplanung; die Tragwerksplanung prüft die übergebenen Lasten und Befestigungspunkte. Die Fensterfirma legt die Detailanschlüsse und die lichten Durchgänge vor Fertigung vor. Die Photovoltaikmontage wird mit Dachabdichtung und Tragwerk abgestimmt. Diese Prüfungen sind vor den jeweils betroffenen Arbeiten einzuplanen. Eine Vergabeentscheidung ersetzt die technische Freigabe der Werkplanung nicht.

4 Offene Entscheidung der Bauherrin

Für die Wärmepumpe liegen zwei technisch mögliche Geräte vor. Der Vergleich wird mit den endgültigen Angeboten und dem Schallnachweis abgeschlossen. Die Bauherrin entscheidet hierüber im Rahmen der Vergabe. Die zuvor zurückgestellte Dachterrasse wird nicht als Wahlposition aufgenommen. Änderungen gegenüber dem vorliegenden Stand sind in der Vergabeempfehlung mit Kosten, Terminfolge und gegebenenfalls Genehmigungsbedarf darzustellen.

Die Unterlagen sind zur Ausschreibung freigegeben. Bestellungen setzen Auftrag, freigegebene Werkplanung und erforderliche Nachweise voraus. Spätere Revisionen werden mit Empfängern und Ausgabedatum protokolliert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: 150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf

SW-HI-26-08 · Seite 1

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.10.2027 · SW-HI-26-08

Vergabetermine und Schnittstellen der sieben Bauaufträge

Die Ausführungsplanung liegt im freigegebenen Stand vom 24.09.2027 vor. Wir schlagen eine private Einzelvergabe in sieben Losen vor. Die Bauherrin finanziert das Gebäude aus Eigenkapital und Bankdarlehen. Förderbescheide oder besondere vergaberechtliche Verpflichtungen wurden uns nicht vorgelegt. Die Bauherrin entscheidet über jeden Vertrag selbst.

1 Termine und Verantwortliche

Vorgang	Termin	Verantwortlich
Versand des vollständigen LV	04.10.2027	Nora Feld
Fragen bis / gemeinsame Antwort	18.10. / 22.10.2027	Fachplaner und Architektur
Angebotseingang	29.10.2027	Maren Birk
Technische und rechnerische Prüfung	01. bis 05.11.2027	Architektur und TGA
Verhandlung und Entscheidung	08. bis 10.11.2027	Bauherrin mit Rechtsanwalt
Vertragsschluss	12.11.2027	Bauherrin und Unternehmen
Einrichtung / Baubeginn	01.12. / 06.12.2027	Steinwerk Hochbau
Gemeinsame förmliche Abnahmen	15.09.2028	Bauherrin und Unternehmen

2 Unterlagen und Vollmacht

Das Leistungsverzeichnis umfasst die sieben Lose und ihre Schnittstellen. Planstände sind in den Vertragsanlagen bezeichnet. Nachträgliche Bieterantworten werden allen betroffenen Unternehmen im gleichen Wortlaut übermittelt. Frau Feld prüft technische und wirtschaftliche Angaben und erstellt den Vergabevorschlag. Sie erhält keine Abschlussvollmacht. Die rechtliche Vertragsgestaltung erfolgt aufgrund des unmittelbaren Mandats der Bauherrin durch die Kanzlei Leinebogen.

Die Rohbaufirma stellt das Gerüst für ihren eigenen Leistungsumfang. Fassadenarbeiten und dafür benötigte Gerüste verbleiben im Hüllenlos. PV-Befestigung, Dachabdichtung und Leitungsdurchführungen sind vor Ausführung gemeinsam freizugeben. Ein niedriger Angebotspreis ersetzt den Nachweis der vollständigen Leistung und der personellen Verfügbarkeit nicht.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Leistungsverzeichnis für das Achtfamilienhaus

1 Projekt und Angebotsgrundlagen

Gegenstand ist der schlüssige Ausbau eines Wohnhauses mit acht Mietwohnungen und 600 m² Wohnfläche. Der Auftrag ist in die nachfolgenden Lose geteilt. Jedes Unternehmen bietet sämtliche beschriebenen Leistungen seines Loses an und bezeichnet Abweichungen ausdrücklich in einem gesonderten Begleitschreiben. Das LV ist eine funktional und bauteilbezogen gegliederte Pauschalleistungsbeschreibung. Planmaße und Fachnachweise bleiben verbindlich; die pauschalen Positionen erlauben keine freie Änderung des vereinbarten Qualitätsstandards. Preise werden netto zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer angeboten.

Zu berücksichtigen sind drei Geschosse, kein Keller, ein Aufzug mit drei Haltestellen, acht barrierefreie Wohnungen einschließlich der rollstuhlgerichten Wohnung 01, die Wärmepumpenanlage und die vereinbarte PV-Anlage. Angrenzende Grundstücke und der öffentliche Gehweg dürfen ohne gesonderte Gestattung nicht als Lagerfläche genutzt werden. Die Ausführung erfolgt nach dem freigegebenen Planregister und den Baugenehmigungsunterlagen.

2 Erdarbeiten und Rohbau

2.1 Baustelleneinrichtung

Bauzaun mit abschließbarem Zugang, Sanitärcontainer, Baustrom-Unterverteilung, Baustellenbeleuchtung und Kran einschließlich Aufbau, Betrieb und Rückbau für den Rohbau. Der öffentliche Gehweg bleibt frei. Der von der Bauherrin beauftragte SiGe-Koordinator erhält Zugang. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

Aushub für Bodenplatte, Leitungsgräben und Aufzugunterfahrt innerhalb des freigegebenen Baufeldes, getrennte Bodenlagerung, Abfuhr überschüssigen unbelasteten Bodens und Verdichtungskontrollen. Grundlage ist der Baugrundbericht. Abweichende wasserführende Schichten sind vor weiterer Bearbeitung zu dokumentieren. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.3 Beton und tragendes Mauerwerk

Bodenplatte, Stützen, drei Geschosse mit tragenden Wänden und Geschossdecken sowie Treppenläufe nach freigegebener Schal- und Bewehrungsplanung. Gebäude EG und 1. OG 20,00 mal 15,00 m, oberstes Geschoss 20,00 mal 11,00 m, ohne Keller. Einbauteile, Aussparungen und Aufzugschacht sind mit den Fachplänen abzugleichen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.4 Rohbaunebenarbeiten

Nichttragende Rohbauwände, Anschlüsse, Gerüste für den eigenen Leistungsumfang, Treppenpodeste, Durchbruchschließungen und geplanter Sockelrohbau. Die Gebäudehülle und der Innenausbau werden gesondert ausgeführt. Vor dem Betonieren erfolgt ein gemeinsamer Abgleich der Durchführungen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3 Dach Fassade und Fenster

3.1 Dachabdichtung und Dämmung

Abdichtung beider Flachdachebenen mit insgesamt 300 m² Dachgrundfläche nach Detailplanung, Gefälledämmung, Attikaanschlüsse, Haupt- und Notentwässerung. Die Unterkonstruktion der PV-Anlage wird mit Los Elektro abgestimmt. Befestigungen dürfen die Dachabdichtung nicht unkontrolliert durchdringen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.2 Fassade und Sockel

Vollständiges Dämm- und Putzsystem für die planmäßig dargestellten Außenwände einschließlich Laibungen, Brandriegeln nach Fachplanung, Sockelanschlüssen und Gerüst. Bauteilanschlüsse werden vor dem Verdecken fotografisch und im Prüfprotokoll dokumentiert. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.3 Fenster und Außentüren

Sämtliche Fenster und Außentüren des Achtfamilienhauses nach Fensterliste, einschließlich Montage, dreistufigem Anschluss, Außenfensterbänken und erforderlichen Sicherheitsverglasungen. Schwellenlose Zugänge der acht Wohnungen und Rettungsöffnungen sind nach freigegebenen Detailmaßen auszuführen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung

Außenliegender Sonnenschutz an den dafür vorgesehenen Wohnraumfenstern, Funktionsprüfung, Einstellung der Beschläge sowie Luftdichtheits- und Anschlusskontrollen mit den zuständigen Fachleuten. Elektrische Zuleitungen kommen aus Los Elektro. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4 Heizung Lüftung und Sanitär

4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung

Zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit je 18 kW nominaler Leistung, Speicher, Pumpen und Regelung nach TGA-Planung. Leistungsangaben ersetzen nicht die raumweise Heizlastberechnung. Hydraulischer Abgleich, dokumentierte Einstellwerte und Einweisung sind eingeschlossen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.2 Sanitäre Anlagen

Trinkwasser- und Abwasserinstallation für acht Wohnungen sowie Hausanschluss- und Technikbereich. Vollständige Bäder nach freigegebenen Ausstattungslisten, insbesondere rollstuhlgerechte Ausstattung der Wohnung 01. Druck-, Dichtheits- und Spülprotokolle werden vor Abnahme übergeben. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.3 Lüftung und Schallschutz

Wohnungslüftung, erforderliche Abluftführung, Schalldämpfung und Kondensatableitung nach abgestimmter TGA-Planung. Einregulierung jeder Wohnung und Messprotokoll für die vorgesehenen Betriebsstufen. Brandschutzdurchführungen werden zugelassen und gekennzeichnet ausgeführt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.4 Zähler und Inbetriebnahme

Acht Wohnungswärmezähler sowie die vereinbarten Wasserzähler, Kennzeichnung, Anlagenbuch, Prüfungen und gemeinsame Inbetriebnahme. Die Mietverwaltung erhält die Zählerzuordnung und die Bedienunterlagen. Ein Wartungsvertrag ist gesondert zu schließen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5 Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

5.1 Elektroinstallation

Zählerschrank, Hauptverteilung, acht Wohnungsverteilungen, Stromkreise, Steckdosen, Lichtauslässe, Potentialausgleich und Schutzmaßnahmen nach Fachplanung. Mess- und Prüfprotokolle jeder Verteilung sowie Stromlaufpläne gehören zur Übergabe. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom

Türkommunikation, Glasfaser-Leerrohre, Allgemeinbeleuchtung, Aufzugzuleitung und technische Stromkreise. Wohnungsstromverträge schließen die Mietparteien selbst. Die PV-Anlage versorgt vereinbarungsgemäß den Allgemeinstromkreis. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.3 Ladeinfrastruktur

Vollständige Vorverkabelung aller acht Pkw-Stellplätze und zwei Ladepunkte mit Lastmanagement, davon einer am barrierefreien Stellplatz. Leitungswege, Leistungsschutz und mögliche Erweiterung werden dokumentiert. Die Netzabstimmung ist im Angebot enthalten. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.4 Photovoltaik

PV-Anlage mit 80 Modulen zu je 450 Wp und insgesamt 36 kWp auf dem Wohnhaus, Wechselrichter, Leitungen und Montage. Modulfläche insgesamt 160 m². Inbetriebnahme und Messkonzept mit dem Netzbetreiber sind eingeschlossen. Eine Strombelieferung der einzelnen Mietparteien ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6 Innenausbau und Bodenbeläge

6.1 Trockenbau und Innenputz

Nichttragende Ausbaukonstruktionen, Installationsschächte und Oberflächen nach freigegebenem Ausbauplan. Schall- und brandschutzrelevante Konstruktionen werden mit den Fachnachweisen abgestimmt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.2 Estrich und Bodenbeläge

Estrich einschließlich erforderlicher Trocknungs- und Belegreifemessungen sowie Bodenbeläge in acht Wohnungen und allgemeinen Verkehrsflächen nach Raumliste. Wohnung 07 erhält den im Auftrag benannten Eichenbelag. Ein Ersatzmaterial bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.3 Innentüren

Wohnungseingangs- und Innentüren einschließlich Zargen, Beschlägen und Schließanlage. Erforderliche lichte Durchgänge und Bewegungsflächen dürfen durch Zargen oder Türanschlüsse nicht vermindert werden. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.4 Malerarbeiten und Endreinigung

Anstriche, Fugenarbeiten im eigenen Gewerk, Schutz und Reinigung bis zur Abnahme. Dauerelastische Fugen werden dokumentiert; Wartungspflichten der späteren Nutzer werden verständlich erläutert. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7 Aufzuganlage

7.1 Anlage und Montage

Personenaufzug mit drei Haltestellen, nutzbarer Kabine 1,10 mal 1,40 m und lichter Türbreite 0,90 m nach abgestimmter Planung. Traglast 630 kg. Schacht, Unterfahrt und Überfahrt werden vor Fertigung aufgemessen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7.2 Steuerung und Notruf

Steuerung, automatische Türen, barrierefrei erreichbare Bedienelemente, Zweirichtungs-Kommunikation und Notrufanbindung. Laufende Notruf- und Wartungsentgelte werden in einem gesonderten Betriebsvertrag geregelt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7.3 Prüfung und Übergabe

Erforderliche Prüfung vor Inbetriebnahme durch die zuständige zugelassene Überwachungsstelle organisieren, Befunde beseitigen, Unterlagen und Einweisung übergeben. Die Prüfentscheidung trifft die Prüfstelle selbst. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8 Außenanlagen und Entwässerung

8.1 Wege und Stellplätze

Stufenlose Hauszugänge, acht Pkw-Stellplätze einschließlich eines gekennzeichneten barrierefreien Stellplatzes, befestigte Fahrradstellplätze und Abfallstandfläche. Gefälle und Anschlusshöhen nach freigegebenem Außenanlagenplan. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8.2 Entwässerung

Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zu den vereinbarten Übergabepunkten, Rückhaltung und gedrosselte Ableitung nach freigegebener Entwässerungsplanung. Keine Versickerung ohne nachgewiesene Eignung und behördliche Zulässigkeit. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8.3 Grün und Spielbereich

Bepflanzung, Rasen, 30 m² Kleinkinderspielbereich mit Einfriedung zum Fahrbereich und Sitzgelegenheit. Fertigstellungspflege bis zur Abnahme und Nachpflegevereinbarung sind eingeschlossen. Geräteunterlagen und Prüfbericht werden übergeben. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

9 Gemeinsame Vertragsvorbereitung

Die Angebotsbindung endet am 19.11.2027. Der Ausführungsterminplan ist mit dem Angebot zu bestätigen. Abschlüsse setzen einen nachvollziehbaren Leistungsstand voraus. Prüfungen, Freigaben und Bedenken sind mit konkretem Plan- und Bauteilbezug zu dokumentieren. Vor Ausführung zusätzlicher Leistungen ist deren Grundlage mit der Bauherrin zu klären; gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Eine vom Planer ausgesprochene technische Empfehlung ist kein rechtsgeschäftlicher Zusatzauftrag.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Erdarbeiten und Rohbau

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
2.1	Baustelleneinrichtung	40.000,00
2.2	Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung	90.000,00
2.3	Beton und tragendes Mauerwerk	360.000,00
2.4	Rohbaunebenarbeiten	160.000,00
	Summe netto	650.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Timo Wendt, Bauleiter
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Vergleichsangebot für Erdarbeiten und Rohbau

Unser Angebot umfasst das Rohbaulos gemäß Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027. Die Preise beruhen auf dem vorgesehenen Baugrund und den freigegebenen Planunterlagen. Die im Bodengutachten beschriebenen Erkundungspunkte erfassen keine lückenlose Untersuchung jedes späteren Aushubbereichs. Bei abweichendem Befund unterbrechen wir nur die betroffene Arbeit und informieren die Bauherrin vor einer Mehrleistung.

Position	Netto EUR
Baustelleneinrichtung	44.000,00
Erdarbeiten	94.000,00
Beton und tragendes Mauerwerk	376.000,00
Rohbaunebenarbeiten	167.000,00
Gesamt netto	681.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	129.390,00
Gesamt brutto	810.390,00

Der früheste Baubeginn ist der 17.01.2028. Die Baustelleneinrichtung könnte ab 10.01.2028 erfolgen. Einen Beginn im Dezember 2027 können wir aufgrund bestehender Bindungen nicht zusagen. Die Rohbauübergabe verschiebt sich dementsprechend um sechs Wochen. Unsere Angebotsbindung endet am 19.11.2027.

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Dokumentations- und Prüfleistungen sind berücksichtigt. Angebote Dritter, Förderbedingungen oder eine nachträgliche Änderung des Ausführungsstandards haben wir nicht eingepreist. Vertragsbedingungen der Bauherrin möchten wir vor einer verbindlichen Auftragsannahme in ihrer vollständigen Fassung prüfen.

gez. Holger Kern, Geschäftsführer

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Dach Fassade und Fenster

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
3.1	Dachabdichtung und Dämmung	130.000,00
3.2	Fassade und Sockel	130.000,00
3.3	Fenster und Außentüren	140.000,00
3.4	Sonnenschutz und Anschlussprüfung	40.000,00
	Summe netto	440.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Ina Mertens, Projektleitung
Anlagen: keine

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermefluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Heizung Lüftung und Sanitär

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
4.1	Wärmeerzeugung und Verteilung	140.000,00
4.2	Sanitäre Anlagen	125.000,00
4.3	Lüftung und Schallschutz	65.000,00
4.4	Zähler und Inbetriebnahme	30.000,00
	Summe netto	360.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Arne Thiel, Bauleitung
Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
5.1	Elektroinstallation	65.000,00
5.2	Kommunikation und Allgemeinstrom	20.000,00
5.3	Ladeinfrastruktur	20.000,00
5.4	Photovoltaik	45.000,00
	Summe netto	150.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die Position Photovoltaik wird bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen mit dem Nullsteuersatz abgerechnet. Für die übrigen Leistungen legen wir 19 Prozent Umsatzsteuer zugrunde. Die Voraussetzungen und die Rechnungsaufteilung werden vor Auftragserteilung mit der Bauherrin dokumentiert.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Innenausbau und Bodenbeläge

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
6.1	Trockenbau und Innenputz	100.000,00
6.2	Estrich und Bodenbeläge	90.000,00
6.3	Innentüren	55.000,00
6.4	Malerarbeiten und Endreinigung	55.000,00
	Summe netto	300.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Jan Merz, Bauleiter
Anlagen: keine

Hubpunkt Aufzüge GmbH

Technikhof 5, 31135 Hildesheim
montage@hubpunkt.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Aufzugsanlage

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
7.1	Anlage und Montage	45.000,00
7.2	Steuerung und Notruf	8.000,00
7.3	Prüfung und Übergabe	7.000,00
	Summe netto	60.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Ralf Hanke, Montageleitung

Anlagen: keine

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH

Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
bau@gruenkante.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Außenanlagen und Entwässerung

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
8.1	Wege und Stellplätze	60.000,00
8.2	Entwässerung	30.000,00
8.3	Grün und Spielbereich	30.000,00
	Summe netto	120.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Mira Roth, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 10.11.2027 · SW-HI-26-08

Vergabevorschlag und dokumentierte Entscheidung

Wir empfehlen die Vergabe der sieben Lose an die in der folgenden Tabelle genannten Unternehmen. Die bauherrenseitige Entscheidung ist am 10.11.2027 im Beisein von Maren Birk, Nora Feld und Rechtsanwalt Dr. Felix Groth protokolliert worden. Die fachliche Angebotsprüfung wurde durch Architektur, Tragwerks- und TGA-Planung jeweils für den eigenen Leistungsbereich ergänzt.

Los	Auftragnehmer	Netto EUR
Erdarbeiten und Rohbau	Steinwerk Hochbau GmbH	650.000,00
Dach Fassade und Fenster	Dachraum Gebäudehülle GmbH	440.000,00
Heizung Lüftung und Sanitär	Wärmefluss Haustechnik GmbH	360.000,00
Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur	Lichtkreis Elektro GmbH	150.000,00
Innenausbau und Bodenbeläge	Innenraum Ausbau GmbH	300.000,00
Aufzuganlage	Hubpunkt Aufzüge GmbH	60.000,00
Außenanlagen und Entwässerung	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH	120.000,00

Für das Rohbaulos liegen zwei unmittelbar vergleichbare Angebote vor. Steinwerk ist um 31.000,00 EUR netto günstiger und bestätigt den erforderlichen Dezemberbeginn. Massivbogen nennt den 17.01.2028. Die Bauherrin beauftragt Steinwerk nach Prüfung der Referenzen und der Personalbenennung. Aus der Terminabweichung wird keine vergaberechtliche Ausschlussentscheidung abgeleitet; es handelt sich um eine private Vertragsentscheidung.

Die übrigen Lose wurden nach Marktansprache mit den jeweils beigefügten vollständigen Angeboten verhandelt. Die Entscheidung beruht auf Leistungsumfang, Schnittstellen und Kapazität, nicht auf einer behaupteten öffentlichen Ausschreibung. Eine besondere Bindung aus Fördermitteln liegt nicht vor. Die Hüllenfirma bestätigt das Schnittstellengespräch zu PV-Befestigung und Fensteranschlüssen.

Die angebotenen Nettosummen werden zu den angebotenen Steuersätzen in die Kostenfortschreibung übernommen. Die rechtlichen Vertragsbedingungen werden von der unmittelbar beauftragten Kanzlei freigegeben. Frau Birk unterzeichnet jeden Vertrag selbst. Frau Feld erhält daraus keine Befugnis, Nachträge rechtsgeschäftlich anzunehmen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Dr. Felix Groth, Rechtsanwalt" <bau@kanzlei-leinebogen.example>
Datum	Mon, 08 Nov 2027 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Unmittelbares Mandat für die sieben Bauverträge

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beauftragen Ihre Kanzlei unmittelbar mit der rechtlichen Ausgestaltung und Prüfung unserer sieben Bauverträge. Mandantin ist die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch mich. Frau Feld liefert die technischen Leistungsbeschreibungen, Planstände und wirtschaftlichen Angebotsergebnisse. Sie soll keine individuellen Rechtsklauseln im eigenen Architektenauftrag für uns entwerfen.

Bitte prüfen Sie die Abgrenzung der Gewerke, die Vergütung einschließlich des unterschiedlichen Steuersatzes für die PV-Leistung, den Änderungsprozess und die Nachweise bei Abschlägen. Die Ausführung soll dem BGB-Bauvertragsrecht unterliegen. Eine pauschale Einbeziehung der VOB/B oder allgemeiner Bedingungen aus Angebotsschreiben ist nicht gewünscht. Für das Rohbaulos bitten wir um eine angemessene Mängelsicherheit nach Abnahme.

Die Freigabe des endgültigen Vertragstextes erfolgt durch unsere Geschäftsführung nach Ihrer Beratung. Den Unternehmen darf der verbindliche Auftrag erst mit unserer Unterschrift erteilt werden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn für Ihre rechtliche Prüfung weitere technische oder tatsächliche Angaben erforderlich sind. Fragen zu den Ausführungsdetails richten Sie mit uns in Kopie an Frau Feld.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Birk, Geschäftsführerin
Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Erdarbeiten und Rohbau

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Steinwerk Hochbau GmbH, vertreten durch Timo Wendt, Bauleiter, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Erdarbeiten und Rohbau. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Baustelleneinrichtung	40.000,00
Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung	90.000,00
Beton und tragendes Mauerwerk	360.000,00
Rohbaunebenarbeiten	160.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 650.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 123.500,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 773.500,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Nach Abnahme stellt der Unternehmer eine Mängelsicherheit in Höhe von 32.500,00 EUR durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts. Die Sicherheit ist nicht auf erstes Anfordern zu zahlen. Sie dient nur den gesicherten Mängelansprüchen aus diesem Vertrag und wird zurückgegeben, sobald nach Ablauf der maßgeblichen Frist keine gesicherten Ansprüche mehr bestehen. Ein doppelter Bareinbehalt wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Timo Wendt, Bauleiter.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Dach Fassade und Fenster

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Dachraum Gebäudehülle GmbH, vertreten durch Ina Mertens, Projektleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Dach Fassade und Fenster. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Dachabdichtung und Dämmung	130.000,00
Fassade und Sockel	130.000,00
Fenster und Außentüren	140.000,00
Sonnenschutz und Anschlussprüfung	40.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 440.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 83.600,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 523.600,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Ina Mertens, Projektleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Wärmefluss Haustechnik GmbH
Installationshof 16, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Heizung Lüftung und Sanitär

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Wärmefluss Haustechnik GmbH, vertreten durch Arne Thiel, Bauleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Heizung Lüftung und Sanitär. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Wärmeerzeugung und Verteilung	140.000,00
Sanitäre Anlagen	125.000,00
Lüftung und Schallschutz	65.000,00
Zähler und Inbetriebnahme	30.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 360.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 68.400,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 428.400,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Arne Thiel, Bauleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Lichtkreis Elektro GmbH, vertreten durch Selin Voß, Elektromeisterin, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Elektroinstallation	65.000,00
Kommunikation und Allgemeinstrom	20.000,00
Ladeinfrastruktur	20.000,00
Photovoltaik	45.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 150.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 19.950,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 169.950,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die PV-Position von 45.000,00 EUR wird getrennt mit dem Nullsteuersatz ausgewiesen; die Bestellerin bestätigt die Installation auf ihrem Wohnhaus und ihre Stellung als Betreiberin.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfaren Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen

Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Selin Voß, Elektromeisterin.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Innenausbau und Bodenbeläge

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Innenraum Ausbau GmbH, vertreten durch Jan Merz, Bauleiter, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Innenausbau und Bodenbeläge. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Trockenbau und Innenputz	100.000,00
Estrich und Bodenbeläge	90.000,00
Innentüren	55.000,00
Malerarbeiten und Endreinigung	55.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 300.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 57.000,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 357.000,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Jan Merz, Bauleiter.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Hubpunkt Aufzüge GmbH
Technikhof 5, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Aufzuganlage

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Hubpunkt Aufzüge GmbH, vertreten durch Ralf Hanke, Montageleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Aufzuganlage. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Anlage und Montage	45.000,00
Steuerung und Notruf	8.000,00
Prüfung und Übergabe	7.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 60.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 11.400,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 71.400,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche

Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Ralf Hanke, Montageleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Außenanlagen und Entwässerung

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Grünkante Garten und Tiefbau GmbH, vertreten durch Mira Roth, Geschäftsführerin, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Außenanlagen und Entwässerung. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Wege und Stellplätze	60.000,00
Entwässerung	30.000,00
Grün und Spielbereich	30.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 120.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 22.800,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 142.800,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfaren Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche

Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Mira Roth, Geschäftsführerin.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Vorgang	Beginn	Ende	Verantwortlich	Abhängigkeit
Baustelleneinrichtung	2027-12-01	2027-12-03	Steinwerk	Freigabe Baufeld
Erdarbeiten und Gründung	2027-12-06	2028-02-18	Steinwerk	Baugrund und Tragwerk
Rohbau Geschosse	2028-02-21	2028-04-28	Steinwerk	Gründung
Dach und Gebäudehülle	2028-04-03	2028-06-16	Dachraum	Abschnittsweise Rohbaufreigabe
TGA Rohinstallation	2028-04-10	2028-06-30	Wärmefluss und Lichtkreis	Durchführungen abgestimmt
Innenausbau	2028-06-05	2028-08-31	Innenraum	Witterungsschutz und Trocknung
Aufzug	2028-07-03	2028-08-25	Hubpunkt	Schachtaufmaß
Außenanlagen	2028-07-17	2028-09-08	Grünkante	Schwerlastverkehr beendet
Inbetriebnahme	2028-09-04	2028-09-08	Planwerk und Fachfirmen	Prüfunterlagen
Vorbegehung	2028-09-10	2028-09-10	Konturfeld	Fertigstellungsanzeigen
Förmliche Abnahmen	2028-09-15	2028-09-15	Bauherrin	Abnahmereife
Wohnungsübergaben	2028-09-29	2028-09-29	Mietverwaltung	Nutzbarkeit und Zählerdaten

Datum: 2027-12-01

Witterung: trocken 5°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Bauzaun und Container gesetzt; Zugang vom Gehweg getrennt

Veranlassung: Zugang täglich sichern

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2027-12-06

Witterung: bedeckt 4°C

Personal: 6

Arbeiten und Befund: Aushub westlicher Abschnitt begonnen; Leitungsmarkierungen vorhanden

Veranlassung: Baugrundabgleich beim Aushub

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2027-12-16

Witterung: Regen 3°C

Personal: 5

Arbeiten und Befund: Bodenlager abgedeckt; offene Gräben gesichert

Veranlassung: Keine Betonage bei ungeeigneter Witterung

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-01-12

Witterung: trocken 2°C

Personal: 7

Arbeiten und Befund: Vorbereitung Sauberkeitsschicht; Tragwerk prüft Aussparungen

Veranlassung: Protokoll vor Betonage

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-02

Witterung: Regen 6°C

Personal: 6

Arbeiten und Befund: Feinsandschicht südöstlich angetroffen; Teilbereich offen

Veranlassung: Baugrundplanung und Bauherrin informiert

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-07

Witterung: trocken 7°C

Personal: 3

Arbeiten und Befund: Beauftragte Filterpackung begonnen; westliche Arbeiten fortgeführt

Veranlassung: Getrennte Stundenaufzeichnung

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-02-11

Witterung: trocken 8°C

Personal: 3

Arbeiten und Befund: Nachtrag01 gemeinsam aufgemessen; Anschluss kontrolliert

Veranlassung: Vor Verdecken dokumentiert

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-21

Witterung: bedeckt 8°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbau EG; Schal- und Bewehrungsstand abgeglichen

Veranlassung: Aussparungen TGA beachtet

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-03-09

Witterung: trocken 10°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Decke EG betoniert; Betonlieferscheine im Rohbauordner

Veranlassung: Nachbehandlung dokumentieren

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-03-23

Witterung: bedeckt 9°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbau1OG; Schachtmaße kontrolliert

Veranlassung: Aufzugfirma erhält Maßblatt

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-04-03

Witterung: trocken 12°C

Personal: 10

Arbeiten und Befund: Dacharbeiten erster Abschnitt begonnen; Abstimmung PV

Veranlassung: Keine ungeprüften Durchdringungen

Zeichnung: I.Mertens

Datum: 2028-04-28

Witterung: trocken 16°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbauabschnitt abgeschlossen; Mauerwerk und Öffnungen sichtbar geprüft

Veranlassung: Übergabe an Folgegewerke

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-05-12

Witterung: Regen 14°C

Personal: 11

Arbeiten und Befund: Fenster eingesetzt; Anschlussfugen in Arbeit

Veranlassung: Stichproben vor Verkleidung

Zeichnung: I.Mertens/N.Feld

Datum: 2028-06-05

Witterung: trocken 20°C

Personal: 12

Arbeiten und Befund: Trockenbau und Leitungsführung; Abschottungen noch offen

Veranlassung: Kennzeichnung je Durchdringung

Zeichnung: J.Merz/E.Sand

Datum: 2028-06-16

Witterung: trocken 22°C

Personal: 9

Arbeiten und Befund: Gebäudehülle geschlossen; PV-Unterkonstruktion abgestimmt

Veranlassung: Dachprotokoll ergänzen

Zeichnung: I.Mertens/S.Voß

Datum: 2028-06-30

Witterung: bedeckt 19°C

Personal: 10

Arbeiten und Befund: TGA-Rohinstallation fertig; Druckprüfung angekündigt

Veranlassung: Vor Estrich dokumentieren

Zeichnung: A.Thiel

Datum: 2028-07-17

Witterung: trocken 24°C

Personal: 7

Arbeiten und Befund: Außenanlagen begonnen; Stellplatz01 abgesteckt

Veranlassung: Bewegungsfläche freigehalten

Zeichnung: M.Roth

Datum: 2028-08-10

Witterung: trocken 23°C

Personal: 12

Arbeiten und Befund: Beläge eingebaut; WE07 Musterabweichung noch nicht erkannt

Veranlassung: Endkontrolle je Wohnung

Zeichnung: J.Merz

Datum: 2028-08-25

Witterung: trocken 21°C

Personal: 5

Arbeiten und Befund: Aufzugmontage beendet; Prüfungstermin 07.09.

Veranlassung: Betrieb erst nach erforderlicher Prüfung

Zeichnung: R.Hanke

Datum: 2028-09-08

Witterung: trocken 18°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Gemeinsame Inbetriebnahme; Anlagenprotokolle geordnet

Veranlassung: Einweisung Verwaltung

Zeichnung: E.Sand/N.Feld

Datum: 2028-09-10

Witterung: bedeckt 17°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Vorbegehung: Tür, Fensterbank WE05, Belag WE07

Veranlassung: Konkrete Mängelmitteilung

Zeichnung: N.Feld

Datum: 2028-09-14

Witterung: trocken 19°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Tür und Fensteranschluss bearbeitet; Belag offen

Veranlassung: Vorbehalt im Abnahmeprotokoll

Zeichnung: N.Feld

Datum: 2028-09-15

Witterung: trocken 18°C

Personal: 9

Arbeiten und Befund: Förmliche Abnahmen; Belagsvorbehalt WE07

Veranlassung: Protokoll von Parteien gezeichnet

Zeichnung: M.Birk/N.Feld

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 02.02.2028 · SW-HI-26-08

Baubesprechung zum abweichenden Bodenbefund

Am 02.02.2028 haben Maren Birk, Nora Feld, Timo Wendt und Dr. Ute Venn die südöstliche Gründungsecke besichtigt. Beim Aushub wurde eine örtlich begrenzte wasserführende Feinsandschicht angetroffen. Die ursprünglichen Erkundungspunkte lagen außerhalb dieses Bereichs. Der Befund wird weder als allgemeiner Fehler des gesamten Baugrundberichts noch als Freigabe einer beliebigen Grundwasserabsenkung verstanden.

Die betroffene Fläche von rund 24 m² bleibt bis zur abgestimmten Sicherung offen. Dr. Venn empfiehlt eine technisch bemessene Filter- und Dränpackung unter dem lokalen Anschlussbereich. Der vorhandene Entwässerungsanschluss darf dafür nicht ohne Abstimmung genutzt werden. Die erforderliche Ableitung erfolgt innerhalb des freigegebenen Baustellenentwässerungskonzepts.

Steinwerk legt bis zum 04.02.2028 ein Nachtragsangebot mit Mengen, Arbeitsstunden und Materialansätzen vor. Frau Feld und die Tragwerksplanung prüfen die technische Einbindung. Nur Frau Birk entscheidet über den Zusatzauftrag. Die Arbeiten an der westlichen Bodenplattenzone können fortgesetzt werden. Ein allgemeiner Stillstand der gesamten Baustelle wird nicht festgestellt.

Timo Wendt nennt zunächst fünf Arbeitstage Auswirkung auf die betroffene Zone. Eine Beschleunigung im März wird geprüft. Ein neuer Endtermin wird heute nicht vereinbart. Die Kostenfortschreibung wird erst nach der Auftragserteilung mit dem vereinbarten Betrag aktualisiert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 02 Feb 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Behinderung im südöstlichen Gründungsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir zeigen an, dass die im Besprechungsprotokoll beschriebene Feinsandschicht die planmäßige Herstellung der Gründung in der südöstlichen Ecke derzeit verhindert. Der betroffene Abschnitt umfasst Achsen C bis D / 3 bis 4. Die zwei eingesetzten Mitarbeiter und der Bagger werden soweit möglich in der westlichen Zone weiterbeschäftigt. Eine vollständige Stilllegung liegt nicht vor.

Ohne Freigabe der ergänzenden Filterpackung können wir die Bewehrung in diesem Abschnitt nicht planmäßig schließen. Unsere erste Einschätzung beträgt fünf Arbeitstage Verzögerung. Ob daraus eine Verschiebung der gesamten Rohbauübergabe folgt, hängt von der Freigabe und den anschließenden Betoniertakten ab.

Wir bitten um Entscheidung nach Vorlage unseres Angebots. Die Anzeige enthält noch keine abschließende Forderung wegen Mehrkosten oder Bauzeitverlängerung. Arbeitsstunden, Geräteeinsatz und Materialverbrauch werden getrennt erfasst. Bitte bestätigen Sie den Eingang und benennen Sie die Entscheidungsperson für den Zusatzauftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 04.02.2028

Nachtragsangebot 01 für lokale Filter und Dränpackung

Auf Grundlage der Baustellenbesprechung vom 02.02.2028 und der technischen Ergänzung der Baugrundplanung bieten wir die örtlich begrenzte zusätzliche Filter- und Dränpackung an. Die Leistung war nach unserer Auslegung des vereinbarten Bodenbefunds nicht in der ursprünglichen Pauschale enthalten. Die Bestellerin hat diese Einordnung vor Auftragserteilung zu prüfen.

Leistung	Menge	Einheitspreis EUR	Netto EUR
Zusätzlicher Aushub und getrennter Abtransport	60 m³	85,00	5.100,00
Filtermaterial liefern und einbauen	45 m³	160,00	7.200,00
Dränleitung mit Anschluss im genehmigten System	30 m	95,00	2.850,00
Zusätzliche Arbeitsstunden und örtliche Prüfungen	57 h	50,00	2.850,00
Gesamt netto			18.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			3.420,00
Gesamt brutto			21.420,00

Bei schriftlicher Beauftragung bis zum 05.02.2028 führen wir die Arbeiten vom 07. bis 11.02.2028 aus. Die Mengen werden gemeinsam aufgenommen. Die Vergütung wird für den beschriebenen Leistungsumfang als Pauschale von 18.000,00 EUR netto vereinbart. Nicht enthalten ist eine dauerhafte Grundwasserabsenkung außerhalb des vorhandenen Konzepts.

Die Ausführung erlaubt nach unserer Terminabstimmung vom 04.02.2028 den Anschluss an den nächsten Betoniertakt. Den Abnahmetermin 15.09.2028 bestätigen wir bei unverzüglicher Freigabe weiterhin. Aus diesem Angebot ergibt sich kein Anspruch auf zusätzliche Beschleunigungsvergütung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter
Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
Datum	Sat, 05 Feb 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Auftrag für Nachtrag 01 zum Rohbauvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beauftragen die im Nachtragsangebot vom 04.02.2028 vollständig beschriebene örtliche Filter- und Dränpackung zum Pauschalpreis von 18.000,00 EUR netto zuzüglich 3.420,00 EUR Umsatzsteuer. Maßgeblich sind die dort abgegrenzten Arbeiten sowie die technische Ergänzung von Dr. Venn. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung oder weitere zusätzliche Arbeiten werden damit nicht beauftragt.

Die Objektüberwachung dokumentiert den Einbau gemeinsam mit Ihrer Bauleitung vor dem Verdecken. Bitte legen Sie Materialnachweise, Fotos mit Bauteilbezug und das gemeinsame Mengenblatt vor. Die Rechnung ist als Nachtrag 01 getrennt von bereits abgerechneten Abschlägen auszuweisen.

Sie haben den unveränderten Abnahmetermin 15.09.2028 bestätigt. Wir übernehmen die von Ihnen vorgeschlagene Ausführung vom 07. bis 11.02.2028. Eine darüber hinausgehende Bauzeit- oder Mehrkostenvereinbarung treffen wir nicht. Bei neuen tatsächlichen Hindernissen erwarten wir eine gesonderte konkrete Mitteilung.

Diese Erklärung erfolgt durch mich als Geschäftsführerin. Eine frühere technische Abstimmung mit Frau Feld stellte noch keinen Zusatzauftrag dar.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 11.02.2028

Gemeinsames Aufmaß des Nachtrags 01

Das Aufmaß wurde am 11.02.2028 vor dem Verdecken durch Nora Feld und Timo Wendt aufgenommen. Dr. Venn war bei der Kontrolle der Filterabstufung anwesend. Die Lage entspricht dem örtlich abgegrenzten Bereich aus der Besprechung vom 02.02.2028. Grundlage der Abrechnung bleibt die am 05.02.2028 vereinbarte Pauschale.

Nachweis	Ansatz	Feststellung
Aushub	10,00 × 4,00 × 1,50 m	60,00 m³
Filterpackung	10,00 × 3,00 × 1,50 m	45,00 m³
Dränleitung	12,00 + 10,00 + 8,00 m	30,00 m
Ergänzende Arbeitszeit	3 Mitarbeiter × 19 Stunden	57,00 Stunden

Die Maße beziehen sich auf unterschiedliche Arbeitsbereiche. Aus der Filtermenge darf deshalb kein identischer Grundriss wie beim gesamten Aushub abgeleitet werden. Der örtliche Anschluss wurde am Nachmittag durch die Fachplanung kontrolliert. Eine vollständige Neuuntersuchung des Grundstücks fand nicht statt.

Die Einbaukontrolle bestätigt die protokollierten Maße und den sichtbaren Arbeitsstand. Sie ist keine pauschale Anerkennung weiterer, nicht beauftragter Leistungen und keine Abnahme des gesamten Rohbaus. Unterschriften: gez. Nora Feld; gez. Timo Wendt; technischer Befund gez. Dr. Ute Venn.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 08.09.2028

Gemeinsamer Inbetriebnahmeterminein der Gebäudetechnik

Am 08.09.2028 haben die TGA-Planung, Wärmefluss Haustechnik, Lichtkreis Elektro und Hubpunkt Aufzüge den abgestimmten Inbetriebnahmeterminein durchgeführt. Die folgenden Feststellungen betreffen die jeweils benannten Anlagen. Der Terminein ersetzt weder die förmliche Abnahme der Bauverträge noch Prüfentscheidungen einer zugelassenen Überwachungsstelle.

Anlage	Feststellung	Unterlage
Wärmeerzeugung	Zwei Geräte je 18 kW, Kaskadenbetrieb und Umschaltung geprüft	Einstellblatt HLS-08
Heizkreise	Hydraulischer Abgleich abgeschlossen; Sollwerte wohnungsweise dokumentiert	Abgleichblatt HLS-09
Trinkwasser	Druckprüfung und Spülung dokumentiert; Temperaturhaltung kontrolliert	Prüfblatt HLS-10
Lüftung	Betriebsstufen je Wohnung eingeregelt	Messblatt L-08
Elektro	Verteilungen geprüft; Kennzeichnung nach Stromlaufplänen	Prüfbericht E-08
PV und Ladepunkte	36 kWp; beide Ladepunkte und Lastmanagement funktionsfähig	Messkonzept PV-08
Aufzug	Prüfung vor Inbetriebnahme am 07.09.2028 ohne offenen sicherheitsrelevanten Befund	Prüfbescheinigung A-08

Die Regelung der Wärmepumpen ist auf einen abgestimmten Heizbetrieb eingestellt. Der technische Betreiber erhält Einweisung und Wartungstermine. Ein späterer Wechsel von Einstellungen ohne Dokumentation ist zu vermeiden. Der jährliche Stromertrag der PV-Anlage wird nicht als garantierte Strommenge zugesagt.

Die Aufzugsprüfung wurde durch die zugelassene Überwachungsstelle vorgenommen; die Montagefirma hat deren Bescheinigung im Anlagenordner hinterlegt. Der Notruf wurde im Beisein der späteren Verwaltung getestet. Vor Mietbeginn sind die tatsächlichen Zählerstände in den Wohnungsübergaben festzuhalten.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 11.09.2028

Feststellungen aus der Vorbegehung

Bei der Vorbegehung am 10.09.2028 wurden drei noch zu erledigende Punkte festgestellt. Im Hausflur 1. OG schließt die Tür zum notwendigen Treppenraum nicht zuverlässig. An Wohnung 05 ist das Ablaufprofil der nördlichen Fensterbank zu kontrollieren. In Wohnung 07 ist entgegen der Ausstattungsfreigabe ein anderer Eichenbelag eingebaut worden.

Die Türfunktion ist vor dem Abnahmetermin am 15.09.2028 herzustellen und gemeinsam nachzuprüfen. Dachraum soll den Fensterbankanschluss öffnen, den Befund dokumentieren und die vorgesehene Entwässerung herstellen. Innenraum Ausbau soll den abweichenden Belag genau benennen und ein Angebot für einen Austausch oder eine einvernehmliche Lösung vorlegen.

Wir stimmen einer Abweichung beim Bodenbelag heute nicht zu. Ein Minderungsbetrag wird noch nicht festgelegt. Die Nutzung der Wohnung zu einer Besichtigung stellt keine Abnahme des Ausbaugewerks dar. Wir halten am vorgesehenen gemeinsamen Abnahmetermin fest, sofern die dann vorhandenen Befunde eine Abnahme erlauben.

Bitte bestätigen Sie Zuständigkeit und Ausführungstermin bis morgen. Frau Feld dokumentiert die technische Nachprüfung; rechtsgeschäftliche Erklärungen erfolgen durch die Bauherrin.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Thu, 14 Sep 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Stand der Arbeiten vor dem Abnahmetermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Tür im 1. OG wurde heute neu eingestellt. Bei drei unmittelbar aufeinanderfolgenden Funktionsprüfungen schloss sie vollständig. Dachraum hat das Ablaufprofil an Wohnung 05 geöffnet und neu angeschlossen. Der Wasserablauf wurde vor Ort kontrolliert; im geöffneten Anschluss lag kein sichtbarer Feuchteschaden vor.

Der Bodenbelag der Wohnung 07 bleibt abweichend. Innenraum Ausbau hat erklärt, dass die technisch geeignete Ersatzqualität nach interner Materialverwechslung eingebaut worden sei. Frau Birk will zunächst ein Muster und den Preisunterschied prüfen. Es liegt noch keine Zustimmung zur Vertragsänderung vor.

Für den morgigen Termin empfehle ich, die erledigten Punkte mit dem jeweiligen Bauteilbezug zu dokumentieren und den Belagsvorbehalt ausdrücklich aufzunehmen. Ob die Bestellerin abnimmt, entscheidet sie nach dem festgestellten Leistungsstand. Die heutige E-Mail enthält keine Abnahmeerklärung im Namen der Bauherrin.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 15.09.2028 · SW-HI-26-08

Protokoll des gemeinsamen förmlichen Abnahmetermins

Am 15.09.2028 wurden die Leistungen der sieben Bauverträge im Wohnhof Am Steinbogen 18 gemeinsam besichtigt. Für die Bestellerin nahm Maren Birk teil, als beratende Objektüberwachung Nora Feld. Die nachfolgend genannten Unternehmen waren jeweils für ihr Gewerk vertreten. Jede Abnahmeerklärung bezieht sich nur auf die bezeichnete Vertragsleistung.

Vertrag	Erklärung und Vorbehalt
Erdarbeiten und Rohbau	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Dach Fassade und Fenster	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Heizung Lüftung und Sanitär	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Innenausbau und Bodenbeläge	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Der abweichende Eichenbelag der Wohnung 07 bleibt als bekannter Mangel vorbehalten. Eine Vergütungsanpassung ist noch nicht vereinbart.
Aufzuganlage	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Außenanlagen und Entwässerung	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.

Die am 11.09.2028 angezeigte Türfunktion und der sichtbare Fensterbankanschluss wurden erneut kontrolliert. Die dokumentierten Maßnahmen sind im sichtbaren Bereich erledigt. Die fachliche Prüfung ersetzt keine Zusage, dass verdeckte Mängel ausgeschlossen seien. Vorbehalte wegen einer Vertragsstrafe werden nicht aufgenommen, weil keine Vertragsstrafe vereinbart wurde.

Die Parteien halten den heutigen Tag als Abnahmedatum ihrer jeweiligen Bauleistung fest. Die reguläre fünfjährige Mängelverjährung aus den hier geschlossenen BGB-Bauverträgen wird mit dem 15.09.2033 als
SW-HI-26-08 · Seite 1

vorläufigem Fristende im Register vermerkt. Spätere Anerkenntnisse, Verhandlungen oder sonstige fristrelevante Vorgänge sind gesondert zu prüfen. Für Architektenleistungen wird heute keine Abnahme erklärt.

Die vollständigen Revisions- und Bedienunterlagen werden im Übergabetermin am 22.09.2028 an die Verwaltung ausgegeben. Der Rohbauunternehmer hat die vereinbarte Mängelbürgschaft vorgelegt. Die Bestellerin bestätigt den Erhalt, ohne damit über noch nicht bekannte Mängelansprüche zu verfügen.

Unterschriften: gez. Maren Birk; Timo Wendt; Ina Mertens; Arne Thiel; Selin Voß; Jan Merz; Ralf Hanke; Mira Roth. Protokollführung: gez. Nora Feld.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Gebäudeübergabe und Unterlagenverzeichnis

Die Objektüberwachung übergibt der Bauherrin und ihrer Mietverwaltung den dokumentierten Stand des Wohnhauses. Der Mietbeginn ist für den 01.10.2028 vorgesehen. Die Übergabe von Unterlagen ist von der bereits erfolgten Abnahme der Bauleistungen sowie einer gesonderten Abnahme der Planerleistungen zu unterscheiden.

1 Bestandsstand

Die Ausführung umfasst acht Wohnungen mit zusammen 600 m² vereinbarter Wohnfläche, drei Geschosse und einen Aufzug. Die tatsächlichen Tür- und Bewegungsflächen wurden im Abschlussaufmaß dokumentiert. Die Dachfläche trägt 80 PV-Module zu je 450 Wp. Von den acht Pkw-Stellplätzen ist Stellplatz 01 barrierefrei gekennzeichnet; alle Stellplätze sind vorverkabelt, zwei mit Ladepunkten ausgestattet. Fahrrad- und Spielbereiche entsprechen dem abschließenden Außenanlagenstand.

2 Übergebene Unterlagen

Bereich	Unterlagen und Zuständigkeit
Bauaufsicht	Genehmigung, Nebenbestimmungen, Baubeginn- und Fertigstellungsmitteilungen; Bauherrin
Planung	Freigegebene Planstände, ergänzte Ausführungsdetails, Revisionsstand; Konturfeld
Rohbau	Material- und Einbauunterlagen, dokumentierter Nachtrag 01; Steinwerk
Gebäudehülle	Fensterlisten, Dach- und Anschlussdetails, Pflegehinweise; Dachraum
Gebäudetechnik	Inbetriebnahme, Einstellwerte, Zählerzuordnung, Bedienung; Planwerk und Fachfirmen
Aufzug	Prüfbescheinigung, Notruf und Betriebsanweisung; Hubpunkt
Außenanlagen	Entwässerung, Geräteunterlagen und Pflegehinweise; Grünkante
Kaufmännisch	Verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege und fortgeschriebene Kosten; Bauherrin

3 Noch laufende Vorgänge

Der Belagsvorbehalt für Wohnung 07 wird außerhalb der Wohnungsübergabe mit dem Ausbauunternehmen geklärt. Ein zusätzlicher Rechnungs- und Zahlungsabgleich ist vorgesehen, da die Buchhaltung einen doppelten Zahlungslauf für eine Elektroabschlagsrechnung gemeldet hat. Das betrifft die finanzielle Abwicklung und wird nicht als weiterer Bauauftrag erfasst.

Die Verwaltung erhält den Schlüsselplan und bestätigt die Übernahme der laufenden Betreiberorganisation. Technische Prüfungen und Wartungsleistungen werden nach den Anlagenanforderungen beauftragt. Die Regelung der Wärmepumpen darf nicht ohne Dokumentation verändert werden. Die Bedienunterlagen sind auch der Vertretung der Verwaltung zugänglich zu halten.

gez. Nora Feld, Architektin
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Stand der Genehmigungsauflagen und Schlussunterlagen

Für die Fertigstellungsmitteilung werden die nachstehenden Unterlagen dem Genehmigungsvorgang zugeordnet. Die Liste unterscheidet den vorgelegten Nachweis von einer eigenen behördlichen Prüfung. Der Umfang der Baugenehmigung wird nicht auf außerhalb ihres Prüfprogramms liegende Ausführungsfragen ausgedehnt.

Gegenstand	Vorgelegte Unterlage	Stand
Genehmigung und Planänderungen	022 sowie freigegebene Pläne und 150	Ausführung mit Genehmigungsstand abgeglichen
Barrierefreie Erschließung	017, 024, 150 und Abschlussaufmaß	Aufzug, R-Wohnung und stufenlose Zugänge hergestellt
Außenanlagen	028 und Unternehmerdokumentation	30 m² Spielbereich, Fahrrad- und Pkw-Flächen hergestellt
Energie und Heizung	016, 162, 163	Ergebnisbericht, Einstell- und Prüfblätter vorhanden
Elektro PV Ladepunkte	165, 166	Prüf- und Inbetriebnahmeberichte vorhanden
Aufzug	167	Prüfung vor Inbetriebnahme ohne offenen sicherheitsrelevanten Befund
Betreiberorganisation	062 und 168; Register 169 folgt	Wartungszuständigkeit übergeben; Zählerablesung und Register zur Wohnungsübergabe am 29.09.2028

Der tatsächliche Brandschutz- und Rettungswegstand wurde mit den verantwortlichen Fachleuten vor der Nutzung begangen. Zufahrten und anleiterbare Bereiche bleiben frei. Nutzungsänderungen, zusätzliche Terrassen oder nachträgliche Einbauten sind nicht durch diese Schlussunterlagen freigegeben.

Die Unterlagen werden der Bauherrin und ihrer Mietverwaltung ausgehändigt. Die Bauherrin veranlasst die erforderlichen Mitteilungen an die Bauaufsicht. Diese Aufstellung erklärt keine behördliche Schlussabnahme und keinen Verzicht auf noch nicht erkennbare Mängel.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
miete@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Betrieb und Wartung des Wohnhauses

Die Mietverwaltung übernimmt ab dem 01.10.2028 die Betreiberorganisation für das Wohnhaus. Die Geschäftsführerin bleibt für die erforderlichen Beauftragungen verantwortlich. Der folgende Plan legt Ansprechpartner und dokumentierte Abläufe fest. Er ersetzt weder Herstellerangaben noch verbindliche Prüfpflichten.

Anlage	Ablauf	Dokumentation
Wärmepumpen und Hydraulik	Jährliche Wartung, zusätzliche Prüfung bei auffälligem Verbrauch oder Regelungsänderung	Betriebsbuch und Einstellwerte
Trinkwasser und Warmwasser	Temperaturen, Störungen und einschlägige Untersuchungsanforderungen mit Fachfirma verfolgen	Mess- und Wartungsberichte
Aufzug	Notruf jederzeit betriebsbereit; Wartung und vorgeschriebene Prüfungen fristgerecht beauftragen	Prüf- und Notrufbuch
Rauchwarnmelder	Betriebsbereitschaft nach Landesrecht und vereinbarter Zuständigkeit sichern	Wohnungsbezogene Wartung
Dach und Entwässerung	Halbjährliche Sichtkontrolle sowie nach außergewöhnlichem Unwetter	Fotos und Reinigungsnachweise
PV und Ladepunkte	Störmeldungen bearbeiten und elektrische Prüfungen nach fachlicher Vorgabe	Anlagenprotokoll
Spielbereich	Regelmäßige Sichtkontrolle, Wartung und sicherheitsbezogene Prüfung	Kontrollbuch

Mietparteien melden Feuchte, Funktionsstörungen und Schäden zeitnah an die Verwaltung. Die Verwaltung dokumentiert Datum, Wohnung, Bauteil und erste Maßnahmen, ohne die Ursache vor fachlicher Prüfung festzulegen. Bei akuter Gefahr werden Sicherungsmaßnahmen veranlasst. Die normale Meldung an eine Fachfirma ersetzt keine Prüfung von Anspruchsfristen.

Kosten der Verwaltung und Instandsetzung werden nicht als umlagefähige Betriebskosten behandelt. Laufende Betriebskosten werden nur im vertraglich und gesetzlich zulässigen Umfang abgerechnet. Die kaufmännische Zuordnung bleibt vom technischen Wartungsplan getrennt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung
Anlagen: keine

Von	Sabine Hartung <hartung@haushalt.example>
An	"Lea Fricke, Mietverwaltung" <miete@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 04 Nov 2030 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Feuchte unter dem Wohnzimmerfenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unter dem nördlichen Wohnzimmerfenster der Wohnung 05 ist seit dem Regen am Wochenende ein feuchter Streifen zu sehen. Wir haben den Bereich nicht überstrichen und ein Handtuch vorgelegt. Die Heizung läuft normal; das Fenster war während des Regens geschlossen. Uns ist nicht klar, ob das Wasser vom Anschluss oder von Kondensation kommt.

Die Erscheinung liegt an demselben Fenster, dessen Anschluss vor unserem Einzug noch bearbeitet worden sein soll. Seit dem Einzug im Oktober 2028 ist uns dort bisher keine sichtbare Feuchte aufgefallen. Die Reinigung der Außenseite haben wir nicht selbst vorgenommen. Am Fenster steht ein niedriger Beistelltisch, aber kein Schrank.

Bitte vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Dienstagvormittag und Donnerstag ab 15 Uhr wäre jemand zu Hause. Falls weitere Schäden drohen, können Sie uns telefonisch über die bei der Verwaltung hinterlegte Nummer erreichen. Wir möchten wissen, welche vorläufigen Maßnahmen sinnvoll sind und wann eine Prüfung erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Hartung

Familie Hartung, Wohnung 05

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

hartung@haushalt.example

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 08.11.2030 · SW-HI-26-08

Objektbegehung zum Fensteranschluss der Wohnung 05

Nora Feld hat am 08.11.2030 gemeinsam mit Ina Mertens, Lea Fricke und Sabine Hartung den gemeldeten Bereich besichtigt. Innen ist eine örtliche Verfärbung unter dem nördlichen Wohnzimmerfenster sichtbar. Der Befund stimmt nicht mit einem gleichmäßig an allen Fenstern auftretenden Kondensatbild überein. Eine abschließende Ursachenfeststellung ist aus der Sichtprüfung allein nicht möglich.

Am äußeren Ablaufprofil befindet sich Laub. Nach dessen Entfernung zeigt der örtliche Wasserlauf weiterhin eine Verzögerung an der rechten Anschlussseite. Dachraum schlägt eine begrenzte Öffnung des Anschlussprofils vor. Die Verwaltung stellt die vorhandenen Reinigungsnachweise bereit. Aus dem Laubfund allein folgt weder ein sicherer Wartungsfehler der Mietpartei noch ein Nachweis mangelhafter Bauausführung.

Die Bauherrin beauftragt die Ursachenklärung unmittelbar bei Dachraum. Die heutige fachliche Bewertung erfolgt im Rahmen der vereinbarten Objektbetreuung. Eine fortlaufende örtliche Überwachung einer späteren Mängelbeseitigung ist damit nicht als zusätzliche Architektenleistung beauftragt.

Die reguläre Ausgangsfrist für den Hüllenvertrag bleibt ausgehend von der Abnahme 15.09.2028 im Fristenregister sichtbar. Für eine behauptete Hemmung oder einen Neubeginn reicht der Versand einer Mängelmeldung nicht aus. Die spätere Korrespondenz ist der anwaltlichen Prüfung zugänglich zu machen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Ina Mertens, Projektleitung" <projekt@dachraum.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Tue, 19 Nov 2030 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Ergebnis der örtlichen Öffnung und Wiederherstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben das rechte Anschlussprofil am Fenster der Wohnung 05 am 18.11.2030 in Anwesenheit der Verwaltung geöffnet. Im überdeckten Bereich war eine zu hoch geführte Dichtstoffraupe sichtbar. Sie wurde entfernt und der Anschluss entsprechend dem abgestimmten Detail wiederhergestellt. Der anschließende Wasserlauf war frei.

Die Arbeiten führen wir ohne gesonderte Vergütung aus. Wir bestätigen den beschriebenen tatsächlichen Befund und die ausgeführten Maßnahmen. Eine darüber hinausgehende rechtliche Erklärung zu anderen Bauteilen oder zu sämtlichen Anspruchsfristen ist damit nicht verbunden. Bitte führen Sie die Verwaltungskorrespondenz und den Befund im Projektarchiv zusammen.

Die innere Oberfläche soll zunächst trocknen. Frau Hartung hat einer Nachkontrolle nach vier Wochen zugestimmt. Sollten erneut Feuchtespuren auftreten, bitten wir um Mitteilung mit Datum und Wetterlage. Eine weitere Ortsüberwachung durch die Architektin haben wir nicht bestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Ina Mertens, Projektleitung
Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 10.08.2033

Begehung vor dem regulären Fristende der Bauverträge

Am 10.08.2033 erfolgte die im Architektenvertrag vorgesehene Objektbegehung vor Ablauf der regulären Mängelverjährung der Bauverträge. Teilgenommen haben Nora Feld, Maren Birk und Lea Fricke. Die Verwaltung stellte Wartungsberichte, Meldungen der Mietparteien und den Vorgang zum Fenster der Wohnung 05 bereit.

Bauteil	Feststellung	Weiteres Vorgehen
Rohbau	Keine auffälligen neuen Risse in den zugänglichen Bereichen	Keine zusätzliche Untersuchung aus dem heutigen Sichtbefund
Dach und Fassade	Keine neue Feuchtemeldung; Wartungen dokumentiert	Wartung fortführen
Fenster Wohnung 05	Nach Bearbeitung 2030 keine erneute Meldung; Innenfläche trocken	Vorgang gesondert rechtlich würdigen
Innenausbau Wohnung 07	Belagsabweichung 2028 durch Vereinbarung und Gutschrift erledigt	Vereinbarung im Archiv belassen
Technik und Aufzug	Betriebs- und Prüfunterlagen liegen im Verwaltungsordner	Betreiberpflichten laufen weiter
Außenanlagen	Übliche Gebrauchsspuren ohne neue konkrete Schadensmeldung	Pflege und Kontrollen fortführen

Die Begehung erfasst die zugänglichen Bereiche und die bereitgestellten Informationen. Sie ist keine zerstörende Untersuchung sämtlicher Bauteile. Die Bauherrin soll neu gemeldete Umstände umgehend rechtlich prüfen lassen. Das reguläre Ausgangsdatum 15.09.2033 wird nicht ungeprüft auf den Vorgang mit der Nachbesserung 2030 übertragen; dessen rechtliche Wirkung ist gesondert zu bewerten.

Für das Rohbaulos sind aus den verfügbaren Vorgängen derzeit keine offenen konkreten Mängelansprüche ersichtlich. Die Mängelbürgschaft kann nach Prüfung zum regulären Fristende zur Rückgabe vorbereitet werden. Für andere Gewerke ist keine solche Bürgschaft vereinbart. Die Rückgabe einer Rohbausicherheit bedeutet keinen Verzicht auf Ansprüche gegen andere Unternehmen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 18.09.2033 · SW-HI-26-08

Rückgabe der Bürgschaft für das Rohbaulos

Nach Auswertung der Vorfristbegehung vom 10.08.2033 und der zwischenzeitlichen Meldungen geben wir die Mängelbürgschaft LB-SW-2028-325 über 32.500,00 EUR für das Rohbaulos zurück. Bis zum heutigen Stand sind keine offenen gesicherten Ansprüche aus diesem Vertrag konkret festgestellt oder angezeigt worden.

Die Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die bezeichnete Sicherheit des Rohbauunternehmens. Sie enthält keinen allgemeinen Erlass von Ansprüchen aus anderen Bauverträgen und keine abschließende rechtliche Einordnung des Fensteranschlussvorgangs von 2030. Die Verwaltungsunterlagen werden weiter aufbewahrt.

Bitte bestätigen Sie den Empfang der Bürgschaftsurkunde. Die Rückgabe wird im Sicherheitenregister der Bauherrin vermerkt. Die Objektüberwachung hat die fachlichen Befunde geliefert; die Entscheidung über die Rückgabe trifft die Bauherrin selbst.

Die Planerleistungen werden gesondert abgeschlossen. Der heutige Vorgang ist weder eine rückwirkende Abnahme des Architektenvertrags noch eine Änderung der laufenden Betreiber- und Wartungsorganisation.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 20.09.2033

Abschluss der beauftragten Objektbetreuung

Die beauftragten Leistungen der Objektbetreuung sind nach der Vorfristbegehung, der fachlichen Auswertung und der Mitwirkung bei der Rückgabe der Rohbausicherheit abgeschlossen. Die Abrechnung der letzten Honorarstufe erfolgt getrennt. Die Bauherrin erhält die fortgeschriebene Dokumentation und die Hinweise zu noch rechtlich zu bewertenden Einzelvorgängen.

Die Betreuung umfasste die fachliche Bewertung gemeldeter Mängel, die erforderlichen Begehungen und die vereinbarte Mitwirkung bei Sicherheiten. Eine vollständige Überwachung späterer Sanierungsarbeiten war nicht zusätzlich beauftragt. Die Begehung von 2030 und die Auswertung der Unternehmerantwort wurden im vorhandenen Auftrag dokumentiert.

Die reguläre fünfjährige Betrachtung der Bauverträge ist nicht mit der Verjährung sämtlicher Ansprüche gegen Planer gleichzusetzen. Insbesondere ist eine Abnahme der Architektenleistungen gesondert zu dokumentieren. Der Abschlussbericht erklärt selbst keine Abnahme durch die Bauherrin.

Der dokumentierte Fensteranschlussvorgang 2030 bleibt mit seinen tatsächlichen Erklärungen im Archiv. Für dessen rechtliche Fristwirkung wird auf die gesonderte anwaltliche Prüfung verwiesen. Laufende Mietverhältnisse, Wartungen und Betreiberpflichten gehen unabhängig vom Ende der Objektbetreuung weiter.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH · SW-HI-26-08 · Register 05.10.2033

001_Projektauftrag_Wohnhof.pdf
002_Bedarfsprogramm_und_Planungsziele.docx
003_Architektenvertrag_mit_Stufenabruf.docx
004_Ortsbesichtigung_Grundlagen.pdf
005_Lageplan_LP01.pdf
006_Baugrund_und_Versickerungsbefund.pdf
007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx
008_Variantenfreigabe_und_Abruf.eml
009_Besprechung_Bauaufsicht_Entwurfsstand.pdf
010_Entwurfsbeschreibung_Stand_Maerz.docx
011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf
012_Grundriss_2OG_GP02.pdf
013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf
014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx
015_Fachplanerkoordination_Entwurf.docx
016_Energie_und_Entwaesserungskonzept.pdf
017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx
018_Bauantrag_Begleitschreiben.docx
019_Baubeschreibung.docx
020_Nachforderung_Bauaufsicht.pdf
021_Antwort_Nachforderung.docx
022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf
023_Abruf_LPH5_bis7.eml
024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf
025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx
026_Freigabe_Details_mit_Rueckfrage.eml
027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf
028_Flaechen_Abstaende_Aussenanlagen.pdf
029_Abschluss_Ausfuehrungsplanung.docx
030_Vergabeterminplan.docx
031_Leistungsverzeichnis_sieben_Lose.docx
032_Angebot_rohbau.pdf
033_Vergleichsangebot_Rohbau.pdf
034_Angebot_huelle.pdf
035_Angebot_hls.pdf
036_Angebot_elektro.pdf
037_Angebot_ausbau.pdf
038_Angebot_aufzug.pdf
039_Angebot_aussen.pdf
040_Vergabevermerk.docx
041_Direktmandat_Vertragsgestaltung.eml
042_Bauvertrag_rohbau.docx
043_Bauvertrag_huelle.docx
044_Bauvertrag_hls.docx
045_Bauvertrag_elektro.docx
046_Bauvertrag_ausbau.docx
047_Bauvertrag_aufzug.docx

048_Bauvertrag_aussen.docx
049_Bauzeitenplan.csv
050_Bautagebuch.csv
051_Baubesprechung_Bodenbefund.docx
052_Behinderungsanzeige_Rohbau.eml
053_Nachtragsangebot_Filterpackung.pdf
054_Nachtragsauftrag_01.eml
055_Gemeinsames_Aufmass_Nachtrag.pdf
056_Gesamteinbetriebnahme_Technik.pdf
057_Maengelanzeige_vor_Abnahme.pdf
058_Nachbesserungsstand.eml
059_Foermliche_Abnahmen.docx
060_Uebergabe_Gebaeudeunterlagen.pdf
061_Auflagen_und_Schlussunterlagen.pdf
062_Betrieb_und_Wartungsplan.pdf
063_Feuchtemeldung_Wohnung05.eml
064_Objektbegehung_Feuchte.docx
065_Rueckmeldung_Fensteranschluss.eml
066_Vorfristbegehung_2033.pdf
067_Rueckgabe_Rohbausicherheit.docx
068_Abschluss_Objektbetreuung.pdf
070_Kaufpreisfaelligkeit_Grundstueck.pdf
071_Grunderwerbsteuerbescheid.pdf
072_Notarkosten_Schlussberechnung.pdf
073_Grundbuch_Kostenrechnung.pdf
074_Maklerrechnung.pdf
075_Baugenehmigung_Kostenbescheid.pdf
076_Bauversicherung_Betragsrechnung.pdf
077_Bank_Finanzierungsentgelt.pdf
078_Bank_Zinsabrechnung_2027.pdf
079_Bank_Zinsabrechnung_2028.pdf
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4.pdf
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4_XRechnung.xml
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7.pdf
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7_XRechnung.xml
082_Architekt_Rechnung_LPH8.pdf
082_Architekt_Rechnung_LPH8_XRechnung.xml
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9_XRechnung.xml
084_TGA_Planungsrechnung.pdf
084_TGA_Planungsrechnung_XRechnung.xml
085_TGA_Schlussrechnung.pdf
085_TGA_Schlussrechnung_XRechnung.xml
086_Tragwerk_Schlussrechnung.pdf
086_Tragwerk_Schlussrechnung_XRechnung.xml
087_Vermessung_Schlussrechnung.pdf
087_Vermessung_Schlussrechnung_XRechnung.xml
088_Baugrund_Rechnung.pdf
088_Baugrund_Rechnung_XRechnung.xml
089_Energie_Rechnung.pdf

089_Energie_Rechnung_XRechnung.xml
090_Brandschutz_Rechnung.pdf
090_Brandschutz_Rechnung_XRechnung.xml
091_Rohbau_Abschlag1.pdf
091_Rohbau_Abschlag1_XRechnung.xml
092_Rohbau_Abschlag2.pdf
092_Rohbau_Abschlag2_XRechnung.xml
093_Rohbau_Schlussrechnung.pdf
093_Rohbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml
094_Gebaeudehuelle_Abschlag.pdf
094_Gebaeudehuelle_Abschlag_XRechnung.xml
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung.pdf
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung_XRechnung.xml
096_HLS_Abschlag.pdf
096_HLS_Abschlag_XRechnung.xml
097_HLS_Schlussrechnung.pdf
097_HLS_Schlussrechnung_XRechnung.xml
098_Elektro_Abschlag.pdf
098_Elektro_Abschlag_XRechnung.xml
099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf
099_Elektro_PV_Schlussrechnung_XRechnung.xml
100_Innenausbau_Abschlag.pdf
100_Innenausbau_Abschlag_XRechnung.xml
101_Innenausbau_Schlussrechnung.pdf
101_Innenausbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml
102_Aufzug_Schlussrechnung.pdf
102_Aufzug_Schlussrechnung_XRechnung.xml
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung.pdf
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung_XRechnung.xml
104_Hausanschluesse_Rechnung.pdf
104_Hausanschluesse_Rechnung_XRechnung.xml
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung.pdf
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung_XRechnung.xml
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur_XRechnung.xml
107_Darlehensvereinbarung.docx
108_Eigenkapital_und_Vermietungsannahmen.docx
109_Projektkonto_2026.pdf
110_Projektkonto_2027.pdf
111_Projektkonto_2028.pdf
112_Projektkonto_2033.pdf
113_Rueckfrage_Elektrozahlung.eml
114_Elektro_Rueckzahlung.eml
115_Innenausbau_Belagsvereinbarung.eml
116_Projektabschluss_Zahlungsstand.eml
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz.pdf
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz_XRechnung.xml
120_Kostenentwicklung.xlsx
121_Rechnungen_und_Zahlungen.xlsx
122_Finanzierung_und_Vermietung.xlsx

130_Mietvertrag_WE01.docx
131_Mietvertrag_WE02.docx
132_Mietvertrag_WE03.docx
133_Mietvertrag_WE04.docx
134_Mietvertrag_WE05.docx
135_Mietvertrag_WE06.docx
136_Mietvertrag_WE07.docx
137_Mietvertrag_WE08.docx
138_Uebergabe_WE01.pdf
139_Uebergabe_WE02.pdf
140_Uebergabe_WE03.pdf
141_Uebergabe_WE04.pdf
142_Uebergabe_WE05.pdf
143_Uebergabe_WE06.pdf
144_Uebergabe_WE07.pdf
145_Uebergabe_WE08.pdf
146_Maengelbuergschaft_Rohbau.pdf
147_Belagsvereinbarung_Wohnung07.docx
148_Fertigstellungsmitteilung.docx
149_Grundstueckskaufvertrag_UVZ_118_2026.pdf
150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf
151_Planstandportal_2027-09-24.png
152_Bauleiterchat_2028-02-02.png
153_Abnahme_Architektenleistungen.docx
154_Vorvertragliche_Auskunft_WE01.eml
155_Vorvertragliche_Auskunft_WE02.eml
156_Vorvertragliche_Auskunft_WE03.eml
157_Vorvertragliche_Auskunft_WE04.eml
158_Vorvertragliche_Auskunft_WE05.eml
159_Vorvertragliche_Auskunft_WE06.eml
160_Vorvertragliche_Auskunft_WE07.eml
161_Vorvertragliche_Auskunft_WE08.eml
162_Energie_Ergebnisbericht.pdf
163_HLS_Einstellung_und_Pruefung.pdf
164_Lueftung_Messblatt.pdf
165_Elektro_Pruefbericht.pdf
166_PV_Ladepunkte_Inbetriebnahme.pdf
167_Aufzug_Pruefbescheinigung.pdf
168_Wartungsvereinbarung_Technik.pdf
169_Zaehlerregister_Bezug.csv
170_Grundsschuldbestellung_UVZ_139_2026.pdf
171_Freistellung_48b_rohbau.pdf
172_Freistellung_48b_huelle.pdf
173_Freistellung_48b_hls.pdf
174_Freistellung_48b_elektro.pdf
175_Freistellung_48b_ausbau.pdf
176_Freistellung_48b_aufzug.pdf
177_Freistellung_48b_aussen.pdf
178_Freistellung_48b_versorger.pdf
179_Freistellung_Abfrage_und_Gueltigkeitsprotokoll.pdf

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim

kanzlei@notarin-fink.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.11.2026

Kaufpreisfälligkeit Grundstück

Zur Urkunde vom 03.11.2026, UVZ 118/2026, teile ich mit, dass die vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen für den Kaufpreis eingetreten sind. Die Auflassungsvormerkung ist eingetragen und das kommunale Negativzeugnis liegt vor. Nicht übernommene Altbelastungen bestehen nicht; eine Löschung von Verkäufergrundpfandrechten ist nicht erforderlich. Das Grundstück ist das im Kaufvertrag bezeichnete Baugrundstück Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim.

1. Kaufpreis und Zahlung

Der Kaufpreis beträgt 450.000,00 EUR. Bitte überweisen Sie den Betrag bis 30.11.2026 unmittelbar an die Verkäuferin. Zahlungsempfängerin ist die Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH; es handelt sich nicht um eine Einzahlung auf ein Notaranderkonto. Die Bankverbindung ist unverändert die in der Urkunde angegebene Verbindung.

Eine Umsatzsteueroption wurde im Grundstückskaufvertrag nicht erklärt. Neben dem Kaufpreis sind keine weiteren Kaufpreisbestandteile, Vermittlungsvergütungen oder beweglichen Gegenstände vereinbart. Die gesondert anfallenden Erwerbsnebenkosten werden von den jeweils zuständigen Stellen erhoben.

Bitte übersenden Sie den Zahlungsbeleg an die Verkäuferin und an mein Büro. Die Eigentumsumschreibung wird nach Eingang der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung und Nachweis der vollständigen Kaufpreiszahlung weiterbetrieben. Diese Mitteilung betrifft nur die vertraglich vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen.

gez. Dr. Carla Fink, Notarin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.11.2026

Grunderwerbsteuerbescheid

Für den Erwerb aufgrund des notariellen Kaufvertrags vom 03.11.2026, UVZ 118/2026, wird gegenüber der Steinbogen Wohnen GmbH Grunderwerbsteuer in Höhe von 22.500,00 EUR festgesetzt. Gegenstand ist das Baugrundstück Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Der Erwerbsvorgang wird unter der Steuernummer 30/145/60816 geführt.

1. Festsetzung und Fälligkeit

Berechnungsgrundlage	EUR
Gegenleistung laut Kaufvertrag	450.000,00
Steuersatz Niedersachsen 5 %	22.500,00
Festgesetzte Steuer	22.500,00

Der festgesetzte Betrag ist am 20.12.2026 fällig. Bitte verwenden Sie für die Zahlung das Kassenzichen GRE-26-816 und die Ihnen bekannte Bankverbindung der Finanzkasse. Umsatzsteuer wird auf diese Steuerfestsetzung nicht erhoben.

Die Festsetzung beruht auf der vorgelegten Erwerbsanzeige und dem Kaufvertrag. Weitere Gegenleistungen wurden nicht mitgeteilt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird nach Zahlung der Steuer an die beurkundende Notarin übersandt.

2. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt Hildesheim eingelegt werden. Der Einspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift zu erklären. Die Einlegung eines Einspruchs hemmt die Fälligkeit nicht.

gez. Anja Dorn, Veranlagung
Anlagen: keine

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim
kanzlei@notarin-fink.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.12.2026

Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschuld

Kostenberechnung zu UVZ 118/2026 vom 03.11.2026 und UVZ 139/2026 vom 19.12.2026.
Kostenschuldnerin: Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim.
Steuernummer der Notarin: 30/145/13705. Leistungszeitraum 03.11.2026 bis 22.12.2026.

Der Geschäftswert des Kaufvertrags beträgt 450.000 EUR; die einfache Gebühr nach Tabelle B beträgt 885 EUR. Der Geschäftswert der Grundschuldbestellung mit Vollstreckungsunterwerfung beträgt 1.600.000 EUR; die einfache Gebühr beträgt 2.695 EUR. Eine Altbelastung der Verkäuferin war nicht zu löschen. Ein Anderkonto und zusätzliche Treuhandauflagen bestanden nicht.

KV GNotKG / Tätigkeit	Ansatz	Betrag EUR
21100 Kaufvertrag	2,0 × 885	1.770,00
22110 / 22112 Vollzug: Anforderung und Prüfung des kommunalen Negativzeugnisses	begrenzt	50,00
22200 Nr. 2 Prüfung und Mitteilung der Kaufpreisfälligkeit	0,5 × 885	442,50
22115 strukturierte Daten Kaufvertrag	0,1 × 885	88,50
21200 Grundschuldbestellung	1,0 × 2.695	2.695,00
22200 Nr. 7 Herbeiführung der Bindung für die Gläubigerin durch gesonderte Entgegennahme	0,5 × 2.695	1.347,50
22114 strukturierte Daten Grundschuld	Höchstbetrag	125,00
32001 abgegebene S/W-Seiten: Kauf 60 Seiten / Grundschuld 40 Seiten	9 + 6	15,00
32005 Post- und Telekommunikationspauschalen für beide Urkunden	2 × 20	40,00
32011 zwei Grundbuchabrufe, JVKostG KV 1151	2 × 8	16,00
Steuerpflichtige Gebühren und Auslagen		6.589,50
32014 Umsatzsteuer 19 %		1.252,01
32015 zwei Gebühren Urkundenarchiv gemäß Paragraph 2 UA-GebS als durchlaufende Beträge	2 × 4,50	9,00
Zahlbetrag		7.850,51

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim

kanzlei@notarin-fink.example

Die Bindungsherbeiführung zur Grundsuld erfolgte durch gesonderte Entgegennahme für die Gläubigerin am 22.12.2026. Die Kosten für das Urkundenarchiv wurden für Rechnung der Kostenschuldnerin verauslagt und sind nicht Teil der umsatzsteuerpflichtigen Bemessungsgrundlage. Vorschüsse wurden nicht vereinnahmt.

Bitte zahlen Sie 7.850,51 EUR bis 05.01.2027 unter der Rechnungsnummer NF-26-118-139 auf das Kanzleikonto. Gerichtskosten werden gesondert von der Gerichtskasse erhoben. Gegen diese Kostenberechnung kann die Entscheidung des zuständigen Landgerichts nach Paragraph 127 GNotKG beantragt werden.

gez. Dr. Carla Fink, Notarin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 23.12.2026

Gerichtskostenrechnung Grundbuch

In der Grundbuchsache Steinbogen Wohnen GmbH, Erwerb Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim, werden die nachstehenden Gerichtskosten angesetzt. Die Anträge sind unter dem Geschäftszeichen HI-GB-2026-778 erfasst. Kostenschuldnerin ist die Erwerberin nach den eingereichten Anträgen.

KV GNotKG / Eintragung	Geschäftswert EUR	Betrag EUR
14110 Eigentumsumschreibung, 1,0	450.000,00	885,00
14121 Buchgrundschuld, 1,0	1.600.000,00	2.695,00
14150 Auflassungsvormerkung, 0,5	450.000,00	442,50
14152 Löschung der Auflassungsvormerkung	Festgebühr	25,00
Gesamtbetrag		4.047,50

Die Zahlung ist unter dem Kassenzeichen GB-26-778 bis 06.01.2027 an die Gerichtskasse zu leisten. Die mitgeteilte Bankverbindung der Gerichtskasse gilt unverändert. Es wurden keine Vorschüsse angerechnet. Umsatzsteuer wird auf die Gerichtsgebühren nicht erhoben.

Der Ansatz enthält die Eigentumsumschreibung, die eingetragene Buchgrundschuld, die zuvor eingetragene Erwerbsvormerkung und deren Löschung. Gebühren einer Löschung fremder Altbelastungen sind nicht entstanden. Die Geschäftswerte wurden den Urkunden UVZ 118/2026 und 139/2026 entnommen.

Gegen den Kostenansatz ist die Erinnerung nach Paragraph 81 GNotKG zulässig. Sie kann beim Amtsgericht Hildesheim schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle eingelegt werden. Bitte geben Sie bei Rückfragen Geschäfts- und Kassenzeichen an.

gez. Klara Sommer, Kostenstelle
Anlagen: keine

Wohnfeld Grundstücke GmbH

Vermittlerhof 15, 31134 Hildesheim
rechnung@wohnfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 04.11.2026

Rechnung WG-26-104 – Grundstücksvermittlung

Rechnung Nr. WG-26-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 05.10.2026 bis 03.11.2026. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13808.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Nachweis und Vermittlung Baugrundstück gemäß Maklerauftrag vom 05.10.2026: 3 % des Kaufpreises von 450.000 EUR	1,00	Auftrag	13.500,00	13.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	13.500,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.565,00
Rechnungsbetrag brutto	16.065,00

Zahlbar ohne Skonto bis 18.11.2026. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WG-26-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Lutz Berger, Geschäftsführung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 21.09.2027

Kostenbescheid zum Bauantrag

Für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren zum Bauantrag SW-HI-26-08 für den Neubau eines Wohngebäudes mit acht Wohnungen, Wohnhof Am Steinbogen 18, werden Gebühren von 4.957,40 EUR festgesetzt. Die Genehmigungsentscheidung wurde gesondert bekannt gegeben. Rechtsgrundlage sind die Niedersächsische Baugebührenordnung (NBauGO) und die nachstehend genannten Gebührenpositionen.

1. Gebührenübersicht

Der Brutto-Rauminhalt beträgt nach den Bauvorlagen 2.710,00 m³. Bei einem Rohbauwert von 208,00 EUR je m³ beträgt der rechnerische Rohbauwert 563.680,00 EUR. Er wird gemäß Paragraf 3 Absatz 4 NBauGO auf 564.000,00 EUR aufgerundet. Der zugrunde gelegte Rohbauwert je m³ entspricht der zum 01.10.2026 veröffentlichten Festsetzung.

Leistung und Berechnung	Gebühr EUR
Anlage 1 Nr. 1.1 Buchstabe a NBauGO: 1.128 angefangene Einheiten zu 500 EUR × 4,30 EUR	4.850,40
Anlage 1 Nr. 12.7 NBauGO: Nachforderung vom 02.06.2027, 60 Minuten	107,00
Gesamtbetrag	4.957,40

Für die Prüfung der unvollständigen Bauvorlagen und das Erstellen der Nachforderung vom 02.06.2027 wurden 60 Minuten einer Sachbearbeiterin der Laufbahngruppe 2 unterhalb des zweiten Einstiegsamts erfasst. Nach Paragraf 6 Absatz 2 NBauGO in Verbindung mit Paragraf 4 Absatz 3 Nummer 2 KOVerm werden zwei angefangene halbe Stunden zu je 53,50 EUR berechnet.

Zahlen Sie den Gesamtbetrag bis 21.10.2027 unter Angabe des Kassenzeichens BA-27-328-K an die Stadtkasse. Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren; Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen. Der Kostenbescheid enthält keine Entgelte privater Prüfengeieure oder Fachplaner.

Gegen diesen Kostenbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Hildesheim erhoben werden. Bei öffentlichen Kosten hat der Widerspruch gemäß Paragraf 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VwGO keine automatische aufschiebende Wirkung. Für Rückfragen sind Aktenzeichen und Kassenzeichen anzugeben. Dieser Kostenbescheid ersetzt nicht die Genehmigungsunterlagen.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.11.2027

Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung

Versicherungsschein BV-SW-2027-180: Versicherungsnehmerin Steinbogen Wohnen GmbH; versichertes Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim, acht Wohneinheiten. Der vereinbarte Schutz besteht vom 01.12.2027 bis 30.11.2028 für die im Versicherungsschein bezeichnete Bauleistung und die Bauherrenhaftpflicht.

1. Einmalbeitrag

Bestandteil	EUR
Beitrag ohne Versicherungssteuer	7.563,03
Versicherungssteuer 19 %	1.436,97
Zahlbetrag	9.000,00

Der Gesamtbeitrag von 9.000,00 EUR wird am 06.12.2027 fällig. Diese Beitragsrechnung weist Versicherungssteuer und keine Umsatzsteuer aus. Bitte verwenden Sie bei der Zahlung die Vertragsnummer BV-SW-2027-180. Der Beitrag umfasst die im Antrag vereinbarte Versicherungssumme; Erweiterungen des Bauumfangs sind dem Versicherer mitzuteilen.

Der Versicherungsschutz richtet sich nach dem Versicherungsschein und den vereinbarten Bedingungen. Schäden sind unter Angabe des Schadentags und der ergriffenen Maßnahmen unverzüglich dem Vertragsservice anzuzeigen. Die Beitragserhebung ersetzt keine Deckungsentscheidung zu einem konkreten Schaden.

gez. Miriam Brand, Vertragsservice

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 02.01.2027

Rechnung LB-27-010 – Vereinbartes Finanzierungsentgelt

Rechnung Nr. LB-27-010. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 02.01.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Individuell vereinbartes Entgelt für die Bereitstellung der Projektfinanzierung gemäß Darlehensvertrag Ziffer 3	1,00	Vereinbarung	10.000,00	10.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	10.000,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	10.000,00

Die Kreditgewährung und das ihr zugeordnete Finanzierungsentgelt werden umsatzsteuerfrei gemäß Paragraph 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG abgerechnet. Es wird keine Umsatzsteuer geschuldet oder ausgewiesen.

Zahlbar ohne Skonto bis 16.01.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-27-010 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2027

Rechnung LB-Z-2027 – Darlehenszinsen 2027

Rechnung Nr. LB-Z-2027. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.01.2027 bis 31.12.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Tranche 400.000 EUR vom 01.01. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 360/360 Tage	1,00	Zeitraum	14.400,00	14.400,00
Tranche 400.000 EUR vom 01.07. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 180/360 Tage	1,00	Zeitraum	7.200,00	7.200,00
Tranche 800.000 EUR vom 01.10. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 90/360 Tage	1,00	Zeitraum	7.200,00	7.200,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	28.800,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	28.800,00

Zinsen für die Kreditgewährung; steuerfrei gemäß Paragraph 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG. Die Zinsen werden gesondert belastet und dem Darlehenskapital nicht zugeschlagen.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.01.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-Z-2027 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2028

Rechnung LB-Z-2028 – Darlehenszinsen 2028

Rechnung Nr. LB-Z-2028. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.01.2028 bis 31.12.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Darlehenssaldo 1.600.000 EUR vom 01.01. bis 31.12.2028 zu 3,6 % jährlich; 360/360 Tage	1,00	Zeitraum	57.600,00	57.600,00
Vertragliche einmalige Zinsvergütung aus Darlehensvertrag Ziffer 3	1,00	Vergütung	-6.400,00	-6.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	51.200,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	51.200,00

Zinsen für die Kreditgewährung; steuerfrei gemäß Paragraf 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG. Die Zinsvergütung von 6.400 EUR ist eine Leistung der Bank aus der individuellen Finanzierungsvereinbarung und kein öffentlicher Zuschuss. Die Abrechnung umfasst auch die Zeit nach Bezugsbeginn; sie trifft keine Aussage über eine bilanzielle Aktivierung.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.01.2029. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-Z-2028 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 24.09.2027

Rechnung KF-27-091 – Objektplanung LPH 1 bis 4

Rechnung Nr. KF-27-091. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 10.10.2026 bis 21.09.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	2.900,00	2.900,00
LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	10.150,00	10.150,00
LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	21.750,00	21.750,00
LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	4.350,00	4.350,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	39.150,00
Umsatzsteuer 19,00 %	7.438,50
Rechnungsbetrag brutto	46.588,50

Pauschalhonorar Objektplanung 145.000 EUR netto für die vereinbarten LPH 1 bis 9. Abgerechnet werden hier 27 % nach dem vertraglichen Zahlungsplan. Weitere Leistungsbilder und Nebenkosten werden nicht zusätzlich berechnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 08.10.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-27-091 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-27-091</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-24</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-10-08</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 1 bis 4. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-10-10</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-09-21</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-27-091</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7438.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7438.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">46588.50</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">46588.50</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 26.11.2027

Rechnung KF-27-116 – Objektplanung LPH 5 bis 7

Rechnung Nr. KF-27-116. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.06.2027 bis 24.11.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
LPH 5 Ausführungsplanung	1,00	Phase	36.250,00	36.250,00
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	1,00	Phase	14.500,00	14.500,00
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	1,00	Phase	5.800,00	5.800,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	56.550,00
Umsatzsteuer 19,00 %	10.744,50
Rechnungsbetrag brutto	67.294,50

Abgerechnet werden 39 % des vereinbarten Pauschalhonorars von 145.000 EUR netto. Die Teilbeträge für LPH 1 bis 4 wurden mit KF-27-091 abgerechnet; sie sind nicht erneut Bestandteil dieser Rechnung.

Zahlbar ohne Skonto bis 10.12.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-27-116 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin
Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-27-116</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-11-26</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-12-10</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 5 bis 7. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-06-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-11-24</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-27-116</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">10744.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">10744.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">67294.50</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">67294.50</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 5 Ausführungsplanung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 6 Vorbereitung der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.10.2028

Rechnung KF-28-104 – Objektplanung LPH 8

Rechnung Nr. KF-28-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2027 bis 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang	1,00	Phase	46.400,00	46.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	46.400,00
Umsatzsteuer 19,00 %	8.816,00
Rechnungsbetrag brutto	55.216,00

Abgerechnet werden 32 % des Pauschalhonorars von 145.000 EUR netto. Die Leistungen der Objektbetreuung in LPH 9 und deren Teilhonorar von 2.900 EUR netto bleiben außerhalb dieser Rechnung.

Zahlbar ohne Skonto bis 03.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-28-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-20</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-03</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 8. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-28-104</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">8816.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">8816.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">55216.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">55216.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 26.09.2033

Rechnung KF-33-092 – Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung

Rechnung Nr. KF-33-092. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 16.09.2028 bis 25.09.2033. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Objektbetreuung gemäß Leistungsvereinbarung einschließlich Vorfristbegehung und Dokumentation	1,00	Phase	2.900,00	2.900,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus KF-27-091, KF-27-116, KF-28-104 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	145.000,00	27.550,00	172.550,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	142.100,00	26.999,00	169.099,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	2.900,00	551,00	3.451,00

Das vereinbarte Pauschalhonorar beträgt abschließend 145.000 EUR netto. Die bereits vereinnahmten Abschläge werden mit ihren Nettobeträgen und der darauf entfallenden Umsatzsteuer abgesetzt. Zusätzliche Mangelbeseitigungsüberwachung wird nicht mit dieser Rechnung abgerechnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 10.10.2033. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-33-092 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin
Anlagen: keine


```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-33-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2033-09-26</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2033-10-10</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-09-16</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2033-09-25</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-27-091</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-24</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-27-116</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-11-26</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-20</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
```

```

<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-33-092</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>

```

```

</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">27550.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">27550.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">172550.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">169099.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">3451.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>

```

```

<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 5 Ausführungsplanung</ns1:Name>

```

```

<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 6 Vorbereitung der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>7</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>8</ns1:ID>

```

```

<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>9</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektbetreuung gemäß Leistungsvereinbarung einschließlich Vorfristbegehung und
Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 27.09.2027

Rechnung PT-27-092 – TGA Planung

Rechnung Nr. PT-27-092. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2026 bis 21.09.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12452.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen	1,00	Leistung	14.000,00	14.000,00
Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung	1,00	Leistung	10.000,00	10.000,00
Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur	1,00	Leistung	6.000,00	6.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	30.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	5.700,00
Rechnungsbetrag brutto	35.700,00

Zahlbar ohne Skonto bis 11.10.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer PT-27-092 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>PT-27-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-27</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-10-11</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>TGA Planung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-09-21</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@planwerk-tga.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TGA</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikring 14</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12452</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Elif Sand, Fachplanerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@planwerk-tga.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>PT-27-092</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE77000000001000000004</ns1:ID>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">5700.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">5700.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.10.2028

Rechnung PT-28-104 – TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss

Rechnung Nr. PT-28-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 22.09.2027 bis 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12452.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Ausführungsdetails und gewerkeübergreifende Koordination	1,00	Leistung	12.000,00	12.000,00
Mitwirkung Ausschreibung und Angebotsprüfung	1,00	Leistung	8.000,00	8.000,00
Fachbauüberwachung, Prüfprotokolle und Übergabe	1,00	Leistung	15.000,00	15.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus PT-27-092 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	65.000,00	12.350,00	77.350,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	30.000,00	5.700,00	35.700,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	35.000,00	6.650,00	41.650,00

Zahlbar ohne Skonto bis 05.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer PT-28-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>PT-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-22</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-05</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-09-22</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>PT-27-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-27</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@planwerk-tga.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TGA</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikring 14</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12452</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Elif Sand, Fachplanerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@planwerk-tga.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>PT-28-104</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE77000000001000000004</ns1:ID>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">12350.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">12350.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">77350.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Ausführungsdetails und gewerkeübergreifende Koordination</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Mitwirkung Ausschreibung und Angebotsprüfung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```



```
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fachbauüberwachung, Prüfprotokolle und Übergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Rechnung BW-28-093 – Tragwerksplanung

Rechnung Nr. BW-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2026 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12339.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Statische Berechnungen einschließlich Nachweisen	1,00	Auftrag	18.000,00	18.000,00
Schal- und Bewehrungsplanung	1,00	Auftrag	17.000,00	17.000,00
Bewehrungsabnahmen und Abschlussdokumentation	1,00	Auftrag	5.000,00	5.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	40.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	7.600,00
Rechnungsbetrag brutto	47.600,00

Zahlbar ohne Skonto bis 06.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer BW-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner
Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>BW-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-22</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-06</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Tragwerksplanung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">statik@bogenwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TRAGWERK</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Tragwerkhof 7</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12339</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>statik@bogenwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>BW-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE07000000001000000003</ns1:ID>
<ns1:Name>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">47600.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">47600.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Statische Berechnungen einschließlich Nachweisen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schal- und Bewehrungsplanung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">17000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Bewehrungsabnahmen und Abschlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 24.09.2028

Rechnung LP-28-094 – Vermessungsleistungen

Rechnung Nr. LP-28-094. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.10.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12678.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Lage- und Höhenaufnahme	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00
Gebäudeabsteckung und Kontrollmessungen	1,00	Auftrag	5.000,00	5.000,00
Schlussvermessung und Bestandsunterlagen	1,00	Auftrag	4.000,00	4.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	15.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.850,00
Rechnungsbetrag brutto	17.850,00

Zahlbar ohne Skonto bis 08.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LP-28-094 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ole Rehm, Vermessungsingenieur

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LP-28-094</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-24</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-08</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Vermessungsleistungen. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-10-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">aufmass@leinepunkt.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-VERMESSUNG</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Messbogen 22</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12678</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ole Rehm, Vermessungsingenieur</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>aufmass@leinepunkt.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LP-28-094</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE23000000001000000006</ns1:ID>
<ns1:Name>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">17850.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">17850.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Lage- und Höhenaufnahme</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gebäudeabsteckung und Kontrollmessungen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schlussvermessung und Bestandsunterlagen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Bodenprofil Ingenieure GmbH

Bohrweg 6, 31137 Hildesheim
bericht@bodenprofil.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 18.01.2027

Rechnung BP-27-018 – Baugrunduntersuchung

Rechnung Nr. BP-27-018. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 02.11.2026 bis 13.01.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12565.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Feldarbeiten mit sechs Sondierungen und Probenentnahmen	6,00	Punkt	1.100,00	6.600,00
Laboruntersuchungen und Gründungsgutachten	1,00	Auftrag	5.400,00	5.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	12.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.280,00
Rechnungsbetrag brutto	14.280,00

Zahlbar ohne Skonto bis 01.02.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer BP-27-018 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Ute Venn, Geotechnikerin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>BP-27-018</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-01-18</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-02-01</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Baugrunduntersuchung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-02</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-01-13</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bericht@bodenprofil.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-GEO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Bohrweg 6</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12565</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Ute Venn, Geotechnikerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bericht@bodenprofil.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>BP-27-018</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE50000000001000000005</ns1:ID>
<ns1:Name>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2280.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2280.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">14280.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">14280.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">6.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6600.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Feldarbeiten mit sechs Sondierungen und Probenentnahmen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">1100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Laboruntersuchungen und Gründungsgutachten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 25.09.2028

Rechnung EP-28-096 – Energieplanung und Fertigstellungsnachweis

Rechnung Nr. EP-28-096. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.11.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14034.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Energiebilanz und Wärmebrückennachweise	1,00	Auftrag	6.500,00	6.500,00
Baubegleitung und energetische Abschlussdokumentation	1,00	Auftrag	3.500,00	3.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	10.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	1.900,00
Rechnungsbetrag brutto	11.900,00

Zahlbar ohne Skonto bis 09.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer EP-28-096 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nils Frank, Energieplanung

Anlagen: keine


```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>EP-28-096</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-25</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-09</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Energieplanung und Fertigstellungsnachweis. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@energiepfad.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ENERGIE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Energieweg 17</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14034</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nils Frank, Energieplanung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@energiepfad.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>EP-28-096</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE87000000001000000018</ns1:ID>
<ns1:Name>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1900.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1900.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">11900.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">11900.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Energiebilanz und Wärmebrückennachweise</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baubegleitung und energetische Abschlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">3500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 25.09.2028

Rechnung RW-28-095 – Brandschutzplanung

Rechnung Nr. RW-28-095. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.11.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14147.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Brandschutznachweis und Planabstimmung	1,00	Auftrag	5.500,00	5.500,00
Baubegleitende Begehung und Schlusssdokumentation	1,00	Auftrag	2.500,00	2.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	8.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	1.520,00
Rechnungsbetrag brutto	9.520,00

Zahlbar ohne Skonto bis 09.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer RW-28-095 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung
Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>RW-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-25</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-09</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Brandschutzplanung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">nachweise@rettungsweg.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-BRAND</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Sicherheitsbogen 19</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14147</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>nachweise@rettungsweg.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>RW-28-095</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE60000000001000000019</ns1:ID>
<ns1:Name>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1520.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1520.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">9520.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">9520.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Brandschutznachweis und Planabstimmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baubegleitende Begehung und Schlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.02.2028

Rechnung SH-28-021 – Rohbau 1. Abschlag

Rechnung Nr. SH-28-021. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2027 bis 12.02.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag	1,00	psch	20.000,00	20.000,00
Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung	1.000,00	m³	45,00	45.000,00
Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung	225,00	m³	600,00	135.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	200.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	38.000,00
Rechnungsbetrag brutto	238.000,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.02.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-021 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine


```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-021</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-02-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-02-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau 1. Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-02-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-021</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">38000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">38000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">238000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">238000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">45.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">225.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">135000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.04.2028

Rechnung SH-28-046 – Rohbau 2. Abschlag

Rechnung Nr. SH-28-046. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.02.2028 bis 12.04.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung	25,00	m³	600,00	15.000,00
Tragende Wandkonstruktionen	1.000,00	m²	180,00	180.000,00
Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung	262,50	m²	400,00	105.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	300.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	57.000,00
Rechnungsbetrag brutto	357.000,00

Der Abschlag erfasst ausschließlich die seit SH-28-021 hinzugekommenen und gemeinsam aufgemessenen Leistungen. Die Gründungsmengen aus beiden Abschlägen ergeben zusammen 250 m³. Der gesonderte Drännachtrag wird nicht in diese Grundvertragsabrechnung einbezogen.

Zahlbar ohne Skonto bis 29.04.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-046 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-046</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-04-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-04-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau 2. Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-02-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-04-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-046</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">25.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Tragende Wandkonstruktionen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">180.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">262.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```



```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung SH-28-093 – Rohbau Schlussrechnung

Rechnung Nr. SH-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.04.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Geschossdecken, Restmenge	187,50	m²	400,00	75.000,00
Treppenläufe einschließlich Podesten	3,00	Einheit	25.000,00	75.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus SH-28-021, SH-28-046 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	650.000,00	123.500,00	773.500,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	500.000,00	95.000,00	595.000,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	150.000,00	28.500,00	178.500,00

Grundvertrag 650.000 EUR netto. Der gesondert beauftragte Nachtrag SH-N01 ist zusätzlich in SH-28-N01 abgerechnet und wird hier weder angesetzt noch abgesetzt.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-04-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>SH-28-021</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-02-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>SH-28-046</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-04-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
```

```

<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">123500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">123500.00</ns1:TaxAmount>

```

```

<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">773500.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">595000.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">45.00</ns1:PriceAmount>

```

```

</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">225.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">135000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">25.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Tragende Wandkonstruktionen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">180.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">262.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>7</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">187.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken, Restmenge</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>8</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">3.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Treppenläufe einschließlich Podesten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>

```

```
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">25000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```


Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.05.2028

Rechnung DG-28-052 – Gebäudehülle Abschlag

Rechnung Nr. DG-28-052. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.04.2028 bis 12.05.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12904.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung	400,00	m²	300,00	120.000,00
Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt	50,00	Stück	2.000,00	100.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	220.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	41.800,00
Rechnungsbetrag brutto	261.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.05.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer DG-28-052 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ina Mertens, Projektleitung

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>DG-28-052</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-05-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-05-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Gebäudehülle Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-04-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-05-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@dachraum.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HUELLE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Dachbogen 11</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12904</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ina Mertens, Projektleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@dachraum.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>DG-28-052</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE66000000001000000008</ns1:ID>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">41800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">41800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">400.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">300.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung DG-28-098 – Gebäudehülle Schlussrechnung

Rechnung Nr. DG-28-098. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.05.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12904.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, zweiter Abschnitt	50,00	Stück	2.000,00	100.000,00
Fassadenbekleidung einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung	800,00	m²	150,00	120.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus DG-28-052 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	440.000,00	83.600,00	523.600,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	220.000,00	41.800,00	261.800,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	220.000,00	41.800,00	261.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer DG-28-098 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ina Mertens, Projektleitung

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>DG-28-098</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Gebäudehülle Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>DG-28-052</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-05-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@dachraum.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HUELLE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Dachbogen 11</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12904</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ina Mertens, Projektleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@dachraum.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>DG-28-098</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE66000000001000000008</ns1:ID>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">83600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">83600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">523600.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">400.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">300.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```



```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, zweiter Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">800.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fassadenbekleidung einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermefluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.06.2028

Rechnung WH-28-063 – Heizung Lüftung Sanitär Abschlag

Rechnung Nr. WH-28-063. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.05.2028 bis 12.06.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13017.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung	1,00	Anlage	80.000,00	80.000,00
Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung	1.000,00	m	60,00	60.000,00
Fußbodenheizung beheizte Flächen	500,00	m²	80,00	40.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	180.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	34.200,00
Rechnungsbetrag brutto	214.200,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.06.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WH-28-063 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>WH-28-063</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-06-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Heizung Lüftung Sanitär Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-06-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@waermefluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HLS</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Installationshof 16</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13017</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Arne Thiel, Bauleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@waermefluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>WH-28-063</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE39000000001000000009</ns1:ID>
<ns1:Name>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">34200.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">34200.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fußbodenheizung beheizte Flächen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Wärmeﬂuss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermeﬂuss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung WH-28-094 – Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung

Rechnung Nr. WH-28-094. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.06.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13017.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Sanitärausstattung und Wohnungsanschlüsse	8,00	Wohnung	12.000,00	96.000,00
Lüftungseinheiten und Verteilung	8,00	Wohnung	8.000,00	64.000,00
Inbetriebnahme, Abgleich und Dokumentation	1,00	Auftrag	20.000,00	20.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus WH-28-063 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	360.000,00	68.400,00	428.400,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	180.000,00	34.200,00	214.200,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	180.000,00	34.200,00	214.200,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WH-28-094 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>WH-28-094</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-06-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>WH-28-063</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@waermefluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HLS</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Installationshof 16</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13017</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
```



```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Arne Thiel, Bauleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@waermefluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>WH-28-094</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE39000000001000000009</ns1:ID>
<ns1:Name>Wärmeffluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">68400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">68400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">428400.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Fußbodenheizung beheizte Flächen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">96000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Sanitärausstattung und Wohnungsanschlüsse</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">64000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Lüftungseinheiten und Verteilung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```

```
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Inbetriebnahme, Abgleich und Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.06.2028

Rechnung LE-28-061 – Elektro Abschlag

Rechnung Nr. LE-28-061. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.05.2028 bis 30.05.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch	8,00	Wohnung	6.500,00	52.000,00
Hauptverteilung und Messkonzept	1,00	Anlage	23.000,00	23.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	75.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	14.250,00
Rechnungsbetrag brutto	89.250,00

Zahlbar ohne Skonto bis 15.06.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-28-061 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-28-061</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-01</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-06-15</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Elektro Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-05-30</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-28-061</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">14250.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">14250.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">52000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Hauptverteilung und Messkonzept</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```


Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung LE-28-098 – Elektro und Ladeinfrastruktur
Schlussrechnung

Rechnung Nr. LE-28-098. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 31.05.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Vorverkabelung für acht Stellplätze und zwei Ladepunkte gemäß Ausführungsplan	1,00	Auftrag	18.000,00	18.000,00
Allgemeinbeleuchtung und Außeninstallation	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00
Aufzugszuleitung, Prüfungen und Dokumentation	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus LE-28-061 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	105.000,00	19.950,00	124.950,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	75.000,00	14.250,00	89.250,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	30.000,00	5.700,00	35.700,00

Der Elektroauftrag ohne die separat gelieferte PV-Anlage beträgt 105.000 EUR netto. Die eigenständige PV-Lieferung und Montage über 45.000 EUR wird ausschließlich mit LE-PV-28-099 abgerechnet. Ein Mieterstromliefermodell ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Die Zahlungseingänge zur Abschlagsrechnung werden außerhalb der Schlussabrechnung in der Debitorenbuchhaltung zugeordnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-28-098 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin
Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-28-098</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-31</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>LE-28-061</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-01</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-28-098</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">19950.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">19950.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">124950.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">52000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Hauptverteilung und Messkonzept</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Vorverkabelung für acht Stellplätze und zwei Ladepunkte gemäß
Ausführungsplan</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Allgemeinbeleuchtung und Außeninstallation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Aufzugszuleitung, Prüfungen und Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>

```

</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.07.2028

Rechnung IA-28-074 – Innenausbau Abschlag

Rechnung Nr. IA-28-074. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.06.2028 bis 12.07.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen	1.000,00	m²	40,00	40.000,00
Innenputz und Spachtelarbeiten	2.200,00	m²	50,00	110.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	150.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	28.500,00
Rechnungsbetrag brutto	178.500,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.07.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer IA-28-074 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-28-074</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-07-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-07-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Innenausbau Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-06-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-07-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-28-074</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE82000000001000000011</ns1:ID>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">28500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">28500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">40.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">110000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innenputz und Spachtelarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung IA-28-095 – Innenausbau Schlussrechnung

Rechnung Nr. IA-28-095. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.07.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Bodenbeläge gemäß Raumbuch	600,00	m²	100,00	60.000,00
Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen	80,00	Stück	500,00	40.000,00
Malerarbeiten einschließlich Untergrundbehandlung	2.500,00	m²	20,00	50.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus IA-28-074 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	300.000,00	57.000,00	357.000,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	150.000,00	28.500,00	178.500,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	150.000,00	28.500,00	178.500,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer IA-28-095 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Innenausbau Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>IA-28-074</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-07-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-28-095</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE82000000001000000011</ns1:ID>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">40.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">110000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innenputz und Spachtelarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">600.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Bodenbeläge gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">80.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Malerarbeiten einschließlich Untergrundbehandlung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```

</ns0:Invoice>

Hubpunkt Aufzüge GmbH

Technikhof 5, 31135 Hildesheim
montage@hubpunkt.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung HA-28-093 – Aufzugsanlage

Rechnung Nr. HA-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.07.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13356.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Aufzugsanlage einschließlich Steuerung und Kabine	1,00	Anlage	42.000,00	42.000,00
Montage und Anschlussarbeiten	1,00	Auftrag	12.000,00	12.000,00
Prüfungen, Inbetriebnahme und Betreiberunterlagen	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	60.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	11.400,00
Rechnungsbetrag brutto	71.400,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer HA-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ralf Hanke, Montageleitung

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>HA-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Aufzugsanlage. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">montage@hubpunkt.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUFZUG</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikhof 5</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13356</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ralf Hanke, Montageleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>montage@hubpunkt.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>HA-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE55000000001000000012</ns1:ID>
<ns1:Name>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">11400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">11400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">71400.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">71400.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">42000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Aufzugsanlage einschließlich Steuerung und Kabine</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">42000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Montage und Anschlussarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Prüfungen, Inbetriebnahme und Betreiberunterlagen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH

Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
bau@gruenkante.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.11.2028

Rechnung GG-28-115 – Außenanlagen und Entwässerung

Rechnung Nr. GG-28-115. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.08.2028 bis 10.11.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13469.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Befestigte Flächen einschließlich Unterbau	500,00	m²	100,00	50.000,00
Außenentwässerung einschließlich Schächten	200,00	m	200,00	40.000,00
Pflanzflächen einschließlich Bodenvorbereitung	300,00	m²	60,00	18.000,00
Fahrradabstellanlage und Einfriedung	1,00	Auftrag	12.000,00	12.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	120.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	22.800,00
Rechnungsbetrag brutto	142.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer GG-28-115 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Mira Roth, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>GG-28-115</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-11-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Außenanlagen und Entwässerung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-08-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-11-10</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@gruenkante.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSSEN</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Pflanzhof 32</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13469</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Mira Roth, Geschäftsführerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@gruenkante.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>GG-28-115</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE28000000001000000013</ns1:ID>
<ns1:Name>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">22800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">22800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```



```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">142800.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">142800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Befestigte Flächen einschließlich Unterbau</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Außenentwässerung einschließlich Schächten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">300.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Pflanzflächen einschließlich Bodenvorbereitung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fahrradabstellanlage und Einfriedung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Leineanschluss Netzdienste GmbH

Netzhof 27, 31135 Hildesheim
anschluss@leineanschluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.08.2028

Rechnung LN-28-081 – Hausanschlüsse

Rechnung Nr. LN-28-081. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.07.2028 bis 15.08.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14373.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Trinkwasseranschluss Grundstück bis Übergabestelle	1,00	Anschlus s	8.500,00	8.500,00
Schmutzwasseranschluss und Übergabeschacht	1,00	Anschlus s	12.000,00	12.000,00
Stromanschluss einschließlich Netzanschlussschrank	1,00	Anschlus s	14.500,00	14.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	35.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	6.650,00
Rechnungsbetrag brutto	41.650,00

Zahlbar ohne Skonto bis 03.09.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LN-28-081 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Henning Wulf, Hausanschlüsse

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LN-28-081</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-08-20</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-09-03</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Hausanschlüsse. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-08-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">anschluss@leineanschluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-VERSORGER</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Netzhof 27</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14373</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Henning Wulf, Hausanschlüsse</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>anschluss@leineanschluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LN-28-081</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE06000000001000000021</ns1:ID>
<ns1:Name>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">6650.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">6650.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Trinkwasseranschluss Grundstück bis Übergabestelle</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schmutzwasseranschluss und Übergabeschacht</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Stromanschluss einschließlich Netzanschlussschrank</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 05.03.2028

Rechnung SH-28-N01 – Nachtrag Drän- und Filterpackung

Rechnung Nr. SH-28-N01. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 07.02.2028 bis 11.02.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Zusätzlicher Aushub gemäß Freigabe vom 05.02.2028	60,00	m³	85,00	5.100,00
Filtermaterial liefern und einbauen	45,00	m³	160,00	7.200,00
Zusätzliche Dränleitung mit Filtervlies	30,00	m	95,00	2.850,00
Zusätzliche Arbeitsstunden gemäß bestätigtem Stundenbericht	57,00	Stunde	50,00	2.850,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	18.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	3.420,00
Rechnungsbetrag brutto	21.420,00

Grundlage ist die schriftliche Beauftragung SH-N01 vom 05.02.2028 nach dem Ortstermin zur abweichenden Bodenschicht. Der Preis von 18.000 EUR netto ergänzt den Grundvertrag. Die Mengen und Stunden wurden im gemeinsamen Aufmaß vom 11.02.2028 bestätigt.

Zahlbar ohne Skonto bis 19.03.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-N01 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine


```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-N01</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-03-05</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-03-19</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Nachtrag Drän- und Filterpackung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-02-07</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-02-11</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-N01</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">3420.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">3420.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">21420.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">21420.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">60.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5100.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzlicher Aushub gemäß Freigabe vom 05.02.2028</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">85.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">45.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">7200.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Filtermaterial liefern und einbauen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">160.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">30.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzliche Dränleitung mit Filtervlies</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">95.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="HUR">57.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzliche Arbeitsstunden gemäß bestätigtem Stundenbericht</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.10.2028

Rechnungskorrektur IA-G-28-017 – Rechnungskorrektur zu
IA-28-095

Rechnungskorrektur Nr. IA-G-28-017. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Vereinbarte Entgeltminderung für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07 gemäß Vereinbarung vom 15.10.2028	1,00	Vereinbarung	-2.500,00	-2.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	-2.500,00
Umsatzsteuer 19,00 %	-475,00
Rechnungsbetrag brutto	-2.975,00

Diese Korrektur bezieht sich ausschließlich auf IA-28-095 vom 30.09.2028. Sie ist eine Entgeltminderung des leistenden Unternehmers und keine Abrechnungsgutschrift des Auftraggebers.

Der Betrag wird auf das bekannte Projektkonto der Auftraggeberin zurückgezahlt. Die Rechnungskorrektur ändert nur den vorstehend bezeichneten Leistungsumfang; die übrigen Positionen der ursprünglichen Rechnung bleiben bestehen.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

```
<ns0:CreditNote xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-G-28-017</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-15</ns1:IssueDate>
<ns1:CreditNoteTypeCode>381</ns1:CreditNoteTypeCode>
<ns1:Note>Rechnungskorrektur zu IA-28-095. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Rechnungskorrektur des Leistenden zu IA-28-095; Entgeltminderung Wohnung 07.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-10-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>IA-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
```

```

<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-G-28-017</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE950000000000000882608</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Erstattung auf das Projektkonto.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">475.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">475.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>

```

```

</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">2975.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">2975.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:CreditNoteLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:CreditedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:CreditedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Vereinbarte Entgeltminderung für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07 gemäß
Vereinbarung vom 15.10.2028</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:CreditNoteLine>
</ns0:CreditNote>

```


Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim
finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.12.2026 · SW-HI-26-08

Projektfinanzierung SW-HI-26-08

1. Vertragsparteien und Kredit

Die Leinebogen Projektbank AG gewährt der Steinbogen Wohnen GmbH zur Finanzierung des Neubaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim ein Darlehen von 1.600.000,00 EUR. Die Geschäftsführerin Maren Birk handelt für die Darlehensnehmerin. Das Darlehen wird auf das ausschließlich für die Bauinvestition geführte Projektkonto ausgezahlt.

2. Auszahlung und Besicherung

Die Bank zahlt 400.000,00 EUR zum 01.01.2027, 400.000,00 EUR zum 01.07.2027 und 800.000,00 EUR zum 01.10.2027 aus. Voraussetzung sind der Nachweis des Grundstückserwerbs und die vereinbarte erstrangige Grundschild von 1.600.000,00 EUR. Die Sicherungszweckerklärung wird gesondert beurkundet beziehungsweise vereinbart. Eine weitergehende Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten wird mit diesem Vertrag nicht bestellt.

3. Zinsen und Entgelt

Der feste Sollzinssatz beträgt 3,60 % jährlich. Für die Bauphase bis 31.12.2028 werden die Zinsen nach der kaufmännischen Methode 30/360 berechnet und jeweils zum Jahresende dem Projektkonto belastet. Zusätzlich ist ein zwischen den Parteien individuell ausgehandeltes Finanzierungsentgelt von 10.000,00 EUR bei der ersten Auszahlung fällig. Die Bank gewährt für das Projekt einmalig eine Zinsvergütung von 6.400,00 EUR, die in der Zinsabrechnung 2028 verrechnet wird. Sie ist von keiner öffentlichen Förderzusage abhängig.

4. Tilgung und Zahlungsweg

Bis 31.12.2028 ist das Darlehen tilgungsfrei. Ab 01.01.2029 beträgt die anfängliche jährliche Tilgung 1,50 % des ursprünglichen Darlehensbetrags. Zusammen mit dem Sollzins ergibt sich eine jährliche Annuität von 81.600,00 EUR, zahlbar in zwölf gleichen Monatsraten von 6.800,00 EUR vom gesonderten Mietbetriebskonto. Innerhalb der gleichbleibenden Rate wächst der Tilgungsanteil, soweit der Zinsanteil durch die Tilgung sinkt. Der Sollzinssatz ist bis 31.12.2038 gebunden. Die Anschlussregelung und die dann verbleibende Restschuld werden vor Ablauf gesondert vereinbart.

5. Projektkonto und Unterlagen

Das Projektkonto wird bis zum Ausgleich der letzten Architektenforderung ohne Habenzins und ohne weitere Kontoführungsentgelte geführt. Mieten, Mietkautionen und laufende Bewirtschaftungsvorgänge werden über andere Konten abgewickelt. Die Darlehensnehmerin übersendet der Bank die Kostenfortschreibung und wesentliche Änderungen des Bauvorhabens. Die Bank darf Auszahlungen nur bei Fehlen einer vereinbarten Auszahlungsvoraussetzung zurückhalten.

6. Abschluss

Die Parteien haben die Bestimmungen gemeinsam am 19.12.2026 besprochen. Vertragsänderungen werden in Textform festgehalten. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Beide Parteien erhalten eine gleichlautende Ausfertigung. Für die Bank: Petra West. Für die Darlehensnehmerin: Maren Birk. Beide haben die Vereinbarung am 19.12.2026 unterzeichnet.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 20.12.2026 · SW-HI-26-08

Gesellschafterbeschluss zur Projektfinanzierung und Vermietungsplanung

1. Eigenkapital

Die Alleingesellschafterin Steinbogen Beteiligungen GmbH beschließt, der Steinbogen Wohnen GmbH für das Projekt SW-HI-26-08 insgesamt 2.100.000,00 EUR als freiwillige Zuzahlung in die Kapitalrücklage zur Verfügung zu stellen. Die Einzahlung erfolgt in drei Teilbeträgen von 800.000,00 EUR zum 15.11.2026, 700.000,00 EUR zum 15.01.2027 und 600.000,00 EUR zum 15.01.2028. Der erste Teilbetrag ist bereits auf dem Projektkonto eingegangen. Eine laufende Verzinsung oder Rückzahlungsfälligkeit wird nicht vereinbart.

2. Freigegebener Kostenrahmen

Der freigegebene Kostenrahmen beträgt 3.650.000,00 EUR einschließlich nicht abziehbarer Umsatzsteuer, Grundstück und Erwerbsnebenkosten sowie der gesondert vereinbarten Finanzierungskosten bis Ende 2028. Die Ausgangskalkulation beträgt 3.463.770,41 EUR. Aus Eigenkapital und Darlehen stehen 3.700.000,00 EUR zur Verfügung. Nicht verbrauchte Mittel bleiben zunächst zur Deckung ausstehender Projektabrechnungen auf dem Projektkonto.

3. Vermietungsannahmen

Geplant ist die langfristige Vermietung sämtlicher acht Wohnungen zu Wohnzwecken ab 01.10.2028. Die Wohnflächen betragen in der Reihenfolge WE 01 bis WE 08 jeweils 68, 75, 82, 68, 75, 82, 75 und 75 m², zusammen 600 m². Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung setzt die Geschäftsführung eine Nettokaltmiete von 13,50 EUR je m² und Monat an. Acht Stellplätze werden ausschließlich zusammen mit den Wohnungen mit jeweils 50,00 EUR monatlich kalkuliert. Diese Werte sind interne Planannahmen und keine Feststellung einer ortsüblichen oder rechtlich zulässigen Miethöhe.

4. Betrieb und Rücklagenplanung

Für nicht umlagefähige Bewirtschaftungsaufwendungen und laufende Instandhaltung werden in einem stabilisierten vollen Vermietungsjahr zunächst 18.000,00 EUR veranschlagt. Diese Planannahme ist vor der Vermietung anhand von Angeboten und den tatsächlichen Verträgen zu aktualisieren. Mietausfall wird zunächst mit null angesetzt; die Arbeitsmappe soll abweichende Leerstands- und Kostenannahmen rechnen können. Kautionen stehen nicht zur Finanzierung der Baukosten zur Verfügung.

5. Nutzung und Verantwortlichkeit

Die Gesellschaft erbringt keine Bauleistungen für Dritte. Sie baut und hält das Haus ausschließlich zur eigenen Wohnraumvermietung. Der PV-Ertrag wird im vereinbarten Allgemeinstromkonzept genutzt; gesonderte Stromlieferverträge mit Mietern werden nicht abgeschlossen. Die steuerliche Zuordnung und die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten werden anhand der Belege mit der steuerlichen Beratung abgestimmt. Die kaufmännische Projektkostenrechnung stellt dafür die Zahlungen und Leistungsabrechnungen getrennt bereit.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2026

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2026

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026. Anfangssaldo 0,00 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2026-11-15 EK-20261115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	800.000,00	–	800.000,00
2026-11-18 SW-74-20261118	Wohnfeld Grundstücke GmbH WG-26-104	–	16.065,00	783.935,00
2026-11-27 SW-70-20261127	Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH KP-2026-118	–	450.000,00	333.935,00
2026-12-08 SW-71-20261208	Finanzamt Hildesheim GRE-26-816	–	22.500,00	311.435,00

Schlussaldo 311.435,00 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2027

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2027

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2027. Anfangssaldo 311.435,00 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2027-01-01 DL-20270101	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	400.000,00	–	711.435,00
2027-01-05 SW-72-20270105	Notarin Dr. Carla Fink NF-26-118-139	–	7.850,51	703.584,49
2027-01-06 SW-73-20270106	Amtsgericht Hildesheim, Grundbuchamt GB-26-778	–	4.047,50	699.536,99
2027-01-15 EK-20270115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	700.000,00	–	1.399.536,99
2027-01-16 SW-77-20270116	Leinebogen Projektbank AG LB-27-010	–	10.000,00	1.389.536,99
2027-02-01 SW-88-20270201	Bodenprofil Ingenieure GmbH BP-27-018	–	14.280,00	1.375.256,99
2027-07-01 DL-20270701	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	400.000,00	–	1.775.256,99
2027-10-01 DL-20271001	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	800.000,00	–	2.575.256,99

Übertrag: 2.575.256,99 EUR. Fortsetzung des Auszugs auf der nächsten Seite.

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Projektkonto 882608 – Fortsetzung 2027

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2027-10-05 SW-75-20271005	Stadt Hildesheim, Bauaufsicht BA-27-328-K	–	4.957,40	2.570.299,59
2027-10-08 SW-80-20271008	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-27-091	–	46.588,50	2.523.711,09
2027-10-11 SW-84-20271011	Planwerk Haustechnik GmbH PT-27-092	–	35.700,00	2.488.011,09
2027-12-06 SW-76-20271206	Bauwert Versicherung AG BV-27-180	–	9.000,00	2.479.011,09
2027-12-10 SW-81-20271210	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-27-116	–	67.294,50	2.411.716,59
2027-12-31 SW-78-20271231	Leinebogen Projektbank AG LB-Z-2027	–	28.800,00	2.382.916,59

Schlussaldo 2.382.916,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 31.12.2028

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2028

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.

Auszugszeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2028. Anfangssaldo 2.382.916,59 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2028-01-15 EK-20280115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	600.000,00	–	2.982.916,59
2028-02-29 SW-91-20280229	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-021	–	238.000,00	2.744.916,59
2028-03-19 SW-105-20280319	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-N01	–	21.420,00	2.723.496,59
2028-04-29 SW-92-20280429	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-046	–	357.000,00	2.366.496,59
2028-05-29 SW-94-20280529	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-052	–	261.800,00	2.104.696,59
2028-06-15 SW-98-20280615	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	–	89.250,00	2.015.446,59
2028-06-19 SW-98-20280619	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	–	89.250,00	1.926.196,59
2028-06-29 SW-96-20280629	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-063	–	214.200,00	1.711.996,59
2028-07-29 SW-100-20280729	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-074	–	178.500,00	1.533.496,59
2028-09-03 SW-104-20280903	Leineanschluss Netzdienste GmbH LN-28-081	–	41.650,00	1.491.846,59
2028-10-06 SW-86-20281006	Ingenieurbüro Bogenwerk BW-28-093	–	47.600,00	1.444.246,59
2028-10-08 SW-87-20281008	Vermessungsbüro Leinepunkt LP-28-094	–	17.850,00	1.426.396,59
2028-10-09 SW-89-20281009	Energiepfad Ingenieurbüro EP-28-096	–	11.900,00	1.414.496,59
2028-10-09 SW-90-20281009	Brandschutzbüro Rettungsweg RW-28-095	–	9.520,00	1.404.976,59
2028-10-14 SW-101-20281014	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-095	–	178.500,00	1.226.476,59
2028-10-14 SW-102-20281014	Hubpunkt Aufzüge GmbH HA-28-093	–	71.400,00	1.155.076,59

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2028-10-14 SW-119-20281014	Lichtkreis Elektro GmbH LE-PV-28-099	–	45.000,00	1.110.076,59
2028-10-14 SW-93-20281014	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-093	–	178.500,00	931.576,59
2028-10-14 SW-95-20281014	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-098	–	261.800,00	669.776,59
2028-10-14 SW-97-20281014	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-094	–	214.200,00	455.576,59
2028-10-14 SW-99-20281014	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-098	–	35.700,00	419.876,59
2028-11-03 SW-82-20281103	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-28-104	–	55.216,00	364.660,59
2028-11-05 SW-85-20281105	Planwerk Haustechnik GmbH PT-28-104	–	41.650,00	323.010,59
2028-11-15 SW-106-20281115	Innenraum Ausbau GmbH IA-G-28-017	2.975,00	–	325.985,59
2028-11-29 SW-103-20281129	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH GG-28-115	–	142.800,00	183.185,59
2028-12-15 LE-RET-20281215	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	–	272.435,59
2028-12-31 SW-79-20281231	Leinebogen Projektbank AG LB-Z-2028	–	51.200,00	221.235,59

Schlussaldo 221.235,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2033

Projektkonto 882608 – Auszug bis 30.09.2033

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2033 bis 30.09.2033. Anfangssaldo 221.235,59 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2033-09-30 SW-83-20330930	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-33-092	–	3.451,00	217.784,59

Schlussaldo 217.784,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.
Für 2029 bis 2032 bestanden auf diesem Projektkonto keine Umsätze. Die Mietbewirtschaftung wird seit Vermietungsbeginn auf dem gesonderten Betriebskonto geführt.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
Datum	Tue, 26 Sep 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Zahlungszuordnung LE-28-061

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei der Vorbereitung der Schlusszahlungen sehe ich im Projektkonto zwei Überweisungen mit dem Verwendungszweck LE-28-061, am 15.06. und am 19.06.2028, jeweils über 89.250 EUR. In meiner Liste steht nur die Rechnung vom 01.06.2028. Bitte senden Sie mir Ihr Debitorenkonto für das Bauvorhaben, damit wir die Zuordnung vor der Schlusszahlung abstimmen können.

Die Schlussrechnungsunterlagen gehen parallel an Frau Feld zur technischen Prüfung. Bitte verrechnen Sie ohne kurze Abstimmung keine Beträge mit anderen Bauvorhaben. Die Überweisungsfreigabe am 19.06. wurde während meiner Abwesenheit durch die Vertretung vorgenommen; auf dem Freigabebeleg steht ebenfalls LE-28-061.

Für die Bankbesprechung am 05.10. brauche ich eine belastbare Übersicht über den noch zu zahlenden Betrag. Ich sende Ihnen die Abschlagsrechnung nochmals mit. Bitte antworten Sie an die Projektadresse und setzen Sie die Buchhaltung in Ihrem Haus hinzu.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 098_Elektro_Abschlag.pdf

Von	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 13 Dec 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Debitorenkonto SW-HI-26-08 und Auszahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben die beiden Zahlungseingänge vom 15.06. und 19.06.2028 zu LE-28-061 nun auf demselben Debitorenkonto zusammengeführt. Der zweite Eingang war zunächst ohne Rechnungszuordnung verbucht. Die Schlussrechnung LE-28-098 wurde am 14.10.2028 in voller Höhe ausgeglichen.

Auf dem Debitorenkonto verbleibt deshalb ein Guthaben von 89.250 EUR. Wir haben die Rückzahlung auf das Projektkonto 882608 für den 15.12.2028 angewiesen. Der Zahlungstext lautet LE-RET-20281215. Unsere Leistungsabrechnung und die ausgewiesene Umsatzsteuer ändern sich dadurch nicht; es handelt sich um die Rückzahlung einer zusätzlich eingegangenen Zahlung.

Bitte teilen Sie uns mit, falls die Bankverbindung inzwischen geändert wurde. Andernfalls ist keine weitere Mitwirkung erforderlich. Die Abrechnung der Ladeinfrastruktur und der beiden Ladepunkte bleibt Bestandteil der bereits übersandten Schlussrechnung.

Mit freundlichen Grüßen
Selin Voß, Elektromeisterin
Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Anlagen: 099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf

Von	"Jan Merz, Bauleiter" <leitung@innenraum-ausbau.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 15 Oct 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Wohnung 07 – Entgeltminderung Bodenbelag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen die heute mit Frau Birk vereinbarte Entgeltminderung von 2.500 EUR netto für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07. Die Auftraggeberin behält den eingebauten Belag; ein Austausch wird insoweit nicht mehr verlangt. Die sonstigen Ansprüche aus den übrigen Gewerkeleistungen werden durch diese Vereinbarung nicht geregelt.

Die beigefügte Rechnungskorrektur IA-G-28-017 bezieht sich auf die Schlussrechnung IA-28-095. Da deren Betrag am 14.10. eingegangen ist, zahlen wir 2.975 EUR einschließlich Umsatzsteuer am 15.11.2028 auf das Projektkonto zurück. Eine Verrechnung mit anderen Objekten ist nicht vorgesehen.

Bitte nehmen Sie diese Nachricht zusammen mit der Rechnungskorrektur zur Kostenfortschreibung. Wir übersenden keine neue Schlussrechnung, damit die ursprüngliche Rechnung und die einzelne Änderung anhand ihrer Nummern nachvollziehbar bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Merz, Bauleiter

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

leitung@innenraum-ausbau.example

Anlagen: 106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 05 Oct 2033 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Letzte Architektenzahlung und Unterlagen für die Jahresarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Schlussrechnung KF-33-092 wurde am 30.09.2033 mit 3.451 EUR vom Projektkonto bezahlt. Bitte ordnen Sie die Rechnung der Objektbetreuung zu und geben Sie die Informationen an die steuerliche Beratung weiter. Die älteren Abschlüsse sind in der kumulierten Schlussrechnung abgesetzt; sie wurden nicht nochmals überwiesen.

Die drei Projektarbeitsmappen enthalten die Belegbeträge, die Zahlungsliste des Projektkontos und die ursprünglichen Vermietungsannahmen. Bitte trennen Sie bei der Jahresarbeit die Investitionsabrechnung von den laufenden Ergebnissen der Vermietung. Das Betriebskonto für die Mietzahlungen, Nebenkosten und Annuitäten wird in der laufenden Buchhaltung geführt und gehört nicht zum Projektkonto.

Die Notar- und Gerichtskosten liegen mit den Kostenberechnungen und den jeweiligen Zahlungen vor. Bitte berücksichtigen Sie bei der Belegzuordnung die gesondert ausgewiesenen durchlaufenden Archivkosten und die vom Grundstück getrennten Finanzierungsleistungen. Die beigefügte Architektenrechnung kann nun ebenfalls dem Zahlbeleg zugeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung LE-PV-28-099 – PV-Anlage Lieferung und Montage

Rechnung Nr. LE-PV-28-099. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.08.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Solarmodule mit je 450 W Nennleistung einschließlich Unterkonstruktion	80,00	Modul	400,00	32.000,00
Wechselrichter, Anlagenverkabelung und Inbetriebnahme	1,00	Anlage	13.000,00	13.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	45.000,00
Umsatzsteuer 0,00 %	0,00
Rechnungsbetrag brutto	45.000,00

Umsatzsteuersatz 0 % gemäß Paragraf 12 Absatz 3 Nummern 1 und 4 UStG. Lieferung und Installation erfolgen an die Steinbogen Wohnen GmbH als Betreiberin der 36-kWp-Anlage auf dem Dach ihres Wohngebäudes mit acht Wohnungen. Gebäudeart und Betreiberstellung sind im Auftrag und in den Übergabeunterlagen dokumentiert. Die Leistung betrifft die PV-Anlage; allgemeine Elektroinstallation und Ladepunkte sind nicht in dieser Rechnung enthalten.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-PV-28-099 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-PV-28-099</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>PV-Anlage Lieferung und Montage. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-08-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-PV-28-099</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">80.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">32000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Solarmodule mit je 450 W Nennleistung einschließlich Unterkonstruktion</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">13000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wechselrichter, Anlagenverkabelung und Inbetriebnahme</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">13000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Wohnhof Am Steinbogen 18 · Kostenentwicklung

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

KG		Kostenbereich	Ausgang EUR	Abgerechnet EUR	Änderung EUR
100		Grundstück und Erwerbsnebenkosten	500,463.01	500,463.01	-
200		Hausanschlüsse	41,650.00	41,650.00	-
300		Baukonstruktion	1,654,100.00	1,672,545.00	18,445.00
400		Technische Anlagen	669,750.00	669,750.00	-
500		Außenanlagen	142,800.00	142,800.00	-
700		Planung, Versicherung, Gebühren	365,007.40	365,007.40	-
800		Finanzierung bis Ende 2028	90,000.00	90,000.00	-
Summe			3,463,770.41	3,482,215.41	18,445.00

Freigegebener Kostenrahmen	3,650,000.00
Noch verfügbar bis Kostenrahmen	167,784.59
Eigenkapital und Darlehen	3,700,000.00
Projektmittel nach Belegbeträgen	217,784.59

Stand 05.10.2033. Kostenfortschreibung einschließlich LPH 9.
Projektkosten und Zahlungen sind getrennt; keine AfA- oder Bilanzberechnung.
Umsatzsteuerbeträge werden für die Wohnvermietung nicht als Vorsteuer abgezogen.

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
KP-2026-118	100	2026-11-16	Kaufpreisfälligkeit Grundstück	450,000.00	-	450,000.00
GRE-26-816	100	2026-11-20	Grunderwerbsteuerbescheid	22,500.00	-	22,500.00
NF-26-118-139	100	2026-12-22	Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschild	6,598.50	1,252.01	7,850.51
GB-26-778	100	2026-12-23	Gerichtskostenrechnung Grundbuch	4,047.50	-	4,047.50
WG-26-104	100	2026-11-04	Grundstücksvermittlung	13,500.00	2,565.00	16,065.00
BA-27-328-K	700	2027-09-21	Kostenbescheid zum Bauantrag	4,957.40	-	4,957.40
BV-27-180	700	2027-11-22	Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung	9,000.00	-	9,000.00
LB-27-010	800	2027-01-02	Vereinbartes Finanzierungsentgelt	10,000.00	-	10,000.00
LB-Z-2027	800	2027-12-31	Darlehenszinsen 2027	28,800.00	-	28,800.00
LB-Z-2028	800	2028-12-31	Darlehenszinsen 2028	51,200.00	-	51,200.00
KF-27-091	700	2027-09-24	Objektplanung LPH 1 bis 4	39,150.00	7,438.50	46,588.50
KF-27-116	700	2027-11-26	Objektplanung LPH 5 bis 7	56,550.00	10,744.50	67,294.50
KF-28-104	700	2028-10-20	Objektplanung LPH 8	46,400.00	8,816.00	55,216.00
KF-33-092	700	2033-09-26	Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung	2,900.00	551.00	3,451.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
PT-27-092	700	2027-09-27	TGA Planung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
PT-28-104	700	2028-10-22	TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss	35,000.00	6,650.00	41,650.00
BW-28-093	700	2028-09-22	Tragwerksplanung	40,000.00	7,600.00	47,600.00
LP-28-094	700	2028-09-24	Vermessungsleistungen	15,000.00	2,850.00	17,850.00
BP-27-018	700	2027-01-18	Baugrunduntersuchung	12,000.00	2,280.00	14,280.00
EP-28-096	700	2028-09-25	Energieplanung und Fertigstellungsnachweis	10,000.00	1,900.00	11,900.00
RW-28-095	700	2028-09-25	Brandschutzplanung	8,000.00	1,520.00	9,520.00
SH-28-021	300	2028-02-15	Rohbau 1. Abschlag	200,000.00	38,000.00	238,000.00
SH-28-046	300	2028-04-15	Rohbau 2. Abschlag	300,000.00	57,000.00	357,000.00
SH-28-093	300	2028-09-30	Rohbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
DG-28-052	300	2028-05-15	Gebäudehülle Abschlag	220,000.00	41,800.00	261,800.00
DG-28-098	300	2028-09-30	Gebäudehülle Schlussrechnung	220,000.00	41,800.00	261,800.00
WH-28-063	400	2028-06-15	Heizung Lüftung Sanitär Abschlag	180,000.00	34,200.00	214,200.00
WH-28-094	400	2028-09-30	Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung	180,000.00	34,200.00	214,200.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
LE-28-061	400	2028-06-01	Elektro Abschlag	75,000.00	14,250.00	89,250.00
LE-28-098	400	2028-09-30	Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
IA-28-074	300	2028-07-15	Innenausbau Abschlag	150,000.00	28,500.00	178,500.00
IA-28-095	300	2028-09-30	Innenausbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
HA-28-093	400	2028-09-30	Aufzugsanlage	60,000.00	11,400.00	71,400.00
GG-28-115	500	2028-11-15	Außenanlagen und Entwässerung	120,000.00	22,800.00	142,800.00
LN-28-081	200	2028-08-20	Hausanschlüsse	35,000.00	6,650.00	41,650.00
SH-28-N01	300	2028-03-05	Nachtrag Drän- und Filterpackung	18,000.00	3,420.00	21,420.00
IA-G-28-017	300	2028-10-15	Rechnungskorrektur zu IA-28-095	(2,500.00)	(475.00)	(2,975.00)
LE-PV-28-099	400	2028-09-30	PV-Anlage Lieferung und Montage	45,000.00	-	45,000.00
Summe				3,026,103.40	456,112.01	3,482,215.41

Quelle: Einzelbelege 70–106 und 119; Rechnungskorrekturen sind negativ.

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
KP-2026-118	2026-11-16	450,000.00	450,000.00	-
GRE-26-816	2026-11-20	22,500.00	22,500.00	-
NF-26-118-139	2026-12-22	7,850.51	7,850.51	-
GB-26-778	2026-12-23	4,047.50	4,047.50	-
WG-26-104	2026-11-04	16,065.00	16,065.00	-
BA-27-328-K	2027-09-21	4,957.40	4,957.40	-
BV-27-180	2027-11-22	9,000.00	9,000.00	-
LB-27-010	2027-01-02	10,000.00	10,000.00	-
LB-Z-2027	2027-12-31	28,800.00	28,800.00	-
LB-Z-2028	2028-12-31	-	-	-
KF-27-091	2027-09-24	46,588.50	46,588.50	-
KF-27-116	2027-11-26	67,294.50	67,294.50	-
KF-28-104	2028-10-20	-	-	-
KF-33-092	2033-09-26	-	-	-

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
PT-27-092	2027-09-27	35,700.00	35,700.00	-
PT-28-104	2028-10-22	-	-	-
BW-28-093	2028-09-22	47,600.00	-	47,600.00
LP-28-094	2028-09-24	17,850.00	-	17,850.00
BP-27-018	2027-01-18	14,280.00	14,280.00	-
EP-28-096	2028-09-25	11,900.00	-	11,900.00
RW-28-095	2028-09-25	9,520.00	-	9,520.00
SH-28-021	2028-02-15	238,000.00	238,000.00	-
SH-28-046	2028-04-15	357,000.00	357,000.00	-
SH-28-093	2028-09-30	178,500.00	-	178,500.00
DG-28-052	2028-05-15	261,800.00	261,800.00	-
DG-28-098	2028-09-30	261,800.00	-	261,800.00
WH-28-063	2028-06-15	214,200.00	214,200.00	-
WH-28-094	2028-09-30	214,200.00	-	214,200.00

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
LE-28-061	2028-06-01	89,250.00	178,500.00	(89,250.00)
LE-28-098	2028-09-30	35,700.00	-	35,700.00
IA-28-074	2028-07-15	178,500.00	178,500.00	-
IA-28-095	2028-09-30	178,500.00	-	178,500.00
HA-28-093	2028-09-30	71,400.00	-	71,400.00
GG-28-115	2028-11-15	-	-	-
LN-28-081	2028-08-20	41,650.00	41,650.00	-
SH-28-N01	2028-03-05	21,420.00	21,420.00	-
IA-G-28-017	2028-10-15	-	-	-
LE-PV-28-099	2028-09-30	45,000.00	-	45,000.00
Summe		3,190,873.41	2,208,153.41	982,720.00

Positiver Saldo: noch nicht gezahlt; negativer Saldo: Zahlbetrag über Belegbetrag.

Die Liste ersetzt keine fachliche Rechnungsfreigabe. Spätere Belege werden durch den Stichtag ausgeschlossen.

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
KP-2026-118	100	2026-11-16	Kaufpreisfälligkeit Grundstück	450,000.00	-	450,000.00
GRE-26-816	100	2026-11-20	Grunderwerbsteuerbescheid	22,500.00	-	22,500.00
NF-26-118-139	100	2026-12-22	Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschild	6,598.50	1,252.01	7,850.51
GB-26-778	100	2026-12-23	Gerichtskostenrechnung Grundbuch	4,047.50	-	4,047.50
WG-26-104	100	2026-11-04	Grundstücksvermittlung	13,500.00	2,565.00	16,065.00
BA-27-328-K	700	2027-09-21	Kostenbescheid zum Bauantrag	4,957.40	-	4,957.40
BV-27-180	700	2027-11-22	Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung	9,000.00	-	9,000.00
LB-27-010	800	2027-01-02	Vereinbartes Finanzierungsentgelt	10,000.00	-	10,000.00
LB-Z-2027	800	2027-12-31	Darlehenszinsen 2027	28,800.00	-	28,800.00
LB-Z-2028	800	2028-12-31	Darlehenszinsen 2028	51,200.00	-	51,200.00
KF-27-091	700	2027-09-24	Objektplanung LPH 1 bis 4	39,150.00	7,438.50	46,588.50
KF-27-116	700	2027-11-26	Objektplanung LPH 5 bis 7	56,550.00	10,744.50	67,294.50
KF-28-104	700	2028-10-20	Objektplanung LPH 8	46,400.00	8,816.00	55,216.00
KF-33-092	700	2033-09-26	Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung	2,900.00	551.00	3,451.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
PT-27-092	700	2027-09-27	TGA Planung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
PT-28-104	700	2028-10-22	TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss	35,000.00	6,650.00	41,650.00
BW-28-093	700	2028-09-22	Tragwerksplanung	40,000.00	7,600.00	47,600.00
LP-28-094	700	2028-09-24	Vermessungsleistungen	15,000.00	2,850.00	17,850.00
BP-27-018	700	2027-01-18	Baugrunduntersuchung	12,000.00	2,280.00	14,280.00
EP-28-096	700	2028-09-25	Energieplanung und Fertigstellungsnachweis	10,000.00	1,900.00	11,900.00
RW-28-095	700	2028-09-25	Brandschutzplanung	8,000.00	1,520.00	9,520.00
SH-28-021	300	2028-02-15	Rohbau 1. Abschlag	200,000.00	38,000.00	238,000.00
SH-28-046	300	2028-04-15	Rohbau 2. Abschlag	300,000.00	57,000.00	357,000.00
SH-28-093	300	2028-09-30	Rohbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
DG-28-052	300	2028-05-15	Gebäudehülle Abschlag	220,000.00	41,800.00	261,800.00
DG-28-098	300	2028-09-30	Gebäudehülle Schlussrechnung	220,000.00	41,800.00	261,800.00
WH-28-063	400	2028-06-15	Heizung Lüftung Sanitär Abschlag	180,000.00	34,200.00	214,200.00
WH-28-094	400	2028-09-30	Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung	180,000.00	34,200.00	214,200.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
LE-28-061	400	2028-06-01	Elektro Abschlag	75,000.00	14,250.00	89,250.00
LE-28-098	400	2028-09-30	Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
IA-28-074	300	2028-07-15	Innenausbau Abschlag	150,000.00	28,500.00	178,500.00
IA-28-095	300	2028-09-30	Innenausbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
HA-28-093	400	2028-09-30	Aufzugsanlage	60,000.00	11,400.00	71,400.00
GG-28-115	500	2028-11-15	Außenanlagen und Entwässerung	120,000.00	22,800.00	142,800.00
LN-28-081	200	2028-08-20	Hausanschlüsse	35,000.00	6,650.00	41,650.00
SH-28-N01	300	2028-03-05	Nachtrag Drän- und Filterpackung	18,000.00	3,420.00	21,420.00
IA-G-28-017	300	2028-10-15	Rechnungskorrektur zu IA-28-095	(2,500.00)	(475.00)	(2,975.00)
LE-PV-28-099	400	2028-09-30	PV-Anlage Lieferung und Montage	45,000.00	-	45,000.00
Summe				3,026,103.40	456,112.01	3,482,215.41

Quelle: Einzelbelege 70–106 und 119; Rechnungskorrekturen sind negativ.

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2026-11-15	EK-20261115	EK	-	800,000.00	800,000.00
2026-11-18	SW-74-20261118	WG-26-104	16,065.00	-	783,935.00
2026-11-27	SW-70-20261127	KP-2026-118	450,000.00	-	333,935.00
2026-12-08	SW-71-20261208	GRE-26-816	22,500.00	-	311,435.00
2027-01-01	DL-20270101	Darlehen	-	400,000.00	711,435.00
2027-01-05	SW-72-20270105	NF-26-118-139	7,850.51	-	703,584.49
2027-01-06	SW-73-20270106	GB-26-778	4,047.50	-	699,536.99
2027-01-15	EK-20270115	EK	-	700,000.00	1,399,536.99
2027-01-16	SW-77-20270116	LB-27-010	10,000.00	-	1,389,536.99
2027-02-01	SW-88-20270201	BP-27-018	14,280.00	-	1,375,256.99
2027-07-01	DL-20270701	Darlehen	-	400,000.00	1,775,256.99
2027-10-01	DL-20271001	Darlehen	-	800,000.00	2,575,256.99
2027-10-05	SW-75-20271005	BA-27-328-K	4,957.40	-	2,570,299.59
2027-10-08	SW-80-20271008	KF-27-091	46,588.50	-	2,523,711.09

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2027-10-11	SW-84-20271011	PT-27-092	35,700.00	-	2,488,011.09
2027-12-06	SW-76-20271206	BV-27-180	9,000.00	-	2,479,011.09
2027-12-10	SW-81-20271210	KF-27-116	67,294.50	-	2,411,716.59
2027-12-31	SW-78-20271231	LB-Z-2027	28,800.00	-	2,382,916.59
2028-01-15	EK-20280115	EK	-	600,000.00	2,982,916.59
2028-02-29	SW-91-20280229	SH-28-021	238,000.00	-	2,744,916.59
2028-03-19	SW-105-20280319	SH-28-N01	21,420.00	-	2,723,496.59
2028-04-29	SW-92-20280429	SH-28-046	357,000.00	-	2,366,496.59
2028-05-29	SW-94-20280529	DG-28-052	261,800.00	-	2,104,696.59
2028-06-15	SW-98-20280615	LE-28-061	89,250.00	-	2,015,446.59
2028-06-19	SW-98-20280619	LE-28-061	89,250.00	-	1,926,196.59
2028-06-29	SW-96-20280629	WH-28-063	214,200.00	-	1,711,996.59
2028-07-29	SW-100-20280729	IA-28-074	178,500.00	-	1,533,496.59
2028-09-03	SW-104-20280903	LN-28-081	41,650.00	-	1,491,846.59

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2028-10-06	SW-86-20281006	BW-28-093	47,600.00	-	1,444,246.59
2028-10-08	SW-87-20281008	LP-28-094	17,850.00	-	1,426,396.59
2028-10-09	SW-89-20281009	EP-28-096	11,900.00	-	1,414,496.59
2028-10-09	SW-90-20281009	RW-28-095	9,520.00	-	1,404,976.59
2028-10-14	SW-101-20281014	IA-28-095	178,500.00	-	1,226,476.59
2028-10-14	SW-102-20281014	HA-28-093	71,400.00	-	1,155,076.59
2028-10-14	SW-119-20281014	LE-PV-28-099	45,000.00	-	1,110,076.59
2028-10-14	SW-93-20281014	SH-28-093	178,500.00	-	931,576.59
2028-10-14	SW-95-20281014	DG-28-098	261,800.00	-	669,776.59
2028-10-14	SW-97-20281014	WH-28-094	214,200.00	-	455,576.59
2028-10-14	SW-99-20281014	LE-28-098	35,700.00	-	419,876.59
2028-11-03	SW-82-20281103	KF-28-104	55,216.00	-	364,660.59
2028-11-05	SW-85-20281105	PT-28-104	41,650.00	-	323,010.59
2028-11-15	SW-106-20281115	IA-G-28-017	(2,975.00)	-	325,985.59

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2028-11-29	SW-103-20281129	GG-28-115	142,800.00	-	183,185.59
2028-12-15	LE-RET-20281215	LE-28-061	(89,250.00)	-	272,435.59
2028-12-31	SW-79-20281231	LB-Z-2028	51,200.00	-	221,235.59
2033-09-30	SW-83-20330930	KF-33-092	3,451.00	-	217,784.59

Quelle: vollständige Projektkontoauszüge 109–112; Erstattungen als negative Zahlungen.

Projektfinanzierung und Vermietungsannahmen

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Ansatz / Ergebnis	Wert	Grundlage
Projektkosten Ausgang	3,463,770.41	Kostenansätze aus Einzelbelegen; ohne Nachtrag/Korrektur
Nachtrag und Entgeltminderung	18,445.00	105 Rohbau / 106 Innenausbau
Projektkosten fortgeschrieben	3,482,215.41	Summe aus den beiden vorstehenden Ansätzen
Eigenkapital	2,100,000.00	108 Gesellschafterbeschluss
Darlehen	1,600,000.00	107 Darlehensvereinbarung
Finanzierungsmittel	3,700,000.00	Eigenkapital und Darlehen
Mittel nach Projektkosten	217,784.59	Finanzierungsmittel abzüglich Projektkosten
Sollzins p. a.	3.6%	107 Darlehensvereinbarung ab 2029
Anfängliche Tilgung p. a.	1.5%	107 Darlehensvereinbarung ab 2029
Annuität volles Jahr	81,600.00	Anfängliche Zinsen plus anfängliche Tilgung
Leerstand / Mietausfall	0.0%	Annahme; Anteil der möglichen Jahreskaltmiete
Nicht umlagefähige Kosten p. a.	18,000.00	108 Planannahme; keine bereits angefallenen Kosten
Miete volles Jahr vor Ausfall	102,000.00	Vermietung: Wohnungs- und Stellplatzkaltmieten
Miete nach Ausfall	102,000.00	Mögliche Miete mal vermieteter Anteil

Projektfinanzierung und Vermietungsannahmen

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Ansatz / Ergebnis	Wert	Grundlage
Ergebnis vor Finanzierung	84,000.00	Miete nach Ausfall abzüglich laufender Kosten
Jährlicher Schuldendienst	81,600.00	Annuität ab Januar 2029
Liquidität vor Ertragsteuern	2,400.00	Laufendes Ergebnis abzüglich Schuldendienst
Schuldendienstdeckung	1.03 x Ergebnis vor Finanzierung / Schuldendienst	

Planjahr 2029 bei ganzjähriger Vermietung. Keine Aussage zur zulässigen Miethöhe.
Keine Betriebs-/Heizkostenvorauszahlungen und keine Kautionen als Ertrag gerechnet.
AfA, Ertragsteuern und spätere Anschlussfinanzierung sind hier nicht modelliert.

Vermietung · volles Planjahr

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Wohnung	Wohnfläche m²	EUR je m²	Wohnung mtl.	Stellplatz mtl.	Jahresmiete
WE 01	68.00	13.50	918.00	50.00	11,616.00
WE 02	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 03	82.00	13.50	1,107.00	50.00	13,884.00
WE 04	68.00	13.50	918.00	50.00	11,616.00
WE 05	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 06	82.00	13.50	1,107.00	50.00	13,884.00
WE 07	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 08	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
Summe	600.00		8,100.00	400.00	102,000.00

Quelle: 108 Gesellschafterbeschluss und Vermietungsannahmen.
Die acht Stellplätze sind den acht Wohnungen zugeordnet.

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Jan-2029	1,600,000.00	6,800.00	4,800.00	2,000.00	1,598,000.00
Feb-2029	1,598,000.00	6,800.00	4,794.00	2,006.00	1,595,994.00
Mar-2029	1,595,994.00	6,800.00	4,787.98	2,012.02	1,593,981.98
Apr-2029	1,593,981.98	6,800.00	4,781.95	2,018.05	1,591,963.93
May-2029	1,591,963.93	6,800.00	4,775.89	2,024.11	1,589,939.82
Jun-2029	1,589,939.82	6,800.00	4,769.82	2,030.18	1,587,909.64
Jul-2029	1,587,909.64	6,800.00	4,763.73	2,036.27	1,585,873.37
Aug-2029	1,585,873.37	6,800.00	4,757.62	2,042.38	1,583,830.99
Sep-2029	1,583,830.99	6,800.00	4,751.49	2,048.51	1,581,782.48
Oct-2029	1,581,782.48	6,800.00	4,745.35	2,054.65	1,579,727.83
Nov-2029	1,579,727.83	6,800.00	4,739.18	2,060.82	1,577,667.01
Dec-2029	1,577,667.01	6,800.00	4,733.00	2,067.00	1,575,600.01
Jan-2030	1,575,600.01	6,800.00	4,726.80	2,073.20	1,573,526.81
Feb-2030	1,573,526.81	6,800.00	4,720.58	2,079.42	1,571,447.39

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Mar-2030	1,571,447.39	6,800.00	4,714.34	2,085.66	1,569,361.73
Apr-2030	1,569,361.73	6,800.00	4,708.09	2,091.91	1,567,269.82
May-2030	1,567,269.82	6,800.00	4,701.81	2,098.19	1,565,171.63
Jun-2030	1,565,171.63	6,800.00	4,695.51	2,104.49	1,563,067.14
Jul-2030	1,563,067.14	6,800.00	4,689.20	2,110.80	1,560,956.34
Aug-2030	1,560,956.34	6,800.00	4,682.87	2,117.13	1,558,839.21
Sep-2030	1,558,839.21	6,800.00	4,676.52	2,123.48	1,556,715.73
Oct-2030	1,556,715.73	6,800.00	4,670.15	2,129.85	1,554,585.88
Nov-2030	1,554,585.88	6,800.00	4,663.76	2,136.24	1,552,449.64
Dec-2030	1,552,449.64	6,800.00	4,657.35	2,142.65	1,550,306.99
Jan-2031	1,550,306.99	6,800.00	4,650.92	2,149.08	1,548,157.91
Feb-2031	1,548,157.91	6,800.00	4,644.47	2,155.53	1,546,002.38
Mar-2031	1,546,002.38	6,800.00	4,638.01	2,161.99	1,543,840.39
Apr-2031	1,543,840.39	6,800.00	4,631.52	2,168.48	1,541,671.91

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
May-2031	1,541,671.91	6,800.00	4,625.02	2,174.98	1,539,496.93
Jun-2031	1,539,496.93	6,800.00	4,618.49	2,181.51	1,537,315.42
Jul-2031	1,537,315.42	6,800.00	4,611.95	2,188.05	1,535,127.37
Aug-2031	1,535,127.37	6,800.00	4,605.38	2,194.62	1,532,932.75
Sep-2031	1,532,932.75	6,800.00	4,598.80	2,201.20	1,530,731.55
Oct-2031	1,530,731.55	6,800.00	4,592.19	2,207.81	1,528,523.74
Nov-2031	1,528,523.74	6,800.00	4,585.57	2,214.43	1,526,309.31
Dec-2031	1,526,309.31	6,800.00	4,578.93	2,221.07	1,524,088.24
Jan-2032	1,524,088.24	6,800.00	4,572.26	2,227.74	1,521,860.50
Feb-2032	1,521,860.50	6,800.00	4,565.58	2,234.42	1,519,626.08
Mar-2032	1,519,626.08	6,800.00	4,558.88	2,241.12	1,517,384.96
Apr-2032	1,517,384.96	6,800.00	4,552.15	2,247.85	1,515,137.11
May-2032	1,515,137.11	6,800.00	4,545.41	2,254.59	1,512,882.52
Jun-2032	1,512,882.52	6,800.00	4,538.65	2,261.35	1,510,621.17

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Jul-2032	1,510,621.17	6,800.00	4,531.86	2,268.14	1,508,353.03
Aug-2032	1,508,353.03	6,800.00	4,525.06	2,274.94	1,506,078.09
Sep-2032	1,506,078.09	6,800.00	4,518.23	2,281.77	1,503,796.32
Oct-2032	1,503,796.32	6,800.00	4,511.39	2,288.61	1,501,507.71
Nov-2032	1,501,507.71	6,800.00	4,504.52	2,295.48	1,499,212.23
Dec-2032	1,499,212.23	6,800.00	4,497.64	2,302.36	1,496,909.87
Jan-2033	1,496,909.87	6,800.00	4,490.73	2,309.27	1,494,600.60
Feb-2033	1,494,600.60	6,800.00	4,483.80	2,316.20	1,492,284.40
Mar-2033	1,492,284.40	6,800.00	4,476.85	2,323.15	1,489,961.25
Apr-2033	1,489,961.25	6,800.00	4,469.88	2,330.12	1,487,631.13
May-2033	1,487,631.13	6,800.00	4,462.89	2,337.11	1,485,294.02
Jun-2033	1,485,294.02	6,800.00	4,455.88	2,344.12	1,482,949.90
Jul-2033	1,482,949.90	6,800.00	4,448.85	2,351.15	1,480,598.75
Aug-2033	1,480,598.75	6,800.00	4,441.80	2,358.20	1,478,240.55

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Sep-2033	1,478,240.55	6,800.00	4,434.72	2,365.28	1,475,875.27
Oct-2033	1,475,875.27	6,800.00	4,427.63	2,372.37	1,473,502.90
Nov-2033	1,473,502.90	6,800.00	4,420.51	2,379.49	1,471,123.41
Dec-2033	1,471,123.41	6,800.00	4,413.37	2,386.63	1,468,736.78
Summe 60 Monate		408,000.00	276,736.78	131,263.22	1,468,736.78

Quelle: 107 Darlehensvereinbarung; gleichbleibende Monatsrate bei sinkender Restschuld.

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Lena und Paul Rehm
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 01, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 01

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Lena und Paul Rehm die Wohnung 01 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 68 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 01. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	918,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	122,40
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	61,20
Gesamtzahlung	1.151,60

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 2.754,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Lena und Paul Rehm. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Derya Aydin
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 02, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 02

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Derya Aydin die Wohnung 02 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG Mitte mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 02. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Derya Aydin. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Jonas und Eva Lenz
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 03, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 03

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Jonas und Eva Lenz die Wohnung 03 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 82 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 03. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.107,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	147,60
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	73,80
Gesamtzahlung	1.378,40

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.321,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Jonas und Eva Lenz. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Mika Petersen
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 04, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 04

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Mika Petersen die Wohnung 04 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 68 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 04. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	918,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	122,40
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	61,20
Gesamtzahlung	1.151,60

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 2.754,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Mika Petersen. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Sabine und Martin Hartung
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 05, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 05

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Sabine und Martin Hartung die Wohnung 05 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG Mitte mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 05. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Sabine und Martin Hartung. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Nora und David Klein
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 06, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 06

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Nora und David Klein die Wohnung 06 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 82 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 06. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.107,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	147,60
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	73,80
Gesamtzahlung	1.378,40

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.321,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Nora und David Klein. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Tessa Brandt
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 07, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 07

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Tessa Brandt die Wohnung 07 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 2.OG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 07. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Tessa Brandt. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Leon und Amira Winter
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 08, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 08

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Leon und Amira Winter die Wohnung 08 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 2.OG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 08. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Leon und Amira Winter. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Lena und Paul Rehm
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 01, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 01

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 01 (EG links, 68 m²) an Lena und Paul Rehm übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-01; Stand 15,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-01; Stand 1.3 m³
Warmwasser	SW-W-01; Stand 0.7 m³
Wärmezähler	SW-H-01; Stand 0.043 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 01 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Lena und Paul Rehm. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Derya Aydin
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 02, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 02

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 02 (EG Mitte, 75 m²) an Derya Aydin übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-02; Stand 18,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-02; Stand 1.4 m³
Warmwasser	SW-W-02; Stand 0.8 m³
Wärmezähler	SW-H-02; Stand 0.046 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 02 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Derya Aydin. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Jonas und Eva Lenz
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 03, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 03

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 03 (EG rechts, 82 m²) an Jonas und Eva Lenz übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-03; Stand 21,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-03; Stand 1.5 m³
Warmwasser	SW-W-03; Stand 0.9 m³
Wärmezähler	SW-H-03; Stand 0.049 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 03 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Jonas und Eva Lenz. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Mika Petersen
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 04, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 04

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 04 (1.OG links, 68 m²) an Mika Petersen übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-04; Stand 24,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-04; Stand 1.6 m³
Warmwasser	SW-W-04; Stand 1.0 m³
Wärmezähler	SW-H-04; Stand 0.052 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 04 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Mika Petersen. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Sabine und Martin Hartung
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 05, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 05

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 05 (1.OG Mitte, 75 m²) an Sabine und Martin Hartung übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-05; Stand 27,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-05; Stand 1.7 m³
Warmwasser	SW-W-05; Stand 1.1 m³
Wärmezähler	SW-H-05; Stand 0.055 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 05 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Sabine und Martin Hartung. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Nora und David Klein
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 06, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 06

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 06 (1.OG rechts, 82 m²) an Nora und David Klein übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-06; Stand 30,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-06; Stand 1.8 m³
Warmwasser	SW-W-06; Stand 1.2 m³
Wärmezähler	SW-H-06; Stand 0.058 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 06 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Nora und David Klein. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Tessa Brandt
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 07, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 07

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 07 (2.OG links, 75 m²) an Tessa Brandt übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Der vorhandene Eichenbelag wurde gezeigt; die Vermieterin klärt dessen abweichende Qualität mit dem Ausbauunternehmen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-07; Stand 33,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-07; Stand 1.9 m³
Warmwasser	SW-W-07; Stand 1.3 m³
Wärmezähler	SW-H-07; Stand 0.061 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 07 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Tessa Brandt. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Leon und Amira Winter
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 08, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 08

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 08 (2.OG rechts, 75 m²) an Leon und Amira Winter übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-08; Stand 36,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-08; Stand 2.0 m³
Warmwasser	SW-W-08; Stand 1.4 m³
Wärmezähler	SW-H-08; Stand 0.064 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 08 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Leon und Amira Winter. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 05.09.2028

Mängelbürgschaft für das Rohbaulos

Bürgschaftsurkunde LB-SW-2028-325. Auf Antrag der Steinwerk Hochbau GmbH übernehmen wir gegenüber der Steinbogen Wohnen GmbH eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zu 32.500,00 EUR zur Sicherung der nach dem Bauvertrag vom 12.11.2027 gesicherten Mängelansprüche für das Rohbaulos des Wohnhauses Wohnhof Am Steinbogen 18.

Die Bürgschaft ist keine Bürgschaft auf erstes Anfordern. Der Umfang richtet sich nach dem gesicherten Vertrag und den bestehenden gesicherten Ansprüchen. Die Einrede der Vorausklage wird ausgeschlossen. Andere gesetzliche Einwendungen und Einreden bleiben im rechtlich zulässigen Umfang erhalten.

Die Urkunde ist nach Wegfall des Sicherungszwecks an uns zurückzugeben. Ein festes automatisches Erlöschensdatum, das bestehende gesicherte Ansprüche unabhängig von ihrem Stand abschneiden würde, wird nicht vereinbart. Eine doppelte Barsicherheit ist nach Mitteilung der Vertragsparteien nicht bestellt.

Diese Urkunde betrifft ausschließlich die Mängelsicherheit des Rohbauvertrags. Sie ist weder eine Finanzierungszusage für die Bauherrin noch eine Sicherheit für die anderen sechs Bauverträge. Die Bürgschaft wird durch unsere zeichnungsberechtigten Mitarbeitenden ausgefertigt.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 15.10.2028 · SW-HI-26-08

Vereinbarung zum Bodenbelag der Wohnung 07

Die Steinbogen Wohnen GmbH und Innenraum Ausbau GmbH einigen sich nach Bemusterung des eingebauten Belags darauf, dass dieser in Wohnung 07 verbleibt. Die Abweichung von der ursprünglich vereinbarten Eichenqualität wird durch eine Herabsetzung der Vergütung um 2.500,00 EUR netto zuzüglich 475,00 EUR Umsatzsteuer ausgeglichen.

Innenraum Ausbau erteilt eine entsprechende Rechnungskorrektur über insgesamt 2.975,00 EUR und erstattet den Betrag auf das Projektkonto der Bauherrin. Die Rechnungskorrektur bezeichnet die betroffene Schlussrechnung und den Leistungsbezug. Bereits geleistete Zahlungen werden nicht als neuer Bauaufwand gebucht.

Mit der Vereinbarung wird nur die bezeichnete Materialabweichung abgegolten. Ansprüche wegen anderer Mängel, etwa fehlerhafter Verlegung oder später erkennbarer Schäden, werden nicht pauschal ausgeschlossen. Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben bestehen.

Die Mietpartei der Wohnung 07 wurde über das verbleibende Material informiert. Der Mietvertrag wird dadurch nicht einseitig geändert. Für die Bauherrin: gez. Maren Birk. Für Innenraum Ausbau: gez. Jan Merz.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht
Markt 3, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 22.09.2028 · SW-HI-26-08

Mitteilung über die Fertigstellung und vorgesehene Nutzung

Wir teilen mit, dass die genehmigten Baumaßnahmen am Achtfamilienhaus abgeschlossen sind. Die Nutzung der acht Wohnungen ist ab 01.10.2028 vorgesehen. Der freigegebene Revisionsstand, die Bestätigungen der verantwortlichen Fachleute und die gemäß Nebenbestimmungen geforderten Unterlagen werden mit dem zugeordneten Verwaltungsvorgang eingereicht.

Die bauliche Ausführung umfasst die genehmigten acht Wohnungen, die barrierefreien Erschließungswege einschließlich Aufzug sowie die vorgesehenen Außenanlagen. Der barrierefreie Pkw-Stellplatz ist gekennzeichnet. Spiel- und Fahrradflächen sind hergestellt. Die elektrische Vorverkabelung aller acht Pkw-Stellplätze und die beiden Ladepunkte sind dokumentiert.

Die technischen Anlagen sind in Betrieb genommen und der Verwaltung übergeben. Die erforderliche Aufzugsprüfung vor Inbetriebnahme ist dokumentiert. Die laufenden Betreiberpflichten bleiben unabhängig von dieser Mitteilung bestehen.

Die Mitteilung enthält keine Erklärung der Bauaufsicht, dass sämtliche Ausführungsdetails von ihr geprüft oder abgenommen worden seien. Bitte ordnen Sie die Unterlagen dem genehmigten Vorhaben zu und teilen Sie uns mit, falls aus dem Verwaltungsvorgang noch konkret bezeichnete Unterlagen fehlen.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 03.11.2026

Grundstückskaufvertrag UVZ 118 2026

Verhandelt zu Hildesheim am 3. November 2026 vor mir, Dr. Carla Fink, Notarin mit dem Amtssitz Hildesheim. Die nachfolgende Niederschrift wird in Urschrift aufgenommen. Die Beteiligten sind der Notarin aus den vorgelegten gültigen Lichtbildausweisen bekannt; die Vertretungsbefugnisse wurden anhand der vorgelegten Registerunterlagen festgestellt.

1 Erschienene und Vertretung

Es erscheinen Herr Nils Kamm, handelnd als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH mit Sitz in Hildesheim, geschäftsansässig Grundstückshof 31, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, und Frau Maren Birk, handelnd als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH mit Sitz in Hildesheim, geschäftsansässig Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Käuferin. Beide Gesellschaften handeln im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Erschienenen erklären, dass die für diesen Erwerb erforderlichen gesellschaftsinternen Zustimmungen vorliegen.

2 Grundstück und Kaufgegenstand

Die Verkäuferin ist im nachstehend bezeichneten Grundbuch als alleinige Eigentümerin eingetragen: Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Bestandsverzeichnis Nummer 1, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Notarin hat das Grundbuch am 3. November 2026 elektronisch eingesehen. Abteilung II und Abteilung III enthalten keine Eintragungen. Offene Eintragungsanträge wurden bei der Einsicht nicht mitgeteilt. Die Verkäuferin erklärt, seitdem keine Verfügungen über das Grundstück getroffen zu haben.

Die Verkäuferin verkauft dieses Grundstück mit allen wesentlichen Bestandteilen und dem ihr gehörenden Zubehör an die Käuferin zu Alleineigentum. Das Grundstück ist unbebaut und unvermietet. Bewegliche Gegenstände werden nicht gesondert verkauft. Die Käuferin plant den Neubau eines Wohngebäudes mit acht Mietwohnungen. Die Verkäuferin übernimmt weder Planungs- noch Bauleistungen und hat keinen Einfluss auf deren spätere Beauftragung.

3 Kaufpreis und Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis beträgt 450.000,00 EUR, in Worten vierhundertfünfzigtausend Euro. Die Parteien vereinbaren keine Option zur Umsatzsteuer. Der Kaufpreis ist ohne Abzug binnen vierzehn Kalendertagen nach Zugang der schriftlichen Fälligkeitsmitteilung der Notarin zu zahlen, frühestens am 30. November 2026; eine frühere Zahlung nach Zugang der Mitteilung ist gestattet. Die Käuferin zahlt unmittelbar auf das auf die Verkäuferin lautende Erwerbskonto bei der Leinebogen Projektbank AG, bankinterne Kontokennung LQ-ERWERB-01. Die dem Käufer bereits übergebene Zahlungsanweisung der Verkäuferin ist vor Zahlungsfreigabe anhand der bekannten Ansprechpartnerin der Bank abzugleichen. Ein Notaranderkonto wird nicht eingerichtet.

Die Notarin soll die Fälligkeit erst mitteilen, wenn die Vormerkung zugunsten der Käuferin im vereinbarten lastenfreien Rang eingetragen ist und das Zeugnis der zuständigen Gemeinde über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts vorliegt. Die Käuferin benötigt keine Finanzierungsgrundschuld vor Eigentumsumschreibung. Weitere Genehmigungen oder die Ablösung von Verkäufergrundpfandrechten sind nach den Erklärungen und Unterlagen der Beteiligten nicht erforderlich. Ergibt sich bei der Abwicklung ein entgegenstehendes Hindernis, wird die Fälligkeit bis zu dessen Beseitigung nicht mitgeteilt.

Die Käuferin weist die unbare Zahlung durch Kontoauszug nach; die Verkäuferin bestätigt den vollständigen Eingang. Die Notarin hat über die gesetzlichen Beschränkungen der Gegenleistung beim Immobilienerwerb und die erforderlichen Nachweise belehrt. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine werden nicht zur Erfüllung verwendet. Die Käuferin darf Zahlungen nur auf eine auf die Verkäuferin lautende, verifizierte Bankverbindung leisten.

4 Besitz Nutzen Lasten und Erschließung

Besitz, Nutzungen, Gefahr und Verkehrssicherungspflichten gehen am Tag nach vollständigem Kaufpreiseingang auf die Käuferin über. Die Verkäuferin übergibt das Grundstück geräumt und frei von schuldrechtlichen Nutzungsrechten Dritter. Bis zum Übergang trägt sie die laufenden öffentlichen und privaten Lasten. Die Parteien erstellen ein Übergabeprotokoll; ein vorgreiflicher Zutritt zu Vermessungs- und Untersuchungszwecken bedarf ihrer gesonderten Abstimmung.

Die Verkäuferin trägt Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge für Anlagen, deren beitragspflichtige Herstellung oder Verbesserung bei Vertragsschluss abgeschlossen ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Bescheiderteilung. Für später begonnene oder abgeschlossene Maßnahmen trägt die Käuferin die auf das Grundstück entfallenden Beiträge. Hausanschlüsse für das Neubauvorhaben und von der Käuferin beauftragte Grundstücksarbeiten gehen zu ihren Lasten. Eine Zusage bestimmter Anschlusskosten oder der sofortigen Bebaubarkeit wird nicht erteilt.

5 Beschaffenheit Rechtsmängel und Verantwortung

Die Käuferin kennt das Grundstück aus Besichtigung und den ihr übergebenen Unterlagen. Die Verkäuferin erklärt, dass ihr keine Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen, Kampfmittelbelastungen, unterirdischen Anlagen oder außerhalb des Grundbuchs begründeten Rechte Dritter bekannt sind. Sie hat das Grundstück nicht selbst gewerblich genutzt. Diese Wissenserklärung ersetzt keine Bodenuntersuchung und ist keine Garantie für eine bestimmte Gründungsart oder Tragfähigkeit.

Die Verkäuferin schuldet die Übertragung frei von eingetragenen und von ihr begründeten nicht übernommenen Rechten Dritter. Sachmängelrechte der Käuferin werden im Übrigen ausgeschlossen; dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen, ausdrücklich übernommener Garantie, vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Für Rechtsmängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Käuferin trägt das Risiko der baurechtlichen Zulässigkeit ihres Vorhabens, soweit die Verkäuferin keine unrichtigen Angaben vorsätzlich oder arglistig macht.

Die Notarin hat darauf hingewiesen, dass sie keine technische Baugrund- oder Wirtschaftlichkeitsprüfung vornimmt und der beabsichtigte Neubau einer eigenen öffentlich-rechtlichen Prüfung bedarf. Die Flächenangabe wird dem Bestandsverzeichnis entnommen; Kaufgegenstand ist das Grundstück innerhalb seiner rechtlichen Grenzen. Eine Teilflächenveräußerung oder Grundstücksteilung ist nicht vereinbart.

6 Auflassung Vormerkung und Grundbuchvollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum an dem in Ziffer 2 bezeichneten Grundstück auf die Steinbogen Wohnen GmbH übergeht. Sie erklären die Auflassung unbedingt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferin beantragt zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zugunsten der Käuferin an rangbereiter Stelle. Die Käuferin bewilligt deren Löschung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine zwischenzeitlichen Eintragungen ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben.

Die Notarin soll den Antrag auf Eigentumsumschreibung erst einreichen, wenn der vollständige Kaufpreiseingang unbar nachgewiesen ist und die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. Bis dahin darf sie keine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift herausgeben, die ohne diese Vollzugssperre die Eigentumsumschreibung ermöglicht. Die Erschienenen bevollmächtigen die Notarin und ihre amtliche Vertretung, die zur vereinbarten Abwicklung erforderlichen Anträge getrennt oder beschränkt zu stellen und zu berichtigen, soweit dadurch der wirtschaftliche Vertragsinhalt nicht verändert wird.

7 Vollzugsauftrag Kosten und Ausfertigungen

Die Notarin wird mit der Anforderung und Prüfung des kommunalen Negativzeugnisses, der Überwachung der Fälligkeitsvoraussetzungen, der Fälligkeitsmitteilung und dem vertragsgemäßen Grundbuchvollzug einschließlich elektronisch strukturierter Antragsdaten beauftragt. Die Erwerberin trägt die Kosten dieser Urkunde, ihres Vollzugs, der Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Jede Partei trägt die Kosten einer von ihr gesondert beauftragten Beratung selbst. Kosten für die Löschung von Verkäuferbelastungen fallen nach dem festgestellten Grundbuchstand nicht an.

Die Beteiligten bestätigen, dass keine Nebenabreden über zusätzliche Kaufpreisbestandteile oder eine Bindung an bestimmte Bauunternehmen bestehen. Der Maklervertrag der Käuferin mit Wohnfeld Grundstücke GmbH ist nicht Gegenstand einer eigenen Vergütungszusage in dieser Urkunde. Die Notarin hat über die gesamtschuldnerische Außenhaftung für Steuern und Kosten sowie darüber belehrt, dass der Eigentumserwerb erst durch Eintragung eintritt.

Die Notarin belehrt über die rechtliche Tragweite der Vormerkung, des Lastenübergangs und der Auflassung. Änderungen und Ergänzungen dieses Kaufvertrags bedürfen der gesetzlich vorgesehenen Form. Eine unwirksame Einzelregelung lässt den Vertrag nur soweit bestehen, wie dies dem Gesetz und dem übereinstimmenden Parteiwillen entspricht; eine automatische Ersetzung durch eine beliebige wirtschaftlich ähnliche Regelung wird nicht vereinbart.

8 Abschluss der Niederschrift

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen von der Notarin vollständig vorgelesen, von ihnen genehmigt und sodann eigenhändig unterschrieben. Gez. Nils Kamm für die Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH. Gez. Maren Birk für die Steinbogen Wohnen GmbH. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin.

Ausfertigungs- und Versandvermerk der Geschäftsstelle: Die für die Beteiligten, Behörden und den Vollzug angeforderten S/W-Ausfertigungen und Abschriften einschließlich der maßgeblichen Vollzugsmitteilungen ergeben insgesamt 60 abgegebene Seiten. Die Urschrift verbleibt in der notariellen Verwahrung; die elektronische Fassung wird in der elektronischen Urkundensammlung verwahrt. Der Urkundsinhalt wird mit diesem Versandvermerk nicht geändert.

Dr. Carla Fink, Notarin · Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift bestätigt


Anlagen: keine

Ausführungsdetails Eingang und Sanitärschacht

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung


1 Eingangsschwelle AP02 1 zu 10

Ausführungsstand 21.08.2027 | Freigabe Objektplanung und Fachplanerkoordination
Maße vor Ort prüfen. Produktbezogene Werkplanung bleibt vor Bestellung abzugleichen.

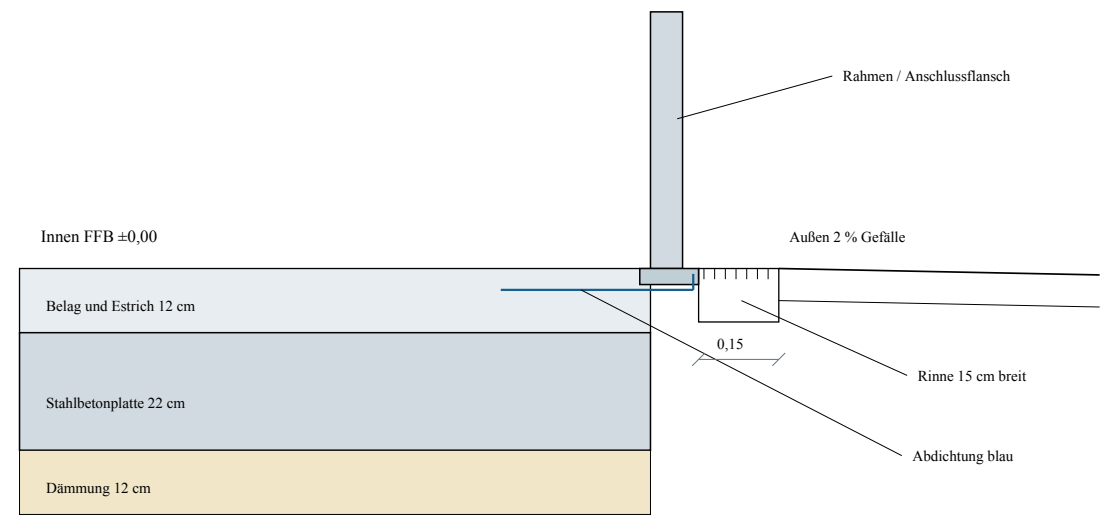

Schwelle ohne Höhenversatz; Türöffnung lichte Breite 0,90 m.
Entwässerungsrinne unmittelbar vor dem Rahmen, an Entwässerung anschließen.
Abdichtung mit geeignetem Anschlussflansch durchgehend anschließen.
Die Türfirma und Abdichtungsfirma stimmen das konkrete System vor Fertigung ab.
Keine nachträgliche Schwellenaufkantung ohne neue Freigabe.

2 Deckenöffnung AP03 1 zu 10

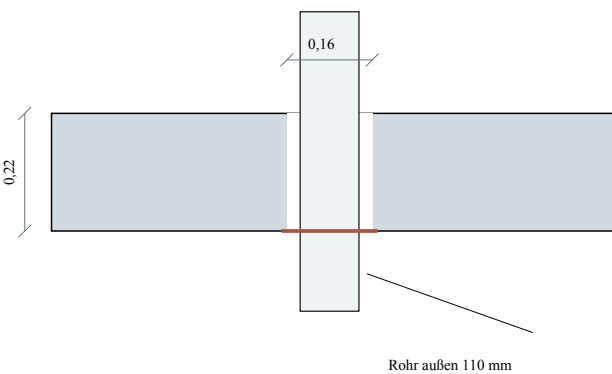

Öffnung 160 x 160 mm im Sanitärschacht.
Lage nach freigegebener Aussparungsliste.
Keine zusätzliche Bohrung im Auflagerbereich.
Abschottung passend zu Bauteil und Rohrsystem.
Eignung und Einbau nach Systemnachweis.
Ausführung vor Verschluss fotografisch erfassen.
Keine Vergrößerung ohne Tragwerksfreigabe.

Projektablage Wohnhof Am Steinbogen

Planregister · gespeicherte Ansicht vom 24.09.2027 16:42

Nora Feld · Ausführung

24.09. 16:42

LP01 / GP01 / GP02 / SP01: koordinierter Stand nach Genehmigung. BF01 und TE01 gehören zum Anlagenverzeichnis. Ausgabe an die ausführenden Firmen über die Vergabeunterlagen.

Detailplanung AP02

21.08. 14:18

Schwellenanschluss und Deckendurchbruch: zur Ausführung freigegeben. Bauteilmaße vor Ort kontrollieren. Anschluss und Durchdringung vor dem Verdecken dokumentieren.

Planregister zur Vergabe

24.09. 16:35

Die Abgabe 24.09.2027 umfasst den beschriebenen Ausführungsstand. Frühere Koordinationsfassungen bleiben im Archiv. Ein geänderter Plan ersetzt keinen erforderlichen Nachtragsauftrag.

Maren Birk · Versand

24.09. 16:39

Vergabeunterlagen können mit diesem Register versandt werden. Vertragsunterschriften erfolgen durch die Geschäftsführung. Technische Rückfragen bitte gesammelt über Frau Feld.

SW-HI-26-08 · Projektarchiv Steinbogen Wohnen

Baustelle Wohnhof Am Steinbogen

Gespeicherter Gesprächsverlauf · 02.02.2028

Timo Wendt

02.02. 08:17

Im südöstlichen Bereich tritt Wasser in die feine Sandschicht. Wir lassen diese Ecke offen und sichern den Aushub. Zwei Leute arbeiten zunächst im Westen weiter.

Nora Feld

02.02. 08:24

Bitte genaue Lage aufnehmen. Frau Venn kommt zum Termin. Keine zusätzliche dauerhafte Wasserhaltung beginnen, bevor Konzept und Zulässigkeit geklärt sind.

Maren Birk

02.02. 09:02

Ich bin zur Besprechung da. Bitte ein getrenntes Angebot für die konkret nötigen Arbeiten. Meine Entscheidung folgt nach technischer und preislicher Prüfung.

Timo Wendt

02.02. 09:11

Verstanden. Der Bagger bleibt heute vor Ort. Nicht alle Beschäftigten stehen still. Ich schreibe die tatsächlich betroffenen Stunden getrennt auf.

SW-HI-26-08 · Projektarchiv Steinbogen Wohnen

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB
Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 25.09.2033 · SW-HI-26-08

Abnahme der abgeschlossenen Architektenleistungen

Die Steinbogen Wohnen GmbH erklärt gegenüber Konturfeld Architektur PartG mbB die Abnahme der nach dem Architektenvertrag und den dokumentierten Stufenabrufen geschuldeten, nunmehr abgeschlossenen Leistungen. Maren Birk und Nora Feld haben den Abschlussbericht vom 20.09.2033, die übergebenen Projektunterlagen und den Stand der Objektbetreuung gemeinsam erörtert.

Eine frühere Teilabnahme von Architektenleistungen wurde in dieser Akte nicht vereinbart oder erklärt. Die förmlichen Bauabnahmen vom 15.09.2028 betrafen ausschließlich die sieben ausführenden Unternehmen. Die heutige Erklärung wird nicht auf dieses Datum zurückbezogen.

Im heutigen Termin werden keine konkret bezeichneten offenen Restleistungen aus dem beauftragten Leistungsumfang festgestellt. Nicht bekannte oder nicht erkennbare Mängelansprüche werden damit nicht ausgeschlossen. Die tatsächlichen Unterlagen zum Fensteranschlussvorgang 2030 bleiben unverändert im Projektarchiv.

Die letzte Honorarstufe kann auf Grundlage der abgeschlossenen Leistungen abgerechnet werden. Die Bauherrin prüft die Schlussrechnung einschließlich bereits gezahlter Abschläge gesondert. Die heutigen Unterschriften bestätigen die vorstehende Erklärung und den Erhalt des Protokolls. Für die Bauherrin gez.Maren Birk; für das Architekturbüro gez.Nora Feld.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Lena und Paul Rehm <wohnung01@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 01 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 918,00 EUR monatlich bei 68 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Derya Aydin <wohnung02@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 02 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Jonas und Eva Lenz <wohnung03@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 03 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.107,00 EUR monatlich bei 82 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Mika Petersen <wohnung04@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 04 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 918,00 EUR monatlich bei 68 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Sabine und Martin Hartung <wohnung05@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 05

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 05 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Nora und David Klein <wohnung06@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 06

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 06 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.107,00 EUR monatlich bei 82 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Tessa Brandt <wohnung07@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 07 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Leon und Amira Winter <wohnung08@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 08

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 08 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 05.09.2028

Ergebnisbericht zur Energieplanung und Heizleistung

Der Bericht dokumentiert den fortgeschriebenen Energiestand des Wohnhauses nach den freigegebenen Gebäude- und Anlagendaten. Er fasst das Ergebnis der Fachplanung für die Übergabe zusammen. Die Ergebnisgrößen beziehen sich auf das gesamte Gebäude; Wohnfläche, energetische Bezugsfläche und Bruttogrundfläche dürfen nicht gleichgesetzt werden.

Größe	Ansatz
Wohnfläche	600,00 m²
Energetische Bezugsfläche des Rechenmodells	720,00 m²
Bruttogrundfläche	820,00 m²
Referenz Primärenergiebedarf	95,00 kWh/(m²·a)
Projekt Primärenergiebedarf	39,40 kWh/(m²·a)
55 Prozent des Referenzwerts	52,25 kWh/(m²·a)
Projektwert für das gesamte Gebäude	28.368 kWh/a
Vereinbarte Wärmepumpenanlage	Kaskade aus 2 Geräten mit je 18 kW nominaler Heizleistung
PV-Anlage	80 Module je 450 Wp, 36 kWp

Die angesetzte Heizlast der Wohnungen beträgt zusammen 27,20 kW. Der zugehörige Anlagenabgleich berücksichtigt die erforderlichen Zuschläge und die Warmwasserbereitung. Die Nennleistung von 36 kW ist keine Behauptung einer bei jeder Außenlufttemperatur unveränderten Geräteleistung. Der Betriebspunkt und die Leistungskennlinien gehören zur Geräteauswahl der TGA-Planung.

Die ausgewiesenen Werte sind Ergebnisgrößen des datierten Fachplanungsstands. Sie ersetzen weder die vollständigen Rechendateien noch einen Energieausweis. Für Änderungen an Hülle, Nutzung oder Anlagen ist die Berechnung fortzuschreiben. Die endgültige gesetzliche Einordnung richtet sich nach dem für Bauantrag und Ausführung maßgeblichen zeitlichen Recht.

gez. Nils Frank, Energieplanung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Einstellblatt HLS08 und Prüfblätter HLS09 bis HLS10

Am 06.09.2028 wurden die hydraulischen Einstellungen und die dokumentierten Prüfungen der Heizungs- und Sanitärinstallation abgeschlossen. Verantwortlich ist Arne Thiel. Die Werte gelten für den beschriebenen Anlagenzustand vor Bezug und werden nach Beginn des regulären Betriebs auf Grundlage der Messwerte überprüft.

HLS09: Wohnungsweise hydraulische Einstellung

Wohnung	Heizlast kW	Volumenstrom l/h	Wärmezähler
01	3,10	533	SW-H-01
02	3,40	585	SW-H-02
03	3,70	636	SW-H-03
04	3,10	533	SW-H-04
05	3,40	585	SW-H-05
06	3,70	636	SW-H-06
07	3,40	585	SW-H-07
08	3,40	585	SW-H-08
Gesamt	27,20	4.678	Acht getrennte Messstellen

Die Sollwerte beruhen auf dem abgeglichenen Netz und einer Auslegungsspreizung von 5 K. Der gerundete Gesamtvolumenstrom stimmt mit 27,20 kW geteilt durch 1,163 kWh/(m³·K) und 5 K überein. Die Warmwasserladung wird vorrangig gesteuert. Die Heizkurve ist zunächst auf 32°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur und auf 38°C bei der vorgesehenen niedrigen Auslegungstemperatur eingestellt.

Die Verwaltung erhält die Einstellwerte und den Wartungskontakt. Sie soll Störungen und spätere Regelungsänderungen im Betriebsbuch festhalten. Eine rein sommerliche Inbetriebnahme bestätigt noch nicht das Verhalten in jeder späteren Heizsituation.

Prüfblatt HLS10: Dichtheit und Inbetriebnahme am 06.09.2028

Prüfer: Arne Thiel. Druckmessgerät WF-DP-28, Anzeigeauflösung 0,1 bar, Funktionskontrolle vor Beginn. Die nachstehenden Werte betreffen die abschließende Prüfung der bezeichneten zugänglichen Rohrnetzabschnitte vor Bezug. Armaturen und Geräte, deren zulässiger Prüfdruck niedriger liegt, waren für die Rohrnetzprüfung getrennt. Die Prüfung bewertet keine unzugänglichen Einzelverbindungen durch bloße Sichtkontrolle.

Abschnitt / Medium	Zeiten / Temperatur	Druck Anfang / Ende	Befund
Heizungsverteilung und Heizkreise; aufbereitetes Füllwasser	08:00 bis 10:00; Wasser 20°C, Raum 21°C	3,0 /3,0 bar	Kein erkennbarer Druckverlust; zugängliche Anschlüsse trocken
Kaltwasser Rohrnetz; gefiltertes Trinkwasser	10:30 bis 11:10; Wasser 18°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen
Warmwasser und Zirkulation, kalt geprüft; gefiltertes Trinkwasser	11:30 bis 12:10; Wasser 19°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen

Das Trinkwasserrohrnetz ist als formstabiles Metallverbundsystem ausgeführt. Der Prüfablauf umfasst den Druckaufbau, zehn Minuten Anpassung, Wiederherstellung des Anfangsdrucks und die anschließende halbstündige Beobachtung. Die aufgezeichneten Werte sind anlagenbezogene Messdaten; sie sind keine allgemeine Prüfanweisung für andere Rohrsysteme oder angeschlossene Geräte.

Nach der Prüfung wurden Prüfeinrichtungen entfernt, die getrennten Betriebsarmaturen wieder angeschlossen und die Trinkwasserleitungen abschnittsweise gespült. Um 14:30 Uhr betrug die Temperatur am Warmwasseraustritt 61°C und am Zirkulationsrücklauf 56°C. Eine mikrobiologische Untersuchung ist durch diese Temperaturmessung nicht nachgewiesen. Die Verwaltung übernimmt ab diesem Tag den dokumentierten Wasserwechsel bis zum Einzug; die Bauherrin beauftragt die für den späteren Betrieb einschlägigen Untersuchungen gesondert.

Heizkreisfüllung, Entlüftung und Betriebsdruck wurden nach der Druckprüfung wiederhergestellt. Die zugänglichen Anschlüsse wurden abschließend kontrolliert. Festgestellter Zustand: keine sichtbare Leckage. Für Wärmeﬂuss: gez. Arne Thiel; zur Übernahme der Betriebsorganisation: gez. Lea Fricke.

gez. Arne Thiel, Bauleitung
 Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Messblatt L08 zur Wohnungslüftung

Die nachfolgend angegebenen Luftmengen wurden am 06.09.2028 nach Einregulierung der Wohnungslüftung dokumentiert. Die Zuluft- und Abluftsummen beziehen sich auf die jeweilige Wohnung in der vereinbarten normalen Betriebsstufe. Messgerätekennzeichen WF-LM-08, Funktionskontrolle vor Messbeginn durchgeführt.

Wohnung	Soll m³/h	Zuluft gemessen	Abluft gemessen
01	80	80	79
02	90	89	90
03	100	100	99
04	80	80	81
05	90	91	90
06	100	99	100
07	90	90	89
08	90	89	90

Die Messwerte werden auf die vereinbarten Sollwerte und den jeweiligen Messzustand bezogen. Die Einstellung der erhöhten Bedarfsstufe wurde zusätzlich an den Bedienelementen erprobt. Die Filter sind zugänglich und wurden der Verwaltung gezeigt. Eine nachträgliche Verdeckung der Zu- oder Abluftöffnungen durch Einbauten ist zu vermeiden.

Es wurden keine die Nutzung ausschließenden Funktionsstörungen festgestellt. Beschwerden über Geräusche oder Zugerscheinungen nach Bezug sind mit Ort, Betriebsstufe und Zeit zu erfassen. Eine spätere Änderung der Nutzung oder der Innenraumaufteilung ist mit dem Lüftungskonzept abzugleichen. Die Unterlage gehört zum technischen Übergabesatz und ist keine pauschale Garantie für sämtliche späteren Betriebsbedingungen.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht E08 zu den elektrischen Anlagen

Die Prüfung der bezeichneten elektrischen Anlagen wurde am 07.09.2028 durch Selin Voß durchgeführt. Dieser Bericht enthält das Stromkreisverzeichnis, die dokumentierten Prüfbedingungen und die für die Bewertung zusammengefassten Messwerte. Er erfasst die acht Wohnungsverteilungen und die nachfolgend bezeichneten Allgemeinstromkreise. Anlagenkennzeichen LK-HI-28-08; Netzsystem TN-S ab Hauptverteilung; Nennspannung 230/400 V. Messgerät LK-IT-28, Funktionskontrolle vor Beginn durchgeführt.

Verteilung	Isolationsmessung MΩ	RCD Auslösezeit ms	Feststellung
WE01	größer 200	22	Schutzleiterzuordnung geprüft
WE02	größer 200	21	Beschriftung ergänzt
WE03	größer 200	23	Ohne offenen Befund
WE04	größer 200	20	Ohne offenen Befund
WE05	größer 200	24	Ohne offenen Befund
WE06	größer 200	21	Ohne offenen Befund
WE07	größer 200	22	Ohne offenen Befund
WE08	größer 200	20	Ohne offenen Befund
Allgemein	größer 200	23	Potentialausgleich kontrolliert

Die Isolationsmessung erfolgte mit 500 V Gleichspannung an den spannungsfreien Leitungen bei getrennten Verbrauchsmitteln und abgetrennten empfindlichen Betriebsmitteln. Angegeben ist je Verteilung der niedrigste ermittelte Wert. Der RCD-Wert bezeichnet die längste gemessene Auslösezeit der zugeordneten 30 mA-Schutzeinrichtungen bei einfachem Bemessungsdifferenzstrom in den geprüften Halbwellenlagen. Die Werte sind zusammen mit den nachfolgenden Schutzleiter- und Schleifenmessungen bewertet worden.

Vorhandene Beschriftungsmängel der Verteilung WE02 wurden vor Abschluss korrigiert. Die Besichtigung umfasste Leiterzuordnung, Kennzeichnung, zugängliche Klemmstellen, Schutzorgane und Potentialausgleich. Schalterfunktionen und die Zuordnung der Abschaltorgane wurden erprobt. Die Prüfung von PV-Erzeugung und Ladepunkten ist zusätzlich im Bericht PV08 dokumentiert. Spätere Einbauten sind nicht erfasst.

Stromkreisverzeichnis und bewertete Messwerte

In jeder Wohnung bestehen die Stromkreise 01 bis 09 nach der folgenden Zuordnung. Das vollständige Kennzeichen lautet beispielsweise WE05-07. Jeder bezeichnete Stromkreis wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Schutzleiterdurchgängigkeit, Polarität und Zuordnung waren in allen bezeichneten Stromkreisen gegeben. Die Gruppenwerte darunter nennen jeweils den höchsten gemessenen Widerstand und erlauben die Zuordnung zum geprüften Verteiler.

Endnummer	Versorgung	Leitungsschutz	Differenzstromschutz
01	Licht Wohnen / Flur	B10 A	Typ A, 30 mA
02	Licht Schlafen / Bad	B10 A	Typ A, 30 mA
03	Steckdosen Wohnen	B16 A	Typ A, 30 mA
04	Steckdosen Schlafräume	B16 A	Typ A, 30 mA
05	Küche Arbeitssteckdosen	B16 A	Typ A, 30 mA
06	Herdanschluss, dreiphasig	B16 A, dreipolig	Typ A, 30 mA
07	Geschirrspüler	B16 A	Typ A, 30 mA
08	Waschmaschine	B16 A	Typ A, 30 mA
09	Wohnungslüftung	B10 A	Typ A, 30 mA

Geprüfte Stromkreise	RPE höchstens Ω	Schleife Zs höchstens Ω	Bewertung
WE01-01 bis 09	0,19	0,72	Kein offener Befund
WE02-01 bis 09	0,20	0,74	Nach Beschriftungskorrektur ohne offenen Befund
WE03-01 bis 09	0,21	0,76	Kein offener Befund
WE04-01 bis 09	0,22	0,78	Kein offener Befund
WE05-01 bis 09	0,23	0,80	Kein offener Befund
WE06-01 bis 09	0,24	0,82	Kein offener Befund
WE07-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund
WE08-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund

Allgemeinverteilung und Anlagenanschlüsse

Kennzeichen / Versorgung	Schutzorgan	RPE Ω	Zs Ω	Prüfergebnis
A01 Treppenhauslicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,18	0,68	Ohne offenen Befund
A02 Außenlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,24	0,81	Ohne offenen Befund
A03 Servicesteckdosen	B16 A / Typ A, 30 mA	0,20	0,74	Ohne offenen Befund
A04 Kommunikationsanlage	B10 A / Typ A, 30 mA	0,16	0,62	Ohne offenen Befund
A05 Technikraumlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,14	0,58	Ohne offenen Befund
A06 Reinigung / Verwaltung	B16 A / Typ A, 30 mA	0,19	0,71	Ohne offenen Befund
T01 Wärmepumpe 1, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,30	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T02 Wärmepumpe 2, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,31	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T03 Aufzug, Zuleitung	C16 A, dreipolig	0,13	0,37	Zuleitung und Abschaltung geprüft

Bei T01 bis T03 reicht der dokumentierte Umfang bis zu den Anschlussklemmen der jeweiligen Anlage. Die internen Herstellerstromkreise werden damit nicht zu allgemeinen Hausstromkreisen erklärt. Die anlagenspezifische Inbetriebnahme ist in 163 und 167 dokumentiert. Der für die Allgemeinstromkreise angegebene RCD-Sammelwert gilt für A01 bis A06; er ist keine Aussage, sämtliche Abgänge T01 bis T03 hätten identische RCD-Typen.

Die gemessenen Schleifenwerte wurden mit den jeweiligen Schutzorganen und der erforderlichen Abschaltung abgeglichen. Für den ungünstigsten Wohnungsstromkreis beträgt der rechnerische Fehlerstrom bei 230 V und $0,86\Omega$ rund 267 A; für T02 bei 230 V und $0,31\Omega$ rund 742 A. Diese Berechnungen gehören zu der dokumentierten Bewertung des konkreten Anlagenstands; sie ersetzen weder Leitungsbemessung noch eine Prüfung nach einer späteren Änderung.

Die Ergebnisbewertung für die hier bezeichneten Stromkreise lautet: kein offener Befund, der im dokumentierten Prüfungsumfang der vorgesehenen Nutzung entgegensteht. Schutzleiter und Potentialausgleich wurden wieder angeschlossen und abschließend kontrolliert. Der Bericht bestätigt keine unveränderten Bedingungen für spätere Einbauten und keine Abnahme anderer Gewerke. Verantwortliche Elektrofachkraft: gez. Selin Voß.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht PV08 und Inbetriebnahme der Ladepunkte

Die PV-Anlage besteht aus 80 Modulen mit je 450 Wp, verteilt auf vier Strings mit je 20 Modulen. Die installierte Nennleistung beträgt 36 kWp. Die belegte Modulfläche beträgt 160 m² bei 300 m² Gesamtdachfläche des Gebäudes einschließlich beider Dachniveaus. Betreiberin und Leistungsempfängerin ist die Steinbogen Wohnen GmbH.

String	Module	Nennleistung kWp	Leerlaufspannung V
1	20	9,00	824
2	20	9,00	821
3	20	9,00	825
4	20	9,00	822
Gesamt	80	36,00	Vier getrennte Stringmessungen

Die Spannungen wurden am selben Vormittag bei vergleichbarer Einstrahlung gemessen. Polarität, Schutzmaßnahmen, Kennzeichnung und Abschaltmöglichkeit wurden kontrolliert. Das abgestimmte Messkonzept sieht Allgemeinstromversorgung und Überschusseinspeisung vor. Es besteht kein Mieterstromliefervertrag mit den einzelnen Wohnungsnutzern. Anmeldung und Zählerzuordnung führt die Betreiberin mit dem Netzbetreiber fort.

Alle acht Pkw-Stellplätze sind vorverkabelt. Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW sind installiert, einer am barrierefreien Stellplatz 01. Das Lastmanagement begrenzt den gleichzeitigen Bezug nach der verfügbaren Anschlussleistung. Im Funktionstest wurden beide Ladepunkte einzeln und gemeinsam angefordert; die Leistungsaufteilung reagierte auf die simulierte weitere Hauslast.

Die Unterlage dokumentiert die Inbetriebnahme. Sie garantiert keinen bestimmten Jahresertrag und ersetzt keine laufenden Prüf- und Wartungsaufgaben. Allgemeine Dach-, Elektro- und Ladeleistungen sind von der gesonderten begünstigten Lieferung und Montage der PV-Anlage in der Abrechnung getrennt.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbescheinigung A08 vor Inbetriebnahme des Aufzugs

Geprüft wurde die von Hubpunkt Aufzüge GmbH errichtete Aufzugsanlage im Wohnhof Am Steinbogen 18, Anlagenkennzeichen HP-HI-28-08. Betreiberin ist die Steinbogen Wohnen GmbH. Die Prüfung vor Inbetriebnahme erfolgte am 07.09.2028 durch Dr. Anton Lahr für die bezeichnete Überwachungsstelle.

Anlagendaten	Feststellung
Nennlast	630 kg
Haltestellen	Drei, EG bis 2.OG
Nutzbare Kabine	1,10 m mal 1,40 m
Lichte Türbreite	0,90 m
Notruf	Zweirichtungsverbindung getestet
Türen und Verriegelung	Funktion im Prüfablauf kontrolliert
Befreiung und Notbetrieb	Vorgehen mit Montagefirma und Verwaltung erprobt
Ergebnis	Kein offener sicherheitsrelevanter Mangel im geprüften Umfang

Die Anlage kann nach dem dokumentierten Ergebnis bestimmungsgemäß in Betrieb genommen werden. Der Betreiber hat die laufenden Pflichten einschließlich Wartung, Notrufbereitschaft, erforderlicher Kontrollen und fristgerechter wiederkehrender Prüfungen zu organisieren. Änderungen an der Anlage sind vor ihrer Nutzung fachlich und rechtlich einzuordnen.

Die Bescheinigung betrifft die Aufzugsanlage und den bezeichneten Prüfungsumfang. Sie ist keine Baugenehmigung und keine Abnahme sämtlicher Bauleistungen. Die Prüfunterlagen werden im Anlagenbuch aufbewahrt; eine Ausfertigung erhält die Betreiberin.

gez. Dr. Anton Lahr, zugelassene Überwachungsstelle
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Wartungsvereinbarung für Wärmepumpen und Lüftung

Steinbogen Wohnen GmbH beauftragt Wärmefluss Haustechnik GmbH ab 01.10.2028 mit der laufenden Wartung der zwei Wärmepumpen, der zugehörigen Regelung und der Wohnungslüftung. Der Vertrag beginnt nach der Bauabnahme. Er ist ein gesonderter Betriebsvertrag und erweitert nicht rückwirkend die vereinbarte Bauvergütung.

Die erste planmäßige Wartung findet im September 2029 statt. Die jährliche Vergütung beträgt 1.800,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Enthalten sind die vereinbarte Sicht- und Funktionskontrolle, die Überprüfung dokumentierter Einstellwerte, die Reinigung der nach Herstellerangaben zugänglichen Anlagenteile sowie ein schriftlicher Wartungsbericht. Ersatzteile und darüber hinausgehende Reparaturen werden nur nach gesonderter Abstimmung berechnet.

Die Firma meldet erkennbare Betriebsstörungen und empfiehlt erforderliche zusätzliche Prüfungen mit konkretem Anlass. Gesetzlich erforderliche Betreiberprüfungen bleiben von der technischen Wartung zu unterscheiden. Die Verwaltung stellt Zugang und vorhandene Betriebsdaten bereit. Der Vertrag verschiebt keine Mängelansprüche aus dem Bauvertrag und schließt sie nicht aus.

Die Vereinbarung läuft zunächst bis 30.09.2029 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Für die Bauherrin gez. Maren Birk; für Wärmefluss gez. Arne Thiel.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Wohnung	Stromzähler	Strom_kWh	Kaltwasserzähler	Kaltwasser_m3	Warmwasserzähler	Warmwasser_m3	Wärmezähler	Wärme_MWh	Ableседatum
01	SW-E-01	15.0	SW-K-01	1.3	SW-W-01	0.7	SW-H-01	0.043	2028-09-29
02	SW-E-02	18.0	SW-K-02	1.4	SW-W-02	0.8	SW-H-02	0.046	2028-09-29
03	SW-E-03	21.0	SW-K-03	1.5	SW-W-03	0.9	SW-H-03	0.049	2028-09-29
04	SW-E-04	24.0	SW-K-04	1.6	SW-W-04	1.0	SW-H-04	0.052	2028-09-29
05	SW-E-05	27.0	SW-K-05	1.7	SW-W-05	1.1	SW-H-05	0.055	2028-09-29
06	SW-E-06	30.0	SW-K-06	1.8	SW-W-06	1.2	SW-H-06	0.058	2028-09-29
07	SW-E-07	33.0	SW-K-07	1.9	SW-W-07	1.3	SW-H-07	0.061	2028-09-29
08	SW-E-08	36.0	SW-K-08	2.0	SW-W-08	1.4	SW-H-08	0.064	2028-09-29

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.12.2026

Grundschuldbestellung UVZ 139 2026

Verhandelt zu Hildesheim am 19. Dezember 2026 vor Dr. Carla Fink, Notarin mit Amtssitz Hildesheim. Erschienen ist Maren Birk, handelnd als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Identität und Vertretungsbefugnis wurden anhand der vorgelegten Ausweis- und Registerunterlagen festgestellt. Die Gesellschaft handelt als Grundstückseigentümerin und als Darlehensnehmerin. Eine persönliche Verpflichtung von Frau Birk im eigenen Namen ist nicht Gegenstand dieser Urkunde.

1 Grundbuch und Gläubigerin

Belastet wird: Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Bestandsverzeichnis Nummer 1, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Notarin hat das Grundbuch am 19. Dezember 2026 elektronisch eingesehen. Die Steinbogen Wohnen GmbH ist seit 18. Dezember 2026 als Eigentümerin eingetragen. Die beim Erwerb eingetragene Auflassungsvormerkung ist gelöscht; Abteilungen II und III sind unbelastet. Begünstigte Gläubigerin ist die Leinebogen Projektbank AG mit Sitz Hildesheim, Bankhof 4, 31134 Hildesheim.

2 Bestellung und Rang

Die Eigentümerin bestellt zugunsten der Gläubigerin eine Buchgrundschuld in Höhe von 1.600.000,00 EUR, in Worten eine Million sechshunderttausend Euro, nebst 15 Prozent jährlichen Grundschuldzinsen seit dem 19. Dezember 2026 und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent des Grundschuldkapitals. Ein Grundschuldbrief wird ausgeschlossen. Das Recht soll die erste Rangstelle in Abteilung III erhalten; ihm sollen keine Rechte in Abteilung II vorgehen. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die entsprechende Eintragung.

Die dinglichen Zinsen und die Nebenleistung erweitern den Sicherungsrahmen. Sie sind nicht mit dem vertraglich vereinbarten Darlehenszins von 3,60 Prozent gleichzusetzen und begründen im Innenverhältnis keinen Anspruch auf eine zusätzliche laufende Darlehensvergütung. Das Grundschuldkapital wird erst nach Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten fällig. Die zwingenden Grenzen des Paragraph 1193 BGB für eine Sicherungsgrundschuld bleiben bestehen.

3 Dingliche Vollstreckungsunterwerfung

Die Eigentümerin unterwirft sich wegen des Grundschkuldkapitals, der bezeichneten Grundschkuldzinsen und der einmaligen Nebenleistung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in das belastete Grundstück in der Weise, dass die Vollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig sein soll. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung dieser Unterwerfung gemäß Paragraf 800 ZPO. Die Bezeichnung als sofortige Unterwerfung hebt die gesetzlichen Voraussetzungen der Fälligkeit, Kündigung, Klauselerteilung und Zustellung nicht auf.

4 Persönliches Schuldversprechen der Gesellschaft

Die Steinbogen Wohnen GmbH übernimmt gegenüber der Gläubigerin zusätzlich die persönliche Haftung für einen Betrag von 1.600.000,00 EUR nebst den in Ziffer 2 bezeichneten Zinsen und der Nebenleistung. Sie unterwirft sich insoweit der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in ihr gesamtes Vermögen gemäß Paragraf 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO. Die Gläubigerin darf aus persönlicher Haftung und Grundschkuld zusammen nur einmal Befriedigung verlangen. Die Sicherungszweckbeschränkung und die darin geregelten Voraussetzungen einer Verwertung gelten auch für dieses Schuldversprechen.

Die Notarin hat erläutert, dass die vollstreckbare Urkunde eine gerichtliche Klage über die titulierten Ansprüche ersetzen kann und Einwendungen gegebenenfalls mit den vorgesehenen Rechtsbehelfen geltend zu machen sind. Vollstreckbare Ausfertigungen sind nur unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen zu erteilen. Die Eigentümerin erhält eine beglaubigte Abschrift; eine weitere vollstreckbare Ausfertigung unterliegt den gesetzlichen Beschränkungen.

5 Sicherungszweck und Freigabe

Die Eigentümerin bestätigt die mit der Bank gesondert vereinbarte enge Sicherungsabrede: Grundschkuld und persönliches Schuldversprechen sichern ausschließlich die Ansprüche der Leinebogen Projektbank AG aus dem am 19. Dezember 2026 geschlossenen Projektdarlehen SW-HI-26-08 über 1.600.000,00 EUR einschließlich seiner wirksam vereinbarten Nebenforderungen. Forderungen gegen Dritte oder aus anderen Bankverbindungen werden nicht erfasst. Eine Verwertung setzt voraus, dass eine gesicherte Forderung fällig und unbeglichen ist und die gesetzlichen sowie vertraglichen Voraussetzungen vorliegen.

Nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Ansprüche und Wegfall des Sicherungszwecks hat die Bank die Sicherheit nach Wahl der Eigentümerin durch Löschungsbewilligung oder Rückabtretung freizugeben. Bei dauerhaftem Missverhältnis zwischen Sicherungswert und gesicherten Forderungen bestehen die vertraglich und gesetzlich vorgesehenen Freigabeansprüche. Die enge Sicherungsabrede liegt der Bank und der Eigentümerin in gleichlautender, unterzeichneter Fassung vor.

6 Grundbucheinträge und Empfangsvollmacht

Die Notarin wird beauftragt, die Eintragung der Grundschild und der Vollstreckungsunterwerfung unter Erstellung der erforderlichen strukturierten Daten zu beantragen. Die Gläubigerin hat die Notarin mit gesonderter schriftlicher Vollmacht bevollmächtigt, die dingliche Einigungserklärung der Eigentümerin für sie entgegenzunehmen. Die Entgegennahme wird außerhalb dieser Beurkundungsverhandlung gesondert erklärt und dokumentiert. Die Vollmacht berechtigt nicht dazu, den Sicherungszweck zu erweitern oder zusätzliche Forderungen anzuerkennen.

Die Gesellschaft trägt die Kosten dieser Urkunde, der gesetzlich vergütungspflichtigen Betreuung, der Eintragung und der vereinbarten Ausfertigungen. Es bestehen keine zusätzlichen Treuhandaufgaben, keine Rangbeschaffung durch Ablösung fremder Rechte und kein Verwahrungsauftrag für Geld. Die Notarin soll der Bank den Eintragungsstand mitteilen; eine gesonderte Rangbescheinigung wird nicht beauftragt.

7 Abschluss der Niederschrift

Der Inhalt wurde der Erschienenen vollständig vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Gez. Maren Birk für die Steinbogen Wohnen GmbH. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin. Die vorstehende Grundschildbestellung ist Bestandteil der getrennt geführten Finanzierungsakte zum Darlehen vom 19. Dezember 2026.

8 Gesonderter Empfangsvermerk vom 22 Dezember 2026

Aufgrund der schriftlich erteilten Empfangsvollmacht nehme ich, Dr. Carla Fink, am 22. Dezember 2026 um 10:15 Uhr die in der Urkunde vom 19. Dezember 2026, UVZ 139/2026, enthaltene dingliche Einigungserklärung gesondert für die Leinebogen Projektbank AG entgegen. Die Empfangsvollmacht ist in der Nebenakte verwahrt. Die Eigentümerin hat die Erklärung nicht widerrufen. Mit der Entgegennahme wird die Bindung der Eigentümerin gegenüber der Gläubigerin nach Maßgabe von Paragraph 873 Absatz 2 BGB herbeigeführt. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin.

Geschäftsstellenvermerk: Die angeforderten S/W-Ausfertigungen, beglaubigten Abschriften und Vollzugsmittelungen zur Grundschildbestellung umfassen insgesamt 40 abgegebene Seiten. Die Aufnahme des Empfangsvermerks verändert den Text der ursprünglichen Erklärung nicht. Der Eintragungsantrag wird mit den elektronisch strukturierten Daten an das Grundbuchamt übermittelt. Die Urschrift verbleibt in notarieller Verwahrung.

Dr. Carla Fink, Notarin · Abschrift einschließlich des gesonderten Empfangsvermerks

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Steinwerk Hochbau GmbH
Anschrift	Werkhof 21, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/12791
Sicherheitsnummer	260000017101
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Dachraum Gebäudehülle GmbH
Anschrift	Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/12904
Sicherheitsnummer	260000017201
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Wärmefluss Haustechnik GmbH
Installationshof 16, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Wärmefluss Haustechnik GmbH
Anschrift	Installationshof 16, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13017
Sicherheitsnummer	260000017301
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Lichtkreis Elektro GmbH
Anschrift	Schaltring 9, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13130
Sicherheitsnummer	260000017401
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Innenraum Ausbau GmbH
Anschrift	Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13243
Sicherheitsnummer	260000017501
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Hubpunkt Aufzüge GmbH
Technikhof 5, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Hubpunkt Aufzüge GmbH
Anschrift	Technikhof 5, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13356
Sicherheitsnummer	260000017601
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung
Anlagen: keine

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Anschrift	Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13469
Sicherheitsnummer	260000017701
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Leineanschluss Netzdienste GmbH
Netzhof 27, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Leineanschluss Netzdienste GmbH
Anschrift	Netzhof 27, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/14373
Sicherheitsnummer	260000017801
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2028

Register der Freistellungsbescheinigungen und Zahlungsprüfungen

Interner Abschlussvermerk der kaufmännischen Projektakte zum 31. Dezember 2028. Bearbeitet von Lea Fricke und freigegeben von Maren Birk. Das Register dokumentiert die vor den Bauzahlungen vorliegenden Freistellungsbescheinigungen und die zugeordneten Gültigkeitsabfragen. Maßgeblich sind die einzelnen Zahlungsdaten des Projektkontos; der Rechnungszeitraum allein reicht für die Zuordnung nicht aus.

1 Eingang und Zuordnung der Bescheinigungen

Die allgemeinen Freistellungsbescheinigungen der acht unten benannten Auftragnehmer gingen am 21. Dezember 2026 als lesbare Kopien im Projektpostfach ein. Name, Anschrift, Steuernummer, Sicherheitsnummer, Gültigkeitszeitraum und Siegelvermerk wurden mit dem jeweiligen Kreditorenstamm abgeglichen. Die Erstabfrage nach Beginn der Gültigkeit erfolgte am 2. Januar 2027; Ergebnis bei allen acht Datensätzen: Bescheinigung gültig für den Zeitraum 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2028. Originaldateien und Abfragevermerke sind der jeweiligen Kreditorenakte zugeordnet.

Beleg	Auftragnehmer	Steuernummer	Sicherheitsnummer
171	Steinwerk Hochbau GmbH	30/145/12791	260000017101
172	Dachraum Gebäudehülle GmbH	30/145/12904	260000017201
173	Wärmefluss Haustechnik GmbH	30/145/13017	260000017301
174	Lichtkreis Elektro GmbH	30/145/13130	260000017401
175	Innenraum Ausbau GmbH	30/145/13243	260000017501
176	Hubpunkt Aufzüge GmbH	30/145/13356	260000017601
177	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH	30/145/13469	260000017701
178	Leineanschluss Netzdienste GmbH	30/145/14373	260000017801

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

miete@steinbogen-wohnen.example

2 Prüfung vor den ersten Zahlungen

Zu jeder nachstehenden Überweisung wurde am selben Tag vor Freigabe die Gültigkeit unter der angegebenen Sicherheitsnummer erneut abgefragt. Die jeweilige Bestätigung lautete gültig; es lag kein Widerrufshinweis vor. In den Abfragevermerken sind die ursprüngliche Gültigkeitsdauer und die Identität des Leistenden unverändert gespeichert. Die unten angegebenen Beträge sind die tatsächlich gebuchten Auszahlungen. Das Register entscheidet nicht über die materielle Berechtigung oder die Einmaligkeit der Rechnung.

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
29.02.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-021	238.000,00	171 gültig
19.03.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-N01	21.420,00	171 gültig
29.04.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-046	357.000,00	171 gültig
29.05.2028	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-052	261.800,00	172 gültig
15.06.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	174 gültig
19.06.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	174 gültig
29.06.2028	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-063	214.200,00	173 gültig

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

miete@steinbogen-wohnen.example

3 Fortgeführte Gültigkeitsprüfungen

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
29.07.2028	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-074	178.500,00	175 gültig
03.09.2028	Leineanschluss Netzdienste GmbH LN-28-081	41.650,00	178 gültig
14.10.2028	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-095	178.500,00	175 gültig
14.10.2028	Hubpunkt Aufzüge GmbH HA-28-093	71.400,00	176 gültig
14.10.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-PV-28-099	45.000,00	174 gültig
14.10.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-093	178.500,00	171 gültig
14.10.2028	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-098	261.800,00	172 gültig

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

miete@steinbogen-wohnen.example

4 Fortgeführte Gültigkeitsprüfungen

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
14.10.2028	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-094	214.200,00	173 gültig
14.10.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-098	35.700,00	174 gültig
29.11.2028	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH GG-28-115	142.800,00	177 gültig

5 Ablage und Abschluss

Auftragnehmeridentität und Gültigkeit wurden jeweils vor Zahlung bestätigt. Ein Steuerabzug wurde für die erfassten Zahlungen nicht vorgenommen. Erstattungen von Auftragnehmern werden im Bank- und Rechnungsregister geführt; sie sind keine ausgehenden Gegenleistungen dieses Registers. Für Zahlungen nach Ablauf des 31. Dezember 2028 darf auf diese Bescheinigungen nicht mehr zurückgegriffen werden; gegebenenfalls ist vor einer weiteren Bauzahlung eine neue gültige Bescheinigung anzufordern und zu prüfen.

Planungsleistungen der Architektin und der Fachplaner, Notarkosten, Grundstückskaufpreis, Steuern, behördliche Gebühren und Bankentgelte werden hier nicht als Bauleistungen erfasst. Die Freistellungsunterlagen und Gültigkeitsvermerke bleiben mit den Zahlungsbelegen gemäß den jeweils geltenden Aufbewahrungspflichten in der Projektakte. Die steuerliche Behandlung der Rechnungen einschließlich Umsatzsteuer wird gesondert beurteilt.

Gez. Lea Fricke · Freigabe Maren Birk am 31.12.2028

Anlagen: keine
