

26_ERP_Projektkonto.txt

Hagedorn Präzisionsteile GmbH

ERP Projektkonto WH26 | Export 25.09.2026 16:00

Währung EUR | Werte netto | Kostenbelege bis 25.09.2026

Gebuchte Leistungen: 1.200.000,00

Verbindlich bestellt einschließlich bereits gebuchter Leistungen: 2.073.000,00

Bis 25.09.2026 bezahlte Leistungen netto: 1.040.000,00

Zahlungen einschließlich 19 Prozent Umsatzsteuer: 1.237.600,00

Offene gebuchte Verbindlichkeiten netto: 160.000,00

Offene gebuchte Verbindlichkeiten brutto: 190.400,00

Ausstehende Leistungen in Bestellungen sind keine gebuchten Verbindlichkeiten.

Die aktuelle Septemberrechnung wurde am 25.09. nacherfasst. Die frühere Augustlieferung ist im Bestandsjournal enthalten; die Kostenbelegliste wurde entsprechend datiert.

Sachbearbeitung: Jana Feldkamp

Exportumfang: gesamte Kostenstelle WH26, ohne Grundstück und Maschinen.

Ende des Auszugs.

29_Bautagebuch_24_09.txt

Westkamp Hallenbau GmbH

Bautagebuch WH26 | 24.09.2026 | Polier Ralf Thiele

Wetter 07:00 Uhr: bedeckt, 13 Grad; 15:00 Uhr: trocken, 18 Grad.

Personal: sechs Monteure, zwei Dachdecker, ein Polier.

Arbeitszeit 07:00 bis 16:00 Uhr, Pause 12:00 bis 12:30 Uhr.

Die letzten zwei Dachpakete wurden an Achse 7 eingehoben. Der Kran war zwischen 08:15 und 10:40 Uhr sowie 13:20 und 14:05 Uhr im Einsatz.

Die Lieferung der Tordichtungen wurde auf 28.09. bestätigt. Der Nordweg ist durch Paneelpaletten belegt.

Für die spätere Trafoanlieferung muss die Lagerfläche geräumt werden.

Keine Personenunfälle. Keine Abnahme. Der Einkauf wurde um 15:10 Uhr auf die noch ungeklärte zusätzliche Kranmiete hingewiesen.

Eintrag abgeschlossen um 16:20 Uhr durch Ralf Thiele.

06_Trafo_Liefermeldung.eml

Von	Nils Breden <nils.breden@elektro-breden.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 11:12:00 +0200
Betreff	WH26: neue Lieferwoche Trafostation

Guten Tag Frau Feldkamp,

anbei erhalten Sie unsere schriftliche Lieferfortschreibung. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen; einen zweiten verfügbaren Schutzschalter kann er derzeit nicht zusagen. Eine frühere Teilanlieferung würde uns bei der Inbetriebnahme nicht helfen.

Für die mobile Anlage habe ich die Anschlusswerte Ihrer beiden Maschinenlinien verwendet. Bitte beachten Sie die Begrenzung auf eine Linie. Wir können die Station nicht allein aufgrund der Terminrunde bestellen. Ich benötige eine gesonderte schriftliche Freigabe. Die Preisbindung für die mobile Anlage endet am Montag um 14:00 Uhr.

Freundliche Grüße
Nils Breden
Elektro Breden GmbH

17_Einkauf_Kran.eml

Von	Leon Rensing <einkauf@hagedorn.de>
An	Anja Kortmann <a.kortmann@kranservice.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 10:40:00 +0200
Betreff	KM N03: noch keine Preisfreigabe

Guten Tag Frau Kortmann,

ich bestätige den Eingang Ihres Angebots. Unsere Bauleitung nennt acht Tage mit Hubbedarf, davon vier noch bevorstehend. Bei vier weiteren Tagen ist nur die Bereitstellung vermerkt. Bitte erläutern Sie, auf welche Absprache Sie sich für die durchgehende Mietzeit stützen.

Den Umsetzvorgang vom 22. September haben wir im Nachweis gefunden. Ich kann Ihnen heute weder die Gesamtsumme bestätigen noch eine Zahlung zusagen. Die Geschäftsführerin bespricht die weitere Baufolge am Montag. Bis dahin bleibt die Verlängerung in unserem Bestellbuch unfreigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Leon Rensing

19_Netzanschluss.eml

Von	Sven Büttner <anschluss@emsnetz.de>
An	Nils Breden <nils.breden@elektro-breden.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 09:05:00 +0200
Betreff	WH26 mobile Versorgung: Schaltbild fehlt

Guten Tag Herr Breden,

uns liegt bislang nur die Leistungsangabe 250 kVA vor. Für die Prüfung benötigen wir das einpolige Schaltbild, den Schutzprüfplan und die Verriegelung gegen Rückspeisung. Ohne diese Unterlagen können wir den Anschluss nicht freigeben.

Für die dauerhafte Station ist der 16. November in der Terminreservierung hinterlegt. Eine abschließende Bestätigung ist erst nach Vorlage der Prüfprotokolle möglich. Bitte übersenden Sie das Schaltbild des Provisoriums bis Montag 09:00 Uhr. Wir melden uns anschließend mit dem Prüfergebnis.

Freundliche Grüße

Sven Büttner

Emsnetz Anschlussservice

20_Geschaeftsfuehrung.eml

Von	Maren Hagedorn <m.hagedorn@hagedorn.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 12:15:00 +0200
Betreff	WH26 Entscheidung am Montag

Guten Tag Frau Feldkamp,

eine Linie ab Anfang November wäre für die Liefertermine hilfreich, aber nicht gleichbedeutend mit dem vollen Produktionsanlauf. Ich möchte vor der Entscheidung den Anschlussstatus und die Auswirkungen auf unsere September- bis Dezemberzahlungen sehen. Bitte lassen Sie die unverbindliche Kranforderung nicht stillschweigend zu einer Bestellung werden.

Die Mietverlängerung unserer bisherigen Produktionsfläche beträgt 8.000,00 EUR je angefangenen Monat. Für November können wir bis 30. September verlängern. Diese Betriebsausgabe gehört nicht in das Bauinvestitionsbudget. Ohne Provisorium rechnen wir derzeit mit dem Anlauf am 7. Dezember; ob der Vermieter auch Dezember anbietet, klärt der Einkauf noch.

Ich gebe heute weder das Provisorium noch zusätzliche Kranmiete frei.

Maren Hagedorn

Von	Elena Voß <e.voss@hagedorn.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 15:15:00 +0200
Betreff	Projektkonto WH26 und Abrufplanung

Guten Tag Frau Feldkamp,

zum 25. September sind auf dem Projektkonto 512.400,00 EUR verfügbar. Die kumulierte Ausstattung des Kontos betrug 1.750.000,00 EUR, die Zahlungen 1.237.600,00 EUR. Weitere Kreditabrufe von 400.000,00 EUR im Oktober und 600.000,00 EUR im November sind im bestehenden Rahmen vorgesehen. Zins und Tilgung laufen über das Hauptkonto und gehören nicht in diese Übersicht.

Die Abschlagsrechnung WH 260924 über 190.400,00 EUR ist noch unbezahlt. Der Finanzplan zieht sie vorsorglich bereits im September ab, obwohl sie am 8. Oktober fällig ist. Unsere Planwerte enthalten weder die Kranverlängerung noch das Provisorium. Vorsteuererstattungen werden für den betrachteten Zeitraum nicht als zusätzlicher Zahlungseingang angesetzt.

Für die Novemberzahlung an Breden wurde die Verschiebung des Lieferabschlags bereits berücksichtigt. Bitte unterscheiden Sie den Bestand des Baukontos vom noch freien Kostenbudget.

Freundliche Grüße

Elena Voß

Finanzen

04_Kostenrahmen.csv

Projekt	Gewerk	Kostenbereich	Budget_netto_EUR
WH26	W01	Planung	120.000,00
WH26	W02	Erdarbeiten	180.000,00
WH26	W03	Tragwerk	640.000,00
WH26	W04	Hülle	420.000,00
WH26	W05	Technik	380.000,00
WH26	W06	Außenanlagen	180.000,00
WH26	W07	Ausstattung	140.000,00
WH26	W08	Baustelleneinrichtung	140.000,00
WH26	RES	Unvergebene Reserve	100.000,00

11_Belegjournal.csv

Beleg	Gewerk	Buchungsdatum	Netto_EUR	USt_EUR
WH-01-1	W01	2026-07-28	38.000,00	7.220,00
WH-01-2	W01	2026-08-28	57.000,00	10.830,00
WH-02-1	W02	2026-07-28	72.000,00	13.680,00
WH-02-2	W02	2026-08-28	108.000,00	20.520,00
WH-03-1	W03	2026-08-28	384.000,00	72.960,00
WH-03-2	W03	2026-09-25	96.000,00	18.240,00
WH-04-1	W04	2026-08-28	136.000,00	25.840,00
WH-04-2	W04	2026-09-25	64.000,00	12.160,00
WH-05-1	W05	2026-07-28	54.000,00	10.260,00
WH-05-2	W05	2026-08-28	86.000,00	16.340,00
WH-07-1	W07	2026-07-28	12.000,00	2.280,00
WH-07-2	W07	2026-08-28	18.000,00	3.420,00
WH-08-1	W08	2026-07-28	42.000,00	7.980,00
WH-08-2	W08	2026-08-28	33.000,00	6.270,00

12_Bestellbuch.csv

Bestellung	Gewerk	Auftragnehmer	Bestellt_netto_EUR	Bestandsdatum
WH-B01	W01	Planwerk	118.000,00	2026-08-31
WH-B02	W02	Erdmann Tiefbau	190.000,00	2026-08-31
WH-B03	W03	Westkamp	630.000,00	2026-08-31
WH-B04	W04	Westkamp	405.000,00	2026-08-31
WH-B05	W05	Elektro Breden und Partner	360.000,00	2026-08-31
WH-B06	W06	Wegewerk	150.000,00	2026-08-31
WH-B07	W07	Regalbau Möller	100.000,00	2026-08-31
WH-B08	W08	Baustellenservice	120.000,00	2026-08-31

21_Zahlungsplan.csv

Monat	Alte_Istverbindlichkei t_netto_EUR	Neue_Leistung_net t_EUR	Zahlung_brutto_EUR	Planstand
2026-09	160.000,00	0,00	190.400,00	25.09.2026
2026-10	0,00	260.000,00	309.400,00	25.09.2026
2026-11	0,00	430.000,00	511.700,00	25.09.2026
2026-12	0,00	316.000,00	376.040,00	25.09.2026

24_Bankansicht.png

Emsland Firmenbank · Hagedorn Präzisionsteile GmbH

Übersicht / Vorgänge / Auswertung

Projektkonto WH26

25.09.2026 · 16:00 Uhr · gespeicherte Ansicht

Buchsaldo

512.400,00 EUR

Verfügbar

512.400,00 EUR


Offener Abschlag

190.400,00 EUR

Buchungsgruppe	Zeitraum	Haben EUR	Soll EUR
Eigenmittel und Kredit	bis 25.09.2026	1.750.000,00	0,00
Ausgeführte Zahlungen	bis 25.09.2026	0,00	1.237.600,00
Vorgemerkte Umsätze	25.09.2026	0,00	0,00

Geschäftsansicht · Zugriff Buchhaltung und Projektleitung

Bilddatei: 24_Bankansicht.png

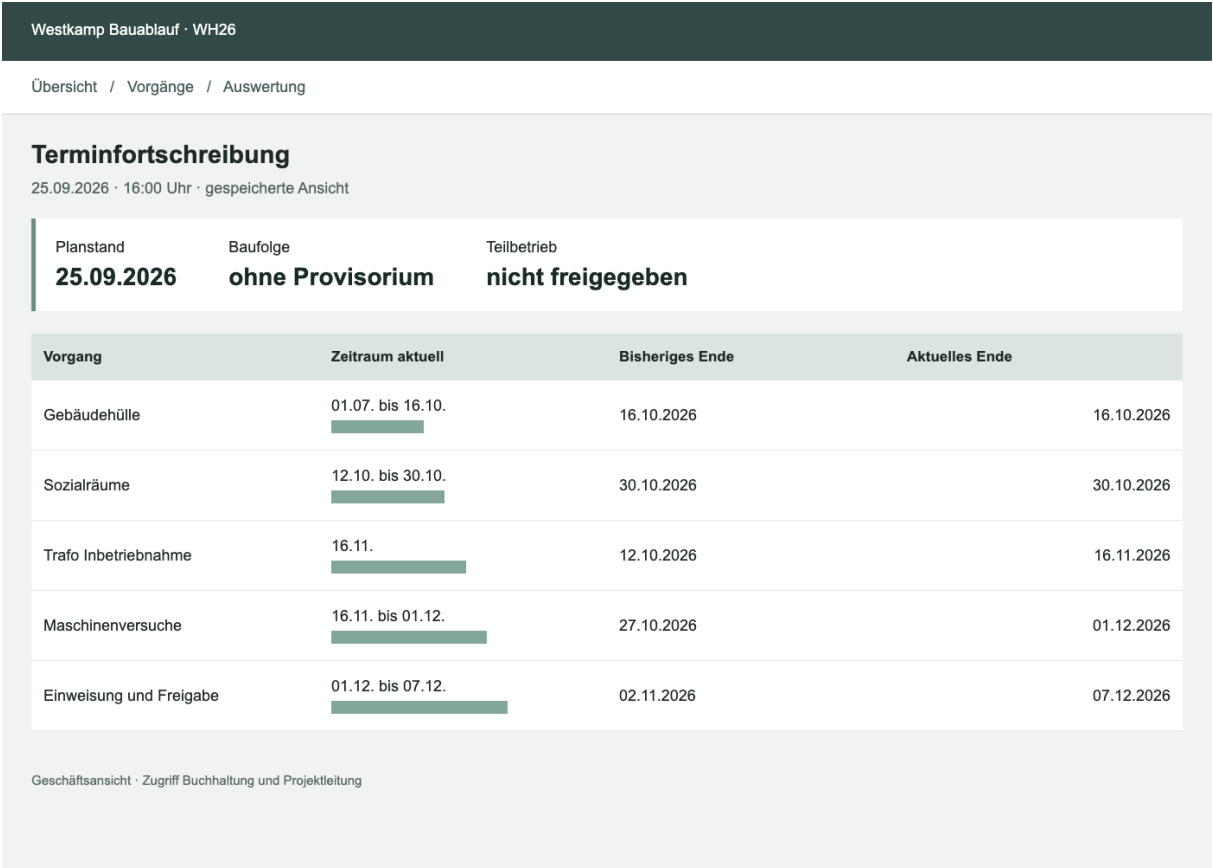

Bilddatei: 25_Bauterminansicht.png

09_Ablauf_und_Zahlungen.xlsx

WH26 Ablauf ohne mobiles Provisorium

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Vorgang	Planbeginn	Planende	Dauer Tage	Beginn aktuell	Ende aktuell	Tage später
Fundamente	2026-04-01	2026-05-08	37	2026-04-01	2026-05-08	0
Stahlmontage	2026-05-11	2026-09-18	130	2026-05-11	2026-09-18	0
Gebäudehülle	2026-07-01	2026-10-16	107	2026-07-01	2026-10-16	0
Sozialräume	2026-10-12	2026-10-30	18	2026-10-12	2026-10-30	0
Außenentwässerung	2026-10-12	2026-11-02	21	2026-10-12	2026-11-02	0
Dauerhafte Energie	2026-10-12	2026-10-12	0	2026-11-16	2026-11-16	35
Maschinenversuche	2026-10-12	2026-10-27	15	2026-11-16	2026-12-01	35
Einweisung und Freigabe	2026-10-27	2026-11-02	6	2026-12-01	2026-12-07	35

Maschinenversuche: Energie vorausgesetzt. Teilbetrieb mit mobiler Anlage nicht freigegeben.

Quellen: 07 Lieferfortschreibung, 08 Baubesprechung, 27 Baufolge. Tage sind Kalendertage.

WH26 Projektkonto und Zahlungsvorschau

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Monat	Anfang brutto	Zufluss brutto	Istrest netto	Neuleistung netto	Abfluss brutto	Ende brutto
2026-09	512,400.00	-	160,000.00	-	190,400.00	322,000.00
2026-10	322,000.00	400,000.00	-	260,000.00	309,400.00	412,600.00
2026-11	412,600.00	600,000.00	-	430,000.00	511,700.00	500,900.00
2026-12	500,900.00	-	-	316,000.00	376,040.00	124,860.00
Flüsse gesamt		1,000,000.00	160,000.00	1,006,000.00	1,387,540.00	

Restzahlung netto	1,166,000.00
Restzahlung brutto	1,387,540.00
Quelle brutto	1,387,540.00
Kontrollsumme	0.00

September beginnt am Kontostand 25.09.; der offene Abschlag wird vorsorglich vor Fälligkeit geplant.

Ohne unbestellte Zusatzangebote, Zinsen und Vorsteuererstattungen. Quelle: 21 Zahlungsplan, 30 Finanzierung.

WH26 Termin und Zahlungsansätze

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Ansatz	Wert	Einheit	Bezug
Dauerhafte Energie	2026-11-16	Datum	07 Lieferfortschreibung
Maschinenversuche	15	Kalendertage	27 Logistik Baufolge
Einweisung und Freigabe	6	Kalendertage	27 Logistik Baufolge
Konto am 25.09.	512,400.00	EUR brutto	24 Bankansicht / 30 Finanzierung
Umsatzsteuersatz	19.0%	Anteil	Bestellungen
Kranangebot	9,600.00	EUR netto	15 KM N03, nicht bestellt
Mobiles Angebot	36,000.00	EUR netto	18 MB 0925, nicht bestellt

10_Kostenfortschreibung.xlsx

WH26 Kostenfortschreibung

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk	Budget	Ist	Obligo	Unbestellt	Forecast	Abweichung
W01 Planung	120,000.00	95,000.00	23,000.00	-	118,000.00	(2,000.00)
W02 Erdarbeiten	180,000.00	180,000.00	10,000.00	-	190,000.00	10,000.00
W03 Tragwerk	640,000.00	480,000.00	150,000.00	-	630,000.00	(10,000.00)
W04 Hülle	420,000.00	200,000.00	205,000.00	15,000.00	420,000.00	-
W05 Technik	380,000.00	140,000.00	220,000.00	30,000.00	390,000.00	10,000.00
W06 Außenanlagen	180,000.00	-	150,000.00	35,000.00	185,000.00	5,000.00
W07 Ausstattung	140,000.00	30,000.00	70,000.00	25,000.00	125,000.00	(15,000.00)
W08 Baustelleneinrichtung	140,000.00	75,000.00	45,000.00	28,000.00	148,000.00	8,000.00
Summe	2,200,000.00	1,200,000.00	873,000.00	133,000.00	2,206,000.00	6,000.00

Unvergebene Reserve	100,000.00
Gesamtbudget	2,300,000.00
Abstand zum Budget	94,000.00
Belegkontrolle	0.00

Ohne KM N03 und MB 0925. Siehe Restkostenerhebung vom 25.09.2026.

Ist ist Leistungsaufwand, kein Zahlungsstand. Obligo ist bestellt abzüglich Ist.

Quellen: 04 Kostenrahmen, 11 Belegjournal, 12 Bestellbuch, 13 Restkostenerhebung.

WH26 verbindliche Vergaben

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk	Leistung	Bestellt	Bestandsdatum
W01	Planung	118,000.00	2026-08-31
W02	Erdarbeiten	190,000.00	2026-08-31
W03	Tragwerk	630,000.00	2026-08-31
W04	Hülle	405,000.00	2026-08-31
W05	Technik	360,000.00	2026-08-31
W06	Außenanlagen	150,000.00	2026-08-31
W07	Ausstattung	100,000.00	2026-08-31
W08	Baustelleneinrichtung	120,000.00	2026-08-31
Summe		2,073,000.00	

WH26 gebuchte Kostenbelege

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Beleg	Gewerk	Buchung	Netto	Umsatzsteuer	Brutto
WH-01-1	W01	2026-07-28	38,000.00	7,220.00	45,220.00
WH-01-2	W01	2026-08-28	57,000.00	10,830.00	67,830.00
WH-02-1	W02	2026-07-28	72,000.00	13,680.00	85,680.00
WH-02-2	W02	2026-08-28	108,000.00	20,520.00	128,520.00
WH-03-1	W03	2026-08-28	384,000.00	72,960.00	456,960.00
WH-03-2	W03	2026-09-25	96,000.00	18,240.00	114,240.00
WH-04-1	W04	2026-08-28	136,000.00	25,840.00	161,840.00
WH-04-2	W04	2026-09-25	64,000.00	12,160.00	76,160.00
WH-05-1	W05	2026-07-28	54,000.00	10,260.00	64,260.00
WH-05-2	W05	2026-08-28	86,000.00	16,340.00	102,340.00
WH-07-1	W07	2026-07-28	12,000.00	2,280.00	14,280.00
WH-07-2	W07	2026-08-28	18,000.00	3,420.00	21,420.00
WH-08-1	W08	2026-07-28	42,000.00	7,980.00	49,980.00
WH-08-2	W08	2026-08-28	33,000.00	6,270.00	39,270.00
Summe			1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00

WH26 unbestellte Restleistungen

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk		Leistung	Nettoansatz
W01	Planung		-
W02	Erdarbeiten		-
W03	Tragwerk		-
W04	Hülle		15,000.00
W05	Technik		30,000.00
W06	Außenanlagen		35,000.00
W07	Ausstattung		25,000.00
W08	Baustelleneinrichtung		28,000.00
Summe			133,000.00

01_Projektauftrag_Werkhalle.docx

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Jana Feldkamp
Projektcontrolling

Warendorf, 25. September 2026

Werkhalle Warendorf

1 Anlass und Umfang

Unsere neue Werkhalle mit 1.800 Quadratmetern soll zwei vorhandene CNC-Linien und die Warenausgabe aufnehmen. Wir sind ein inhabergeführter Metallverarbeiter mit 68 Beschäftigten. Bauherrin ist allein die Hagedorn Präzisionsteile GmbH; es gibt keine öffentliche Förderung und keine Vergabe durch eine öffentliche Stelle. Das Grundstück gehört uns bereits und liegt außerhalb des Bauinvestitionsbudgets.

2 Stand der Steuerung

Der Beschluss vom 12. Januar erlaubt 2.300.000,00 EUR netto einschließlich 100.000,00 EUR nicht vergebener Reserve. Die Kostenblätter schließen am 25. September um 16:00 Uhr. Istkosten sind gebuchte Nettoleistungen, nicht Bankabgänge. Verbindliche Bestellungen und zusätzliche, noch unbestellte Restleistungen werden getrennt geführt. Maschinenkauf, Finanzierungskosten und laufende Produktion sind nicht Bestandteil dieser Kostenstelle.

3 Anstehende Entscheidung

Die Trafostation kommt nach heutiger Mitteilung erst am 9. November. Der bisher vorgesehene Produktionsanlauf am 2. November ist damit nicht gesichert. Westkamp bietet eine geänderte Baufolge an; Elektro Breden hat eine zeitlich begrenzte Versorgung angeboten. Die Leistung dieser Versorgung reicht nicht für beide CNC-Linien gleichzeitig. Die Entscheidung liegt bei mir. Bis zur Besprechung am 28. September um 10:00 Uhr ist keine Variante freigegeben.

Bitte führen Sie die laufende Kosten- und Terminübersicht für die Geschäftsführung fort. Eine Erhöhung des Gesamtbudgets oder die Anerkennung des Kranangebots ist damit nicht verbunden. Verhandlungen über Ansprüche gegenüber Lieferanten führt ausschließlich die Geschäftsführung nach gesonderter Abstimmung.

Maren Hagedorn
Geschäftsführerin

03_Hallenbauvertrag.docx

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Beckum und Warendorf, 19. Februar 2026

Vertrag über Tragwerk und Gebäudehülle

1 Gegenstand

Westkamp Hallenbau GmbH errichtet auf dem Grundstück Werkstraße 18 das Stahltragwerk, Dach und Außenwände der 1.800 Quadratmeter großen Werkhalle gemäß Plan WH-04 vom 10. Februar 2026. Zum Tragwerk gehören Fundamente, Stützen, Binder und Aussteifung. Die Gebäudehülle umfasst gedämmte Dach- und Wandpaneele, vier Sektionaltore, Lichtbänder und die Dachentwässerung bis zum Übergabepunkt. Technische Gebäudeausrüstung, Stromversorgung, Außenanlagen und Maschinenmontage sind nicht enthalten.

2 Vergütung und Zahlungen

Die Vergütung beträgt für das Tragwerk 630.000,00 EUR netto und für die Hülle 405.000,00 EUR netto. Umsatzsteuer wird mit 19 Prozent gesondert ausgewiesen. Abschlagsrechnungen weisen den bis zum Stichtag ausgeführten Leistungswert sowie sämtliche vorausgegangenen Rechnungen und Zahlungen aus. Die Bauleitung bestätigt die Mengen. Zahlungen sind 14 Kalendertage nach Eingang der prüfbaren Rechnung zu leisten. Es ist weder Skonto noch ein laufender Sicherheitseinbehalt vereinbart.

3 Ablauf und Schnittstellen

Die Montage beginnt am 11. Mai. Die Halle soll am 16. Oktober wetterdicht und für den Innenausbau zugänglich sein. Die Bauherrin stellt ab dem 12. Oktober die vereinbarte elektrische Anschlussleistung bereit. Die für Maschinenversuche erforderliche Leistung von 450 kVA ist keine Leistung von Westkamp. Behinderungen und mögliche Umstellungen sind am selben Arbeitstag der Bauleitung mitzuteilen; daraus folgt noch keine zusätzliche Vergütungsfreigabe.

4 Änderungen

Zusätzliche Leistungen werden vor Ausführung mit Beschreibung, Preis und Auswirkung auf die Termine angeboten. Die Bauherrin erteilt den Auftrag schriftlich durch ihre Geschäftsführerin. Terminprotokolle ersetzen keine Preisvereinbarung. Teilflächen dürfen nach Abstimmung vorab genutzt werden; hierdurch wird weder eine Schlussabnahme erklärt noch eine fehlende Prüfung ersetzt.

Für Westkamp: Henrik Westkamp. Für Hagedorn: Maren Hagedorn. Beide Parteien haben die Vertragsfassung am 19. Februar 2026 unterzeichnet.

08_Baubesprechung_25_09.docx

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

Teilnehmer: Maren Hagedorn, Henrik Westkamp, Nils Breden, Leon Rensing

25. September 2026, 08:30 bis 09:20 Uhr

Baubesprechung Werkhalle

1 Baufortschritt

Die Stahlmontage ist bis Achse 8 abgeschlossen. Zwei Tore werden am 30. September gesetzt. Die Abdichtung des letzten Lichtbandes ist für den 2. Oktober vorgesehen. Westkamp hält den Termin für die wetterdichte Hülle am 16. Oktober weiterhin für erreichbar. Die Mengen für den Septemberabschlag sind am 23. September gemeinsam aufgenommen worden.

2 Energie und Baufolge

Breden nennt den 9. November für die Anlieferung und den 16. November für die Inbetriebnahme. Der bisherige Plan sieht Energie am 12. Oktober und Maschinenversuche bis 27. Oktober vor. Westkamp kann ohne dauerhafte Energie zuerst die Sozialräume und Außenentwässerung fertigstellen. Für die CNC-Versuche bleibt eine leistungsfähige Versorgung erforderlich.

3 Kran und Nachtrag

Kranservice Münsterland verlangt zwölf zusätzliche Miettage und einen weiteren Umsetzungsvorgang. Rensing bestätigt vier ausgeführte Tage mit Hubbedarf bis heute. Vier weitere Einsatztage sind erst disponiert. Der Nachweis sieht für vier zusätzliche Tage ausschließlich Bereitstellung vor. Ob diese Standtage zu vergüten sind, ist zwischen Einkauf und Vermieter noch nicht abschließend abgestimmt. Eine Preisfreigabe wurde heute nicht erteilt.

4 Festgehaltener Stand

Die Geschäftsführerin entscheidet nach Eingang der aktualisierten Anschlussbestätigung am 28. September. Eine Vollversorgung beider Linien über das Provisorium wurde von keinem Teilnehmer zugesagt. Das Protokoll dokumentiert den Gesprächsstand und verändert keine Bestellung.

Jana Feldkamp

Versandt an die Teilnehmer am 25. September, 11:10 Uhr

13_Restkostenerhebung.docx

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

Geschäftsführung Hagedorn Präzisionsteile GmbH

25. September 2026

Restleistungen nach den bestehenden Bestellungen

Die folgenden Nettoansätze betreffen Leistungen, die noch nicht bestellt sind. Sie enthalten keine offenstehenden Leistungen aus den bestehenden Aufträgen. Das Bestellbuch erfasst die bereits gebundenen Summen vollständig. Die Restkostenerhebung ergänzt diese Beträge und ersetzt nicht die noch ausstehenden Rechnungen.

Für die Hülle fehlen 15.000,00 EUR für zusätzlich gewünschte Innenverkleidung an den Toren. Technik enthält 30.000,00 EUR für die noch zu vergebende Druckluftverteilung. Außenanlagen benötigen weitere 35.000,00 EUR für die Zufahrt im Norden. Die Ausstattung enthält 25.000,00 EUR für die Werkbänke. Die Baustelleneinrichtung benötigt 28.000,00 EUR für planmäßigen Rückbau, Endreinigung und die bereits kalkulierte verlängerte Bauüberwachung. Zu Planung, Erdarbeiten und Tragwerk werden derzeit keine unbestellten Restleistungen erwartet.

Die Ansätze beruhen auf der Mengenrunde vom 23. September. Sie umfassen zusammen 133.000,00 EUR. Die umstrittene Kranforderung von 9.600,00 EUR und das mobile Stromangebot von 36.000,00 EUR sind darin nicht enthalten. Beide Beträge bleiben bis zur Entscheidung gesondert. Die Reserve von 100.000,00 EUR ist weder verbraucht noch nochmals als Restkosten aufzuschlagen.

Jana Feldkamp
Projektcontrolling

27_Logistik_Baufolge.docx

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

25. September 2026

Baufolge bei späterer Stromversorgung

1 Verfügbare Arbeitsbereiche

Die Sozialräume können mit dem bestehenden Baustrom fertiggestellt werden. Ab 12. Oktober lassen sich dort Türen, Sanitärobjekte und Oberflächen bearbeiten. Die Außenentwässerung kann parallel außerhalb der späteren Tiefladerzufahrt ausgeführt werden. Die Nordzufahrt muss ab 6. November für die Station frei bleiben; dort lagern zurzeit Paneelpakete.

2 Maschinenbereich

Die Maschinen lassen sich mechanisch aufstellen, solange keine elektrische Inbetriebnahme erfolgt. Der Maschinenbauer benötigt nach bestätigter Energieversorgung 15 Kalendertage für die Versuche; anschließend sind sechs Kalendertage für Einweisung und Produktionsfreigabe eingeplant. Ohne Provisorium ergibt sich aus dem Energieansatz 16. November ein geplanter Anlauf am 7. Dezember. Das ist eine Bauablaufannahme, keine Terminbestätigung des Maschinenbauers.

3 Provisorium

Bei einer ab 12. Oktober freigegebenen mobilen Versorgung könnte zunächst nur Linie 1 erprobt werden. Linie 2 folgt nach dem dauerhaften Netzanschluss. Die Arbeitsbereiche lassen sich absperren, ohne die Fluchtwege zu beeinträchtigen. Elektro Breden muss zuvor die Leitungswege und den sicheren Umschaltvorgang planen. Eine Bestellung der Anlage lässt sich aus diesem Ablaufvorschlag nicht ableiten.

Henrik Westkamp
Projektleiter

02_Budgetbeschluss.pdf

Investitionsfreigabe Werkhalle

Die Geschäftsführung genehmigt die nachfolgende Kostenplanung für den Neubau. Alle Werte verstehen sich netto; die Gesellschaft nutzt die Halle ausschließlich für ihre umsatzsteuerpflichtige Fertigung. Grundstück und Maschinen bleiben im bestehenden Anlagenplan.

Die Reserve ist kein Auftrag und keine bereits erwartete Ausgabe. Einzelbeauftragungen bis 25.000,00 EUR innerhalb eines freigegebenen Gewerks zeichnet die Projektleitung gemeinsam mit dem Einkauf. Zusatzleistungen außerhalb der Vergabesumme sowie jede Entnahme aus der Reserve bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführerin. Die Mittelbereitstellung erfolgt aus Eigenmitteln und dem Investitionskredit gemäß gesondertem Finanzierungsplan.

Gezeichnet: Maren Hagedorn, Geschäftsführerin. Jana Feldkamp hat den Beschluss am 13. Januar in das Projektregister übernommen.

Kostenbereich	EUR netto
Planung	120.000,00
Erdarbeiten	180.000,00
Tragwerk	640.000,00
Hülle	420.000,00
Technik	380.000,00
Außenanlagen	180.000,00
Ausstattung	140.000,00
Baustelleneinrichtung	140.000,00
Reserve	100.000,00
Gesamtfreigabe	2.300.000,00

05_Bestellung_Trafostation.pdf

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

18. März 2026

Bestellung EB 260318

Wir bestellen die betriebsfertige Trafostation 630 kVA einschließlich Aufstellung, Kabelanschluss und Schutzprüfung für 180.000,00 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Die Station ist Bestandteil der Vergabesumme Technik von 360.000,00 EUR netto; sie darf dort nicht ein zweites Mal angesetzt werden.

Die Lieferung ist für den 5. Oktober, die Inbetriebnahme für den 12. Oktober 2026 vereinbart. Die Abschlagsstufen betragen 54.000,00 EUR netto nach bestätigter Fertigungsfreigabe, 90.000,00 EUR nach Lieferung und 36.000,00 EUR nach dokumentierter Inbetriebnahme. Bis 25. September wurden 54.000,00 EUR fakturiert und bezahlt. Dieser Betrag ist im Ist des Gewerks W05 enthalten.

Die Bestellung umfasst keine mobile Ersatzversorgung. Eine solche Versorgung wäre gesondert anzubieten und durch Maren Hagedorn zu beauftragen. Die Zufahrt für den Tieflader muss spätestens zwei Arbeitstage vor Anlieferung frei sein.

Auftragsannahme durch Elektro Breden am 21. März: Preis, Liefertermin und Zahlungsstufen bestätigt.
Einkauf: Leon Rensing.

07_Lieferfortschreibung.pdf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Lieferfortschreibung zur Station EB 260318

Der Hersteller hat die Endprüfung der Schaltanlage wegen einer noch fehlenden Schutzbaugruppe auf den 5. November verschoben. Wir reservieren den Tieflader für den 9. November und zwei Montageteams für den 10. bis 13. November. Den bisherigen Liefertermin 5. Oktober können wir nicht halten.

Die Inbetriebnahme ist jetzt für den 16. November vorgesehen, sofern die Netzfregabe vorliegt. Der Preis der bestellten Anlage und die Abschlagsstufen bleiben nach unserer Kalkulation unverändert. Eine mobile Anlage ist darin nicht enthalten. Zum rechtlichen Umgang mit der Terminverschiebung enthält dieses Schreiben keine Vereinbarung.

Unser Disponent bestätigt den Transport am 30. Oktober erneut. Bis dahin bleibt der genannte Termin eine Herstellerzusage, keine bereits erfolgte Lieferung.

Nils Breden
Geschäftsführer

14_Kranmietvereinbarung.pdf

Kranservice Münsterland GmbH
Am Hafen 17, 48155 Münster

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

7. Mai 2026

Mietvereinbarung KM 260511

Wir stellen vom 11. Mai bis 18. September einen Turmdrehkran mit 45 Metern Ausladung auf der Baustelle WH26 bereit. Der Grundpreis einschließlich Aufbau, Abbau und Erstprüfung beträgt 42.000,00 EUR netto. Die Bedienung durch unterwiesenes Personal der Bauunternehmen ist im Grundpreis nicht enthalten. Die Gesellschaft bleibt Mieterin; Westkamp meldet den Einsatzbedarf.

Eine schriftlich vereinbarte Verlängerung kostet 650,00 EUR netto je zusätzlichem Mietwerktag. Samstage und Sonntage werden nicht berechnet. Ein zusätzlich beauftragtes Umsetzen innerhalb der Baustelle kostet 1.800,00 EUR netto. Unvereinbarte Standzeiten und reine Einsatzmeldungen werden vor Rechnungsstellung mit dem Einkauf abgestimmt.

Der Grundpreis ist vollständig im Bestellbuch W08 erfasst. Eine Verlängerung ist zum Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht bestellt. Rückgabe und Abbau sind drei Werktage vorher telefonisch anzumelden und schriftlich zu bestätigen.

Für den Vermieter: Anja Kortmann. Für die Mieterin: Leon Rensing und Jana Feldkamp.

15_Nachtragsangebot_Kran.pdf

Kranservice Münsterland GmbH
Am Hafen 17, 48155 Münster

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Angebot KM N03 zur Verlängerung

Wir bieten die Verlängerung um zwölf Mietwerktage vom 21. September bis 6. Oktober sowie ein zusätzliches Umsetzen an. Die Berechnung erfasst auch Tage, an denen der Kran für Sie bereitsteht, aber kein Hub angefordert wird. Die Verlängerung wird erst nach Ihrer schriftlichen Annahme verbindlich.

Unser Disponent hat den ursprünglich geplanten Abbau am 18. September aufgrund der telefonischen Baustellenmeldung zurückgestellt. Wir können den Kran nicht tageweise zwischenvermieten. Bitte teilen Sie uns bis 28. September mit, ob der Abbau nun für den 7. Oktober eingeplant werden soll. Das Angebot ist keine Rechnung und enthält keine Zahlungsaufforderung.

Anja Kortmann
Disposition und Vermietung

Leistung	Menge	Einzelpreis EUR	Netto EUR
Mietwerktage	12	650,00	7.800,00
Umsetzen	1	1.800,00	1.800,00
Summe netto			9.600,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			1.824,00
Gesamt			11.424,00

16_Kran_Einsatznachweis.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Einkauf Hagedorn Präzisionsteile GmbH

25. September 2026

Disposition Kranverlängerung

Die Bauleitung hat die zusätzlichen Mietwerkzeuge wie folgt disponiert. Nur die bis zum 25. September erfassten Hube sind ausgeführt; die späteren Termine sind Bedarfsmeldungen. Die Unterschrift bestätigt die Disposition, nicht die Preisvereinbarung mit dem Vermieter.

Für den 22. September ist der Umsetzungsvorgang durch den Polier bestätigt. Die vier Tage ohne Hubbedarf sind weiterhin als Standtage eingeplant. Ob der Lieferant diese im Angebot berechnet, entscheidet nicht die Bauleitung.

Ralf Thiele
Polier Westkamp

Datum	Hubbedarf	Stand
21.09.2026	ja	ausgeführt
22.09.2026	ja, Umsetzen	ausgeführt
23.09.2026	nein	Standtag
24.09.2026	ja	ausgeführt
25.09.2026	ja	ausgeführt
28.09.2026	nein	geplant
29.09.2026	ja	geplant
30.09.2026	ja	geplant
01.10.2026	nein	geplant
02.10.2026	ja	geplant
05.10.2026	ja	geplant
06.10.2026	nein	geplant

18_Angebot_Mobilversorgung.pdf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

25. September 2026

Mobile Stromversorgung MB 0925

Wir bieten eine mobile Versorgung vom 12. Oktober bis einschließlich 22. November für sechs Wochen an. Die maximale nutzbare Leistung beträgt 250 kVA. Damit kann eine CNC-Linie einschließlich der notwendigen Nebenaggregate erprobt und im reduzierten Betrieb genutzt werden. Ein gleichzeitiger Betrieb beider Linien mit zusammen 450 kVA ist ausgeschlossen.

Das Angebot umfasst Anlieferung, Aufbau, Schutzprüfung, Rückbau und die sechs Wochen Miete. Der kalkulierte Betriebsstoffbedarf ist als Pauschale für den vereinbarten Einschichtbetrieb enthalten. Mehrschichtbetrieb und längere Nutzung wären neu zu kalkulieren. Die endgültige Anschlussprüfung am Einspeisepunkt und die Freigabe des Netzbetreibers stehen noch aus.

Wir halten die Anlage bis 28. September um 14:00 Uhr unverbindlich verfügbar. Beauftragung und 30 Prozent Abschlag sind nach schriftlicher Annahme vorgesehen, der Rest nach Rückbau. Dies ist ein Angebot und keine bereits ausgelöste Zahlung.

Nils Breden

Position	EUR netto
Transport und Aufbau	6.000,00
Sechs Wochen Miete zu 4.000 EUR	24.000,00
Prüfung und Rückbau	3.000,00
Betriebsstoffpauschale	3.000,00
Summe netto	36.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	6.840,00
Gesamt	42.840,00

22_Abschlagsrechnung_September.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum
Steuernummer 304/5872/2109

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Abschlagsrechnung WH 260924

Für Tragwerk und Gebäudehülle rechnen wir den gemeinsam am 23. September aufgenommenen Leistungsstand ab. Leistungszeitraum dieser Abschlagsstufe: 1. bis 23. September 2026. Die kumulierten Beträge enthalten die bisherigen Abschlagsrechnungen. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Die bis August berechneten 520.000,00 EUR netto sind vollständig bezahlt. Für die Septemberstufe ergibt sich der nachstehende Zahlbetrag. Er ist am 8. Oktober ohne Abzug auf unser bekanntes Geschäftskonto zu leisten. Die Leistung ist im Septemberjournal in W03 mit 96.000,00 EUR und W04 mit 64.000,00 EUR enthalten; die übrigen Augustbuchungen wurden bei der Leistungsfortschreibung übernommen.

Henrik Westkamp
Geschäftsführer

Berechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Leistung kumuliert	680.000,00	129.200,00	809.200,00
Bisher berechnet und bezahlt	520.000,00	98.800,00	618.800,00
Aktueller Abschlag	160.000,00	30.400,00	190.400,00

23_Leistungsstand_Halle.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

23. September 2026

Leistungsfeststellung Tragwerk und Hülle

Die gemeinsam aufgenommenen Mengen ergeben den folgenden kumulierten Wert. Tragwerk ist zu 480.000,00 EUR netto ausgeführt; Gebäudehülle zu 200.000,00 EUR. Der Wertnachweis ist Grundlage der Abschlagsrechnung WH 260924. Er umfasst keine technische Gebäudeausrüstung und keine Kranmietverlängerung.

Die Augustzwischenstände wurden für die Rechnung mit 384.000,00 EUR Tragwerk und 136.000,00 EUR Hülle zugrunde gelegt. Die Septemberzunahme beträgt damit 96.000,00 EUR und 64.000,00 EUR. Die Feststellung von Mengen und Leistungswerten stellt keine Abnahme der gesamten Halle dar. Dichtheitsprüfung, Toreinstellung und Dokumentation stehen noch aus.

Bestätigt für Westkamp: Henrik Westkamp. Bestätigt für die Bauherrin: Jana Feldkamp.

Leistung	Auftrag netto EUR	Erbracht netto EUR
Tragwerk	630.000,00	480.000,00
Gebäudehülle	405.000,00	200.000,00
Summe	1.035.000,00	680.000,00

28_Elektro_Schnittstellen.pdf

Elektro Breden GmbH
Projektleitung WH26

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

22. September 2026

Anschlusswerte der Fertigung

Die beiden Fertigungslinien benötigen einschließlich Absaugung und Kühleinrichtungen gemeinsam 450 kVA. Linie 1 ist mit 220 kVA einschließlich ihrer Nebenaggregate angesetzt. Für die allgemeinen Hallenverbraucher sind weitere 20 kVA vorgesehen. Eine mobile Versorgung mit 250 kVA kann daher Linie 1 mit den Hallenverbrauchern versorgen, nicht beide Fertigungslinien.

Die Angaben beruhen auf den Geräteblättern des Maschinenbauers vom 17. September. Anlaufströme und Schutzkoordination sind vor Anschluss gesondert zu prüfen. Der mobile Aufbau darf nicht parallel zum Netz betrieben werden. Ein verbindlicher Anschlussplan ist noch nicht gezeichnet.

Nils Breden
Elektroplanung

Verbraucher	Planleistung kVA
Linie 1 einschließlich Nebenaggregate	220
Linie 2 einschließlich Nebenaggregate	230
Allgemeine Hallenverbraucher	20
