

VERGABEAKTE

Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Aktenzeichen	HB-STH-2026-019
Auftraggeber	Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau
Vorhaben	Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Interne Projekttakte HM-2026-BAU-018

Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

1. Eingang

Die Bekanntmachung 2026/S 132-345678 wurde am 15.06.2026 in TED gefunden und am 16.06.2026 vollständig aus der Plattform geladen. Die Angebotsfrist endet am 15.07.2026 um 12:00 Uhr.

2. Erste Risikopunkte

Punkt	Bewertung	Folge
Markenbezug Dachfenster	Velux ohne Zusatz gleichwertig	Rüge vorbereiten
Referenzhöhe	drei Referenzen je 10 Mio. EUR bei Schätzwert 8.5 Mio. EUR	Verhältnismäßigkeit prüfen
Bauzeit	14 Monate bei laufendem Veranstaltungsbetrieb	Bauablaufplan erforderlich
GAEB-Datei	X83 vorhanden, Mengen plausibel	Import in Kalkulationssystem

3. Fristen

Der Markenbezug ist erst aus den Vergabeunterlagen erkennbar. Er muss deshalb nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden. Die Rüge wird zur Risikominimierung bereits am 20.06.2026 erhoben; die Zehn-Kalendertage-Frist der Nr. 1 ist für diesen Unterlagenverstoß nicht der maßgebliche Endtermin.

Geschäftsführung und Kalkulation

Prüfbericht Vergabeunterlagen Stadthalle Musterstadt

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Prüfbericht Vergabeunterlagen Stadthalle Musterstadt

1. Leistungsverzeichnis

Die GAEB-X83-Datei enthält 186 Positionen. Kritisch sind Dachfenster, Brandschutzbekleidungen und Schnittstellen zur technischen Gebäudeausrüstung. Die Mengen erscheinen in drei Positionen unplausibel und werden über Bieterfrage aufgeklärt.

2. Vergaberechtliche Angriffspunkte

Der Markenbezug bei Dachfenstern ist nicht begründet. Ein Zusatz oder gleichwertig fehlt. Für diese EU-Bauvergabe ist § 7 EU Abs. 2 VOB/A die unmittelbare Regel: Ein Fabrikat darf nur ausnahmsweise genannt werden, wenn der Auftragsgegenstand sonst nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Nennung ist mit oder gleichwertig zu öffnen.

Die Referenzanforderung von jeweils mindestens 10 Mio. EUR ist bei einem geschätzten Auftragswert von 8.5 Mio. EUR voraussichtlich überzogen. Sachgerecht wäre eine Bandbreite, die vergleichbare Komplexität, Gebäudetyp und Bauablauf statt starrer Übergroße bewertet.

3. Angebotstechnische Maßnahmen

1. GAEB X83 importieren und Positionslücken prüfen.
2. Bepreistes Angebot als X84 erzeugen.
3. Alternativprodukt Dachfenster technisch dokumentieren.
4. Rüge vor Angebotsabgabe einreichen.
5. Nach Nichtabhilfe Nachprüfungsantrag vorbereiten.

Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau

Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Hochbau Mustermann GmbH rügen wir die Leistungsbeschreibung im Verfahren Sanierung Stadthalle Musterstadt, TED 2026/S 132-345678.

Die Rüge erfolgt nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB vor Ablauf der Angebotsfrist, weil der beanstandete Markenbezug aus den Vergabeunterlagen erkennbar ist.

1. Gerügter Vergabeverstoß

In Position 03.02.140 verlangt das Leistungsverzeichnis ausdrücklich Velux-Dachfenster Typ GGU MK08 ohne Zusatz oder gleichwertig und ohne technische Begründung. Die Leistung kann durch Maße, Material, Wärmedurchgang, Brandschutzanforderungen, Öffnungsart und Zubehör produktneutral beschrieben werden.

2. Rechtliche Bewertung

Die Vorgabe verletzt § 7 EU Abs. 2 VOB/A und den Gleichbehandlungsgrundsatz aus § 97 Abs. 2 GWB. Ein bestimmtes Fabrikat darf nur ausnahmsweise genannt werden, wenn der Auftragsgegenstand anders nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Nennung ist mit oder gleichwertig zu öffnen. Das ist hier nicht geschehen.

3. Abhilfeverlangen

Wir bitten um Änderung des Leistungsverzeichnisses, Aufnahme einer Gleichwertigkeitsklausel, Veröffentlichung einer Bieterinformation und angemessene Verlängerung der Angebotsfrist.

Mit freundlichen Grüßen

Hochbau Mustermann GmbH

Klaus Mustermann

Hochbau Mustermann GmbH

Nichtabhilfe zur Rüge Dachfenster Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Nichtabhilfe zur Rüge Dachfenster Stadthalle

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Rüge vom 20.06.2026 wird zurückgewiesen.

Begründung

Die ausgeschriebenen Dachfenster seien nach Auffassung der Vergabestelle wegen der vorhandenen Dachkonstruktion erforderlich. Die Planerin habe mitgeteilt, dass nur das genannte Produkt in den vorhandenen Anschlussdetails ohne Neuplanung eingesetzt werden könne.

Aktennotiz Bieterseite

Die Begründung bleibt angreifbar. Die Vergabestelle legt keine technische Dokumentation vor und prüft keine gleichwertigen Produkte. Die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB läuft ab Zugang der Nichtabhilfe. Der Nachprüfungsantrag muss spätestens am 10.07.2026 eingehen.

Vergabekammer des Landes Musterland

Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Anträge

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, den Zuschlag auf Grundlage der unveränderten Vergabeunterlagen zu erteilen.
2. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, das Leistungsverzeichnis produktneutral zu fassen oder die Produktvorgabe nachvollziehbar zu begründen.
3. Die Angebotsfrist ist nach Korrektur angemessen zu verlängern.

Zulässigkeit

Die Antragstellerin ist interessierte Bieterin und durch die Produktvorgabe in ihren Zuschlagschancen beeinträchtigt. Die Rüge vom 20.06.2026 war rechtzeitig. Die Nichtabhilfe datiert vom 25.06.2026; die Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist gewahrt.

Begründetheit

Der Markenbezug ohne Gleichwertigkeitsöffnung beschränkt den Wettbewerb. Die Vergabestelle hat keine tragfähige technische Alleinstellung dokumentiert. Die pauschale Berufung auf Anschlussdetails ersetzt keine vergaberechtskonforme Prüfung.

Eilbedürftigkeit

Ohne Zuschlagssperre droht der Zuschlag trotz rechtswidriger Unterlagen. Die Antragstellerin kann ein wertbares Angebot nur abgeben, wenn gleichwertige Dachfenster zugelassen oder die Produktvorgabe rechtmäßig begründet wird.

Interne Projektakte HM-2026-BAU-018

Formcheck Angebotsabgabe Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Formcheck Angebotsabgabe Stadthalle

Prüfschritt	Status	Bemerkung
GAEB X84 erzeugt	erledigt	Export aus Kalkulationssystem am 14.07.2026
Angebotsschreiben	erledigt	Textform, vertretungsberechtigte Person benannt
Eignungsnachweise	erledigt	PQ-VOB plus drei Projektreferenzen
Bieterfragen berücksichtigt	erledigt	Antworten 1 bis 6 eingearbeitet
Rügefögen	offen	Angebot wird hilfsweise auf Basis der unveränderten Unterlagen abgegeben
Geschäftsgeheimnisse markiert	erledigt	Kalkulationsblatt intern, nicht als Anlage hochgeladen

Abgabevermerk

Die elektronische Angebotsabgabe soll spätestens am 15.07.2026 um 10:00 Uhr abgeschlossen sein. Upload, Signatur/Textform und Empfangsbestätigung werden als PDF in der Projektakte abgelegt.

Vergabekammer des Landes Musterland

Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag Dachsanierung Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag Dachsanierung Stadthalle

Anträge

Die Antragsgegnerin beantragt,

- 1. den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen;
- 2. hilfsweise eine etwaige Beanstandung durch eine produktneutrale Berichtigung der Position 03.02.140 und eine angemessene Verlängerung der Angebotsfrist zu beheben;
- 3. der Antragsgegnerin zu gestatten, die Angebotsprüfung im Übrigen fortzuführen, ohne vor einer Entscheidung der Vergabekammer den Zuschlag zu erteilen.

Verfahrensstand

Die Antragstellerin rügte am 20.06.2026 die Bezeichnung des Dachfenstersystems „Velux GGL 3066“ ohne ausdrücklichen Gleichwertigkeitszusatz. Die Nichtabhilfe ging ihr am 25.06.2026 über die Vergabepattform zu. Der Nachprüfungsantrag wurde der Stadt am 06.07.2026 übermittelt. Ein Zuschlag ist nicht erteilt.

Sachlicher Grund der Ausgangsfassung

Das Bestandsdach enthält Anschlüsse und Eindeckrahmen des genannten Systems. Das beauftragte Planungsbüro ging davon aus, dass dessen Bezeichnung die Schnittstellenrisiken für Abdichtung, Innenfutter und Wartung eindeutig beschreibt. Ein Beschluss, ausschließlich Produkte dieses Herstellers zuzulassen, ist in der Vergabeakte nicht dokumentiert.

Die Stadt räumt ein, dass der technische Zweck genauer und produktneutral hätte beschrieben werden können. Maßgeblich sind lichte Öffnung, Einbaumaß, Anschluss an die vorhandene Unterspannbahn, Schlagregendichtheit, Wärmedurchgangskoeffizient und die Übernahme der Gewährleistung für den Gesamtanschluss.

Rechtliche Würdigung

§ 7 EU VOB/A verlangt eine eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung. Produktbezeichnungen dürfen den Wettbewerb nicht ohne sachlichen Grund verengen; soweit eine Bezugnahme ausnahmsweise erforderlich ist, muss Gleichwertigkeit eröffnet und anhand überprüfbarer Merkmale bewertet werden. Die Dokumentation muss erkennen lassen, ob ein behaupteter technischer Grund tatsächlich vorlag.

Die Stadt hält eine vollständige Aufhebung des Verfahrens nicht für erforderlich. Eine Berichtigung der Position, die Veröffentlichung einer Gleichwertigkeitsmatrix und eine Fristverlängerung würden einen möglichen Verstoß beseitigen, ohne andere Teile des Leistungsverzeichnisses zu verändern.

Beweismittel

Anlage	Inhalt	Aussage
AG 1	Bestandsplan Dachfläche D-04	Lage und Maße der vorhandenen Öffnungen
AG 2	Planer-E-Mail vom 28.04.2026	Ursprung der Produktbezeichnung
AG 3	Detailzeichnung Anschluss 5.2	Anforderungen an Abdichtung und Innenfutter
AG 4	Entwurf Berichtigung Position 03.02.140	produktneutrale Mindestmerkmale und Nachweisweg

Vorgeschlagene Abhilfe

Die Stadt ist bereit, die Position durch folgende Regel zu ersetzen: Zugelassen ist das benannte Referenzprodukt oder ein technisch gleichwertiges Dachfenstersystem. Die Gleichwertigkeit ist mit Produktdatenblatt, maßstäblichem Anschlussdetail und einer Erklärung zur einheitlichen Gewährleistung nachzuweisen. Über die Gleichwertigkeit wird vor Ablauf der neu festzusetzenden Angebotsfrist auf eine rechtzeitig gestellte Bieterfrage entschieden.

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle

Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

Prüfauftrag

Geprüft wird, welche technischen Merkmale für den Anschluss der zwölf Dachfenster an den Bestand erforderlich sind und ob das von der Hochbau Mustermann GmbH benannte System Altura AX-78 bei Vorlage ergänzender Unterlagen grundsätzlich gleichwertig sein kann. Eine fabrikatsbezogene Freigabe ist nicht Gegenstand dieses Vermerks.

Mindestmerkmale

Merkmal	Technisches Mindestniveau	Nachweis	Bedeutung für Bestand
Außenmaß	780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm	bemaßte Werkzeichnung	vorhandene Sparrenöffnung bleibt nutzbar
Wärmedurchgang	Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin	Datenblatt oder Prüfzeugnis	Einhaltung Energiekonzept
Schlagregendichtheit	Systemprüfung für Dachneigung 35 Grad	Prüfbericht	Schutz der Innenbekleidung
Anschluss	Eindeckrahmen und Unterdachanschluss als abgestimmtes System	Detail und Montageanleitung	keine offene Haftungsschnittstelle
Ersatzteile	Lieferbarkeit für mindestens zehn Jahre	Herstellereklärung	Betrieb und Instandhaltung
Gewährleistung	ein verantwortlicher Auftragnehmer für Fenster und Anschluss	Bietererklärung	Vermeidung geteilter Verantwortlichkeit

Vorläufiger Produktvergleich

Prüfpunkt	Referenzsystem	Altura AX-78	Vorläufiges Ergebnis	Offener Beleg
Einbaumaß	erfüllt	laut Datenblatt erfüllt	vergleichbar	Werkzeichnung mit tatsächlichem Aufmaß
Uw-Wert	1.0	1.0	erfüllt	Prüfzeugnis vollständig vorlegen
Dachneigung	15 bis 90 Grad	20 bis 65 Grad	bei 35 Grad erfüllt	Montageanleitung deutsch
Unterdachanschluss	vorkonfektioniert	objektspezifisch	technisch möglich	Anschlussdetail Planstand Ausführung
Ersatzteilzusage	zwölf Jahre	zehn Jahre	Mindestniveau erfüllt	rechtsverbindliche Herstellererklärung
Gewährleistung	Generalunternehmer	noch nicht erklärt	offen	Bietererklärung

Bewertung

Die Produktbezeichnung allein ist technisch nicht erforderlich. Die für den Bestand entscheidenden Schnittstellen lassen sich durch messbare Merkmale beschreiben. Das Alternativsystem ist nicht ohne weitere Prüfung freizugeben, kann aber bei Vorlage der bezeichneten Unterlagen gleichwertig sein. Eine Ablehnung nur wegen des Herstellernamens wäre fachlich nicht begründbar.

Die Vergabestelle sollte die Matrix allen Unternehmen gleichzeitig über die Plattform bereitstellen, eine einheitliche Nachweisfrist festsetzen und ihre Entscheidung zu jedem angebotenen Alternativsystem in derselben Struktur dokumentieren.

Beteiligte im Verfahren VK ML 7-19/26

Mündliche Verhandlung Dachsanierung Stadthalle Musterstadt

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Protokoll der mündlichen Verhandlung

Beteiligte

Für die Antragstellerin erschienen die Geschäftsführerin, der Kalkulationsleiter und die Verfahrensbevollmächtigte. Für die Antragsgegnerin erschienen die Leiterin der Zentralen Vergabestelle, der Projektleiter Hochbau und der Verfahrensbevollmächtigte. Der mit der Dachplanung beauftragte Architekt wurde als Auskunftsperson gehört.

Erörterter Sachstand

Die Antragstellerin erklärte, sie habe am 14.07.2026 vorsorglich ein Angebot mit dem Referenzprodukt abgegeben, um ihre Zuschlagschance nicht zu verlieren. Die Mehrkosten gegenüber dem Alternativsystem beziffere sie vorläufig mit 18.640 EUR netto. Die Antragsgegnerin bestätigte, dass bis zur Entscheidung der Kammer kein Zuschlag erteilt wird.

Der Architekt erklärte, die Marke sei aus einem früheren Bestandsplan übernommen worden. Eine Marktprüfung anderer Systeme oder ein schriftlicher Beschluss über eine technische Alleinstellung habe vor Veröffentlichung nicht stattgefunden. Entscheidend seien Anschlussmaße, Abdichtung und eine einheitliche Gewährleistung.

Hinweise der Kammer

- 1. Die objektive Auslegung der Position spricht derzeit gegen eine Gleichwertigkeitsöffnung.
- 2. Eine technische Begründung muss vor Veröffentlichung dokumentiert sein; nachträgliche Zweckmäßigkeitserwägungen ersetzen die ursprüngliche Dokumentation nicht ohne Weiteres.
- 3. Eine Berichtigung kommt als milderer Mittel in Betracht, wenn alle Unternehmen denselben Informationsstand und ausreichend Zeit für Anpassungen erhalten.
- 4. Die Frage, ob die vorsorgliche Angebotsabgabe das Rechtsschutzinteresse entfallen lässt, wird verneint; das Angebot beseitigt die behauptete Wettbewerbsbeschränkung nicht.

Vergleichsgespräch

Punkt	Antragstellerin	Antragsgegnerin	Zwischenstand
Leistungsposition	produktneutrale Neufassung	Zustimmung	Einigkeit
Nachweise	Datenblatt und Anschlussdetail	zusätzlich Herstellererklärung	grundsätzlich einigungsfähig
Angebotsfrist	mindestens 14 Kalendertage	zehn Kalendertage	offen
Kosten	Kostenaufhebung	Kostenteilung	offen

Eine abschließende Einigung kam nicht zustande. Die Beteiligten erhalten bis 17.07.2026 um 12:00 Uhr Gelegenheit, zu einer Fristverlängerung von zwölf Kalendertagen Stellung zu nehmen.

Beteiligte im Verfahren VK ML 7-19/26

Beschluss Dachsanierung Stadthalle Musterstadt

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Beschluss Dachsanierung Stadthalle Musterstadt

Tenor

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, im Vergabeverfahren HB-STH-2026-019 auf Grundlage der unveränderten Position 03.02.140 den Zuschlag zu erteilen.
2. Bei fortbestehender Beschaffungsabsicht wird die Antragsgegnerin verpflichtet, das Verfahren in den Stand vor Ablauf der Angebotsfrist zurückzusetzen, die technischen Anforderungen produktneutral und überprüfbar zu fassen und eine angemessene neue Angebotsfrist zu bestimmen.
3. Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin zu einem Viertel und die Antragsgegnerin zu drei Vierteln. Die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten war notwendig.

Gründe

Zulässigkeit

Die Antragstellerin hat ihr Interesse am Auftrag, eine mögliche Rechtsverletzung und einen drohenden Schaden dargelegt. Ihre Rüge vom 20.06.2026 ging vor Ablauf der Angebotsfrist ein. Der am 03.07.2026 eingereichte Antrag wahrt auch die Frist nach der Nichtabhilfe vom 25.06.2026.

Begründetheit

Die Leistungsbeschreibung war in der angegriffenen Position nicht eindeutig für gleichwertige Produkte geöffnet. Die Vergabeakte enthält weder eine vor Veröffentlichung abgeschlossene Prüfung technischer Alternativen noch eine Begründung, weshalb allein das bezeichnete Fabrikat den Bedarf deckt. Der in der mündlichen Verhandlung erläuterte Wunsch nach sicheren Anschlussdetails ist sachlich nachvollziehbar, lässt sich aber durch technische Mindestmerkmale und Nachweise abbilden.

Die Kammer schreibt kein bestimmtes Alternativprodukt vor. Die Vergabestelle bleibt für die Bedarfsermittlung und die fachliche Gleichwertigkeitsprüfung verantwortlich. Sie muss jedoch denselben veröffentlichten Maßstab auf alle Angebote anwenden und die Entscheidung nachvollziehbar dokumentieren.

Rechtsfolge

Die vollständige Aufhebung ist nicht erforderlich. Eine Rückversetzung, Berichtigung und neue Angebotsfrist beseitigen den Verstoß bei geringerer Beeinträchtigung des Beschaffungsvorhabens. Die bislang eingereichten Angebote dürfen erst nach einer für alle Unternehmen transparenten Entscheidung über das weitere Verfahren geöffnet oder gewertet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist die sofortige Beschwerde nach §§ 171 und 172 GWB statthaft. Die anwendbare Fassung und die Wirkungen der Beschwerde bestimmen sich nach dem durch § 187 Abs. 2 GWB maßgeblichen Beginn des Vergabeverfahrens.

Vergabeakte, Fachbereich Hochbau und Rechnungsprüfungsamt

Umsetzung des Beschlusses VK ML 7-19/26

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Umsetzung der Rückversetzung

1. Entscheidung

Die Stadt setzt das Verfahren in den Stand vor Ablauf der Angebotsfrist zurück. Die elektronische Angebotsöffnung vom 15.07.2026 wird nicht als Wertungsgrundlage verwendet. Bereits eingegangene Angebote bleiben im gesperrten Projektraum archiviert und können von den Bietern durch vollständig neue Angebote ersetzt werden.

2. Berichtigungsumfang

Bereich	bisheriger Stand	neuer Stand	Verantwortlich
Position 03.02.140	Fabrikatsnennung ohne belastbare Öffnung	funktionale Mindestmerkmale und Gleichwertigkeitsnachweise	Fachplanung
GAEB X83	Versionsstand 03 vom 16.06.2026	Versionsstand 04 mit unveränderter Ordnungszahl	AVA-Stelle
PDF-LV	abweichende Seitenreferenz	gleiche Positionsnummer und gleicher Kurztext wie X83	Vergabestelle
Angebotsfrist	15.07.2026	20.08.2026, 12:00 Uhr	Vergabestelle
Bindefrist	30.09.2026	30.10.2026	Vergabestelle

Andere Leistungspositionen, Mengen und Zuschlagskriterien werden nicht geändert. Die Vergabestelle prüft vor Veröffentlichung mit einem automatisierten GAEB-/PDF-Abgleich, ob Ordnungszahlen, Einheiten, Mengen und Kurztexte übereinstimmen.

3. Umgang mit Altangeboten

- Die Altangebote werden weder geöffnet noch inhaltlich ausgewertet.
- Die Bieter erhalten den Hinweis, dass nur ein nach der Berichtigung neu übermitteltes Angebot gewertet wird.
- Ein bloßes Bestätigen des alten Angebots ist technisch nicht vorgesehen; die Plattform verlangt eine neue vollständige Abgabe.
- Die Vergabestelle protokolliert Hashwert, Eingangszeit und erfolgreichen Rücklesetest jeder neuen GAEB-X84-Datei.

4. Freigabekette

Freigabe	Prüfswertpunkt	Ergebnis
Fachplanung	technische Notwendigkeit und Gleichwertigkeit	freigegeben mit Matrix
AVA-Stelle	X83-Schema, Position und Einheit	fehlerfrei importiert
Vergabestelle	Beschlussumsetzung und Fristen	freigegeben
Rechnungsprüfung	Änderungsumfang und Wettbewerb	keine Einwände

Die Berichtigung wird erst nach Abschluss aller vier Freigaben gleichzeitig in PDF und GAEB bereitgestellt.

5. Rücksetzungs- und Sperrprotokoll

Systemaktion	Zeit	Ergebnis	Beleg
alte X83-Fassung gesperrt	23.07.2026, 10:14 Uhr	kein weiterer Download	Portalprotokoll P-441
Altangebote in Quarantäne verschoben	23.07.2026, 10:31 Uhr	keine Wertungsberechtigung	Rechteeexport R-19
Wertungsprojekt geschlossen	23.07.2026, 10:42 Uhr	alte Bewertungsbögen nur lesbar	VMS-Ticket 8821
Version 04 rückgelesen	23.07.2026, 14:08 Uhr	X83 und PDF positionsgleich	Prüfbericht AVA-04
neue Angebotsphase angelegt	23.07.2026, 15:22 Uhr	Fristen und Rollen bestätigt	Vier-Augen-Freigabe

Die bisherigen Angebote werden nicht gelöscht, sondern beweissicher und ohne Zugriff der Wertungsgruppe archiviert. Das Öffnungsprotokoll der neuen Angebotsphase weist ausschließlich die nach der Berichtigung eingegangenen Dateien aus.

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle

Registrierte Unternehmen im Verfahren HB-STH-2026-019

Berichtigung Position 03.02.140 und neue Angebotsfrist

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Bieterinformation zur berichtigten Dachfensterposition

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabeunterlagen werden aufgrund des Beschlusses der Vergabekammer vom 20.07.2026 berichtigt. Die bisherige Fassung der Position 03.02.140 ist nicht mehr zu verwenden.

1. Neue Leistungsanforderung

Anzubieten sind zwölf Dachfenstereinheiten einschließlich Eindeckrahmen und Unterdachanschluss. Zugelassen ist jedes System, das sämtliche veröffentlichten Mindestmerkmale erfüllt. Eine bestimmte Marke wird nicht verlangt.

Mindestmerkmal	Anforderung	zulässiger Nachweis
Außenmaß	780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm	bemaßte Werkzeichnung
Wärmedurchgang	Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin	Produktdatenblatt oder Prüfzeugnis
Dachneigung	nachgewiesene Schlagregendichtheit bei 35 Grad	Systemprüfbericht
Anschluss	abgestimmtes Fenster-, Eindeckrahmen- und Unterdachsystem	Montageanleitung und Anschlussdetail
Ersatzteile	Lieferbarkeit mindestens zehn Jahre	Herstellererklärung
Gewährleistung	einheitliche Verantwortlichkeit des Auftragnehmers	Bietererklärung

Die Gleichwertigkeit wird anhand dieser Merkmale geprüft. Der Herstellername allein führt weder zu einer Bevorzugung noch zu einer Ablehnung.

2. Dateien und Versionsstand

Datei	neue Version	Prüfsumme im Portal
Leistungsverzeichnis PDF	04	wird im Downloadbereich angezeigt
GAEB X83	04	wird im Downloadbereich angezeigt
Gleichwertigkeitsmatrix	01	wird im Downloadbereich angezeigt
Bewerbungsbedingungen	03	Fristen und Abgaberegeln aktualisiert

Bei Abweichungen zwischen lokal gespeicherter Datei und Portalprüfsumme ist die Datei erneut herunterzuladen. Fragen zur Berichtigung sind bis 10.08.2026, 12:00 Uhr, ausschließlich über das Vergabeportal einzureichen.

3. Neue Fristen

Die neue Angebotsfrist endet am 20.08.2026, 12:00 Uhr. Die Bindefrist endet am 30.10.2026. Bereits übermittelte Angebote werden nicht gewertet; jedes Unternehmen muss ein vollständiges neues Angebot einschließlich GAEB-X84-Datei abgeben.

4. Bereitstellung und Empfang

Die Berichtigung wurde am 24.07.2026 um 11:06 Uhr gleichzeitig als Portalnachricht und Änderungsbekanntmachung veröffentlicht. Alle 17 registrierten Unternehmen erhielten eine Zustellbenachrichtigung. Das Portal verlangt vor einer neuen Angebotsabgabe die Bestätigung, dass Version 04 des PDF-LV und der X83-Datei heruntergeladen wurde.

Kontrollpunkt	Status
eForms-Änderungsdatensatz	technisch angenommen
PDF-LV Version 04	Virenprüfung und Sichtprüfung bestanden
GAEB X83 Version 04	Schema-, Import- und Rücklesetest bestanden
alte Versionen	als überholt gekennzeichnet und für neue Downloads gesperrt
Bieterfragenkanal	bis 10.08.2026, 12:00 Uhr geöffnet

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle

Registrierte Unternehmen im Verfahren HB-STH-2026-019

Bestandsaufmaß zu Dachfenstern und Heizungsanschlüssen nach Berichtigung

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Gemeinsames Bestandsaufmaß der berichtigten Leistungspositionen

1. Ortstermin

Der Ortstermin fand am 28.07.2026 von 08:12 Uhr bis 11:46 Uhr statt. Für die Stadt nahmen Bauleiterin Dipl.-Ing. Anne Roth, TGA-Planer Markus Hellwig und Vergabesachbearbeiterin Lina Berger teil; elf von 17 registrierten Unternehmen waren vertreten. Alle Antworten werden gleichzeitig im Vergabeportal veröffentlicht.

Die Halle blieb während der Begehung im Probetrieb. Der Zugang zum westlichen Dachfeld war wegen einer Bühnenprobe zwischen 09:20 Uhr und 09:55 Uhr gesperrt. Die Maße dieses Feldes wurden deshalb aus dem Bestandsplan B-1998-17 übernommen und am Folgetag durch das Planungsbüro kontrolliert.

2. Aufmaß Position 03.02.140

Fenster	Bestandsöffnung Breite	Bestandsöffnung Höhe	Dachneigung	Besonderheit
D-01 bis D-04	792 bis 797 mm	1.192 bis 1.198 mm	35.4 Grad	Schalung 24 mm, Unterspannbahn partiell erneuert
D-05 bis D-08	788 bis 794 mm	1.187 bis 1.195 mm	34.8 Grad	Sparrenabstand bei D-07 nur 816 mm
D-09 bis D-12	Planmaß 790 mm	Planmaß 1.195 mm	35.0 Grad	Vor-Ort-Kontrolle am 29.07.2026 nachgeholt

Die Toleranz von höchstens 5 mm betrifft das Außenmaß des angebotenen Fensters, nicht die Rohbauöffnung. Anpassungen der Wechselhölzer und Anschlusskeile sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren; Hauptsparren bleiben unberührt.

3. Aufmaß Position 04.01.020

Strang	Anschlussbestand	geplante Leistung	Kalkulationshinweis
H-1 Nordfoyer	Stahl DN 65, Flansch PN 6	Übergang auf neue Pumpengruppe	zwei Übergangsstücke und temporäre Absperrung enthalten
H-2 Saal	Stahl DN 80, Flansch PN 10	hydraulische Einbindung Heizkreis Saal	Nachtabschaltung am 14.09.2026 vorgesehen
H-3 Bühne	Mischinstallation Stahl/Kupfer	Austausch bis zur ersten zugänglichen Verschraubung	7.5 Meter Rohrleitung als Abrechnungsansatz

Für H-3 nennt das PDF-LV Version 04 eine Menge von 5 Metern, die GAEB-X83-Datei 7.5 Meter. Berichtigung 04a setzt in beiden Dateien einheitlich 7.5 Meter fest; die Preisposition bleibt unverändert.

4. Bieterfragen und Antworten

laufende Nummer	Frage	Antwort der Vergabestelle
41	Darf ein System mit Außenmaß 780 x 1.180 mm und abweichendem Eindeckrahmen angeboten werden?	Ja, wenn sämtliche Mindestmerkmale und der funktionsfähige Gesamtanschluss nachgewiesen werden.
42	Ist eine zehnjährige Ersatzteilzusage des Händlers ausreichend?	Ja, sofern sie die konkrete Produktlinie bindend erfasst; eine bloße Herstellerbroschüre ohne Laufzeitzusage genügt nicht.
43	Werden Mehrkosten aus unregelmäßigen Rohbauöffnungen gesondert vergütet?	Nein, die dokumentierten Abweichungen sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren. Nicht erkennbare Substanzabweichungen bleiben dem Vertragsrecht vorbehalten.
44	Welcher Datenstand gilt bei Widerspruch zwischen PDF und GAEB?	Nach Berichtigung 04a sind beide Fassungen inhaltlich identisch. Vorherige Dateien sind nicht zu verwenden.

5. Versions- und Importprüfung

Datei	Version	Erzeugt	Rücklesetest	Ergebnis
LV_■Stadthalle_■04a_04a1.pdf	04a1	29.07.2026, 15:08 Uhr	Sichtprüfung Seite 47	Menge und Text berichtigt
LV_■Stadthalle_■04a_04a3	04a3	29.07.2026, 15:12 Uhr	Import AVA-Bau 11.4	Positionen und Mengen vollständig
Bieterfragen_■41_■402.pdf	402	29.07.2026, 15:21 Uhr	Vier-Augen-Lesung	Antworten vollständig
Aufmass_■Dach_■Heizung.xlsx	01g	29.07.2026, 14:43 Uhr	Summenkontrolle	zwölf Fenster, drei Heizstränge

Die Dateien wurden am 29.07.2026 um 16:02 Uhr im Portal bereitgestellt. Die Angebotsfrist vom 20.08.2026, 12:00 Uhr, bleibt bestehen. Die Vergabestelle prüft am 05.08.2026 anhand der eingehenden Bieterfragen, ob eine weitere Fristverlängerung erforderlich wird.

6. Unterschriften

Anne Roth, Bauleitung; Markus Hellwig, TGA-Planung; Lina Berger, Zentrale Vergabestelle

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: HM-2026-BAU-018

Stand: 29.07.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 29.07.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Prüfbericht Vergabeunterlagen Stadthalle Musterstadt - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Nichtabhilfe zur Rüge Dachfenster Stadthalle - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Formcheck Angebotsabgabe Stadthalle - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Hochbau Mustermann GmbH <hochbau@hochbau-musterstadt.example.de>

WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Von	Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau - Poststelle <poststelle@hochbau-musterstadt.example.de>
An	Hochbau Mustermann GmbH <hochbau@hochbau-musterstadt.example.de>
Datum	Thu, 30 Jul 2026 19:35:00 +0200
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: HM-2026-BAU-018
Betreff: Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

- Zuletzt sichtbare Aktenstücke:
- 01_bekanntmachung_pruefnotiz.docx
 - 02_vergabeunterlagen_pruefbericht.docx
 - 03_ruegeschreiben_markenbezug.eml
 - 04_nichtabhilfe_vergabestelle.docx
 - 05_nachpruefungsantrag_vk.docx
 - 06_angebotsabgabe_checkliste.docx
 - 07_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
 - 08_gleichwertigkeitsmatrix_sachverstaendigenvermerk.docx

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße
Poststelle / Vergabeakte

Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Datensatz 1

Zeitstempel	2026-06-17 09:19:00
System	Vergabepattform
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_bekanntmachung_pruefnotiz.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	4c34068770970006
Bemerkung	Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-06-18 09:20:00
System	AVA/ERP
Nutzer	fachamt
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	01_bekanntmachung_pruefnotiz.docx
Status	OK
SHA256	f7f5c90841b26a16
Bemerkung	Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-06-18 09:34:00
System	DMS
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_vergabeunterlagen_pruefbericht.docx
Status	OK
SHA256	168b91b2f70779df
Bemerkung	Prüfbericht Vergabeunterlagen Stadthalle Musterstadt

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-06-19 09:34:00
System	Fristenkalender
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	02_vergabeunterlagen_pruefbericht.docx
Status	OK
SHA256	5e2bf19789e465a4
Bemerkung	Prüfbericht Vergabeunterlagen Stadthalle Musterstadt

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-06-20 09:51:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_ruegeschreiben_markenbezug.eml
Status	OK
SHA256	4e0ae8227cb622da
Bemerkung	Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-06-21 09:53:00
System	Vergabepattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	03_ruegeschreiben_markenbezug.eml
Status	nachbearbeitet
SHA256	25fd078e026662e9
Bemerkung	Rüge wegen produktbezogener Leistungsbeschreibung Dachfenster

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-06-25 10:10:00
System	AVA/ERP
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_nichtabhilfe_vergabestelle.docx
Status	OK
SHA256	3fdd00bf7b4cf320
Bemerkung	Nichtabhilfe zur Rüge Dachfenster Stadthalle

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-06-26 10:05:00
System	DMS
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	04_nichtabhilfe_vergabestelle.docx
Status	OK
SHA256	e8777e006f9eafd6
Bemerkung	Nichtabhilfe zur Rüge Dachfenster Stadthalle

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-07-03 10:21:00
System	Fristenkalender
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_nachpruefungsantrag_vk.docx
Status	OK
SHA256	3732fa171514b1b7
Bemerkung	Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-07-04 10:20:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	05_nachpruefungsantrag_vk.docx
Status	OK
SHA256	76a33a981203ded5
Bemerkung	Nachprüfungsantrag Sanierung Stadthalle Musterstadt

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-07-09 11:00:00
System	DMS
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
Status	OK
SHA256	9e9243f62febbd5
Bemerkung	Stellungnahme zum Nachprüfungsantrag Dachsanierung Stadthalle

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-07-12 11:18:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_gleichwertigkeitsmatrix_sachverstaendigenvermerk.docx
Status	OK
SHA256	6cc993e13773acfb
Bemerkung	Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-07-14 10:39:00
System	Vergabepattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_angebotsabgabe_checkliste.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	bca8a35a5cb9b3ac
Bemerkung	Formcheck Angebotsabgabe Stadthalle

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-07-16 11:32:00
System	AVA/ERP
Nutzer	fachamt
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_protokoll_muendliche_verhandlung_vk.docx
Status	OK
SHA256	8350c2d7204ba7ec
Bemerkung	Protokoll der mündlichen Verhandlung

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-07-20 11:46:00
System	Fristenkalender
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_beschluss_vk_rueckversetzung.docx
Status	OK
SHA256	319a766acf628f31
Bemerkung	Beschluss Dachsanierung Stadthalle Musterstadt

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-07-23 12:04:00
System	Vergabeplattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_umsetzungsvermerk_rueckversetzung.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	b43486b4d0d07425
Bemerkung	Umsetzung der Rückversetzung

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-07-24 12:27:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_aenderungsbekanntmachung_lv_freigabe.eml
Status	OK
SHA256	78b2c9c168aaaf9d
Bemerkung	Bieterinformation zur berechtigten Dachfensterposition

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-07-29 12:44:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	fachamt
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_bestandsaufmass_kalkulationsprotokoll.docx
Status	OK
SHA256	d4bebedeafd34fda
Bemerkung	Gemeinsames Bestandsaufmaß der berechtigten Leistungspositionen

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Fristenmatrix

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Ereignis	Datum	Frist	Rechtsgrundlage	Folge
Erkennbarer Markenbezug	17.06.2026	spätestens bis Angebotsfrist 15.07.2026 12:00 Uhr rügen	§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB	Rüge 20.06.2026
Nichtabhilfe	25.06.2026	15 Kalendertage	§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB	Nachprüfungsantrag bis 10.07.2026
Angebotsfrist	15.07.2026 12:00	Upload vorher abschließen	Vergabeunterlagen	Abgabe 15.07.2026 10:22

Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau

GAEB-Angebot Hochbau Mustermann X84

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Datenanlage: GAEB-Angebot Hochbau Mustermann X84

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB_DA_XML phase="X84" version="3.3"
xmlns="urn:example:gaeb:vergaberecht-werkstatt">
<Award procedure="HB-STH-2026-019" key="HB-STH-2026-019-X83" />
<Bidder>Hochbau Mustermann GmbH</Bidder>
<Offer id="HM-2026-BAU-018" submitted="2026-07-15T10:22:00+02:00">
<Item no="03.02.140" unitPrice="1180.00" totalPrice="28320.00" currency="EUR" />
<Item no="04.01.020" unitPrice="86.50" totalPrice="58820.00" currency="EUR" />
</Offer>
</GAEB_DA_XML>
```

Stadt Musterstadt - Fachbereich Hochbau

GAEB-Leistungsverzeichnis Stadthalle X83

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle


Datenanlage: GAEB-Leistungsverzeichnis Stadthalle X83

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB_DA_XML phase="X83" version="3.3"
xmlns="urn:example:gaeb:vergaberecht-werkstatt">
<Award procedure="HB-STH-2026-019" key="HB-STH-2026-019-X83" />
<BoQ id="LV-LOS-TB" title="Sanierung Stadthalle Musterstadt - Los Trockenbau und
Dachfenster">
<Item no="03.02.140">
<ShortText>Dachfenster liefern und einbauen</ShortText>
<LongText>Ursprünglich produktbezogene Vorgabe Velux GGU MK08; Rüge wegen fehlender
Gleichwertigkeitsklausel.</LongText>
<Quantity unit="St">24</Quantity>
</Item>
<Item no="04.01.020">
<ShortText>Brandschutzbekleidung F90</ShortText>
<Quantity unit="qm">680</Quantity>
</Item>
</BoQ>
</GAEB_DA_XML>
```

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

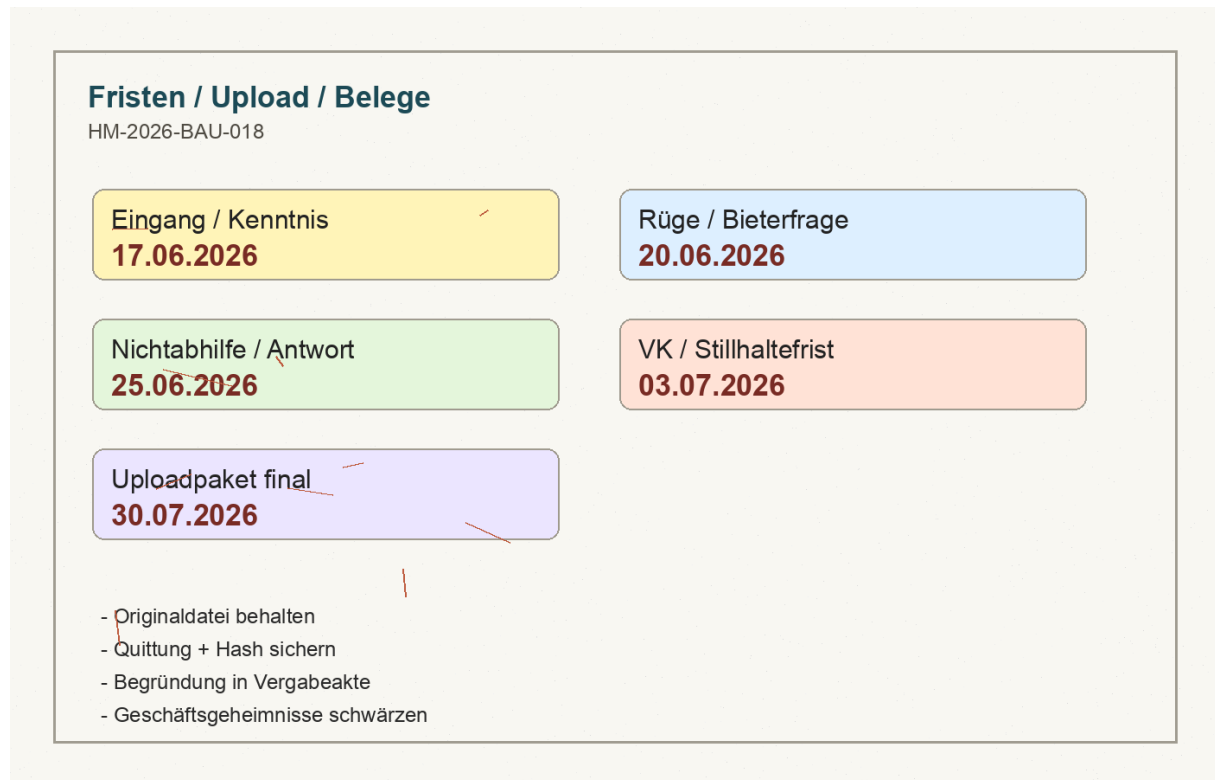

Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht
